

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 329 - 002	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 210/001	Číslo ZBV: 8
---	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ:25253361

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	-26 106,60	332 689,23	306 582,63

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	-26 106,60	332 689,23	306 582,63

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. c. 329 - 002

Cielo SVP/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 210/001

Číslo ZBV / Skupina změny:

8/5

Strany smlouvy o dílo SMLD-0163/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.03.2024 (dále jen Smlouva):

Obědnatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	37	počet listů

Pflege

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Dodatečné požadavky Objednatele

Název (dílní) Změny:

Popis a zdůvodnění Změny:

S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době předání staveniště zhotoviteli žádáme o rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání RDS objektu SO 210 – Most ev.č. 329-002 přes ŽDC v Pečkách. Požadavky Objednatel je blíže popsány níže:

1. Doplnění zatěsnění spár zálivky v celé délce říms a v místech otevřených spár ve vozovce.
2. Opravu stávajících EMZ nad oběma opěrami - včetně doplnění pruhů z MA (LA)

Výše uvedené skutečnosti vzešly z dodatečného požiadavku Objednateľa nad rámec pôvodného záměru zakázky. Z tohoto dôvodu jsou administrované v rámci Skupiny 5.

Jedná se o Změnu de minimis, podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Změny de minimis jsou změny, které splňují podmínky stanovené v §222 odst. 4 ZZVZ, jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-26 106,60	332 689,23	306 582,63	358 795,83

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Nožka, DiS	podpis
Stavební dozor: IBH, spol.s.r.o.	jméno	Ing. Miroslav Bureš	podpis
Zástupce Objednatelů odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS SK Náměstek úseku ekonomického	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatelů: KSÚS SK vedoucí manažer, zástupce vedoucího mostních techniků	jméno	Ing. Milán Jeřábek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Michael Kučera	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 210/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 329 - 002	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 251 524,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 251 524,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-26 106,60	332 689,23	332 689,23	7,83%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-26 106,60	4 558 107,13	306 582,63	7,21%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Stredočeskýho kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 210 Most ev. č. 329 - 002								SO 210					
Číslo a název rozpočtu: SO 210 Most ev. č. 329 - 002								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	M2	1,000	1,700	0,700	46319,400	46 319,40	0,00	32 423,58	78 742,98	32 423,58	70,00%
10	9115C12R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - repase	M	15,000	30,000	15,000	5129,800	76 947,00	0,00	76 947,00	153 894,00	76 947,00	100,00%
16	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	24,000	18,000	-6,000	4351,100	104 426,40	-26 106,60	0,00	78 319,80	-26 106,60	-25,00%
		Nové položky											
18	967168.N	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ - VYBOURÁNÍ A OBNOVA	KPL	0,000	1,000	1,000	223318,650	0,00	0,00	223 318,65	223 318,65	223 318,65	100,00%
Celkem													
									- 26 106,60	332 689,23		306 582,63	16,26

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Nožka, DiS. (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:	Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje
---------------------------------	--

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	39 553 104,29
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	40 057 814,29
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	48 469 955,24
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,28%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32*36	Suma změn kladných a změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 253 650,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-3,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 865 931,29

12=(1)*0,15	Limit	5 932 965,64
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	7,35%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	2 906 935,25

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název stavby:	Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 329 - 002
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 210/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby	1
09 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace	12
10 Stavební deník	11
11 CN Santech	6
12 Příloha CN Santech	1
13 Vyjádření TDI k ZBV 8 SO 210	2
14 CN na opravu EMZ Slehořer	1
15 CN na opravu EMZ Al silnice	2
16 Vyjádření Objednatele k ocenění	1
Počet listů celkem	38

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 210 Most ev. č. 329 - 002								1					
Číslo a název rozpočtu SO 210 Most ev. č. 329 - 002								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DLO 7 dní +7 dní pro opravu EMZ navíc oproti původnímu rozsahu pro údržbu (10 + 10) Cena 7/10 ceny původní - 46 319,4 * 0,7 = 32 423,58 Kč 0,7 = 0,700	KPL	1,000	1,700	0,700	46319,400	46 319,40	0,00	32 423,58	78 742,98	32 423,58	70,00%
2	0272120R.c	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLIK NA FIKTRIF TRATI	KPL	96,000	96,000	0,000	32674,900	3 136 790,40	0,00	0,00	3 136 790,40	0,00	0,00%
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KPL	1,000	1,000	0,000	37634,500	37 634,50	0,00	0,00	37 634,50	0,00	0,00%
4	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	KPL	9,375	9,375	0,000	4013,300	37 624,69	0,00	0,00	37 624,69	0,00	0,00%
5	626112.c	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	KPL	4,000	4,000	0,000	2780,000	11 120,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00%
6	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNĚM KRYTÍ	KPL	1,138	1,138	0,000	703,000	800,01	0,00	0,00	800,01	0,00	0,00%
7	74C9620R	PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA NA MOSTU - obnova PKO	KPL	60,000	60,000	0,000	4512,000	270 720,00	0,00	0,00	270 720,00	0,00	0,00%
8	9111C1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	40,000	40,000	0,000	3937,100	157 484,00	0,00	0,00	157 484,00	0,00	0,00%
9	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál	KPL	15,000	15,000	0,000	4049,000	60 735,00	0,00	0,00	60 735,00	0,00	0,00%
10	9115C12R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - repase	KPL	15,000	30,000	15,000	5129,800	76 947,00	0,00	76 947,00	153 894,00	76 947,00	100,00%
11	9115C1R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál	KPL	15,000	15,000	0,000	1075,100	16 126,50	0,00	0,00	16 126,50	0,00	0,00%
12	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	2,000	2,000	0,000	5210,900	10 421,80	0,00	0,00	10 421,80	0,00	0,00%
13	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	2,000	2,000	0,000	4631,900	9 263,80	0,00	0,00	9 263,80	0,00	0,00%
14	931335	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	KPL	20,000	20,000	0,000	553,300	11 066,00	0,00	0,00	11 066,00	0,00	0,00%
15	93640R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ - úprava odvod, žlábků opěr	KPL	2,000	2,000	0,000	17369,800	34 739,60	0,00	0,00	34 739,60	0,00	0,00%
16	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KPL	24,000	18,000	-6,000	4351,100	104 426,40	-26 106,60	0,00	78 319,80	-26 106,60	-25,00%
17	938543.b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	KPL	9,375	9,375	0,000	383,200	3 592,50	0,00	0,00	3 592,50	0,00	0,00%
18	938543.c	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	KPL	4,000	4,000	0,000	323,900	1 295,60	0,00	0,00	1 295,60	0,00	0,00%
19	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	224417,300	224 417,30	0,00	0,00	224 417,30	0,00	0,00%
		Nové položky											
20	93160R.N	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ - VYBOURÁNÍ A OBNOVA Cena stanovena dle Směrnice R-Sm-36, bodu 17.4. iii) a bodu 17.5. Nabídková cena 194190 = 194 190,000 Výrobní režie 5%, správní režie 5%, zisk 5% 194191*0,15 = 29 128,650 Mezisoučet = 223 318,650 Množství 1 = 1,000	KPL	0,000	1,000	1,000	223 318,65	0,00	0,00	223 318,65	223 318,65	223 318,65	100,00%
		Celkem						4 251 524,50	- 26 106,60	332 689,23	4 558 107,13	306 582,63	1,45

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Věc: Pokyn Objednatele k provedení změny prací během výstavby Díla „Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ (dále jen Stavba)

S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době předání staveniště zhotoviteli **žádáme o rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání RDS objektu SO 210 – Most ev.č. 329-002 přes ŽDC v Pečkách o:**

1. Doplnění zatěsnění spár zálivkami v celé délce říms a v místech otevřených spár ve vozovce.
2. Opravu stávajících EMZ nad oběma opěrami – včetně doplnění pruhů z MA (LA)

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS, včetně fotodokumentace a ověření výměr. Doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě detailního ohledání na místě v době již zahájené stavby po konzultacích a doporučeních projektanta AD. Provedení úprav dle výše uvedeného postupu významným způsobem zvýší užitnou hodnotu a celkovou bezpečnost i životnost Stavby. Řešení bylo konzultováno s TDS a odsouhlaseno objednatelem na místě. Objednatel bere v úvahu také využití současných možností zhotovitele v prostoru probíhající stavby. Provedení se předpokládá po ukončení zimní přestávky na jaře roku 2025.

Zhotovitel bude postupovat bez nároku na prodloužení lhůty pro celkové dokončení stavby, změna může vyvolat dílčí úpravu v HMG provádění objektu.

Zhotovitel zpracuje a předloží **Technologický postup** provedení požadovaného rozšíření o výše uvedené změny, CN a všechny potřebné podklady ke schválení změny způsobem a v rozsahu článku 6.7 SOD.

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu provádění stavby. Externí organizaci budou podklady předány po schválení jejich provedení a úplnosti ze strany TDS a souhlasu objednatele.

Objednatel souhlasí se zahájením realizace požadovaných změn bez zbytečného odkladu, tak aby celkový dopad na HMG stavby byl minimální. Zhotovitel použije v maximální míře položek definovaných v cenové nabídce a případně doloží podrobný rozklad položek obsažených v cenové nabídce změny Stavby, které nejsou obsaženy v oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v jeho poslední známé aktualizace.

V Kolíně dne 3.10.2024

Ing. Milan Jeřábek
Vedoucí manažer – zástupce vedoucí

ník

Za zhotovitele převzal:
(jméno, podpis a datum)



Most ev.č. 329-002

RDS/DSPS

**Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice,
železniční koridory a ostatní riziková území na území
Středočeského kraje - SMLD-0163/00066001/2024**

Stavba

Stavební objekt

SO 210 – Most ev.č. 329-002 (Pečky)

Předkládá:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel (přímý zhotovitel):

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	IBH, spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradova 3178 272 01 Kladno IČ: 47540966	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Projektant:	Pontex spol. s.r.o. se sídlem: Bezová 1658 147 14 Praha 4 IČ: 40763439	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Pardubice a.s. se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice IČ: 25253361	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 22 075 06	Vedoucí projektant: Ing. David Dvořáček	
Schválil: Ing. Petr Souček	Zodp. projektant: Ing. David Dvořáček	
Tech. kontrola: Ing. Kamil Pejchal	Vypracoval: Ing. Tomáš Malecký	

Objednatel: KSÚS	Obec: Pečky	Kraj:	Středočeský
Akce: MPM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – TECHNICKÁ POMOC A ZJEDNODUŠENÁ PD		Datum: 26.5.25	Stupeň
			RDS/DSPS
Objekt: SO 210 – MOST ev.č. 329-002			



1. Zásady zpracování

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

2. Identifikační údaje stavby

2.1. Identifikační údaje dokumentu a účastníků výstavby

Zhotovitel, stavba, sekce, účinnost, zpracovatel, schvalující orgán Zhotovitele a Objednatele včetně jména, funkce, data a podpisu odpovědných osob.

Identifikační údaje Objednatele, stavebního dozoru, Zhotovitele a pod-zhotovitelů, projektantů.

Objednatel (zástupce)	
Organizace	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov
Odpovědný zástupce	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
Odpovědný technický zástupce	Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
Kontaktní údaje	

Zhotovitel	
Organizace	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice
Odpovědný zástupce	Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby
Kontaktní údaje	
Zodpovědný stavbyvedoucí	Jan Nožka, DiS
Kontaktní údaje	

Projekce	
Organizace	PONTEX s.r.o. Praha 4, Bezová 1658
Funkce	Zhotovitel PD
Odpovědný projektant	Ing. David Dvořáček
Kontaktní údaje	

Zástupce objednatele	
Jméno	KSÚS Sk, p.o. vedoucí manažer, zástupce vedoucího úseku mosty Ing. Milan Jeřábek
Kontaktní údaje	



2.2. Vysvětlivky použitých termínů

ČSN	česká technická norma
ČSN EN	česká technická norma – česká verze mezinárodní normy
KZP	kontrolní a zkušební plán
ŘSD	ředitelství silnic a dálnic,
TDI	technický dozor investora
RDS	realizační dokumentace stavby,
SD	stavební deník
TePř	technologický předpis
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČSN EN ISO	česká technická norma identická s evropskou normou ISO
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
OŽP	ochrana životního prostředí
PD	projektová dokumentace
PDPS	projektová dokumentace pro provedení stavby
PO	požární ochrana
PP	pracovní postup
SOD	smlouva o dílo
SV	stavby vedoucí
TKP	technické kvalitativní podmínky ŘSD ČR
TP	technologické podmínky MD
ZTKP	zvláštní technické kvalitativní podmínky

2.3. Technické údaje o stavbě

II. Ukazatele stavby jako např. délkové či objemové charakteristiky, skladby a typy konstrukcí.

Ukazatele stavby	
Údaj o stavbě	Charakteristika
Název stavby	MPM Zajištění bezpečnosti – technická pomoc a zjednodušená PD
Stavební objekt	SO 210 - Most ev. č. 329-002
Kraj	Středočeský
Katastrální území	Pečky
Obec	Pečky
Druh převáděné komunikace	2. třída / 329
Délka přemostění	63.21 m
Délka mostu	m
Délka NK	65.71 m
Šikmost mostu	100.00 g
Volná šířka mostu	9.50 m
Šířka chodníků	2.50 m
Celková šířka mostu	12.50 m

**Ukazatele stavby**

Výška mostu nad terénem	6.90 m
Stavební výška	m
Plocha NK	m ²

Sanační práce:**Předúprava povrchu a odstranění degradovaných částí:**

Před vlastní sanací spodní hrany římsy byla provedena úprava povrchu včetně odstranění narušeného či degradovaného betonu. Betonové povrchy byly mechanicky očištěny bouracími nástroji a dočištěny ocelovým kartáčem, aby byla dostatečně otevřena pórová struktura betonu a povrch byl dostatečně zdrsňen pro správné přilnutí sanačních vrstev.

Očištění a ošetření výztuže:

Odhalená betonářská výztuž musela být i při slabé korozi ošetřena. Nejprve byl mechanicky odstraněn beton v okolí korodující výztuže tak, aby bylo možné výztuž očistit a ošetřit po celém jejím obvodu. Nutné bylo rovněž odstranit beton min. 20mm za výztuží. Současně bylo nutné, aby výztuž byla takto odhalena až do zdravého úseku bez koroze o délce 100-150mm.

Očištěná výztuž byla poté v celé odhalené délce ošetřena antikorozním nátěrem s aktivními pigmenty – Resibond SP. Příprava nátěru a aplikace nátěru se řídila TL výrobce. Antikorozní nátěr se nanášel ihned po očištění výztuže a to štětkou ve dvou vrstvách. Nejprve se provedl nátěr 1. vrstvy v tl. 1mm po celém obvodu výztuže. Po vytvrdnutí (cca 30min.) se nanas 2. nátěr opět v tl. 1mm. Před dalšími aplikacemi opravných hmot musel být nátěr dostatečně vytvrdlý. Aplikace nátěru nesměla být prováděna, pokud teplota výztuže nebo okolní teplota klesne pod 5°C.

Hrubá reprofilace betonu:

Místa s hloubkově odstraněným betonem (hloubky nad 5mm) byly reprofilovány správkovou maltou Resibond Standart. Jednalo se o k tomu účelu určenou PCC maltu třídy R4 (se statickou funkcí) dle EN 1504-3.

Před nanesením správkové malty musely být z povrchu odstraněny všechny nesoudržné i prachové části. Povrch musel být předem řádně provlhčen.

Nejprve byl aplikován štětcem spojovací můstek. Příprava správkové malty se řídí TP výrobce. Malta se aplikovala zednickou lžící či dřevěným hladítkem na stále vlhký povrch – spojovací můstek se nesměl nechat vyschnout!

Resibond Standart směl být aplikován v několika vrstvách, každá s tloušťkou od 5 – 25mm na aplikaci (až 75mm horizontálně), každá vrstva se musela nechat vytvrdnout (20min. při 20°C). Jestliže rozdílne vrstvy vytvrdnou ještě před kompletací, znovu se aplikuje spojovací můstek. Hlazení lžící nebo finalizace povrchu hladítkem či houbou se může provádět, jakmile začne malta tuhnout

Při tuhnutí především v podmínkách vysokých teplot, nízké vlhkosti nebo silného větru je nutné povrch aplikace řádně ošetřovat alespoň po dobu 5 dnů. Chránit před výparem zakrytím PE fólií nebo vlhkou tkaninou, vlhčením. Lze také aplikovat vhodný ošetřovací přípravek.

Aplikace správkové malty nesměla být prováděna, pokud teplota podkladu nebo okolní teplota klesne pod 5°C anebo jsou teploty vyšší než 30°C.

Oprava PKO:**Předúprava povrchu a odstranění degradovaných částí:**

Povrch ocelové konstrukce zábradlí, svodidel, protidotykové zábrany byl mechanicky očištěn od koroze, byly odstraněny zbytky nečistot a povrch upraven na drsnost povrchu dle ČSN ISO 8503-1



Způsob aplikace:

Základní vrstva a vrchní nátěr byl prováděn pásovými nátěry štětcem/válečkem.

Charakteristika použitých nátěrových hmot:

2K - Deripox Grund S dvousložkový základní nátěr nebo mezinátěr na bázi epoxidové pryskyřic, zvýšený obsah sušiny

2K - Derocryl Lack EG 687 dvousložkový krycí lak na bázi polyuretanu s obsahem železité slídy

Podmínky pro aplikaci:

teplota okolí	min. +10°C/max. 30°C (standard)
teplota objektu	min. teplota nad rosný bod – 5°C
relativní vlhkost	min. 30%/ max. 85 %
teplota povrchu konstrukce	min. +10°C/max. 40°C



Fotodokumentace provedených prací

Obr. 1 – reprofilace podhledů sanační maltou do 20mm – 13,375 m²



Obr. 2 – doplnění dopravních značek – 2ks



Obr. 3 – zábradlí lankové – 40,0 m



Obr. 4 – zábradlí mostní – obnova PKO – 15,0 m





Obr. 5 – svodidlo mostní – repase, obnova PKO+spoj.mat. – 30,0 m



Obr. 6 – těsnění dilatačních spár – 20,0 m





Obr. 7 – úprava odvodňujícího žlábků opěr – 2 ks



Obr. 8 – mostní odvodňovací trubka – 24,0 ks



Obr. 9 – protidotyková zábrana mostu – obnova PKO - 60,0 m²



Obr. 10 – doplnění těsnících zál. podél říms + otevřených spár ve vozovce - 198,0 m (ZBV)





Obr. 11 – oprava stávajících EMZ – 50,0 m² (ZBV)



Údaje o stavbě			
Přesný název stavby (nebo její části)	SO 210 MOST EV. Č. 329-002		
Místo stavby			
Územní rozhodnutí (číslo jednací)		Datum nabytí právní moci	
Stavební nebo jiné povolení (č. jednací)		Datum nabytí právní moci	
Stavebník — objednatel (vč. změn odpovědných osob apod. během výstavby)			
Název	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA PILNICE STŘEDODĚKREMOVSKÉHO KOPCE		
Sídlo	ZBROJOVSKÁ 31/11 150 21 TRAM.		
IČ		DIČ	
Zastoupený (jméno, příjmení a funkce)			
Ing. MILAN JERÁBEK		TDI	
Zhotovitel — dodavatel (vč. změn odpovědných osob apod. během výstavby)			
Název			
Sídlo			
IČ			
Zastoupený (jméno, příjmení a funkce)			Telefon
JAN KOŽKA, DI		STAVBY VEDOUcí	
MILAN NASTOUPIL		STAVBY VEDOUcí	
Odpovědná autorizovaná osoba jméno a příjmení			
Číslo autorizace		Rozsah autorizace	
Telefon		Razítko a podpis	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
	DNEŠNÍMO DNE BYLO PŘEDÁNO A PŘEVZATO STAVENÍSTĚ, VIZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS.	
11.10.-12.10.24	POČASÍ: OBLAČNO, PŘEMĚNKA + 5°C - + 12°C	
	PRÁTEK - SOBOTA POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPCE, 3x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 08 ⁰⁰ - 05 ⁰⁰	
	MECHANISACE: CH+TPCE - PVS S KLOPKA, POUVAL, LIEBHERR + KLEC, ELEKTROCEZ TRÁVA, ZUČNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRÁCE: PŘÍKOLEVÍ PRACOVNÍKŮ ZOSP	
	- DOVOZ A POZEVÍ PVS (KARÁDOVA) A PVS S RUKOU	
	- OPAZEVÍ DOPRAVNÍHO ZUČNÍ NA MOSTĚ + SETAFORD	
	NA PŘÍDAVÝ PROVOZ NA MOSTĚ	
	- NAPĚTOVÁ A TRÁTOVÁ VÝLUKA KOLEJE SMĚR CHOTUTICE (21 ⁰⁰ - 05 ⁰⁰)	
	- VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU V PROTID. ZÁBRAN	
	- NÁTER ŽARNOU PROTIDOT. ŽÁBRAN	
	- OPAZEVÍ KEREZ. TRUBICEK, NA STAVAJÍCÍ ODVOD. TRUBKY POD MOSTEM	
12.-13.10.24	POČASÍ: POLOJASNO + 3°C - + 14°C	
	PRÁTEK - SOBOTA POČET PRAC.: 1+2 CH+TPCE, 3x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 21 ⁰⁰ - 05 ⁰⁰	
	MECHANISACE: CH+TPCE - PVS LIEBHERR (DOVCEZ, ZABR) + KLEC, ELEKTROCEZ TRÁVA, ZUČNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRÁCE: PŘÍKOLEVÍ PRACOVNÍKŮ ZOSP	
	- NAPĚTOVÁ A TRÁTOVÁ VÝLUKA KOLEJE SMĚR CHOTUTICE	
	- VÝMĚNA SPOJ. MATERIÁLU V PROTIDOTKOVÝCH ZÁBRAN	
	- NÁTER ŽARNOU PROTIDOT. ZÁBRAN	
	- OPAZEVÍ KEREZ. TRUBICEK, NA STAVAJÍCÍ ODVOD. TRUBKY POD MOSTEM	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
13.10.24	POČASÍ: POLOJASNĚ + 4°C - + 14°C	
ÚTERÝ	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPCE, 3x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 21 ⁰⁰ - 05 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - PVJS, LEBHERR+KLEC, ELEKTROČ., RŮZNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PRŮBĚH PRACOVNÍKŮ ŽOZP	
	- NÁPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝCUNA KOLEJE PŘES LADUTICE	
	- VÝMĚNA SPOJ. MATERIÁLŮ U PROTIDOT. ZÁBRAN MŮSTU	
	- NÁTER BARVOU PROTID. ZÁBRAN	
	- OČIŠTĚNÍ NEREZ. TRUBICEK, NA STAVÁNÍČ. ODVODN. TRUBIC	
	TOU POITEN	
15.10.24	POČASÍ: POLOJASNĚ + 4°C - + 13°C	
ÚTERÝ	POČET PRAC.: 1+2 CH+TPCE, 3x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 04 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - PVJS, ELEKTROČ., RŮZNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PRŮBĚH PRACOVNÍKŮ ŽOZP	
	- VÝMĚNA SPOJ. MATERIÁLŮ U PROTIDOT. ZÁBRAN MŮSTU	
	- NÁTER BARVOU PROTID. ZÁBRAN	
	- OČIŠTĚNÍ KONTAMINACE NA MŮSTĚ	
15.10.24	ŽÍJS TDI	
	TDI provedl kontrolu stavu. Bez problémů	
16.10.24	POČASÍ: POLOJASNĚ + 4°C - + 16°C	
STŘEDA	POČET PRAC.: 1+2 CH+TPCE, 3x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - PVJS, ELEKTROČ. STŘAHA, RŮZNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PRŮBĚH PRACOVNÍKŮ ŽOZP	
	- VÝMĚNA SPOJ. MATERIÁLŮ U PROTIDOT. ZÁBRAN MŮ.	
	- NÁTER BARVOU PROTID. ZÁBRAN	
	- OČIŠTĚNÍ KONTAMINACE NA MŮSTĚ	
17.10.24	POČASÍ: POLOJASNĚ + 8°C - + 16°C	
ČTÁTEK	POČET PRAC.: 1+2 CH+TPCE, 3x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - PVJS, ELEKTROČ. STŘAHA, RŮZNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PRŮBĚH PRACOVNÍKŮ ŽOZP	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
	- VÝMĚNA SPOL. MAT. U PROTIDOT. ZAŽRAK MONT	
	- NÁTER ŽARNOU PROTID. ZAŽRAK A ZAŽRAK	
	- DOVOZ A PLOŽENÍ MUKIHOVÉHO LETEŽÍ	
18.10.-19.10.24	POČASÍ: POLOJASNO + 10°C - + 15°C	
19.10.24	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPCE, 3+ MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 21 ⁰⁰ - 05 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - TVJS, LIEBHERR + KLEC, ELEKTROODRÁVA, RŮZNÁ NÁŘADÍ	
	TOPIŠ PRACÍ: PLOŽENÍ PRACOVNÍKŮ ŽOŽP	
	- NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝLUKA 1. STANICE KOLEJE	
	- VÝMĚNA SPOL. MATERIÁLU U PROTIDOT. ZAŽRAK	
	- NÁTER PROTIDOT. ZAŽRAK	
	- OPAZOVÁNÍ KREZ. TRUBICEK NA STAVAJÍCÍ ODVOZOVACÍ TRUBICÍ POD MOSTEM	
19.-20.10.24	POČASÍ: POLOJASNO + 4°C - + 16°C	
20.10.24	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPCE, 3+ MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 21 ⁰⁰ - 05 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - TVJS, LIEBHERR + KLEC, ELEKTROODRÁVA, RŮZNÁ NÁŘADÍ	
	TOPIŠ PRACÍ: PLOŽENÍ PRACOVNÍKŮ ŽOŽP	
	- NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝLUKA 1. STANICE KOLEJE	
	- VÝMĚNA SPOL. MATERIÁLU U PROTIDOT. ZAŽRAK	
	- NÁTER PROTIDOT. ZAŽRAK	
	- OPAZOVÁNÍ KREZ. TRUBICEK NA STAVAJÍCÍ ODVOZOVACÍ TRUBICÍ POD MOSTEM	
	- SPALOVACÍ ŘÍMSY A PODMLADY MOSTOVKY	
20.-21.10.24	POČASÍ: POLOJASNO + 6°C - + 17°C	
21.10.24	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPCE, 3+ MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 21 ⁰⁰ - 05 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - TVJS, LIEBHERR + KLEC, ELEKTROODRÁVA, RŮZNÁ NÁŘADÍ	
	TOPIŠ PRACÍ: PLOŽENÍ PRACÍ ŽOŽP	
	- NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝLUKA 1. STAN. KOLEJE	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
	- VÝPĚJA POJ. MATERIÁLŮ U PROTIDOT. ZÁBRAN - KATER PROTIDOT. ZÁBRAN - OPAZOVALÍ NEREL. TRUBICE, NA STAV. ODVOD. TRUBKY POD MOSTEM - SANACE ŘÍTNÍ A PODHLEDU MOSTOVKY - KATER ARMATURNÍ INHIBIT. KORÓZE	
22.10.24	TOČANÍ: POLOVANNO + 6°C - + 16°C ÚČET PRAC: 1+2 CH+T PCE, 3x MTH SERVIS PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 18⁰⁰ MECHANIZACE: CH+T PCE - PVJS, ELEKTROCE, RUCNÍ NÁŘADÍ, LEPEŽI POPIS PRAC: PROLOŽÍ PRAC. ZOTP - STAVBA MUKLÍKOVÉHO LEPEŽI - OPAZOVALÍ NEREL. TRUBICE, NA STAVAJÍCÍ ODVOD. TRUBKY POD MOSTEM - SANACE OPĚR MOSTU - KATER ARMATURNÍ INHIBIT. KORÓZE	
23.10.24	NA MOSTĚ NE NEPRACOVANO PRÁČA	
24.10.24	TOČANÍ: POLOVANNO + 4°C - + 18°C ÚČET PRAC: 1+2 CH+T PCE, 3x MTH SERVIS PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 18⁰⁰ MECHANIZACE: CH+T PCE - PVJS, ELEKTROCE, RUCNÍ NÁŘADÍ, LEPEŽI POPIS PRAC: PROLOŽÍ PRACOVNÍK ZOTP - SANACE OPĚR MOSTU → KATER ARMATURNÍ INHIBIT. KORÓZE - STAVBA MUKLÍKOVÉHO LEPEŽI - OPAZOVALÍ NEREL. TRUBICE, NA STAVAJÍCÍ ODVOD. TRUBKY, POD MOSTEM	
25.10.24	TOČANÍ: OBČANNO + 10°C - + 15°C ÚČET PRACOVNÍK: 1+2 CH+T PCE, 2x MTH SERVIS PRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰ - 18⁰⁰ MECHANIZACE: CH+T PCE - PVJS, ELEKTROCE, LEPEŽI, RUCNÍ NÁŘADÍ	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
	<u>POPIS PRACÍ</u> ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ ZOZP - PÁLIACE OPER A KŘÍDEL MONTA → NÁTER ARNATUŘI KUHIL - KOROZE - STAVBA LESTNÍ - ČISTENÍ DNOV. ŽÁBNU NA OTEVŘENÍ ZA UZJENÍ - MONTA → OPAZOVÁNÍ NERETOVÉHO ŽÁBNU NA KOLICÍCH - ŽABKŮ → ČÁSTEČNÁ PÁLIACE ŽABKŮ	
20-24.10.24	<u>POČASÍ</u>: OBLAČNO + 10°C - + 14°C <u>POČET PRACOVNÍKŮ</u>: 1+2 CH+TPE, 2x MPI SERVIS <u>PRACOVNÍ DOBA</u>: 21⁰⁰ - 05⁰⁰ <u>MECHANIZACE</u>: CH+TPE - PR3S, LIEBHERR + KLEC, ELEKTROCENTRÁLA, RUCNÍ NÁŘADÍ <u>POPIS PRACÍ</u>: ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ ZOZP - NÁPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝLUHA 2. STAVBY KOLEJE - VÝMĚNA SPJN. MATERIÁLU U PROTID. ŽÁBRAN → NÁTER - PROTID. ŽÁBRAN - OPAZOVÁNÍ NERET. TRUBIC, NA STAVÁNÍ DVOU TRUBIC - TOD MONTA - NÁTER OBNAŽENÉ ARNATUŘI INHIBITOREM KOROZE	
24-28.10.24	<u>POČASÍ</u>: POLOJASNO + 10°C - + 16°C <u>POČET PRACOVNÍKŮ</u>: 1+2 CH+TPE, 2x MPI SERVIS <u>PRACOVNÍ DOBA</u>: 21⁰⁰ - 05⁰⁰ <u>MECHANIZACE</u>: CH+TPE - PR3S, LIEBHERR + KLEC, ELEKTROCENTRÁLA, RUCNÍ NÁŘADÍ <u>POPIS PRACÍ</u>: ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ ZOZP - NÁPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝLUHA 2. STAVBY KOLEJE - VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU U PROTID. ŽÁBRAN → - NÁTER ŽÁBRAN - OPAZOVÁNÍ NERET. TRUBIC, NA STAVÁNÍ DVOU TRUBIC TOD MONTA	
28-29.10.24	<u>POČASÍ</u>: POLOJASNO + 10°C - + 18°C <u>POČET PRACOVNÍKŮ</u>: 1+2 CH+TPE, 2x MPI SERVIS <u>PRACOVNÍ DOBA</u>: 21⁰⁰ - 05⁰⁰ <u>MECHANIZACE</u>: CH+TPE - PR3S, LIEBHERR + KLEC, ELEKTROCENTRÁLA, RUCNÍ NÁŘADÍ <u>POPIS PRACÍ</u>: ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ ZOZP - NÁPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝLUHA 2. STAVBY KOLEJE - VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU U PROTID. ŽÁBRAN →	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
	WATER PROTIDOT. ŽABRAU - OPAZOVALI' NEREZ. TAVRICE, NA STAV. OD. TRUBU POD MOSTOM - WATER OBNAZ. AUTOTURNI ILMIBIT. LOROZE → PALACE PODMLEDU MOSTOVNY	
30.10.24	POČASÍ: TOU JASNO + 8°C - + 15°C POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPE, 4x MPI SERVIS PRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰ MECHANIZACE: CH+TPE - PVIS TAVU, ELEKTROREUTRAVA, RUCNÍ NÁŘADÍ POPIS PRACÍ: JAKOŽ PRACOVNÍKŮ DOZP - STAVBA LEŽEŇÍ → ŽITELNÍ ODVOD. ŽABRAU NA OPERACI ZA LOŽNÍKAMI MOSTU → OPAZOVALI' NEREZ. ŽABRAU NA KONEČNÝ ŽABRAU → PALACE ODLOU ŽABRAU - VÝMĚNA STAV. MATERIÁLU U PROTIDOT. ŽABRAU → WATER PROTID. ŽABRAU - NAPŮJENÍ A ODVOD LEŽEŇÍ - OPRAVA A VÝMĚNA NABOURANÝCH SVODIČŮ	
30.10.24	TOI přenechal kontrolu stavu bez připomínek.	
31.10.24	POČASÍ: OBLAČNO + 10°C - + 15°C POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPE, 4x MPI SERVIS PRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰ MECHANIZACE: CH+TPE - PVIS, ELEKTROREUTRAVA, RUCNÍ NÁŘADÍ POPIS PRACÍ: JAKOŽ PRACOVNÍKŮ DOZP - OPRAVA A VÝMĚNA NABOURANÝCH SVODIČŮ - OPAZOVALI' (NAVRTÁVALI') LANOU ŽABRAU NA KŘÍDLA MOSTU → MROBETNÍ Z PASTBETONU, POD PATNAMI - PALACE OPER MOSTU	
1.11.24	POČASÍ: OBLAČNO + 10°C - + 16°C POČET PRACÍ: 1+2 CH+TPE, 4x MPI SERVIS PRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰ MECHANIZACE: CH+TPE - PVIS, ELEKTRORE, RUCNÍ NÁŘADÍ POPIS PRACÍ: JAKOŽ PRACÍ DOZP - OPRAVA A VÝMĚNA NABOURANÝCH SVODIČŮ - OPAZOVALI' (NAVRTÁVALI') LANOU ŽABRAU NA KŘÍDELCI MOSTU → ZKOTVENÍ MROBETNÍ Z PASTBETONU, POD PATNAMI ŽABRAU - ÚKLID STAVEJISTE	

[illegible]

Datum	Denní záznamy stavby
22.4.2025	Zápis o předání a převzetí staveniště přítomni: Martin Pícha - SANTECH ALTA Jan Nožka - Chládek a Tinkler Dnešního dne přebírá zhotovitel od objednatele staveniště k provedení opravy MD2 na mostě ev.č. 329-002 Pečky dle obj.č. N25-1012-0143 ze dne 12.3.2025. Práce budou prováděny ve dvou etapách a to: I. etapa - 22.4 - 24.4 II. etapa - 28.4 - 4.5 Tímto zhotovitel zahajuje vlastní práce. zhotovitel: objednatel: SANTECH ALTA Chládek a Tinkler Jan Nožka
22.4.2025	počasí: jasno poč. prac: 4 + 1 THP mechanismy: 2x vozidlo, centrála, kompresor, vřzačka, bouř. kladivo popis prac: - příprava mechanismů a staveniště - rozměření a značení oprav OP1 - I. etapa - prořezání vřzačkou spár včetně vybourání - zaplavení ETZ včetně doplnění OP1 - uklid mechanismů a staveniště kontrola bez zá

Datum	Denní záznamy stavby
23.4.2025	počasí: jasno poč. prac: 4 + 1 THP mechanismy: 2x vozidlo, centrála, kompresor, vřzačka, flexa, bouř. kladivo popis prac: - příprava mechanismů a staveniště - rozměření a značení oprav OP2 - I. et. - prořezání vřzačkou spár včetně vybourání - zaplavení ETZ včetně doplnění - broušení okopávkou plechu OP1 + OP2 - obnova PKO okopávkou plechu - uklid mechanismů a staveniště kontrola bez zá
24.4.2025	počasí: oblačno - zataženo poč. prac: 6 mechanismy: 2x vozidlo, centrála, kotlí, postřikovač, kompresor popis prac: - příprava mechanismů a staveniště - čištění podkladu tl. vakuem - pokládka LA ve dvou vrstvách OP1 a OP2 - čištění komůrek ETZ v dímsích - zajištění mod. odst. záclinkou - dokončení ETZ v dímsích zádílením kamenivem 2/4 mm - uklid mechanismů a staveniště kontrola bez zá

Datum	Denní záznamy stavby
25.4.2025	* s ohledem na tuhou dešť zhotovitel písměje vstřel prováděné práce
26.4.2025	POHŮZKA KOO ROZP PO STAVENÍ + KA ROZP, BEZ PŘIPOMÍNEK
26.4.2025	počasí: jasno poč. prac. 3+1 THP mechanismy: 2x vozidlo, centrála, kompresor, čerpadla, kotel, postřikovač popis prací: - příprava mechanismů a stavení - přepravu pracovních spár a napojení - čistění tl. vzduchem + penetrace - zabít horníky ast. zábrankou - dokončení příslušným vepřem - uklid před uvedením do provozu - uklid mechanismů a stavení kontrola b
	* Dnešního dne zhotovitel ukončil práce na provedení prací I. etapy Přivedení provozu a zahájení prací II. etapy proběhne dne 28.4.2025.

Datum	Denní záznamy stavby
28.4.2025	počasí: jasno poč. prac. 4 mechanismy: 2x vozidlo, centrála, kompresor, bouřecí kladiva, čerpadla spár, PB hořák, popis prací: - příprava mechanismů a stavení - označení a provedení prací II. etapy OP1 a OP2 - vybavení voz. vstev vč. zaplavení stavajících ETZ OP1 - uklid mechanismů a stavení kontrola bez z
29.4.2025	počasí: jasno poč. prac. 4+1 THP mechanismy: 2x vozidlo, centrála, kompresor, bouřecí kladiva, PB hořák, popis prací: - příprava mechanismů a stavení - vybavení vozov. vstev OP2 vč. zaplavení ETZ OP2 - broušení skopových plechů OP1,2 včetně obnovení PKO - uklid mechanismů a stavení kontrola bez zřvaz
	* Bude probíhat technologická přestávka do doby pokládky LT. Předpoklad 1-2.5.2025

Datum	Denní záznamy stavby
1.5.2025	počasí: Jasně poč. prac. 3 mechanismy, 1x vozidlo, kompresor, popis prac. - příprava mechanismů a staveniště - čištění podkladu H. vzduchem - provedení pokládky LA OP1 a OP2 ve druhu usťvách - dokončení kam 2/4 mm + válcování - uklid mechanismů a staveniště
2.5.2025	Jasně poč. prac. 4 + ITMP mechanismy, 2x vozidlo, kotl, centrifuga, čerpadla, postřikovač, 7 Blaker popis prac. - příprava mechanismů a staveniště - přibírání pracovních spr a čerpadel - čištění + penetrace - zalití mod. asf. závlakov - obnovení PKO okrajových plechů - dokončení EMZ v timsích kamenivem 2/4 mm. - uklid mechanismů a staveniště

Datum	Denní záznamy stavby
2.5.2025	<u>Žápis o předání a převzetí</u> <u>staveniště</u> přítomni: Pichá Martin - SANTECH ATE Jan Nožka - Chládek a Tinkler Dnešního dne zhotovitel ukončil práce na provedení opravy povrchu vozovky a MD2 na mostě el. č. 329-002 Pečky dle obj. č. N25-1012-0143 ze dne 12.3.2025. výměnice prací viz samostatný soupis Práce byly provedeny v pořádkovém vzhledu a kvalitě odpovídající tomuto druhu prací. staveniště je vyklizeno od všech zbytků stavebního materiálu a nečistot a je schopno bezpečného přístupu. Tímto zhotovitel předává objednateli staveniště po ukončení prací, který tímto souhlasí s vystavením fa za provedení práce. zhotovitel. objednatel. SANTECH ATE s.r.o. Chládek a Tinkler Martin Pichá Jan Nožka



Štěpánská 2071/37
110 00 Praha 1
IČO: 24277665, DIČ: CZ24277665

Cenová nabídka

č. 23/02/2025 K

Stavba : Oprava povrchu MDZ

Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 329-002 Pečky

Technologie: Oprava povrchu MDZ

Objednatel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Jan Nožka
K Vápence 2677
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Zpracovatel : SANTECH Alfa s.r.o.
Martin Pícha
Štěpánská 2071/37
110 00 Praha 1

Datum: 19.2.2025
Počet stran: 6

OBSAH :

- 1. Úvod**
- 2. Technologický postup**
- 3. Materiály použité k zabudování**
- 4. Použité mechanismy**
- 5. Cenová část**
- 6. Spolupůsobení objednatele**
- 7. Termín realizace**
- 8. Záruční doba**
- 9. Garance**

1. Úvod :

Předmětem cenové nabídky je provedení opravy povrchu dilatačních závěrů. Cenová nabídka je vypracována na základě poptávky zhotovitele.


SO 201 Most ev.č. 329-002 Pečky

Všechny materiály jsou certifikovány a schváleny pro použití v ČR.

Více informací naleznete na www.santechalfa.cz. Na těchto stránkách rovněž naleznete technické listy, osvědčení a certifikáty naší firmy.



Most ev.č. 329-002 Pečky

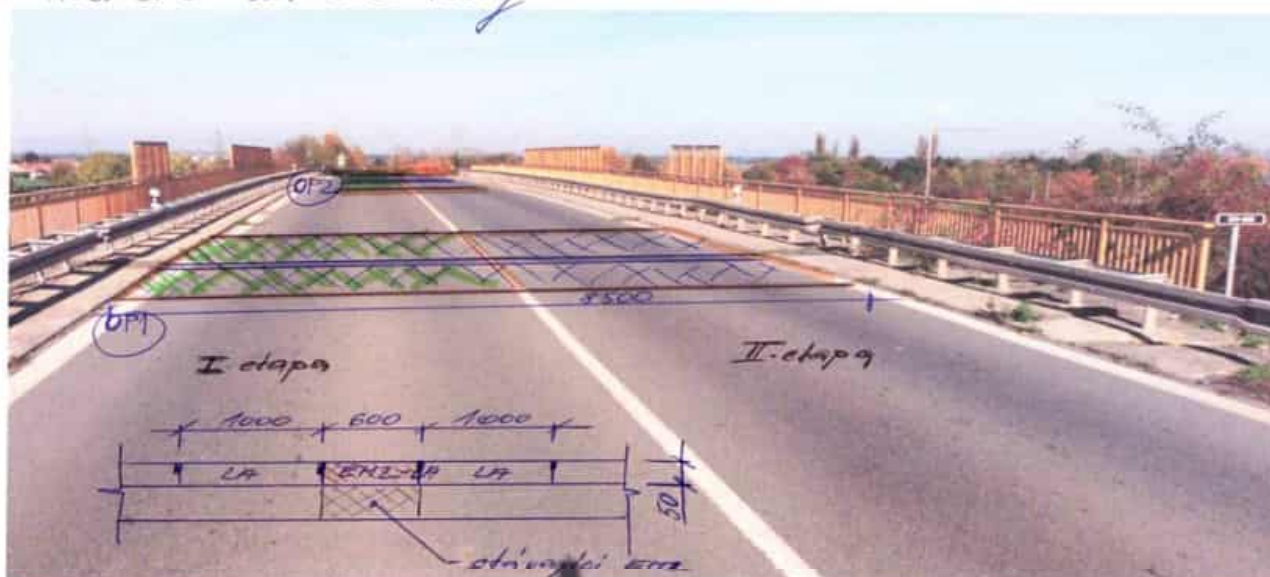

2. Technologický postup:

- Vytýčení a zaznačení prostoru k opravě
- Prořezání řezačkou spar na tl. 50 mm
- Vybourání vozovkových vrstev včetně stávajícího EMZ
- vyčištění podkladu mechanicky a tlakovým vzduchem
- Zapravení odhaleného MDZ
- Pokládka LA v tl. 50 mm
- Prořezání pracovních spar a napojení
- zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou BIGUMA TL 82



3. Materiály použité k zabudování:

primární postřík
modifikovaná zálivka (EMZ)

– Colzumix
– BIGUMA BR

Materiály jsou certifikovány pro použití v ČR. Technické listy budou předány objednateli na vyžádání.

4. Použité mechanismy:

- vozidlo
- ruční postřikovač GLORIA
- řezačka spar CEDIMA
- bourací kladiva
- vzduchový kompresor
- motorová čistička spar
- zalévací kotel s nepřímým ohřevem
- PB hořák
- centrála
- drobné ruční nářadí

5. Cenová část:

Cena prací byla stanovena zhotovitelem na základě podkladů předložených objednatelem. Výpočet ceny je uveden v příloze č. 1 , která tvoří nedílnou součást cenové nabídky.

Fakturace bude provedena na základě skutečných výměr, které budou zapsány do SD zhotovitele a budou odsouhlaseny objednatelem.

6. Spolupůsobení objednatele:

- zaslání závazné objednávky před zahájením prací
- splatnost faktury za provedené práce 45 dnů
- fakturace provedených prací po ukončení jednotlivých etap
- zajištění vjezdu vozidel zhotovitele
- projednat částečnou popř. úplnou uzávěru vozovky s investorem
- zajištění výluky provozu na objektu po dobu provádění prací
- zajistit pracoviště prosté nároku třetích osob

Ostatní náležitosti budou domluveny v případě realizace před zahájením stavby, případně v SOD.

7. Termín realizace:

Dle harmonogramu stavby 2025

Práce budou prováděny ve třech samostatných etapách.

Předpokládaný termín nástupu dle potřeby a požadavku objednatele. Termín bude upřesněn telefonicky 10 dnů před požadovaným nástupem.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že práce lze provádět za klimatických podmínek, které odpovídají tomuto druhu prací. Teplota podkladu + 5 - 8°C

8. Záruční doba:

S ohledem na charakter opravy zhotovitel na provedené práce záruku neposkytuje.

9. Garance

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací v ceně uvedené v tomto cenovém návrhu jenž je nedílnou součástí této cenové nabídky v souladu s obecně platnými předpisy a normami Obchodního a Občanského zákoníku v kvalitě odpovídající tomuto druhu prací.

Vypracoval:

Oprava povrchu EMZ most ev.č. 329-002

popis:	jedn.:	počet:	jedn.cena:	cena celkem:
Prořezání vozovkových vrstev tl. do 50 mm	m	40	50,00 Kč	2 000,00 Kč
Ruční vybourání vozovky včetně stávajícího EMZ	m3	2,5	10 850,00 Kč	27 125,00 Kč
Zapravení EMZ včetně doplnění	m	17	1 750,00 Kč	29 750,00 Kč
Pokládka obrusné vrstvy z MA 11 IV PMB v tl. 50 mm - I.etapa	Klp	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Pokládka obrusné vrstvy z MA 11 IV PMB v tl. 50 mm - II.etapa	Klp	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Prořezání drážky 20/40 mm v místě EMZ včetně zalití asfaltovou zálivkou typu EMZ	m	34	310,00 Kč	10 540,00 Kč
Prořezání drážky 12/30 mm v místě napojení včetně zalití asfaltovou zálivkou	m	40	85,00 Kč	3 400,00 Kč
Prořezání drážky 20/40 mm podél říms včetně zalití asfaltovou zálivkou typu EMZ	m	11	125,00 Kč	1 375,00 Kč
Přesun techniky I.etapa	Klp	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Přesun Techniky II.etapa	Klp	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Likvidace vybouraného materiálu I.etapa	Klp	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Likvidace vybouraného materiálu II.etapa	Klp	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Celkem				194 190,00 Kč

předpokládané náklady celkem:

bez DPH

194 190 Kč

Zpracoval : Martin Pícha

V Praze dne: 19.2.2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
p. Ing. Jeřábek Milan

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 8
Stavba: **Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ — SO 210 – Most ev.č. 329-002 přes ŽDC v Pečkách**

Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby č. SMLD-0163/00066001/2024 (dále jen Smlouva). K Vaší žádosti o stanovisko TDI investora k předložené změně během výstavby výše uvedené akce sděluji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení na základě místního šetření za účasti objednatele, zhotovitele a TDI jsou upřesněny níže:

- 1) Zhotovitel provede doplnění spar zálivkou v celé délce říms
- 2) Zhotovitel provede opravu obou stávajících EMZ včetně pruhů z MA (LA)
- 3) Zhotovitel provede repas ocelových mostních svodidel ve větším rozsahu

2. Stanovisko TDI

Z pozice TDI konstatuji:

- a. Množství provedených prací nárokových zhotovitelem v tomto ZBV odpovídají skutečnosti.
- b. Změna cen kladných činí 332 689,23,00 Kč bez DPH.
- c. Změna cen záporných činí -26 106,60 Kč bez DPH
- d. Celková cena navrhovaných Změn záporných a kladných je 306 582,63 Kč bez DPH.

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS. Navýšení rozsahu stavebních prací bylo odsouhlaseno a bude provedeno na základě místního šetření, porovnáním stávajícího stavu s předpokládanými stavebními pracemi a po konzultaci s AD tak, aby bylo splněno zadání, zajištěna bezpečnost a zajistila se delší životnost stavby. Nové položky, které jsou v třídíku URS jsou oceněné v c.ú. 2023/1. Oceněno v souladu se Smlouvou a dle „Zásad oceňování změn a tvorby nových položek“ směrnice při provádění

změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zřehna“) u veřejných zakázek na stavební práce.

Předložené podklady pro stanovení ceny byly kontrolovány a souhlasí.

TDI provedl kontrolu předloženého znění ZBV Č. 8 včetně všech příloh s následujícím závěrem:

S výše uvedeným návrhem ZBV 8 za TDI souhlasím. Zněny jsou písemně zdokumentovány, doloženy zaměřením, vážnými lístky nebo zápisy v SD.

Děkuji,

za IBH, spol. s r.o.

Ing. Miroslav Bureš

V Kladně dne: 08.10. 2025



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel : Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.				Měsíc/rok : 02/2025		Projekt:	
Datum: 20.02.2025		Celková částka : 211 320,00		DPH: 21% 44 377,20	Celkem Kč : 255 697,20		Soupis č./str. 1/1
FIRMA: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.						Místo : Pečky	
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
		Oprava povrchu EMZ most ev.č. 329-002, Pečky					
		Řezání stávajícího asfaltového krytu do tl. 50mm	mb	40,00	75,00	3 000,00	
		Bourání stávajícího asfaltového krytu vč. EMZ	m3	3,00	12 000,00	36 000,00	
		Oprava EMZ	mb	18,00	2 250,00	40 500,00	
		Polyládka MA 11 IV PMB do tl. 50mm	den	2,00	43 850,00	87 700,00	
		Prořez a zálivka drážky 20/40 - zálivka typ EMZ	mb	34,00	380,00	12 920,00	
		Prořez a zálivka drážky 12/30 v místě napojení - modifikovaná zálivka	mb	40,00	105,00	4 200,00	
		Přesun mechanizace	klp	1,00	24 000,00	24 000,00	
		Doplňující náklady					
		Odstranění stávající zálivky a vyhotovení nové - podél říms	mb	15,00	200,00	3 000,00	
		Výměry jsou pouze orientační, fakturováno bude dle skutečně provedených prací.					
		celkem				211 320,00	
20.02.2025		Vypracoval: Petr Vozob				Odsouhlasil: Ml	

(1)

Al silnice spol. s r.o.
Veliny 113
53401 Holice
IČO: 079 20 555
DIČ: CZ 079 20 555
(zhotovitel)

Cenová nabídka

I. Předmět cenové nabídky

Předmětem cenové nabídky je oprava elastických mostních uzávěrů, akce Kolín, Pečky, Poděbrady, rozdělené do etap dle zadání objednatele.

II. Cena a způsob placení

Cena dle předpokládaného rozsahu.

Fakturace bude provedena po dokončení jednotlivých etap na základě oboustranně potvrzených předávacích protokolů.

Předpokládaná celková cena díla činí **1 864 270,00 Kč**.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

III. Termín provedení a předání

Zahájení prací 03/2025, dle požadavku stavby. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín realizace prodloužen. Dílo bude předáno včetně předávací prohlídky.

U díla většího rozsahu bude docházet k předání a převzetí díla průběžně. Předání a převzetí díla bude potvrzeno písemně protokolem o převzetí.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k převzetí díla dojde až po jejich odstranění.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu **24 měsíců** od předání díla. Záruka se vztahuje pouze na provedenou opravu. Na vady vzniklé na opravě vlivem poruchy v podloží nebude brán zřetel. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů (pokud to umožní klimatické podmínky) od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

Ve Velinách dne 24.02.2025

Al Silnice spol. s r.o.
Stanislav Kadrmas
(zhotovitel)

(2)

Předpokládaný rozsah:

Oprava elastického mostního uzávěru, most Kolín 125-035

1	125-035	počet jednotek	jenotková cena	cena za opravu Kč
1	výměna EMZ	12	2500	30000
2	výměna ohrusné vrstvy	54	2680	144720
3	prořez a zalití prac. Spár	150	90	13500
4	nájezd prac. techniky 3x	3	12400	37200
5	Likvidace odpadů	1	24800	24800
lokace 1			cena celkem	250220

Oprava elastického mostního uzávěru, most Pečky 329-002

1	329-002	počet jednotek	jenotková cena	cena za opravu Kč
1	výměna EMZ	17	2500	42500
2	výměna ohrusné vrstvy	45	2680	120600
3	prořez a zalití prac. Spár	85	90	7650
4	nájezd prac. techniky 2x	2	13300	26600
5	Likvidace odpadů	1	22200	22200
lokace 1			cena celkem	219550

Oprava elastického mostního uzávěru, most Poděbrady 611-018

1	611-018	počet jednotek	jenotková cena	cena za opravu Kč
1	výměna EMZ	21	2500	52500
2	výměna ohrusné vrstvy	460	2680	1232800
3	prořez a zalití prac. Spár	310	90	27900
4	nájezd prac. techniky 2x	2	13500	27000
5	Likvidace odpadů	1	54300	54300
lokace 1			cena celkem	1394500

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Věc: Vyjádření objednatele ke způsobu ocenění prací „Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ (dále jen Stavba)

S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a již vydaným pokynům objednatele k rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání úprav v prostoru mostních závěrů na mostech ev.č. 125-035 (SO 206), 329-002 (SO 210) a 611-018 (SO 215):

Vzhledem ke stavu stávajících mostních závěrů a stálému opakování závad bylo Zhotovitelem navrženo a Objednatelem odsouhlaseno nestandardní řešení opravy nad rámec prosté výměny EMZ.

Toto řešení zahrnuje výměnu EMZ, výměnu obrusných vrstev na plochách přiléhajících k EMZ a zřízení asfaltových zálivek jak v obrusných vrstvách, tak i kolem řims.

Aby bylo možné cenově zohlednit technické řešení uvedené v Technologickém předpisu Zhotovitele, a zároveň i zvýšené náklady při provádění prací po částech (zajištění průjezdnosti), souhlasí Objednatel s použitím metody ocenění prací podle čl. 17.4. iii) Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek – R-Sm-36, tedy získání tří nezávislých nabídek podzhotovitelů. Tyto nabídky Zhotovitel doloží do dokumentace změny.

V Kolíně dne 24.3.2025

.....
Ing. Milan Jeřábek
Vedoucí manažer – zástupce vedoucí

iniků

Za zhotovitele převzal:
(jméno, podpis a datum
