

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 008

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: **008**

Ručně bourané sondy

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

22. 01. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatel na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

20. 02. 2018 / 27. 02. 2018 / 05. 03. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Na základě zjištěných nesrovnalostí v PD a skutečnosti na stavbě byl GP (statikem) zadán požadavek na provedení doplňujících sond.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Při odhalování částí nosné konstrukce objektu došlo k zjištění, že skutečný stav neodpovídá předané prováděcí dokumentaci a dle vyjádření přízvaného statika HSD statika s.r.o. (GP), zjištěné skutečnosti neodpovídají ani dostupné archivní dokumentaci. Dále při odtěžení přítěžovacího násypu v 1.PP byla objevena ŽB konstrukce, která opět nebyla zakreslena v dokumentaci. Na základě těchto zjištění byl statikem Generálního projektanta společností HSD statika s.r.o. určen rozsah ručně bouraných sond, potřebný pro další návrh konstrukcí a jejich případné opatření a sanace.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

Příloha č. 2 – požadavek na sond GP

Příloha č. 3 – skica sond I

Příloha č. 4 – skica sond II

Příloha č. 5 - termíny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná zjištěním nepředvídatelných okolností.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 167 675,- Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: 0,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 167 675,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 008

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: *Atio*.....

DATUM: *9.3.18*.....

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: *Atio*.....

DATUM: *6.3.2018*.....

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: *Atio*.....

DATUM: *13.3.2018*.....

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *6.3.2018*.....

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		



Strana č. 1 Přílohy č.1 ZL č. 008

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 008
Ručně bourané sondy

LIKVIDACE AZBESTU

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K21.00 Bourání - ručně bourané sondy	kpl	1	167 675,00	167 675,00
CELKEM KČ BEZ DPH				167 675,00

Strana č. 2 Přílohy č. 1 ZL č. 008

Stavba:

Objekt:

ZL 008 - Ručně bourané sondy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 675,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				167 675,00	
D	21.03		Ručně bourané sondy				167 675,00	
1	K	971052431R	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm Ručně bouraná sonda do ŽB stěny bez nutnosti použít lešení - 0,5x0,4x0,1m, vč. likvidace odpadu (3 sondy/patro)	kus	26,000	853,00	22 178,00	
2	K	971033451R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm Ručně bouraná sonda do cihelné stěny ve výšce 3 m, prováděno z lešení (kapsa do zdi pod stropem) - 0,5x0,5x0,4m, vč. likvidace odpadu (1 sonda/patro)	kus	8,000	4 698,00	37 584,00	
3	K	971052451R	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm Ručně bouraná sonda do ŽB stěny ve výšce 3 m, prováděno z lešení (kapsa do zdi pod stropem) - 0,5x0,5x0,4m, vč. likvidace odpadu (1 sonda/patro)	kus	10,000	6 449,00	64 490,00	
4	K	974049257R	Vysekání rýh v betcnových zdech u stropu hl do 100 mm š do 300 mm Ručně bouraná sonda do ŽB průvltaku, prováděno z lešení (pásová sonda do průvltaku) - 0,6x0,1x0,03 m, vč. likvidace odpadu (2 sondy/patro)	kus	18,000	1 933,00	34 794,00	
5	K	961055111R	Bourání základů ze ŽB Ruční odbourání části ŽB základového pásu se zachováním výztuže - 1,2x0,45x0,8 m, vč. likvidace odpadu	kus	1,000	8 629,00	8 629,00	

FW: NRP7-sondy do konstrukcí

Od: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Datum: 9.2.2018 8:56

Dobrý den,

Požadavek na sondy byl předán přímo dodavateli v požadovaném termínu – viz níže. Posílám i Vám na vědomí.

S pozdravem

Deltaplan spol. s r.o.

Jankovcova 938/18

170 00 Praha 7

M: [REDACTED]

From: [REDACTED]

Sent: Tuesday, February 06, 2018 4:22 PM

To: [REDACTED]

Subject: Fwd: NRP7-sondy do konstrukcí

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: NRP7-sondy do konstrukcí

Datum: Tue, 6 Feb 2018 16:22:06 +0100

Od: Ing. [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Dobrý den,

V příloze Vám zasílám schéma sond, které bychom potřebovali pro další návrh konstrukcí a jejich případné opatření a sanaci.

Snažil jsem se zakreslit a popsat sondy v půdoryse a dále v axonometrickém pohledu. Pokud nebudete něčemu rozumět, prosím kontaktujte mne.

Pásové sondy v nosných zavětrovacích stěnách, průvlacích a věncích (trámech) nad stěnami budeme potřebovat v každém patře.

S pozdravem

mobil: [REDACTED]


tel. kancelář: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

<http://www.hsdstatika.cz>

Přílohy:

- IMG-20180206144459.pdf
- IMG-20180206141828.pdf

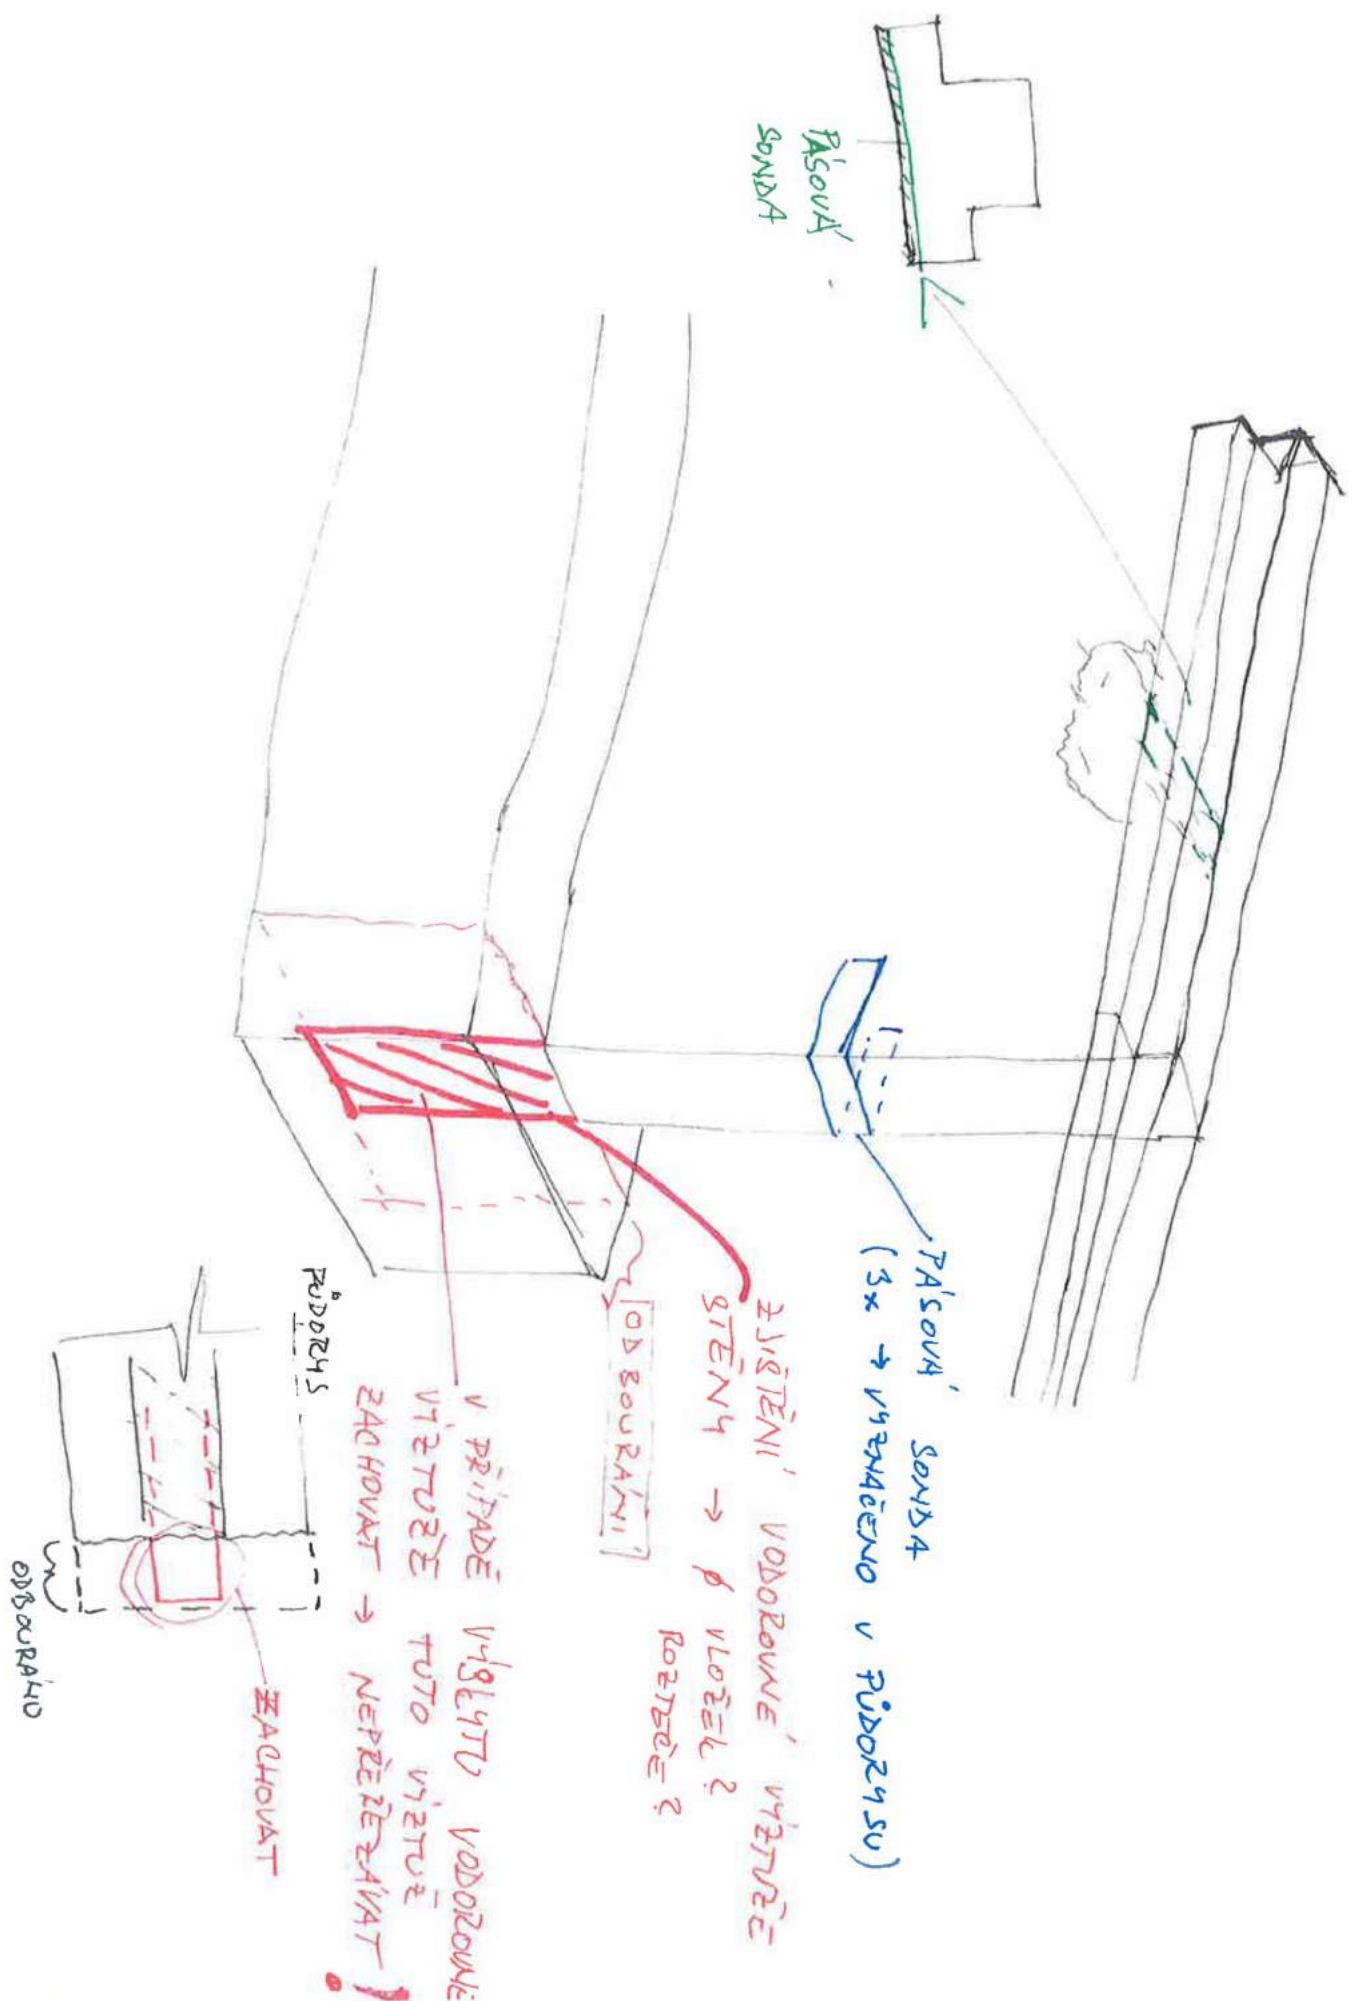

14

Příloha č. 5 ZL 008 - Termíny

Sonda č. 1 termín do 6. 3. 2018

Sonda č. 2 termín do 5. 3. 2018

Sonda č. 3 termín do 7. 3. 2018

Sonda č. 4 v termínu do 5. 3. 2018 – provedení 2 ks (osa C – 7. a 8. NP) – předložení výstupu z destruktivních sond k vyhodnocení statikovi GP - na základě jeho rozhodnutí bude přistoupeno buď k dalším požadovaným destruktivním sondám dle CN tohoto ZL (s termínem do 3 dnů od rozhodnutí), nebo bude k identifikaci výztuže použita metoda Ferroskan (cena není součástí tohoto ZL ani CN – termín bude ověřen), aby se eliminovali následné sanační práce po destruktivních sondách (sanační práce po sondách dle tohoto ZL nejsou součástí ceny).

Sonda č. 5 termín do 23. 2. 2018



