




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Investor:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Datum: 05.08.2025	
Název akce: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty dopravního podniku hl. m. Prahy v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2	
Předmět změny: Změna rozsahu výměny oken na objektu A – dodatečná výměna oken výškové budovy na objektu A a částí podnože objektu A v objektu SO 04 depa Kačerov Popis a zdůvodnění změny: Jedná se nepředvídatelnou změnu, která nemohla být odhalena v průběhu verifikace. Tyto okna měla být zachována. Při montáži fasádního systému DekMetal, bylo zjištěno, že stávající okna jsou nevyhovující, degradována a hrozí vypadnutí oken z budovy. Okna jsou v havarijním stavu z důvodu dlouhodobého zatékání vody do konstrukce oken. Bylo rozhodnuto o výměně všech oken na výškové budově a části oken na podnoži. Z důvodu demontáže stávajících oken včetně vnitřních žaluzií dojde k dodávce nových vnitřních žaluzií. Na výškové budově dojde k výměně všech oken, včetně provedení napojení, zapravení ostění a nadpraží. Na podnoži dojde k výměně částí oken včetně oprava ostění, nadpraží. Členění oken je zachováno. Okna jsou doplněny o magnety a vnitřní žaluzie.			
Počet připojených listů specifikací:	31 x A4, 2 x A3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost			
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00, Praha 9			



Stanovisko technického dozoru stavby: **Souhlasí/nesouhlasí**

[REDACTED]
Building management solutions s.r.o.



BMS ②
management solutions s.r.o.
25 40/23 | 180 00 Praha
ICO: 268 12 999 DIČ: CZ26812999

Stanovisko projektanta stavby: **Souhlasí/nesouhlasí**


Stavební částí – Habena s.r.o.



HABENA
spol. s r.o.
Korunní 60
120 00 Praha 2
IČ: 60486708
DIČ: CZ60486708
Tel./fax: 224 252 033

Stanovisko energetického specialisty: **Souhlasí/nesouhlasí**


[REDACTED]
ENVIROS, s.r.o.



- Příloha:

- Návrh na změnu stavby – K-006 - Depo Kačerov – Objekt A – změna rozsahu oken – 3xA4
- Rozpočet – 1xA4
- Výpis oken pro výpočet výměr – 1xA4
- Fotodokumentace – 20xA4
- Prohlášení firmy Otherm ke stávajícímu stavu – 1xA4
- Vyjádření TDI ke stavu původních oken – 2xA4
- Projektová dokumentace – objekt A – 2xA3, 3xA4



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Metrostav DIZ s.r.o.	
Datum:	05.08.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Smluvní strany se dohodly na realizaci oken výškové budovy na objektu A a částí podnože objektu A v objektu SO 04 depa Kačerov Popis a zdůvodnění změny: Jedná se nepředvídatelnou změnu, která nemohla být odhalena v průběhu verifikace. Tyto okna měla být zachována. Při montáži fasádního systému DekMetal, bylo zjištěno, že stávající okna jsou nevyhovující, degradována a hrozí vypadnutí oken z budovy. Okna jsou v havarijním stavu z důvodu dlouhodobého zatékání vody do konstrukce oken. Bylo rozhodnuto o výměně všech oken na výškové budově a části oken na podnoži. Z důvodu demontáže stávajících oken včetně vnitřních žaluzií dojde k dodávce nových vnitřních žaluzií. Na výškové budově dojde k výměně všech oken, včetně provedení napojení, zapravení ostění a nadpraží. Na podnoži dojde k výměně částí oken včetně oprava ostění, nadpraží. Členění oken je zachováno. Okna jsou doplněny o magnety a vnitřní žaluzie.		
Počet připojených listů specifikací: 31 x A4, 2 x A3 (celkový počet)	Počet připojených výkresů: 2 x A3, 3 x A4	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	11.745.900,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11.745.900,00,- Kč	31.3.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce:	
	 Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 186 00 Praha 8 Ing. Petr Šrámek IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (194)	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty DPP v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice

Číslo stavby: 20-0-3379

Pořadové číslo změnového listu:

K-006

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	SO	Číslo (pod objektu):	04	Název:	Depo Kačerov - Objekt A změna rozsahu oken
Popis změny: Na výškové budově dojde k výměně všech oken, včetně provedení napojení, zapravení ostění a nadpraží. Na podnoží dojde k výměně částí oken včetně oprava ostění, nadpraží. Členění oken je zachováno. Okna jsou doplněny o magnety a vnitřní žaluzie.					
Zdůvodnění změny: Jedná se nepředvídatelnou změnu, která nemohla být odhalena v průběhu verifikace. Tyto okna měla být zachována. Při montáži fasádního systému DekMetal, bylo zjištěno, že stávající okna jsou nevyhovující, degradována a hrozí vypadnutí oken z budovy. Okna jsou v havarijním stavu z důvodu dlouhodobého zatékání vody do konstrukce oken. Bylo rozhodnuto o výměně všech oken na výškové budově a části oken na podnoží. Z důvodu demontáže stávajících oken včetně vnitřních žaluzií dojde k dodávce nových vnitřních žaluzií.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Habena s.r.o. - souhlasí s výše uvedenou změnou. 					

HABENA
spol. s r.o.
Korunní 60
120 00 Praha 2
IČO: 60486708
DIČ: CZ60486708
Tel./fax: 224 252 063

Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty DPP v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice	Číslo smlouvy: 001052 00 23	SO 04	Změnový list č: K-006
--	-----------------------------	-------	-----------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

ANO, dochází k vytvoření nové PD DPS.

Do časového plánu stavby:

ANO, s dopadem do harmonogramu - je zohledněno v rámci DOD č.2.

Do ceny stavby:

zvýšení o: 11 745 900,00 Kč

snížení o: 0,00 Kč

Rozdíl 11 745 900,00 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021915, DIČ CZ25021915

(118)

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

Technický dozor investora:

Souhlasím

Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Building management s.r.o.

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

Technický dozor investora:

Souhlasím

Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Building management s.r.o.

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Metrostav DIZ s.r.o.

Building management solutions s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zenklova 2530/23 | 180 00 Praha

IČ 25021915, DIČ CZ25021915

IČO: 288 12 999 DIČ: CZ28812999

(118)

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Technický dozor investora:

Podpis:

Za Objednatele:

Podpis:

Building management solutions s.r.o.

Zenklova 2530/23 | 180 00 Praha
IČO: 288 12 999 DIČ: CZ28812999

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Podpis:

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

190 00 Praha 9

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	1xA4
Příloha č. 2	Výpis oken pro výpočet výměr	1xA4
Příloha č. 3	Fotodokumentace	20xA4
Příloha č. 4	Prohlášení firmy Otherm ke stávajícímu stavu	1xA4
Příloha č. 5	Vyjádření TDI ke stavu původních oken	2xA4
Příloha č. 6	Projektová dokumentace objekt A	2xA3, 3xA4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	28xA4, 2xA3

SOUPIS PRACÍ



Stavba: EPC Depo Kačerov, Pankrác, Střešovice PHA-22-231
Objekt: ZBV - Změnové listy
Soupis: ZL K-006 - Kačerov - objekt A -změna rozsahu oken

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 745 900,00

D HSV ZL K-006 - Kačerov - objekt A -změna rozsahu oken 11 745 900,00

D SO04_PS04112 Objekt A 11 745 900,00

1	K	001R	- objekt A - výměna části okenních výplní, výměna vstupních portálů - změna požadavku na okna	m2	665,170	15 869	10 555 600,00	Smluvní položka
	PP		- objekt A - výměna části okenních výplní, výměna vstupních portálů - změna požadavku na okna					
	VV		plocha nových oken 665,17 m2					
	VV		665,17		665,170			
2	K	002R	- objekt A - instalace stínících prvků - vnitřní žaluzie	m2	485,350	2 452	1 190 300,00	Smluvní položka
	PP		- objekt A - instalace stínících prvků - vnitřní žaluzie					
	VV		plocha nových žaluzií 485,35 m2					
	VV		485,35		485,350			
	VV		Součet		485,350			

Okna objekt A

1	- objekt A - výměna částí okenních výplní, výměna vstupních portálů - změna požadavku na okna	665,17					
Rozpis a počty oken na objektu A							
	počet kusů	Plocha celkem	šířka okna	výška okna/dveří	Parametr	Pozn	
1	143	275,418	1,07	1,8	Uw = 0,9 W/m2-K	žaluzie + okna výškové budovy - jihovýchodní strana	
2	1	2,5132	1,03	2,44	Uw = 0,9 W/m2-K	D6 Dveře na podnož výškové budovy - jihovýchodní strana -bez žaluzií	
3	144	277,344	1,07	1,8	Uw = 0,9 W/m2-K	žaluzie + okna výškové budovy - severozápadní strana	
4	18	24,948	0,77	1,8	Uw = 0,9 W/m2-K	okna výškové budovy - jihozápadní strana - od budovy B -bez žaluzií	
5	18	24,948	0,77	1,8	Uw = 0,9 W/m2-K	okna výškové budovy - severovýchodní strana - od vrátnice -bez žaluzií	
6	30	60	1	2	Uw = 0,9 W/m2-K	okna podnože - bez žaluzií	
	celkem	665,1712 m2					
2	- objekt A - instalace stínících prvků - vnitřní žaluzie	485,35					
Rozpis a počty oken s vnitřní na objektu A							
	počet kusů	Plocha celkem	šířka okna	výška okna/dveří	Parametr	Pozn	
	108	208,008	1,07	1,8	Uw = 0,9 W/m2-K	žaluzie okna výškové budovy jihovýchodní strana - rozsah oken - nejsou uvažované okna-žaluzie na schodišti -tj. 4x9 pater	
	144	277,344	1,07	1,8	Uw = 0,9 W/m2-K	žaluzie okna výškové budovy - severozápadní strana - rozsah všech oken	
	celkem	485,352 m2					

Vyjádření / posudek na stávající okna na Depu Kačerov, Sliachská 1150/1, Praha 4

Popis současného stavu:

- Stávající okna jsou z měkkého smrkového dřeva s izolačním dvojsklem a zejména pak na SZ fasádě je značné množství oken napadeno hnilobou zevnitř od kce Boletických panelů.
- Většina oken se potom vizuálně jevila v celkem dobrém stavu, avšak při demontáži krycích lišt, po obnažení okenních rámu, byla pod vrstvami barvy objevena hloubková hniloba.
- V některých případech byla zjištěna i netěsnost mezi rámem okna a fasádou.
- U mnoha oken byla zjištěna i netěsnost zasklení vůči rámu. Dále vlivem ztráty pevnosti a tvaru rámu byly značné netěsnosti i mezi křídlem a rámem.


Z tohoto zjištění vyplývá, že okna jsou ve velmi špatném stavu a některá již ani nelze řádně uzavřít, což má vliv na velké tepelné ztráty v zimním období, rovněž i hlukový útlum je značně nízký. Toto negativně ovlivňuje komfort práce v kancelářích tohoto objektu.

Návrh nového stavu:

- Většina původních oken je již neopravitelná, proto navrhujeme výměnu původních dřevěných oken **za nová plastová okna bílé barvy s izolačním trojsklem ve stejném členění jako původní okna.**
- Tímto se značně zlepší komfort všech místností v tomto objektu, a to jak po stránce tepelných ztrát, tak i snížení hlukového útlumu.

V Praze dne 11.5.2025


OTHERM PRAHA s.r.o.



s.r.o.

ICO: 27259561

***Vyjádření TDI
ke stavu
původních oken***



Zpráva o nově zjištěné skutečnosti – areál Depo Kačerov, objekt A, část výšková budova

Popis zjištění:

V rámci probíhajících stavebních prací na objektu A – část výšková budova – byla při demontáži původní fasády a krycích lišt okenních rámců zjištěna skrytá vada na stávajících okenních konstrukcích. Při demontáži stávající fasádní konstrukce bylo odhaleno rozsáhlé poškození dřevěných rámců oken způsobené hnilobou.

Toto poškození bylo před demontážními pracemi vizuálně nezjistitelné, neboť bylo zcela skryto za fasádním opláštěním a krycími lištami. Byla zjištěna značná degradace nosných částí rámců, doprovázená odlupováním nátěrů a rozpadem dřevní hmoty.

Příčina závady:

Na základě vizuální prohlídky lze konstatovat, že příčinou degradace je dlouhodobé působení vlhkosti, která pronikala do konstrukce rámců. Pravděpodobným zdrojem vlhkosti jsou netěsnosti v napojení oken na fasádní plášť, případně porušení povrchových úprav rámců, což vedlo k postupnému napadení a hnilobě dřeva.

Rozsah poškození:


Poškození se netýká pouze jednotlivých oken, ale dle provedených kontrol lze konstatovat, že obdobný stav je u většiny oken na výškové budově. Lokální oprava by byla technicky obtížná a ekonomicky neefektivní, neboť by vyžadovala rozsáhlé zásahy do nosných částí rámců a jejich statického kotvení.

Návrh řešení:


S ohledem na rozsah a charakter zjištěné vady, která ohrožuje životnost a funkčnost okenních konstrukcí, technický dozor stavby navrhuje:

1. **Výměnu všech oken na výškové budově objektu A** za nové, splňující současné technické a energetické požadavky.
2. Při nové montáži zajistit odpovídající napojení na fasádní plášť, provedení spolehlivé hydroizolace a použití materiálů s vyšší odolností vůči povětrnostním vlivům.



Severovýchodní

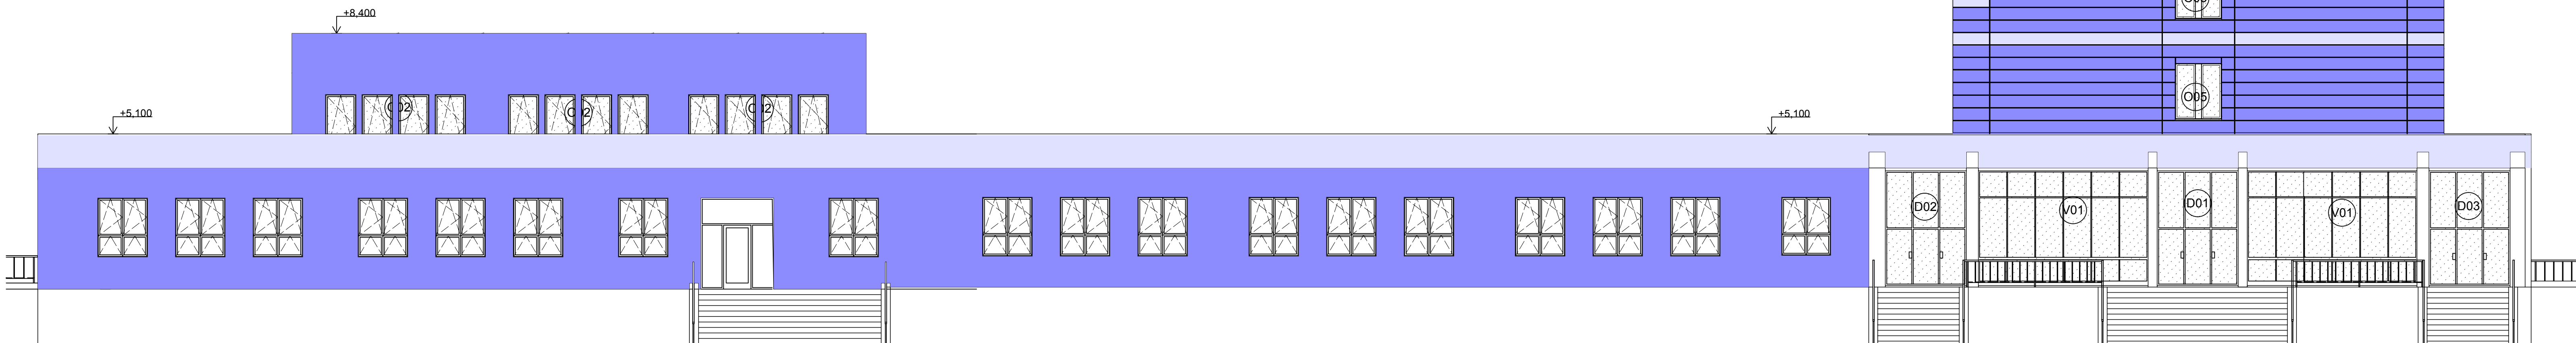

Severovýchodní (B)

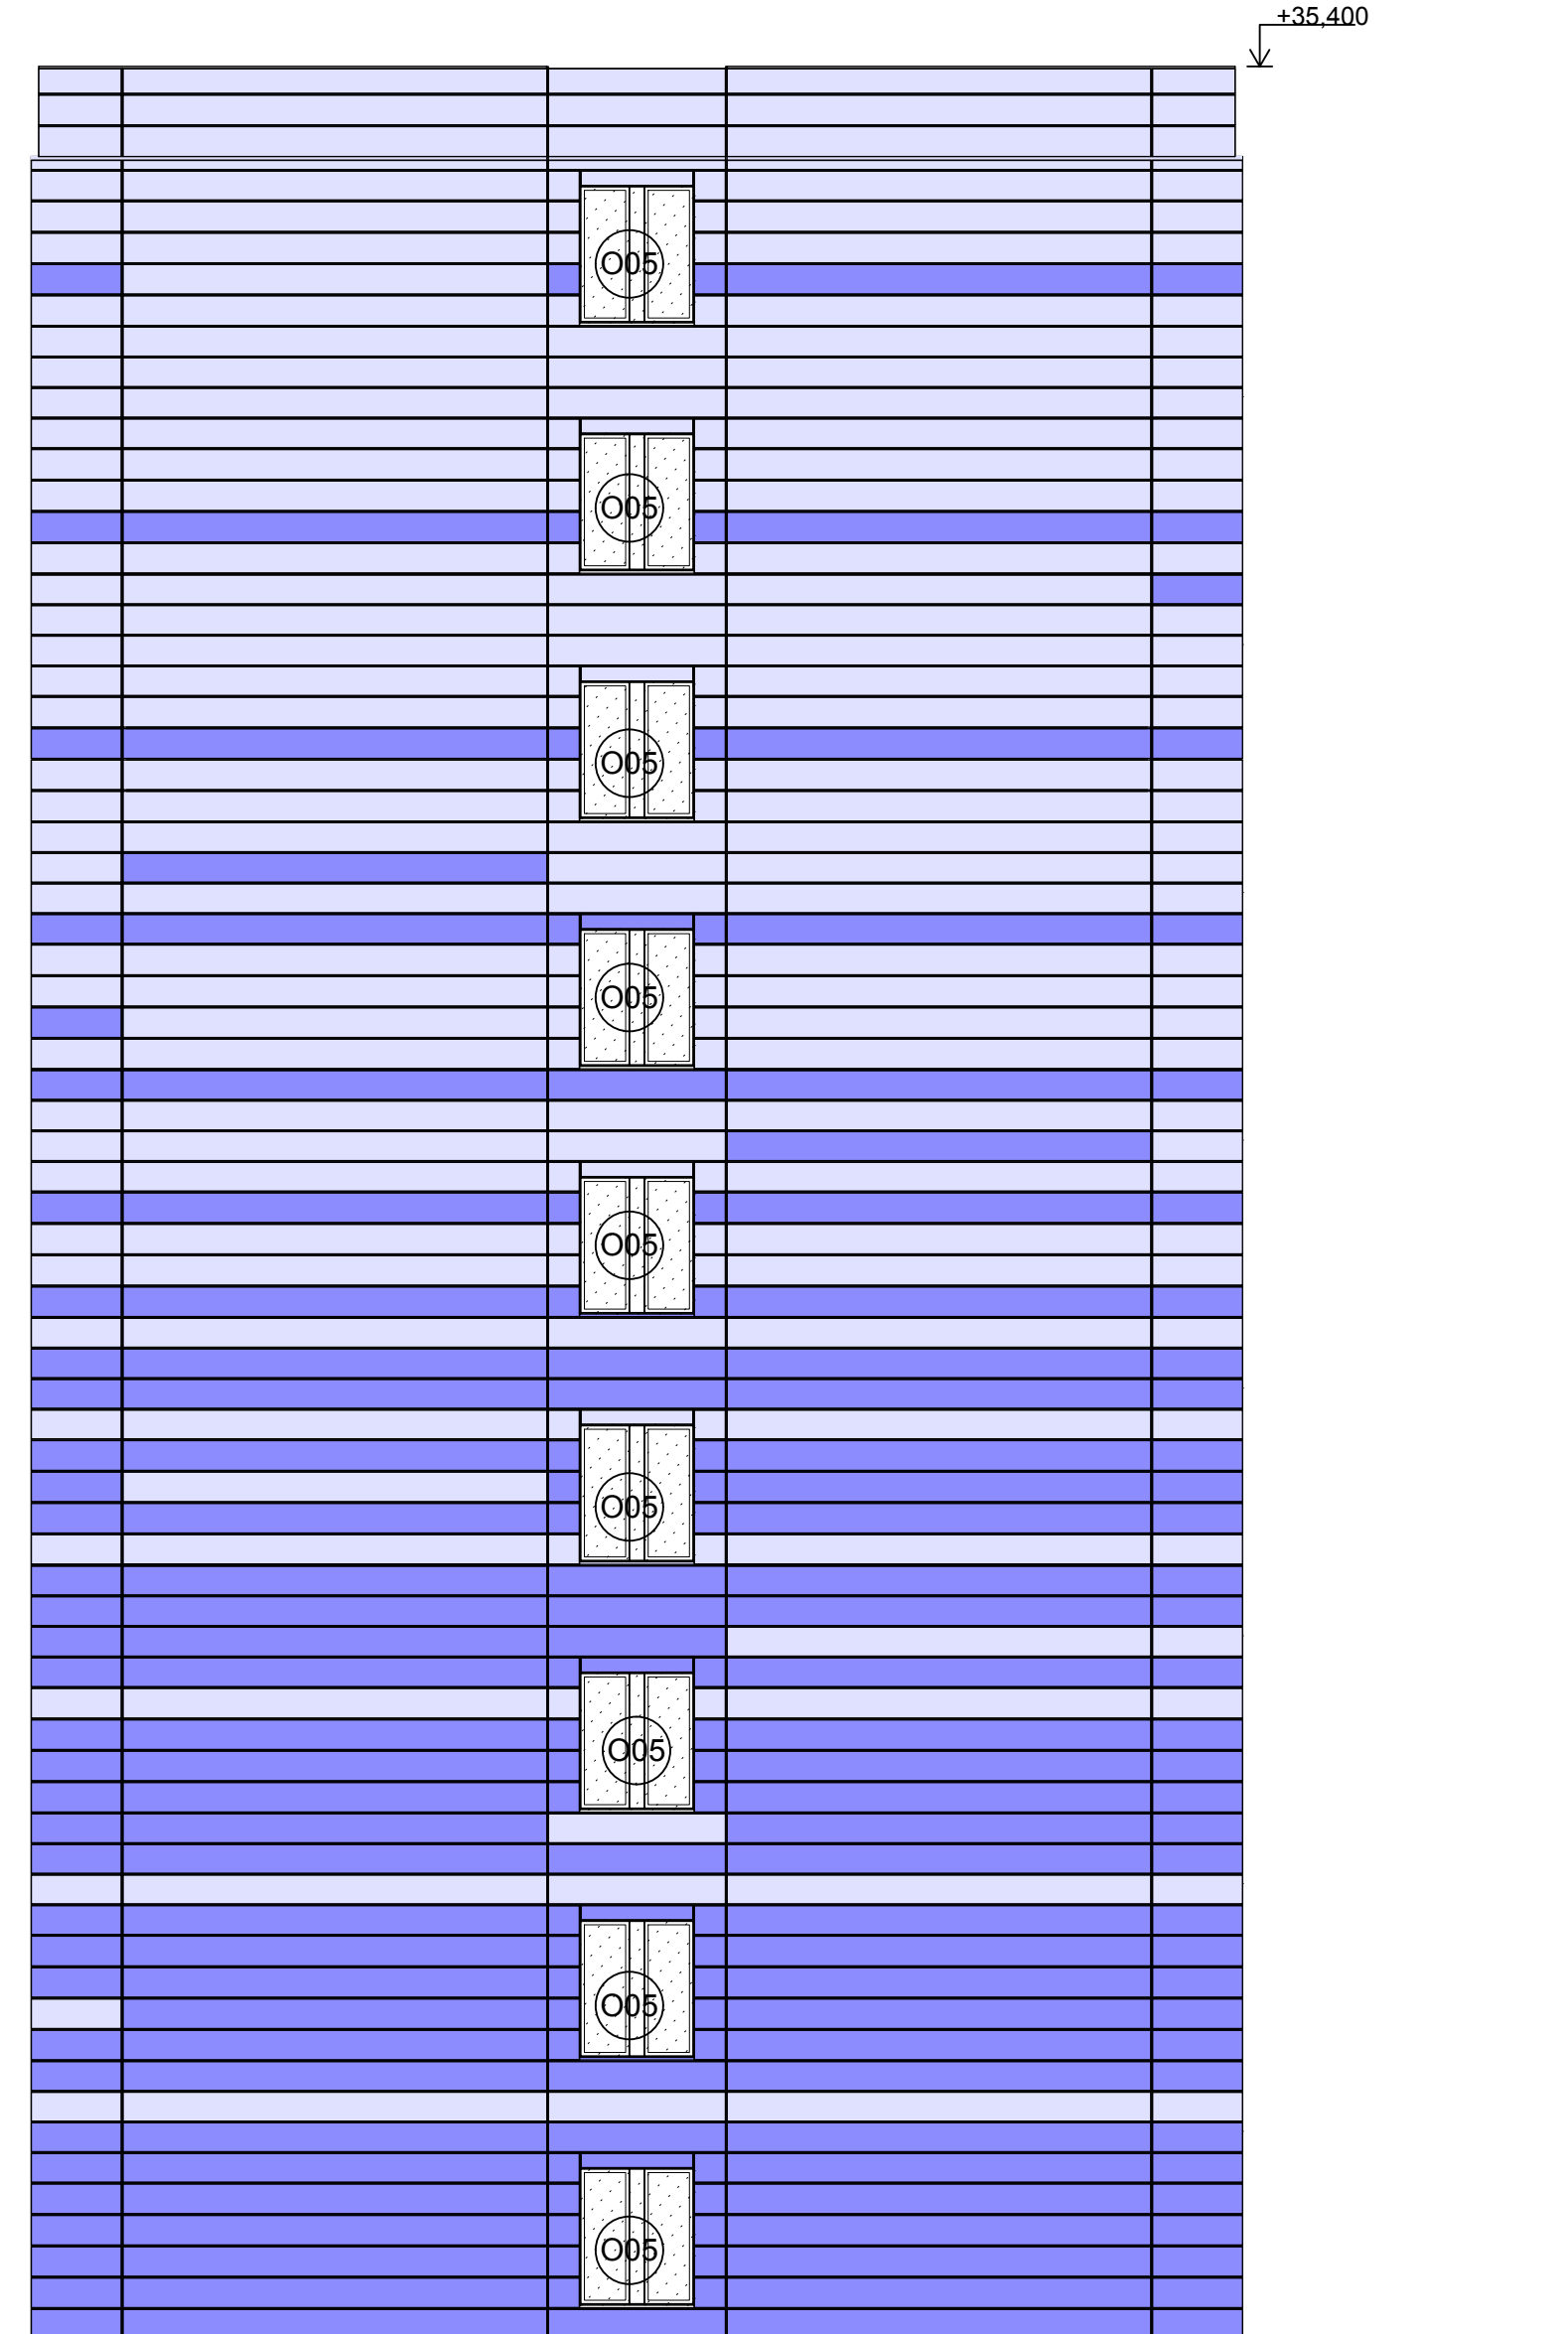


Severozápadní (C)

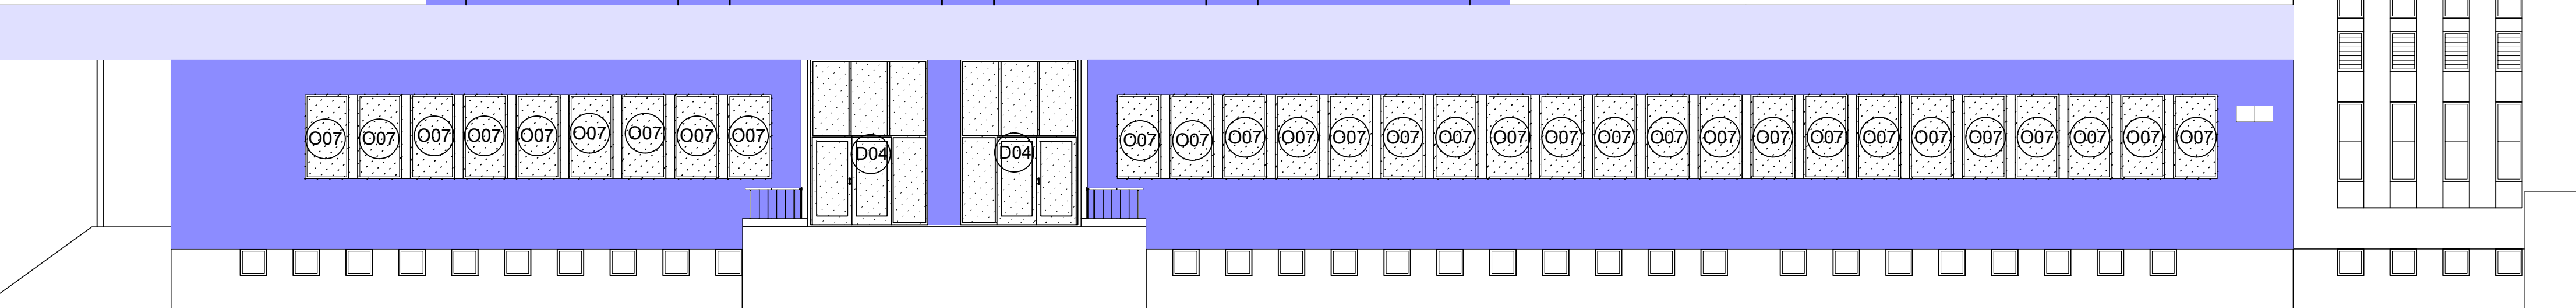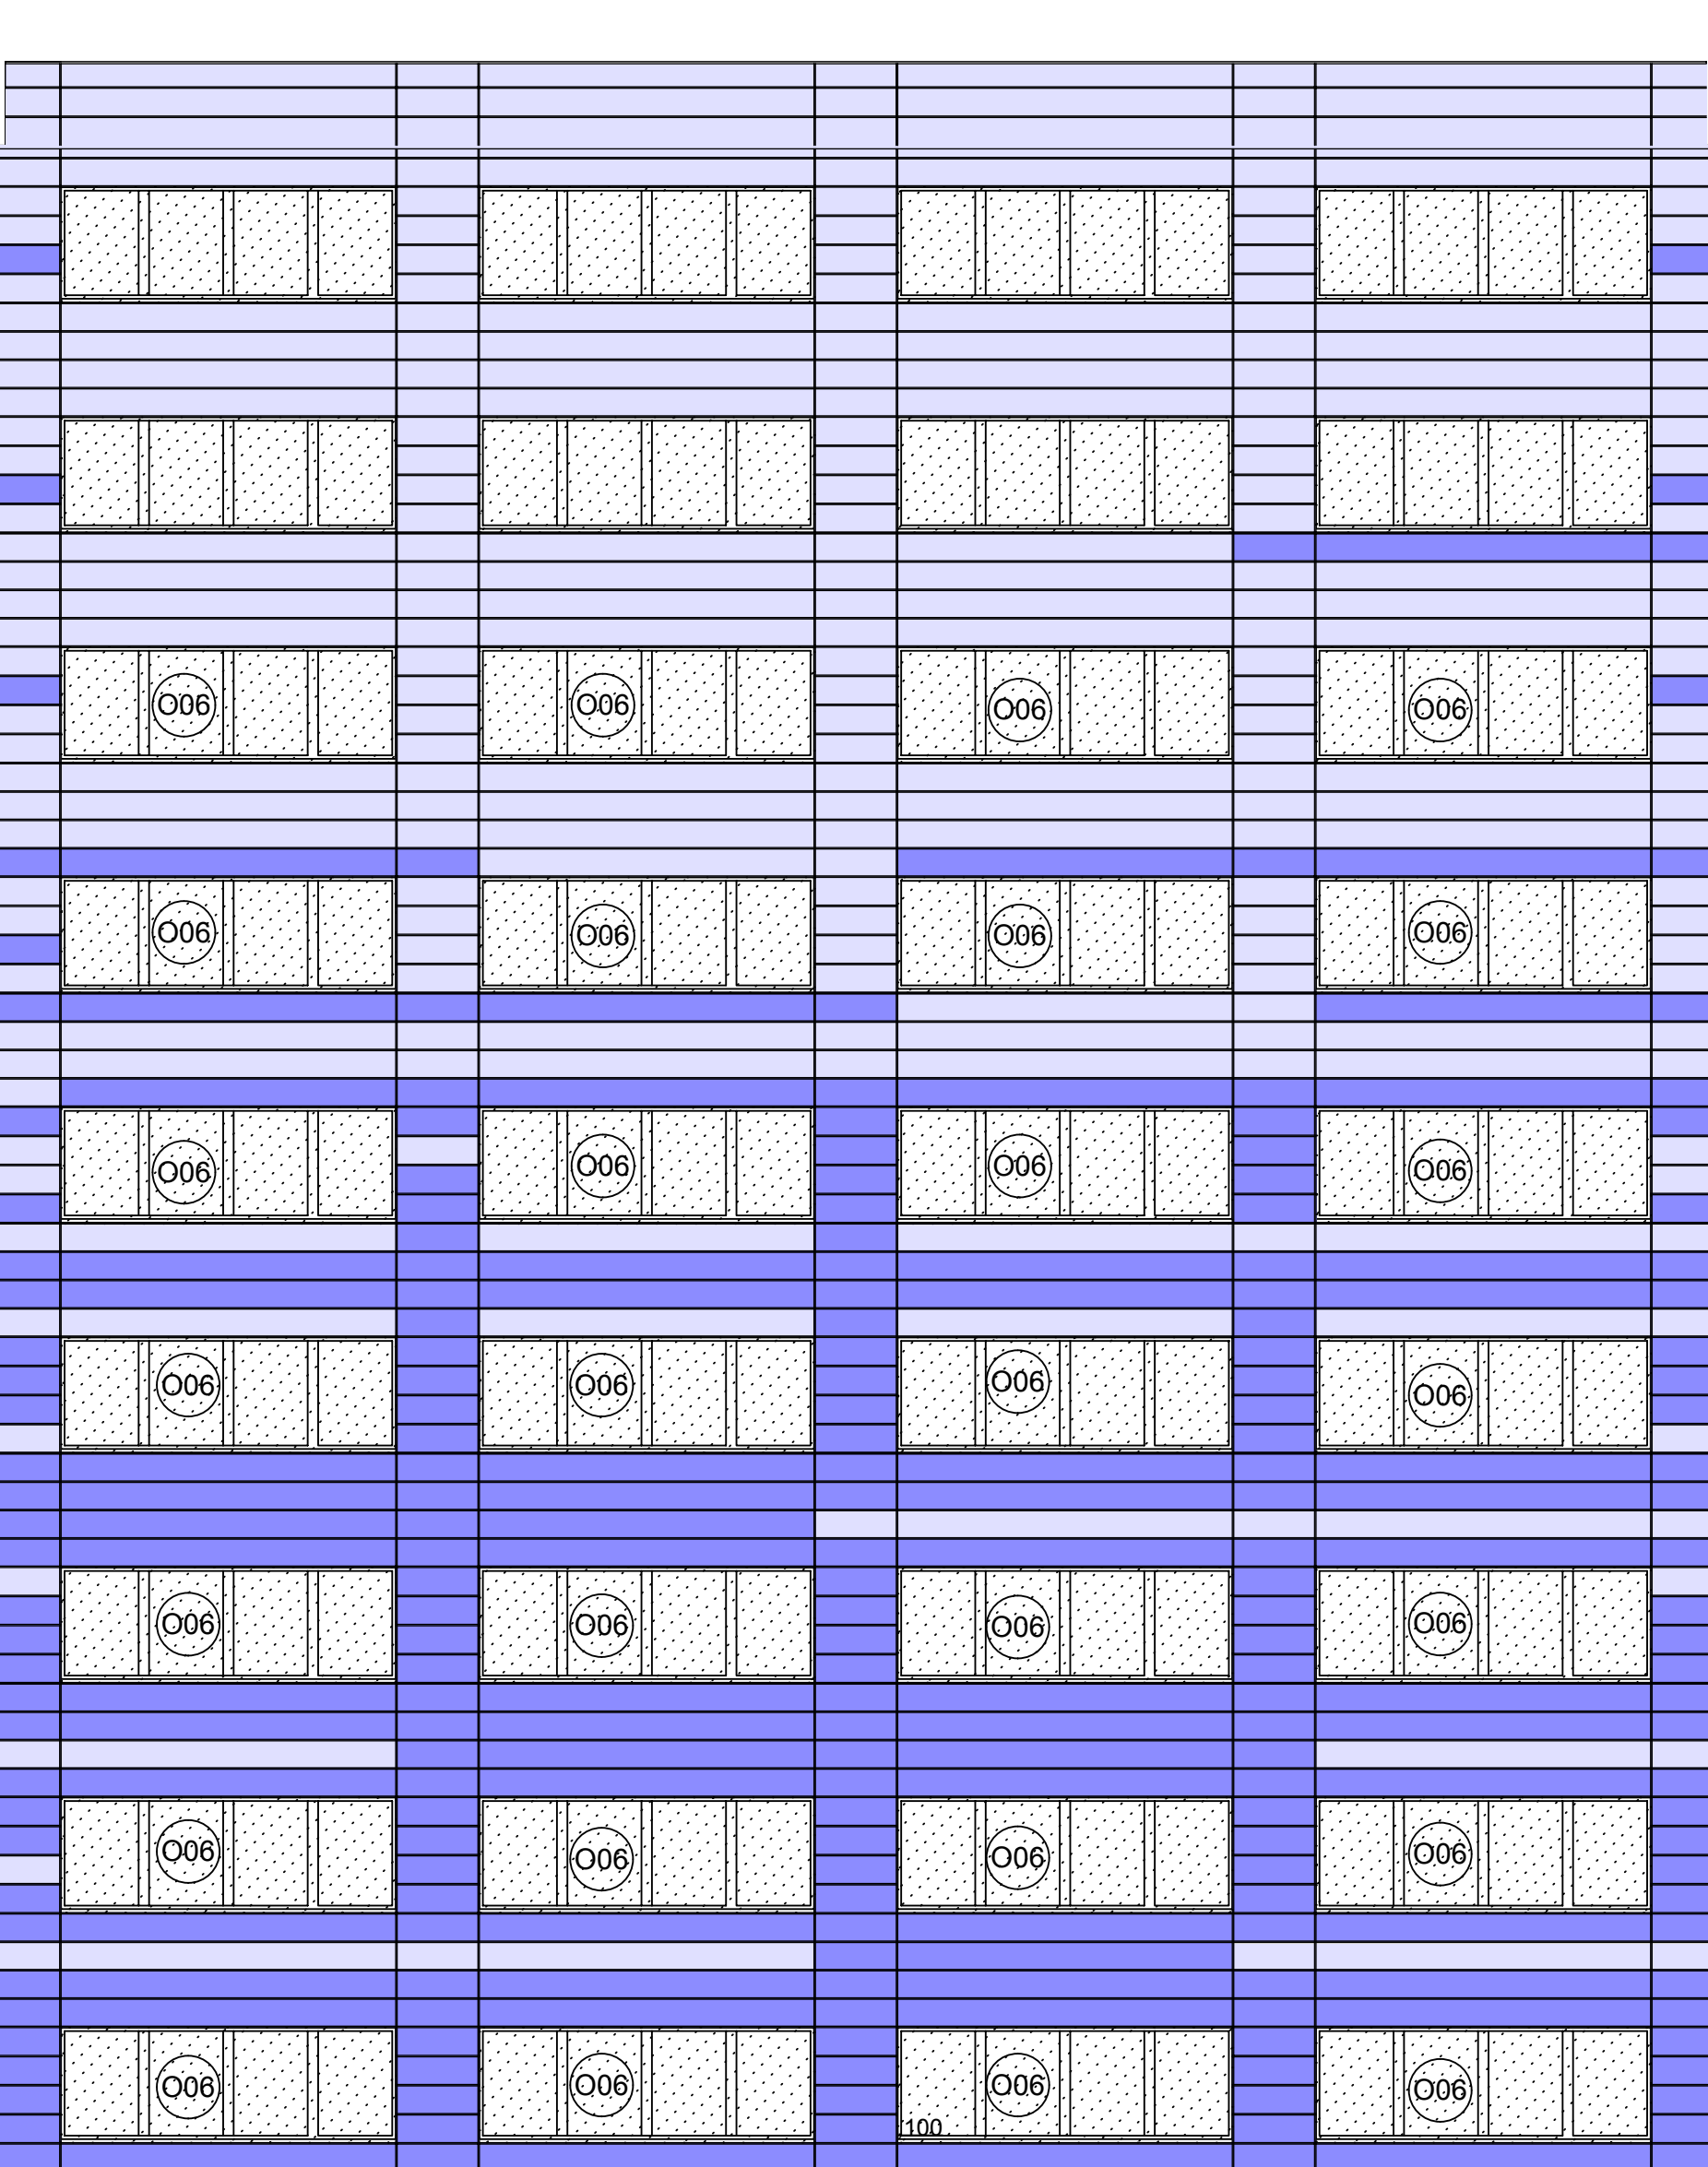


POZNÁMKA:
VELIKOSTI OKENNÍCH OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ.
BAREVNOST BUDE DOREŠENA ZA ASISTENCE HLAVNÍHO ARCHITEKTA DPP-METRO

- Míněné výplně otvorů
- Kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z EPS tl. 180 mm. POUŽÍTE PODNOŽ A ŽIRAVOTNÍ STŘEDISKO
- FASÁDA PROVEDENA SYSTÉMEM DEKMETAL. ZOBEC Z EPS tl. 180 mm. S IZOLANTEM MW TL 180mm. PROVĚTRÁVANA POUŽÍTE VÝSKOVÁ BUDOVA
- Fotovoltaické panely

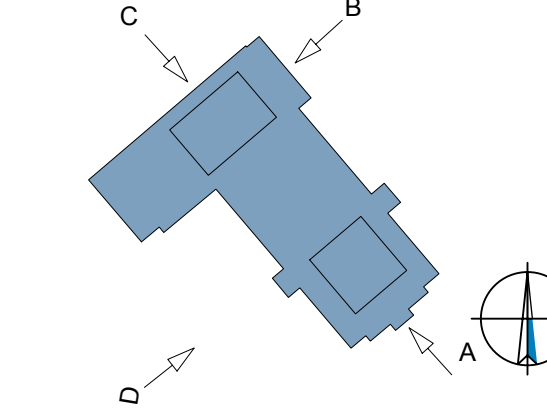


ZMĚNA Č.		VYPRACOVAL:		PODPIS:		DATUM:	
GENÉRALNÍ PROJEKTANT: ENESA a.s. Českomoravská 2532/18b, 190 00 Praha 9 www.enesa.cz - www.enesa.cz - info@enesa.cz IČ: 27382052 - IČ: 27382052 DIČ: CZ27382052		ČLEN SDRUŽENÉ METROSTAVI BÉ s.r.o. Kotěvská 2404/1, 160 00 Praha 6 www.metrostav.cz - www.metrostav.cz - info@metrostav.cz IČ: 25021915 - IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					
PROFESÍ: STAVEBNÍ ČÁST - HABENA spol. s r.o.		VYPRACOVAL:		TECHNICKÁ KONTROLA:			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT							
INVESTOR DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, a.s.							
NÁZEV AKCE: POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC PRO VYBRANÉ OBJEKTY DPP V AREÁLECH DEPO KAČEROV, CENTRÁLNÍ DISPEČNÍK, VOZOVNA PANKRÁČ A VOZOVNA STŘEŠOVICE		ČÍSLO ZAKÁZKY		21052			
ČÁST: SO 04 - DEPO KAČEROV PS 04.1.1 Stavění opatření - objekt A		FORMÁT A4		4			
		STUPEŇ PD		DŠP			
		DATUM		04/2024			
		MĚRITKO		1:100			
NÁZEV VÝKRESU: POHLEDY - SV, SZ - NAVRHOVANÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU: D1.1.1. - 05b		PÁŘE Č.:			

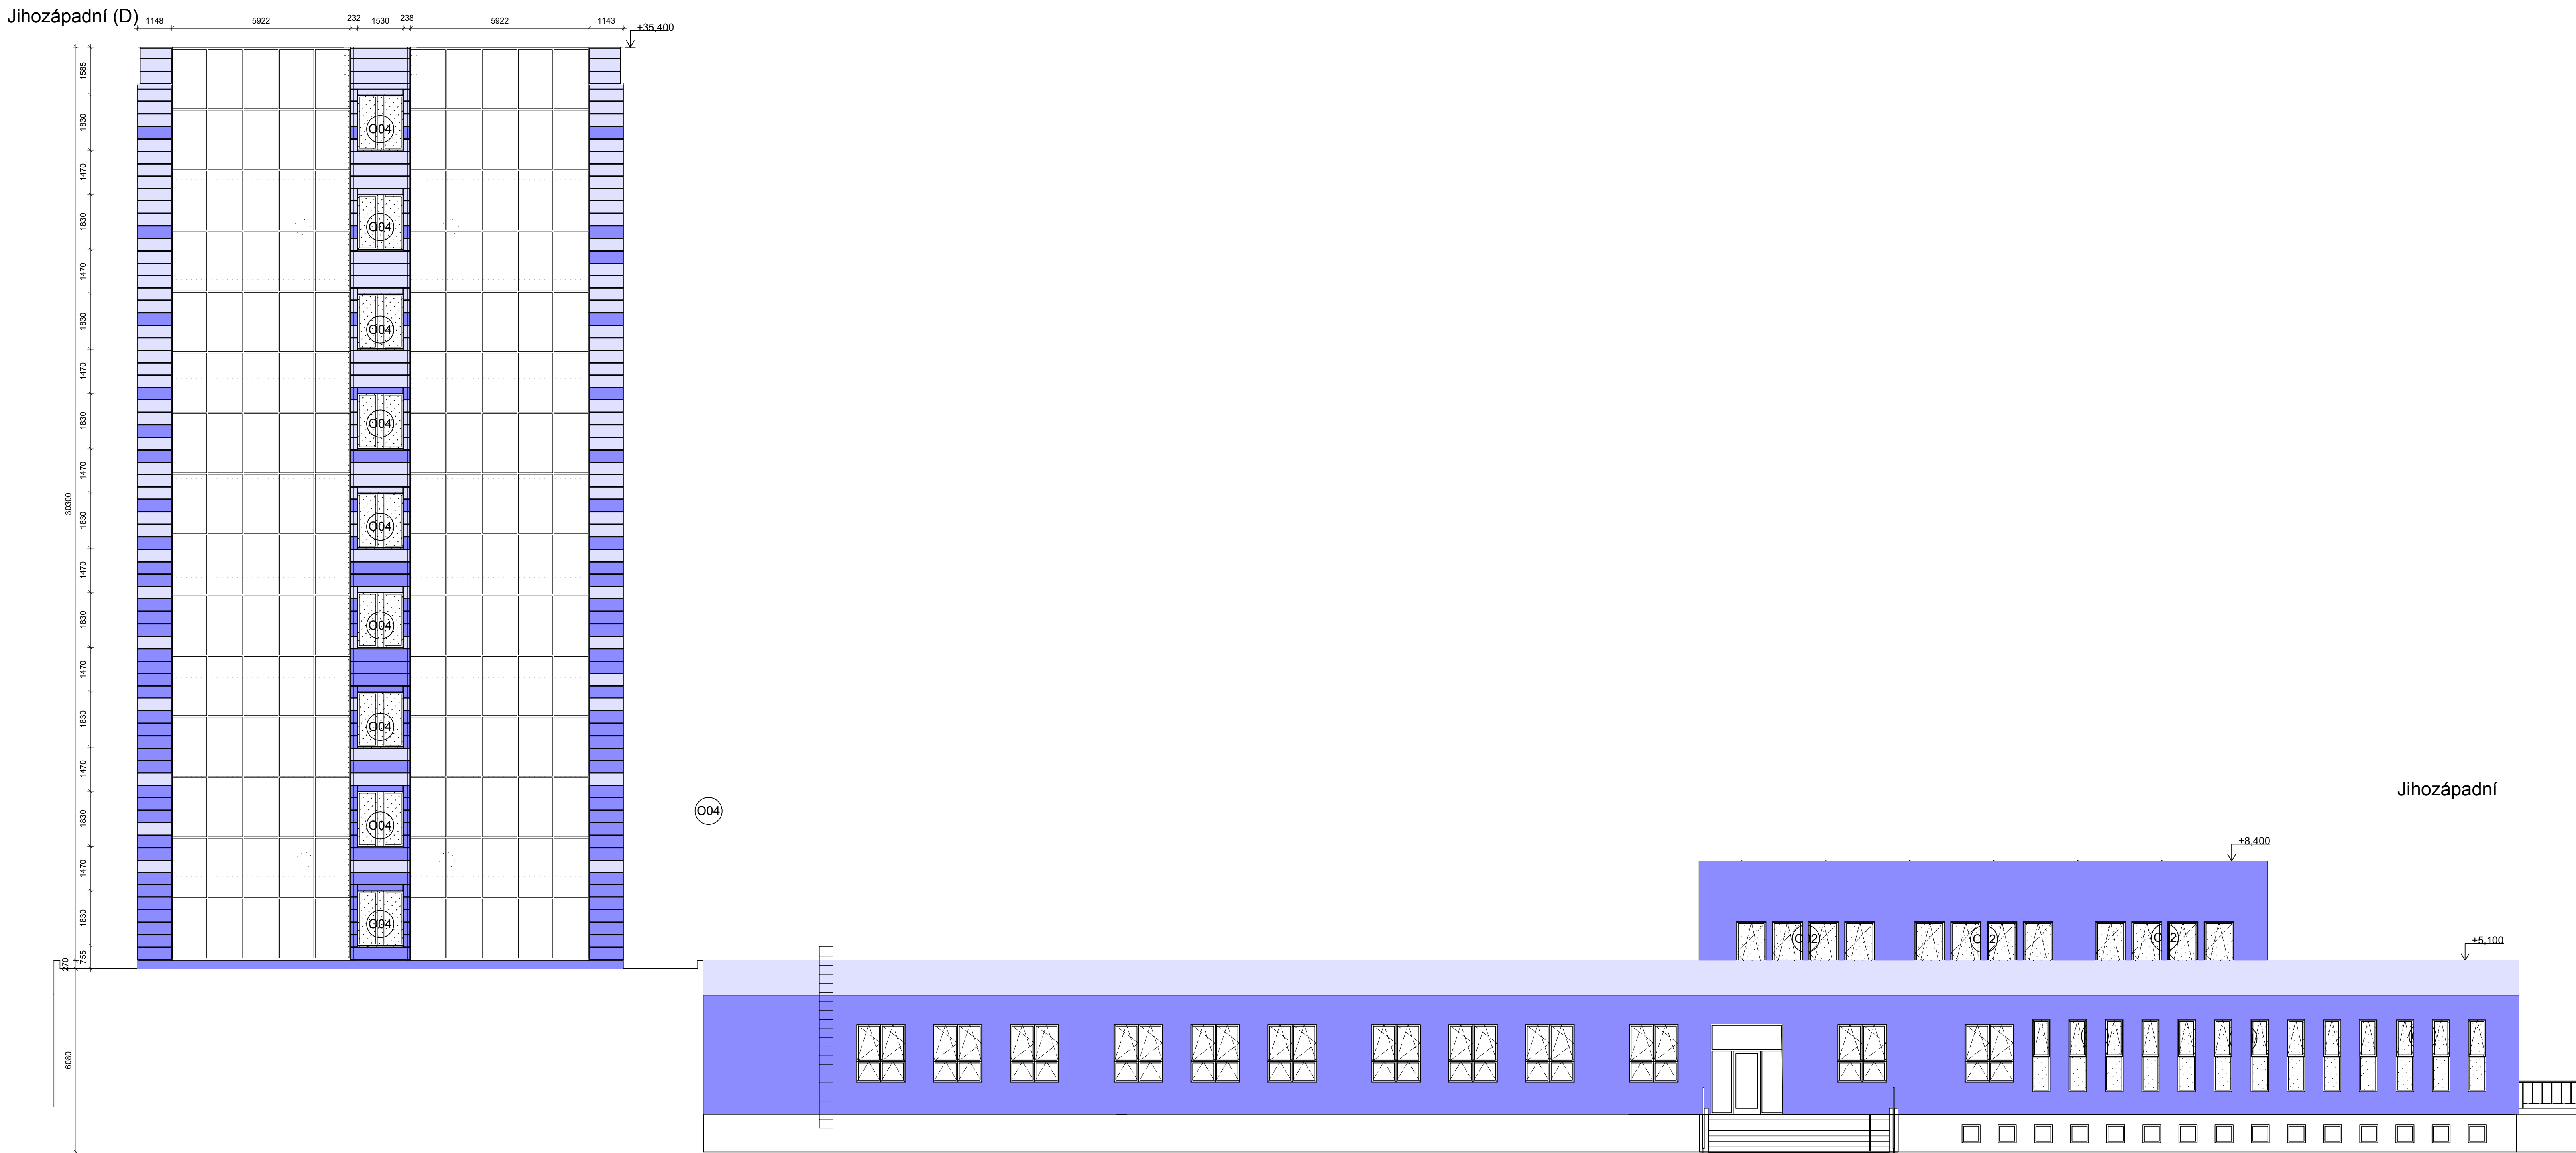




POZNÁMKA:

Z1 Z1 Externí záclada lamelové s ručním elektronickým ovládním, 12 ks





VELIKOSTI OKENNÍCH OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
BAREVNOST BUDE DOREŠENA ZA ASISTENCE HLAVNÍHO ARCHITKTA DPP-METRO

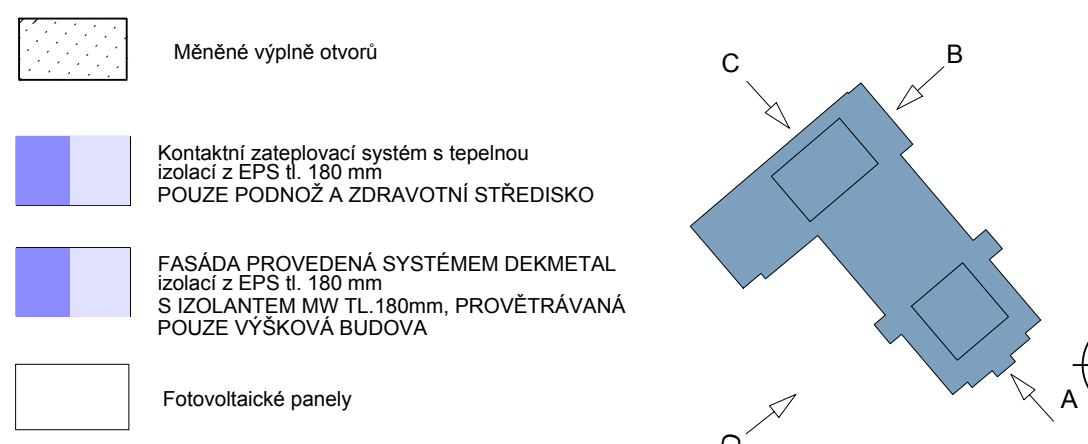

ZMĚNA Č.	VYPRACOVAL :	PODPIS :	DATUM :
GENÉRALNÍ PROJEKTANT: ENESA a.s. Česká zpráva 2532/18b, 180 00 Praha 9 www.ensac.cz - www.ensac.cz - ensac@ensac.cz IČ: 27382052 IČ: 27382052 DIČ: CZ27382052	ČLEN SPRÁVNÍ METROSTAVIČKA s.r.o. Kotelnická 140/4, 180 00 Praha 9 www.metrostavici.cz - www.metrostavici.cz - info@metrostavici.cz IČ: 27382052 IČ: 27382052 DIČ: CZ27382052		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
PROJESE : STAVEBNÍ ČÁST - HÁBENÁ spol. s r.o.	TECHNICKÁ KONTROLA :		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :		
INVESTOR: DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, a.s.			
NÁZEV AKCE: POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC PRO VYBRANÉ OBJEKTY DPP V AREÁLECH DEPO KAČEROV, CENTRÁLNÍ DISPEČNÍ VOZOVNA PANKRAC A VOZOVNA STŘEŠOVICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	21052	
ČÁST: SO 04 - DEPO KAČEROV PS 04.1.1 Stavební opatření - objekt A	FORMÁT A4	4	
	STUPEŇ PD	DSP	
	DATUM	04/2024	
	MĚŘÍTKO	1:100	
NÁZEV VÝKRESU: POHLEDY - JV, JZ - NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU: D1.1.1. - 00b	PÁRE Č.:	

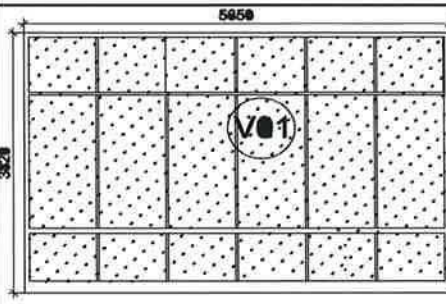Tabulka oken						
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Popis - stav	Navrhované opatření
			Šířka	Výška		
001	31		600	2400	Okno kované s jednoduchým zasklením, dvukřídlé, 1x sklopné, 1x pevné.	Okno plastové jednoduché, s izolačním trejsekem Ug = 0,6 W/m2K, barva bílá, Uw = 0,9 W/m2K.
002	30		1020	2100	Okno dřevěné s izolačním dvířskem, otevřené / sklopné.	Okno plastové jednoduché, s izolačním trejsekem Ug = 0,6 W/m2K, barva bílá, Uw = 0,9 W/m2K.
003	9		600	1800	Okno dřevěné s izolačním dvířskem, dvukřídlé, 1x pevné, 1x sklopné.	Okno plastové jednoduché, s izolačním trejsekem Ug = 0,6 W/m2K, barva bílá, Uw = 0,9 W/m2K.
V01	2		5850	3820	Presklená stěna, ocelový rám, zasklené jednoduchým sklem, pevné zasklení.	Okno hliníkové s PTM, zasklené izolačním trejsekem, celk. Uw / max 0,96 W/m2K. Práškové lakování – v odstínu RAL bílá
V-01	12		900	2230	Okno kované s jednoduchým zasklením, dvukřídlé, pevné	Okno hliníkové s PTM, zasklené izolačním trejsekem, celk. Uw / max 0,96 W/m2K. Práškové lakování – v odstínu RAL bílá
V-02	2		2750	2100	Okno kované s jednoduchým zasklením, dvukřídlé, pevné	Okno hliníkové s PTM, zasklené izolačním trejsekem, celk. Uw / max 0,96 W/m2K. Práškové lakování – v odstínu RAL bílá

ZMĚNA Č. :		VYPRACOVAL :		PODPIS :	DATUM :
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENESA a.s. Českomárvská 2532/10b, 100 00 Praha 9 www.enesa.cz - www.enesa.cz enesa@enesa.cz IČ: 27382052 - IČ: 27382052 DIČ: CZ27382052		ČLEN SDRUŽENÍ: METROSTAV BIZ s.r.o. Keřkovská 2450/4, 100 00 Praha 8 www.metrostavbiz.cz - www.metrostavbiz.cz info@metrostavbiz.cz IČ: 25021015 - IČ: 25021015 DIČ: CZ25021015		 ENESA ČLEN ČEZ ESCO	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :			
PROFESE : STAVEBNÍ ČÁST - HABENA spol. s.r.o.					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :			
INVESTOR DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, a.s.					
NÁZEV AKCE: POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC PRO VYBRANÉ OBJEKTY DPP V AREÁLECH DEPO KAČEROV, CENTRÁLNÍ DISPEČINK, VOZOVNA PANKRÁC A VOZOVNA STŘEŠOVICE ČÁST: SO 04 - DEPO KAČEROV PS 04.1.1 Stavební opatření - objekt A				ČÍSLO ZAKÁZKY	21052
				FORMÁT A4	4
				STUPEŇ PD	DSP
				DATUM	04/2024
				MĚŘÍTKO	
NÁZEV VÝKRESU : SPECIFIKACE OKEN				ČÍSLO VÝKRESU : 01.1.1. - 09	PARÉ Č.:

Tabuľka oken						
Č.	KS	Náhľad	Rozmery		Popis - stav	Navrhované opatrení
			Šírka	Výška		
O04	18		770	1800	Okno drevené s izolačným dvojskdom, otvárať / sklopné.	Okno plastové jednoduché, s izolačným trojskdom $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, farba biela, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.
O05	18		770	1800	Okno drevené s izolačným dvojskdom, otvárať / sklopné.	Okno plastové jednoduché, s izolačným trojskdom $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, farba biela, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.
O06	287		1070	1800	Okno drevené s izolačným dvojskdom, otvárať / sklopné.	Okno plastové jednoduché, s izolačným trojskdom $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, farba biela, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. žaluzie
O07	30		1000	2000	Okno drevené s izolačným dvojskdom, otvárať / sklopné.	Okno plastové jednoduché, s izolačným trojskdom $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, farba biela, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Tabulka dveří								
Č.	Ks	Rozměry dveří		Celkové rozměry otvoru		Popis	Navrhované opatření	Poznámka
		Šířka	Výška	Šířka	Výška			
D01	1	900	2000	2700	3820	Prosklená vstupní konstrukce, ocelový rám s jednoduchým zasklením, 2x dveře	Vstupní dveře, hliníkový rám s PTM, zasklené izolačním zasklením, typ a členění dveří bude upřesněno Celkové Ud = max. 1,2 W/m2K Práškové lakování - RAL bílá	
D02	1	900	2000	2700	3820	Prosklená vstupní konstrukce, ocelový rám s jednoduchým zasklením, 2x dveře	Vstupní dveře, hliníkový rám s PTM, zasklené izolačním zasklením, typ a členění dveří bude upřesněno Celkové Ud = max. 1,2 W/m2K Práškové lakování - RAL bílá	
D03	1	900	2000	2700	3820	Prosklená vstupní konstrukce, ocelový rám s jednoduchým zasklením, 2x dveře	Vstupní dveře, hliníkový rám s PTM, zasklené izolačním zasklením, typ a členění dveří bude upřesněno Celkové Ud = max. 1,2 W/m2K Práškové lakování - RAL bílá	
D04	1	1800	2000	2700	3800	Dveře kovové prosklené, dvoukřídlé, s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, s jednoduchým zasklením.	Vstupní dveře, hliníkový rám s PTM, zasklené izolačním zasklením, typ a členění dveří bude upřesněno Celkové Ud = max. 1,2 W/m2K Práškové lakování - RAL bílá	
D04A	1							
D05	1	5300	2870	5300	2870	Dveře kovové prosklené, dvoukřídlé, s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, s jednoduchým zasklením.	Vstupní dveře, hliníkový rám s PTM, zasklené izolačním zasklením, typ a členění dveří bude upřesněno Celkové Ud = max. 1,2 W/m2K	
D06	1	1030	2440	1030	2440	Dveře plastové částečně prosklené, jednokřídlé balkonové zateplené, samozavírač	Vstupní dveře, plastový rám Celkové Uw = max. 0,9 W/m2K	
VD	3	1600	2000	1800	3700	Dveře kovové prosklené, dvoukřídlé, s nadsvětlíkem, s jednoduchým zasklením.	Vstupní dveře, hliníkový rám s PTM, zasklené izolačním zasklením, typ a členění dveří bude upřesněno Celkové Ud = max. 1,2 W/m2K Práškové lakování - RAL bílá	

ZMĚNA Č. :		VYPRACOVAL :		PODPIS :	DATUM :
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENESA a.s. Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9 www.enesa.cz - www.enesa.cz enesa@enesa.cz IČ: 27382052 - IČ: 27382052 DIČ: CZ27382052		ČLEN SDRUŽENÍ: METROSTAV DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 www.metrostavdiz.cz - www.metrostavdiz.cz info@metrostavdiz.cz IČ: 25021915 - IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915		 ČLEN ČEZ ESCO	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :			
PROFESE : STAVEBNÍ ČÁST - HABENA spol. s.r.o.					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :			
INVESTOR DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, a.s.					
NÁZEV AKCE: POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC PRO VYBRANÉ OBJEKTY DPP V AREÁLECH DEPO KAČEROV, CENTRÁLNÍ DISPEČINK, VOZOVNA PANKRÁC A VOZOVNA STŘEŠOVICE ČÁST: SO 04 - DEPO KAČEROV PS 04.1.1 Stavební opatření - objekt A				ČÍSLO ZAKÁZKY	21052
				FORMÁT A4	4
				STUPEŇ PD	DSP
				DATUM	04/2024
NÁZEV VÝKRESU :				ČÍSLO VÝKRESU :	PARÉ Č.:
SPECIFIKACE DVEŘÍ				D1.1.1. - 08	
