



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
- je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500009334
ZMĚNOVÝ LIST č. 01/SÚS PK

Stavební akce:	"Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech" Č.projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změnový list č. 01/SÚS PK
--	---------------------------

Dotčená část stavby:	SO 701 - Zastřešení terminálu		
Název / označení změny:	Výztuž a zpětný zásyp		
Podklad pro změnu:	Zadávací dokumentace, RDS		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Navýšení výztuže se týká dodatečné úpravy základové patky ZP Z02 v návaznosti na kolizi se stavebním objektem SO 302, nástupiště č. 1 osa 6. Výztuž musela být znovu objednána. Položka zásypu chybí v rozpočtu a je nezbytná pro dokončení díla.			
Změna se týká položek : viz příložený rozpočet			
Jedná se o položky, které se nachází ve smluvním rozpočtu			
Způsob ocenění změny:			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			24 660,81 Kč
přípočty celkem:			24 660,81 Kč
odpočty celkem:			0,00 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje j.c. výpočet množství, fotodokumentace stanovisko AD stanovisko TDS		

firma/ organizace	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.			
projektant /AD/ Laboro ateliér s.r.o.			
TDS - INGEM a.s.			
objednatel /SÚS PK/			
objednatel /m KT/			

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech						CELKEM	55 318 815,65 Kč	
Název SO/PS:		SO 701 - Zastřešení terminálu								
Název změny:		ZL č. 01 - Výztuž a zpětný zásyp								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce										
7	275361821	SoD	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	20,799	0,432	21,231	27984,00	582 039,22 Kč	
Součet za Díl								582 039,22 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
24 660,81 Kč	0,00 Kč	55 343 476,46 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
12 089,09 Kč	0,00 Kč	594 128,31 Kč
12 089,09 Kč	0,00 Kč	594 128,31 Kč


Nové položky

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	změna	po změně	Jednotková	Celkem
100	174151101	SO 301 p.č. 22	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,000	63,484	63,484	198,03	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
12 571,72 Kč	0,00 Kč	12 571,72 Kč
12 571,72 Kč	0,00 Kč	12 571,72 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS



Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Výkop p.č. 1 = 347,126 m³

Patka Z01

32,000 x 2,300 x 1,900 x 0,820 x 1,500 = 172,003 m³

Patka P01

14,000 x 2,050 x 2,050 x 1,000 x 1,500 = 88,253 m³

260,256 m³

Podkladní beton

Patka Z01 32 ks

2,500 x 2,100 x 0,100 = 0,525 m³
 0,525 x 32,000 = **16,800 m³**

Patka P01 14 ks

2,150 x 2,150 x 0,100 = 0,462 m³
 0,462 x 14,000 = **6,468 m³**

Patka Z01

32,000 x 1,900 x 2,300 x 0,820 = 114,669 m³

Patka P01


14,000 x 2,050 x 2,050 x 1,000 = 58,835 m³

196,772 m³

ZPĚTNÝ ZÁSYP Výkop 260,256 - Provedené konstrukce 196,772 = **63,484 m³**

PŘÍKLAD PRO VÝPOČET ZPĚTNÉHO ZÁSYPU - ZP-Z01

ŘEZ B-B 1:50

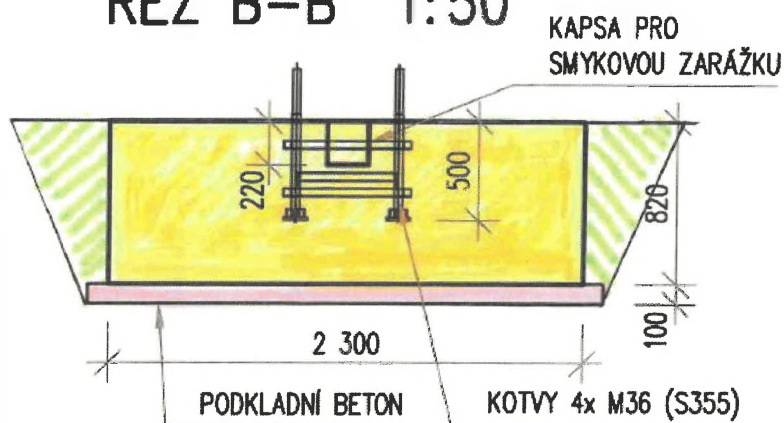

KONSTRUKCE PATKY Z01
 PODKLADNÍ BETON
 ZPĚTNÝ ZÁSYP



Výkaz výztuže dle RDS

VÝKAZ VÝZTUŽE PRO 1 PATKU

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R		
				8	12	16
1	R 8	1500	42	63.0		
2	R 16	3250	28			91.0
3	R 12	2550	4		10.2	
4	R 12	3150	4		12.6	
5	R 12	2600	4		10.4	
6	R 12	2650	4		10.6	
7	R 16	2300	62			142.6
CELKOVÁ DELKA [m]				63.0	43.8	233.6
HMOTNOST [kg]				24.9	38.9	368.7
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				432.4		



STAVBA: PŘESTUPNÍ TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY V KLATOVECH

DENÍK: 701 - SO 701 - ZASTŘEŠENÍ TERMINÁLU

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	Zamračeno	4,2°C	0,0 mm/h	18:00	Polojasno	7,8°C	0,0 mm/h
12:00	Polojasno	7,5°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	PŘÍMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE
BERGER BOHEMIA a. s.	Strojník Zástupce Stavbyvedoucího Dělník		Dělník Dělník

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA
Kramer	BERGER BOHEMIA a. s.	
Vibrační pěch	BERGER BOHEMIA a.s.	

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN - MJ
Zpětný zásyp základových patek ZP P01 II. nástupiště se zhuštění po vstvách návoz zásypového materiálu z mezideponie		



STAVBA: PŘESTUPNÍ TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY V KLATOVECH

bulldary.online

DENÍK: 701 - SO 701 - ZASTŘEŠENÍ TERMINÁLŮ

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	Zamračeno	14,0°C	0,0 mm/h	18:00	Polojasno	18,0°C	0,0 mm/h
12:00	Zamračeno	20,0°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE
[REDAKOVANÉ]	Stavební Dělník	[REDAKOVANÉ]	Stavební Dělník
[REDAKOVANÉ]	Zástupce Stavbyvedoucího	[REDAKOVANÉ]	
[REDAKOVANÉ]	Zástupce Stavbyvedoucí Podzhotovitele Montážník Stavbyvedoucí Podzhotovitele	[REDAKOVANÉ]	Montážník Montážník
[REDAKOVANÉ]	Geodet		

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDÍ	NÁZEV DODAVATELE	POŠÁDKA
Auto s hydraulickou rukou	Egoé plus a.s.	
Teleskopická hydraulická montážní plošina	Egoé plus a.s.	
Teleskopická hydraulická montážní plošina	Egoé plus a.s.	

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MIN. MJ
Montáž atypických zámečnických a ocelových konstrukcí včetně přesunu hmot, práce probíhají na nást.č.1. Přílohy: 2025_07_16 (1).jpg 2025_07_16 (2).jpg	Egoé plus a.s.	
Geodetické vytyčení závitových tyčí základových patek ZP Z 01 č.5,4 a ZP Z02 č.6 I.nástupiště	Hrdlička Spol. s.r.o.	
Osazení výztuže patky ZP Z02 č.6 na betonové distanční podložky 50 mm vyvážení košů závitových tyčí patek č.6,5,4 na I. nástupiště vázání armatury Přílohy:	AKT Stav s.r.o.	

20250717_161043.jpg





Stanovisko TDS k ZL č. 01

Název stavby : Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

Název ZL: SO 701 – Zastřešení terminálu - Výztuž a zpětný zásyp

Důvod změny:

- a) Základová patka ZP Z02 musela být s ohledem na kolizi s SO 302 upravena a tím vznikla potřeba aktualizace PD armovací výztuže-navýšení.
- b) V rozpočtu stavby je opomenuta položka zpětného zásypu základových patek. Nezbytné pro dokončení stavební zakázky.

Stanovisko TDS:

Bez připomínek.

Technické posouzení:

Jediné možné řešení byl nákup vyššího (nutného) množství armovací výztuže + provedení zpětných zásypů.

Výkaz výměr:

Doložen rozdílový výkaz výměr.

Ocenění změny (bez DPH):

cenová kalkulace je zpracována dle položek ze základního rozpočtu

Odpočítané položky	-	0,00 Kč
Přípočtové položky	+	24 660,81 Kč
Celkem ZL č.01	+	24 660,81 Kč

Závěr:

TDS se ZL č.01 souhlasí.

za TDS

INGEM
Barrat
321
DIČ:

Vyjádření AD k ZL č. 01

Název stavby: Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

Číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953

Dotčená část stavby: SO 701 - Zastřešení terminálu

Název ZL: Výztuž a zpětný zásyp

Stanovisko AD:

V položkovém rozpočtu chyběla položka zpětný zásyp. V rámci RDS byla upravena základová patka ZP Z01 na Z02 u nástupiště N1 na základě skutečné polohy šachty objektu SO 302.

Závěr:

Autorský dozor se ZL č.01 souhlasí.

