

Technický list změny (TLZ) č. 7

TLZ č./verze:	ZL č. 7
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	1862995011
Ze dne:	17.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002477
Stavba:	INFRASTRUKTURA_Rekonstrukce laboratoří-opakování
Objekt:	budova A, budova B Praha 6 Technická 3 - 5
Název změny:	H 03, L 07 - doplnění odkalovacích nádobek rozvodu vakua
Důvod změny a identifikace původce změny:	
V místnostech H 03 a L 07 je dle PD navrženo provést vakuový rozvod. Z důvodu zvýšení životnosti instalovaných vakuových pump budou na sacím potrubí u jednotlivých pracovišť instalovány odkalovací nádobky, které zachytí případné nasáté tekutiny a pevné prvky, které by mohly poškodit vakuové pumpy.	
Popis změny:	
Dodávka a montáž 9 ks odkalovacích nádobek (H 03 - 4 ks; L 07 - 5 ks)	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
souhlasí	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technické plyny

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet VCP - 4xA4;
- 2) Půdorys laboratoře s vyznačením změn - 2xA3;

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	bez dopadu
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	21 325,14 Kč + DPH
	Celkem:	21 325,14 Kč + DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	
Za objednavatele:	xxxxxx	26.02.2019		
Za TDI:	xxxxxx	26.02.2019		
Za projektanta:	xxxxxx	26.02.2019		
Za zhotovitele:	xxxxxx	26.02.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	200-06a	Praha 6 - VŠCHT 2016
	ZL č.7.	A H03, A L07 - Odkalovací nádoby vákua
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 325,14 CZK
Základní DPH	21 %	4 478,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		21 325,14 CZK
Cena celkem s DPH		25 803,42 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
21	A H03, A L07	0	21 325	4 478	25 803
1	VRN	0	418	88	506
7	A H03 - Odkalovací nádoby	0	9 292	1 951	11 243
7	A L07 - Odkalovací nádoby	0	11 615	2 439	14 054
Celkem za stavbu		0	21 325	4 478	25 803

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Položkový rozpočet


S:	200-06a	Praha 6 - VŠCHT 2016
O:	ZL č.7.	A H03, A L07
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				418,14
1	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00	41,81	41,81
2	005122 R	Provozní vlivy	kpl	1,00	20,91	20,91
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	41,81	41,81
4	005124010R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	313,61	313,61
Celkem						418,14

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Množství	Měrná jednotka	Dodávka za mj.	Montáž za mj.	Cena
ZL č.7.	H03 A					
	Výbava					
	Láhev polysulfon 2l na vakum	4	ks	2 323,0	0	9 292
	CELKEM					9 292

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Množství	Měrná jednotka	Dodávka za mj.	Montáž za mj.	Cena
ZL č.7.	L 07 A					
	Výbava					
	Láhev polysulfon 2l na vakum	5	ks	2 323,0	0	11 615
	CELKEM					11 615

ZMĚNA: Z.L. č.7 - Dodávka a montáž 4 ks odkalovacích nádobek

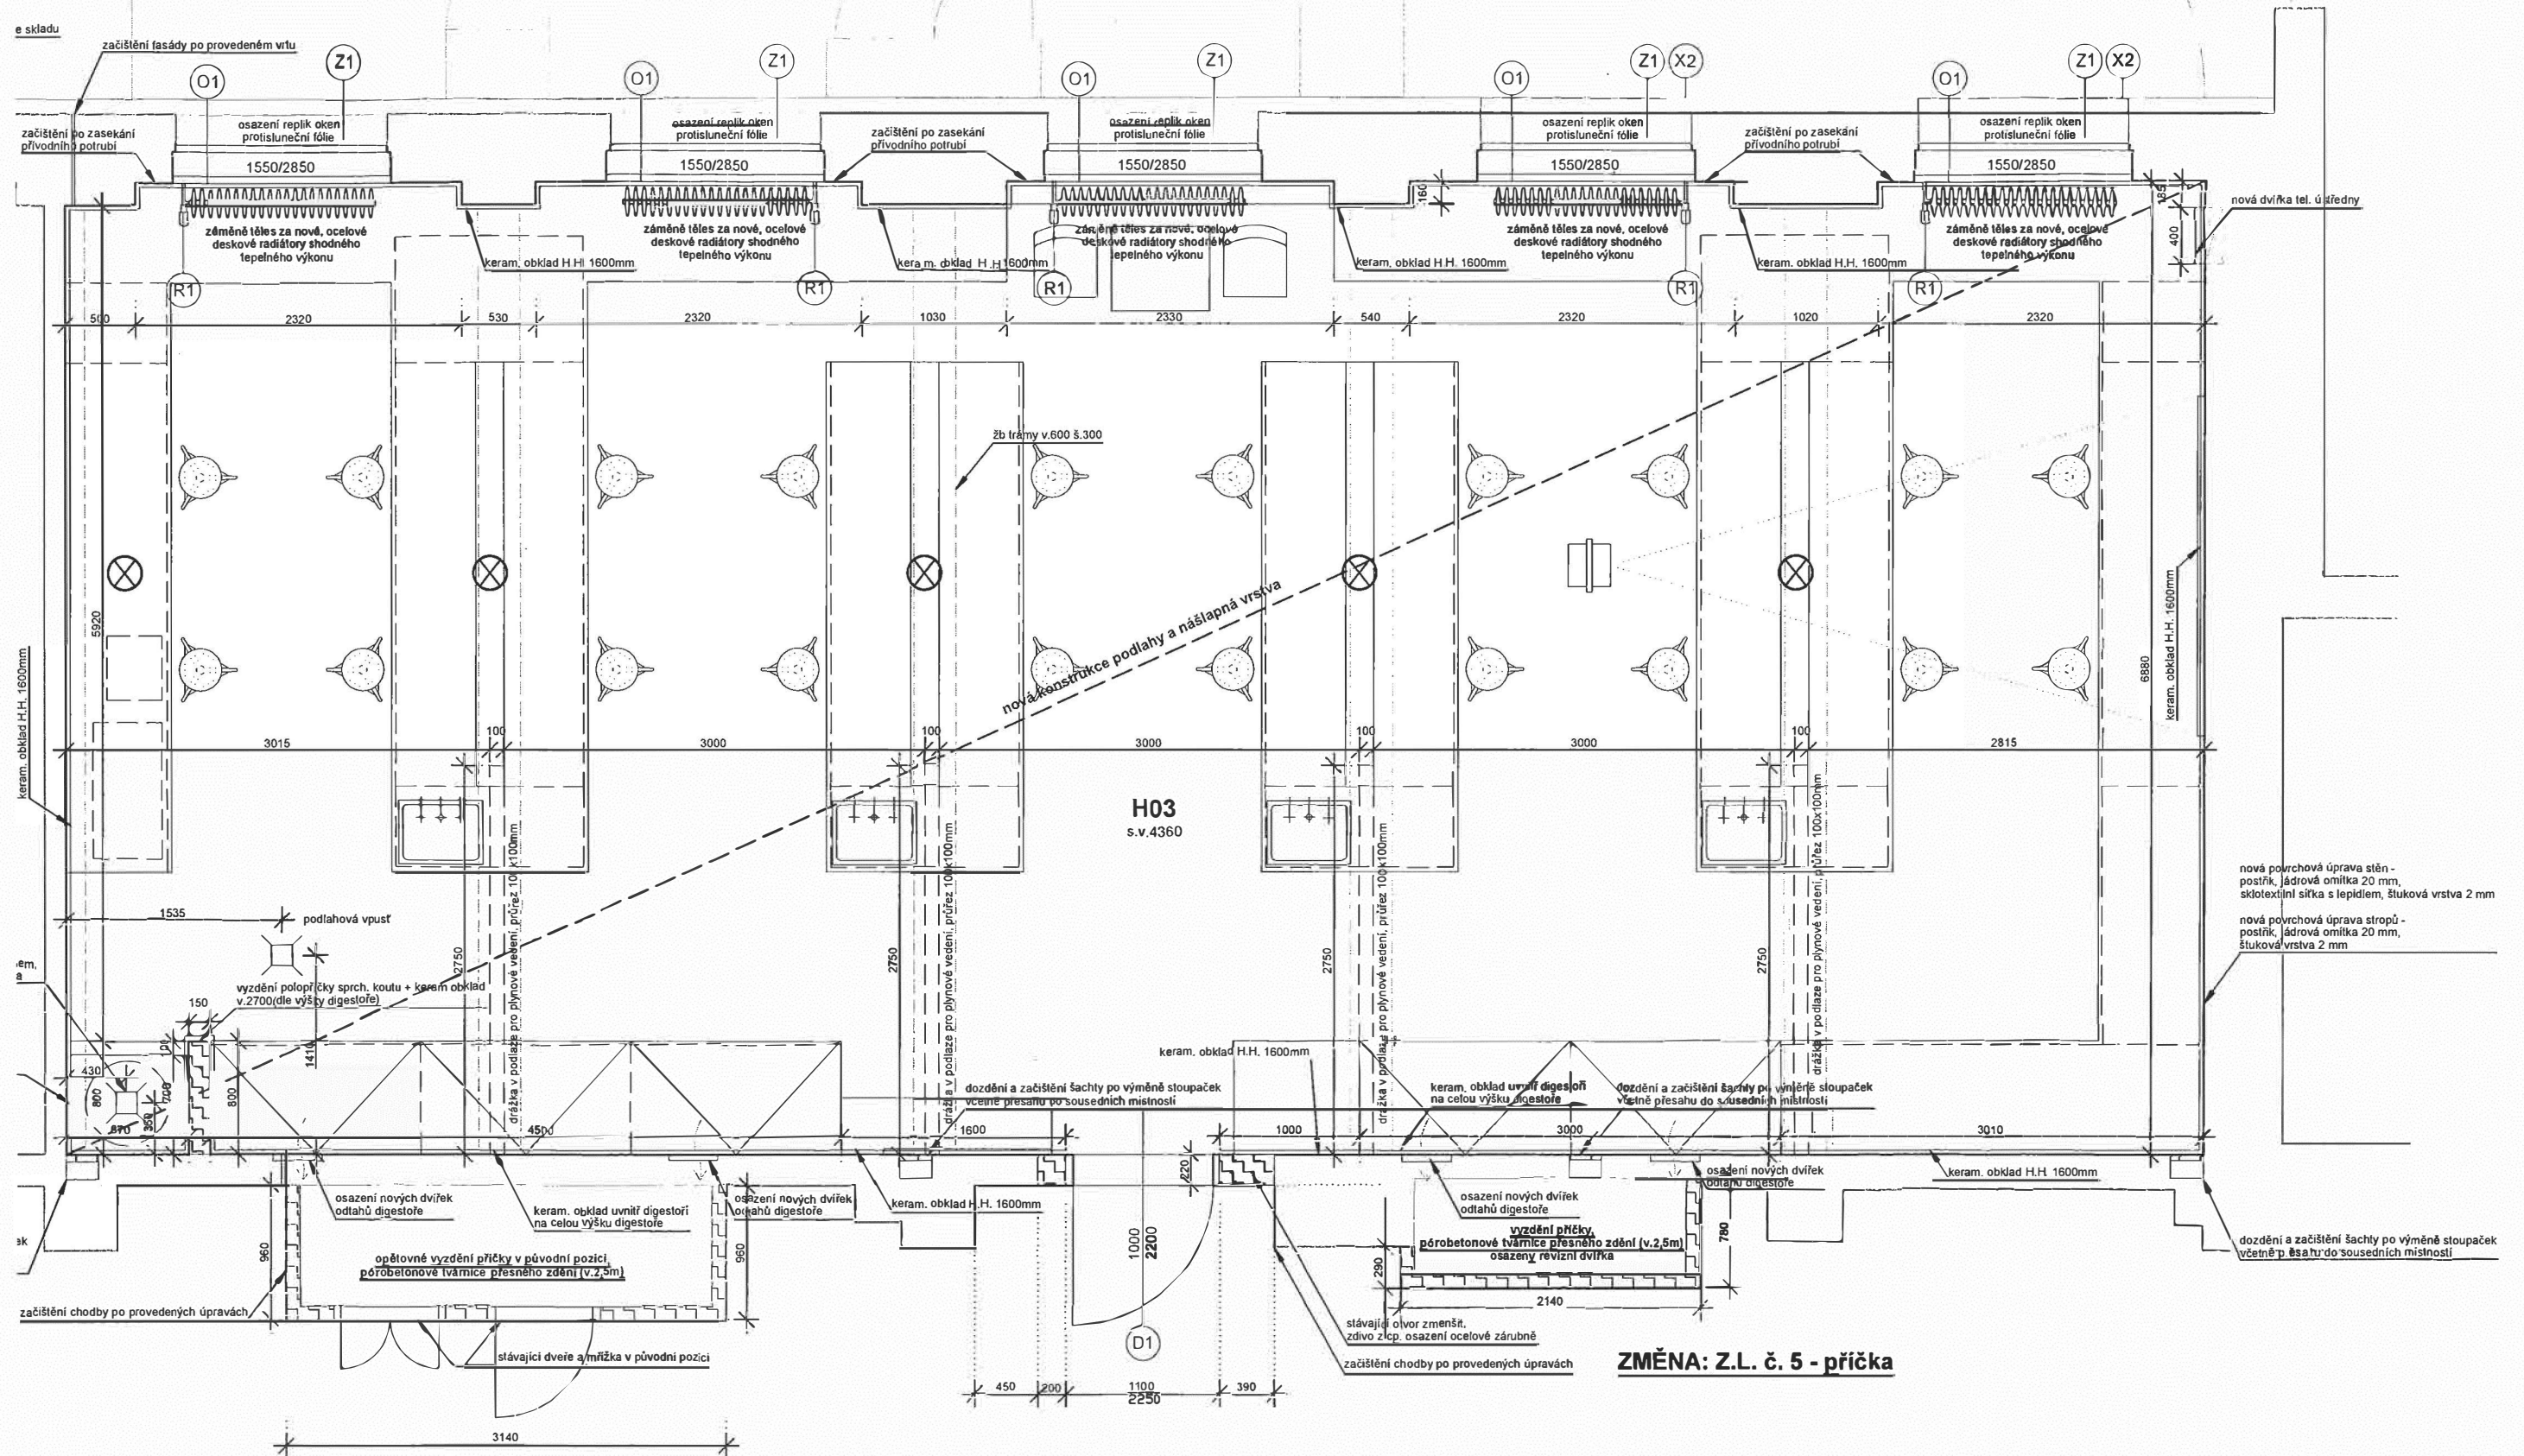

Technický list změny (TLZ) č. 10

TLZ č./verze:	ZL č. 10
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	1862995011
Ze dne:	17.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002477
Stavba:	INFRASTRUKTURA_Rekonstrukce laboratoří-opakování
Objekt:	budova A, budova B Praha 6 Technická 3 - 5
Název změny:	A 076,078 - zasekání rozvaděče
Důvod změny a identifikace původce změny:	
V laboratoři A 076 je z důvodu prostorové kolize s nábytkem nutno zasekat rozvaděč NN - silový	
Popis změny:	
Zasekání 1 ks rozvaděče NN - silového	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
souhlasí	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	



Konstrukce zámečnické, nátěry

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet VCP - 3xA4;
- 2) Půdorys laboratoře s vyznačením změn - 2xA4;

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	bez dopadu
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	2 499,00 Kč + DPH
	Celkem:	2 499,00 Kč + DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	
Za objednavatele:	xxxxx	26.02.2019		
Za TDI:	xxxxx	26.02.2019		
Za projektanta:	xxxxx	26.02.2019		
Za zhotovitele:	xxxxx	26.02.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	200-06a	Praha 6 - VŠCHT 2016
	ZL č.10	A S076, S078
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 499,00 CZK
Základní DPH	21 %	524,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		2 499,00 CZK
Cena celkem s DPH		3 023,79 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
22	A S076, S078	0	2 499	525	3 024
1	VRN	0	49	10	59
3	Elektroinstalace - silnoproud	0	2 450	515	2 965
Celkem za stavbu		0	2 499	525	3 024

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Položkový rozpočet

S:	200-06a	Praha 6 - VŠCHT 2016
O:	22	A S076, S078
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00	4,90	4,90
2	005122 R	Provozní vlivy	kpl	1,00	2,45	2,45
	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	4,90	4,90
3	005124010R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	36,75	36,75
Celkem						49,00

**VŠCHT - REKONSTRUKCE LABORATORÍ
22 S076 (A)**

D 1.4 - Elektro silnoproud - ZL č. 10

Číselné zařídění	Popis	Měrná jednotka	Množství	Kč/MJ	Celkem
500	Rozvaděče				
502	Zaskání rozvaděče, přesunutí, osazení	hod	7	350,00	2 450,00
					2 450,00

