

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR HAVÍŘOV CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008965	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 - Kanalizace dešťová a OLK SO 10.2 Kanalizace SŽDC	

Číslo smlouvy o dílo: **980/OUR/19** ze dne **6. 1. 2020**
 Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří**
 Projektant/ autorský dozor: **DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
 Technický dozor objednatele/investora: **ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava**

Přílohy: PZ-3.1 Změnový rozpočet dle § 222 odst. 6 PZ-3.2 Situace neprováděné větve D5 dešťové kanal. SO 04 PZ-3.3 Situace neprováděné větve Kp5 kanaliz.SŽDC SO 10.2 PZ-3.4 Tabulka evidence změn	Počet paré: 5 Rozdělovník: 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
 V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že není potřeba realizovat uvedené stavební práce a dodávky:

SO 04 - Kanalizace dešťová a OLK
 Projektová dokumentace stavby navrhovala odvodnění zastřešení ocelové konstrukce přes kanalizační šachtu SD14 a stoku D5 z potrubí DN200 délky 25,5m do "SO 10.1 - Kanalizace SmVaK".
 V rámci velké kumulace inženýrských sítí v daném území a pro zjednodušení vedení tras inženýrských sítí bude odvodnění ze zastřešení svedeno do uliční vpusti "Vp2" a odtud do "SO 10.1 - Kanalizace SmVaK".

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
7 451 721,73	-109 961,54	0,00	7 341 760,19

SO 10.2 Kanalizace SŽDC
 V projektové dokumentaci stavby je navržena přeložka kanalizace ve správě Správy Železnic, která odvádí odpadní vodu z nádražní budovy a části kolejíště a poté do jednotné kanalizace.
 Projektová dokumentace pro "Přednádražní prostor Havířov" navrhovala provedení větve kanalizace "Kp5" z kameninového potrubí DN 300 z výpravní budovy s napojením do "SO -10.1 Kanalizace SmVaK" a do kanalizačního řadu. Při provádění zemních prací pro větev kanalizace "Kp5" před budovou bylo zjištěno, že z výpravní budovy nádraží pro tuto větev neexistuje napojení (domovní kanalizace). Odkanalizování výpravní budovy nádraží v rámci projektu Správy Železnic "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov" je svedena k šachtě S13 pro napojení na větev kanalizace "Kp11" stavby "Přednádražní prostor Havířov".
 V rámci koordinace staveb "Přednádražní prostor Havířov" a "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov" je navržena větev kanalizace "Kp5" nadbytečná a neexistuje pro ni ze strany Správy Železnic budoucí využití. Větev kanalizace Kp5 (od šachty S8 po výpravní budovu) nebude realizována.

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
2 334 268,83	-448 830,64	0,00	1 885 438,19

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):
 AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:
 TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Finanční vliv: **ANO**


Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
9 785 990,56 Kč	-558 792,18 Kč	0,00 Kč	-5,71%	9 227 198,38 Kč

Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
11 164 910,04 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová Ing. Lenka Krejčová	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno Ing. Ladislav Čech st.	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Radim Žvak	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno Ing. Miroslav Janíček	datum	podpis

PZ-3.1 (RP-rekapitulace)

Stavba:	18007	Přednádražní prostor Havířov
Objednatel:	Město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov	IČO: 00 29 74 88 DIČ: CZ 00 29 74 88
Projektant:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	OHL ZS, a.s., Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSC 602 00	IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
Vypracoval:		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 0
Snížená DPH	15 %	0,00 0
Základ pro základní DPH	21 %	-117 346,36 0
Základní DPH	21 %	-676 138,54 0
Cena celkem bez DPH		-558 792,18 0
Cena celkem s DPH		-676 138,54 CZK
v _____ dne _____		
 _____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
05	SO 04 Kanalizace dešťová a OLK	-109 961,54	-109 961,54	-23 091,92	-133 053,46	19,68
12	SO 10.2 Kanalizace SŽDC	-448 830,64	-448 830,64	-94 254,43	-543 085,07	80,32
Celkem za stavbu			-558 792,18	-117 346,36	-676 138,54	100,00

Položkový rozpočet

S:	18007	Přednádražní prostor Havířov
O:	05	SO 04 Kanalizace dešťová a OLK
R:	5	SO 04 Kanalizace dešťová a OLK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	82 726,22
---------------	--------------------	------------------

13	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	42,68000	219,81	9 381,49
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

25,50*1,00*1,50 38,25000
 Přípojka; průměrná hloubka 1,45 m
 2,00*1,00*1,20 2,40000
 rozšíření pro revizní šachty a OLK 5%
 40,65*0,05 2,03000

14	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	42,68000	27,48	1 172,85
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

15	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	76,50000	87,92	6 725,88
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

Stoka D5; průměrná hloubka 1,50 m

25,50*1,50*2 76,50000

17	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	76,50000	54,95	4 203,68
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

19	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,34000	87,92	1 876,21
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

=42,6825*0,5 21,34000

20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,68000	252,78	10 788,65
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,68000	16,49	703,79
----	-----------	-----------------------------	----	----------	-------	--------

22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	76,83000	164,86	12 666,19
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

=42,6825*1,80 76,83000

23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,26000	98,91	2 003,92
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

42,6825 42,68000

Obsyp a lože potrubí kanalizace

25,50*1,20*0,70*-1 -21,42000

retenční nádrž

2,00*0,50*-1 -1,00000

24	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	33,43000	456,09	15 247,09
----	-----------	-----------------------------------	---	----------	--------	-----------

=20,2625*1,65 33,43000

25	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	17,36000	395,66	6 868,66
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Kanalizace

25,50*1,20*0,60 18,36000

zemina vytlačen potrubím

25,50*0,30*0,30*pi/4*-1 -1,80000

svody

2,00*1,00*0,40 0,80000

26	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	28,99000	382,47	11 087,81
----	-----------	-------------------------	---	----------	--------	-----------

=17,35843 * 1,67 28,99000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	3 762,04
---------------	-----------------------------	-----------------

39	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,26000	1 154,00	3 762,04
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

kanalizace

25,50*1,20*0,10 3,06000

svody

2,00*1,00*0,10 0,20000

Díl: 8	Trubní vedení	21 969,23
---------------	----------------------	------------------

48	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	2,00000	549,52	1 099,04
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

vpustě + sřešní svody

0+2 2,00000

52	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	25,50000	150,57	3 839,54
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

53	28611168	trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN 8	m	25,88000	185,74	4 806,95
----	----------	--	---	----------	--------	----------

25,5 * 1,015			25,88000			
62	28611366	koleno kanalizační PVC 200x45°	kus	1,00000	130,79	130,79
67	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo	m	25,50000	32,97	840,74
77	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,00000	4 033,51	4 033,51
78	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,00000	1 890,36	1 890,36
79	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	1,00000	1 395,79	1 395,79
80	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	85,84	85,84
81	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,00000	3 846,67	3 846,67
Díl: 99		Přesun hmot				1 504,05
106	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,61000	934,19	1 504,05

Celkem	109 961,54
---------------	-------------------

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Položkový rozpočet

S:	18007	Přednádražní prostor Havířov
O:	12	SO 10.2 Kanalizace SŽDC
R:	12	SO 10.2 Kanalizace SŽDC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	259 808,56
---------------	--------------------	-------------------

6	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 počet křížení 5 ks, přípojky 1 ks 5*1,20+1*1,00	m	7,00000	274,76	1 923,32
7	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů počet křížení 4 ks 4*1,20	m	4,80000	219,81	1 055,09
8	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (7+4,8)*1,50*2,00	m3	35,40000	384,67	13 617,32
10	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 stoky C, průměrná hloubka 2,80; šířka rýhy 1,20 m 30,2*2,80*1,20 kanalizační přípojky, průměrná hloubka 2,00 m, šířka rýhy 1,00 m 3*2,00*1,00 Rozšíření v místě šachet 3% =107,472*0,03	m3	110,69000	219,81	24 330,77
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	110,69000	27,48	3 041,76
12	131233101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3 při překopech inženýrských sítí ručně kopané sondy v místě podzemních vedení 0,60*1,50*2,00*(4+1)	m3	9,00000	1 044,10	9 396,90
13	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 3	m3	9,00000	208,82	1 879,38
14	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m pažení pro přípojky 3*2,00*2	m2	12,00000	87,92	1 055,04
15	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m stoka C 30,2*2,80*2	m2	169,12000	164,86	27 881,12
16	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,00000	54,95	659,40
17	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	169,12000	87,92	14 869,03
18	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (110,69616+9)*0,50	m3	59,84000	87,92	5 261,13
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	110,69000	252,78	27 980,22
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	110,69000	16,49	1 825,28
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 110,69616*1,80	t	199,25000	164,86	32 848,36
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 110,69616+9 obsyp a lože kanalizace 30,2*1,20*0,75*-1 přípojky 3*1,00*0,55*-1	m3	90,87000	98,91	8 987,95
23	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál (90,86616-9)*1,65	t	135,08000	456,10	61 609,99

24	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m kanalizace 30,2*1,20*0,60 vytlačená zeminy potrubím 30,2*0,30*0,30*pi/4*-1 přípojky 3*1,00*0,45 vytlačená zeminy potrubím 3*0,20*0,20*pi/4*-1	m3	20,87000	395,66	8 257,42
				21,74000		
				-2,13000		
				1,35000		
				-0,09000		
25	583373310	šterkopísek frakce 0-22 =20,86617 * 1,67	t	34,85000	382,47	13 329,08
				34,85000		

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 231,11

26	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 kanalizační šachty do hloubky 2,00 m, 1 ks 1,00*pi*0,15*2,00*1 potrubí DN300 30,2*0,30*pi*0,06	m3	2,65000	3 297,14	8 737,42
				0,94000		
				1,71000		

27	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	30,20000	49,46	1 493,69
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 35 454,72

28	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného podklad pod potrubí kanalizace 30,2*0,05 přípojky 3*1,00*0,10	m3	1,81000	1 154,00	2 088,74
				1,51000		
				0,30000		

29	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,00000	153,87	153,87
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

30	59224013	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	1,00000	222,01	222,01
----	----------	--	-----	---------	--------	--------

34	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop podkladní desky šachty 2,00*2,00*0,15*1 podkladní deska potrubí 30,2*1,20*0,08	m3	3,50000	2 747,62	9 616,67
				0,60000		
				2,90000		

35	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop kanalizace 30,2*1,2*0,23	m3	8,34000	2 802,57	23 373,43
				8,34000		

Díl: 8 Trubní vedení 93 088,22

36	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,00000	549,52	549,52
43	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	30,20000	582,50	17 591,50
44	59710707.1	trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 30,2 * 1,015	m	30,65000	1 244,12	38 132,28
				30,65000		0,00

45	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dřívků trub pomocí převlečné manžety DN 300	kus	1,00000	3 934,59	3 934,59
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

46	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrováním těsněním otevřený výkop DN 300	kus	1,00000	717,68	717,68
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

47	59711773	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 L60cm spojovací systém F/F tř.160/160 1 * 1,015	kus	1,02000	1 999,17	2 039,15
				1,02000		

50	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	3,00000	150,57	451,71
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

51	28611107	troubka kanalizační PVC-U 200x6,9x6000 mm SN 12 3 * 1,015	m	3,05000	368,18	1 122,95
				3,05000		

60	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	30,20000	32,97	995,69
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

61	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina	kus	1,00000	13 408,39	13 408,39
----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

62	59224034	dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100 x 78.5 x 15 cm	kus	1,00000	7 913,16	7 913,16
----	----------	---	-----	---------	----------	----------

63	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm	kus	1,00000	753,95	753,95
----	----------	--	-----	---------	--------	--------

64	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	1,00000	1 085,86	1 085,86
----	----------	---	-----	---------	----------	----------

66	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,00000	1 489,21	1 489,21	
67	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,00000	572,60	572,60	
68	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU- B-1, bez odvětrání	kus	1,00000	2 329,98	2 329,98	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				39 850,50	
70	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	13,59000	153,87	2 091,09	
		30,2*0,3*1,5		13,59000			
71	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	122,31000	14,29	1 747,81	
72	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,59000	175,85	2 389,80	
73	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,09000	164,86	1 004,00	
74	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	41,22000	791,31	32 617,80	
		2,6489*2,3		6,09000			
Díl: 99		Přesun hmot				10 397,53	
76	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,13000	934,19	10 397,53	


Celkem	448 830,64
---------------	-------------------

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

PZ-3.2 SO 04 Kanalizace dešťová a OLK

Neprovedená větev
kanalizace "D5" délky 25,5 m
SO 04 - Kanalizace dešťová a OLK


Nádraží HAVÍŘOV

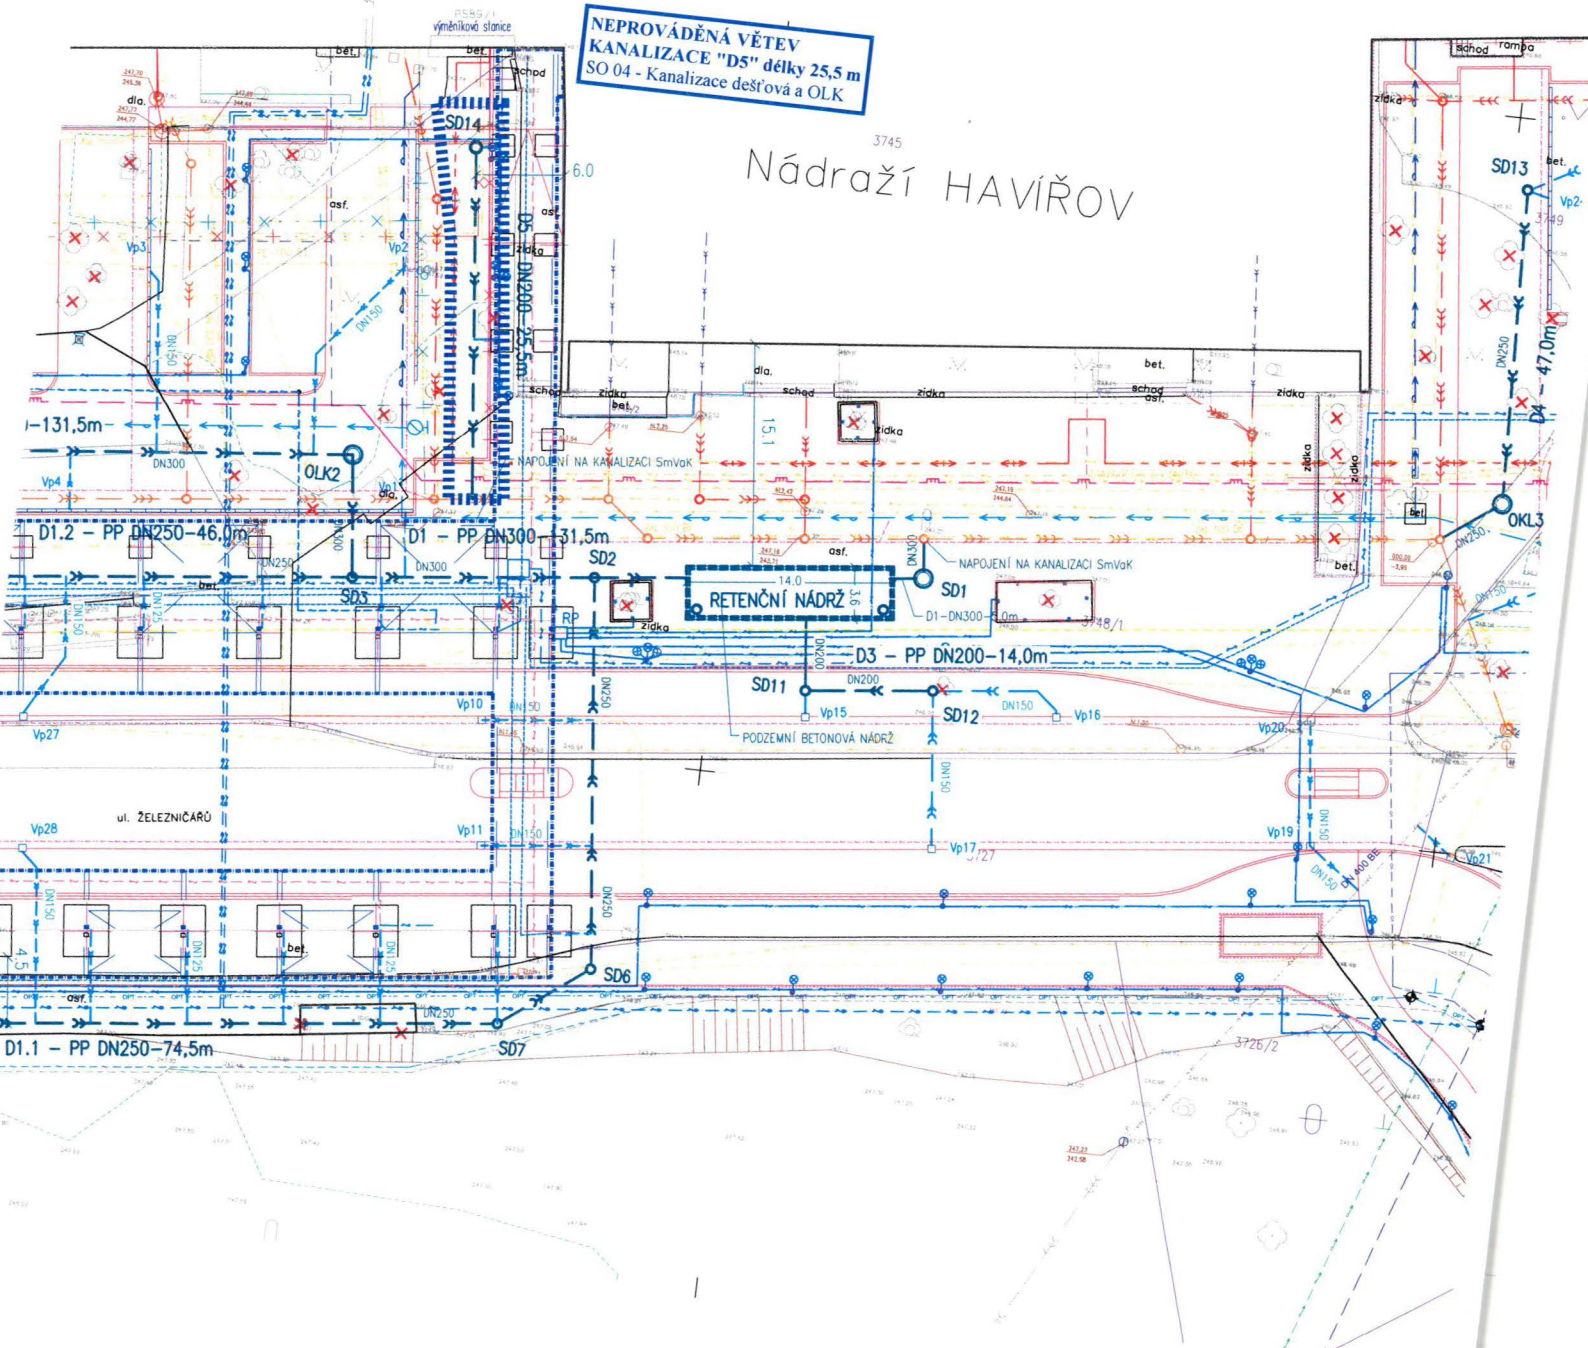

PZ-3.3 SO 10.2 Kanalizace SŽDC

NEPROVÁDĚNÁ PŘÍPOJKA
KANALIZACE "Kp5" délky 33,2m
SO 10.2 - Kanalizace SŽDC

3745
Nádraží HAVÍŘOV

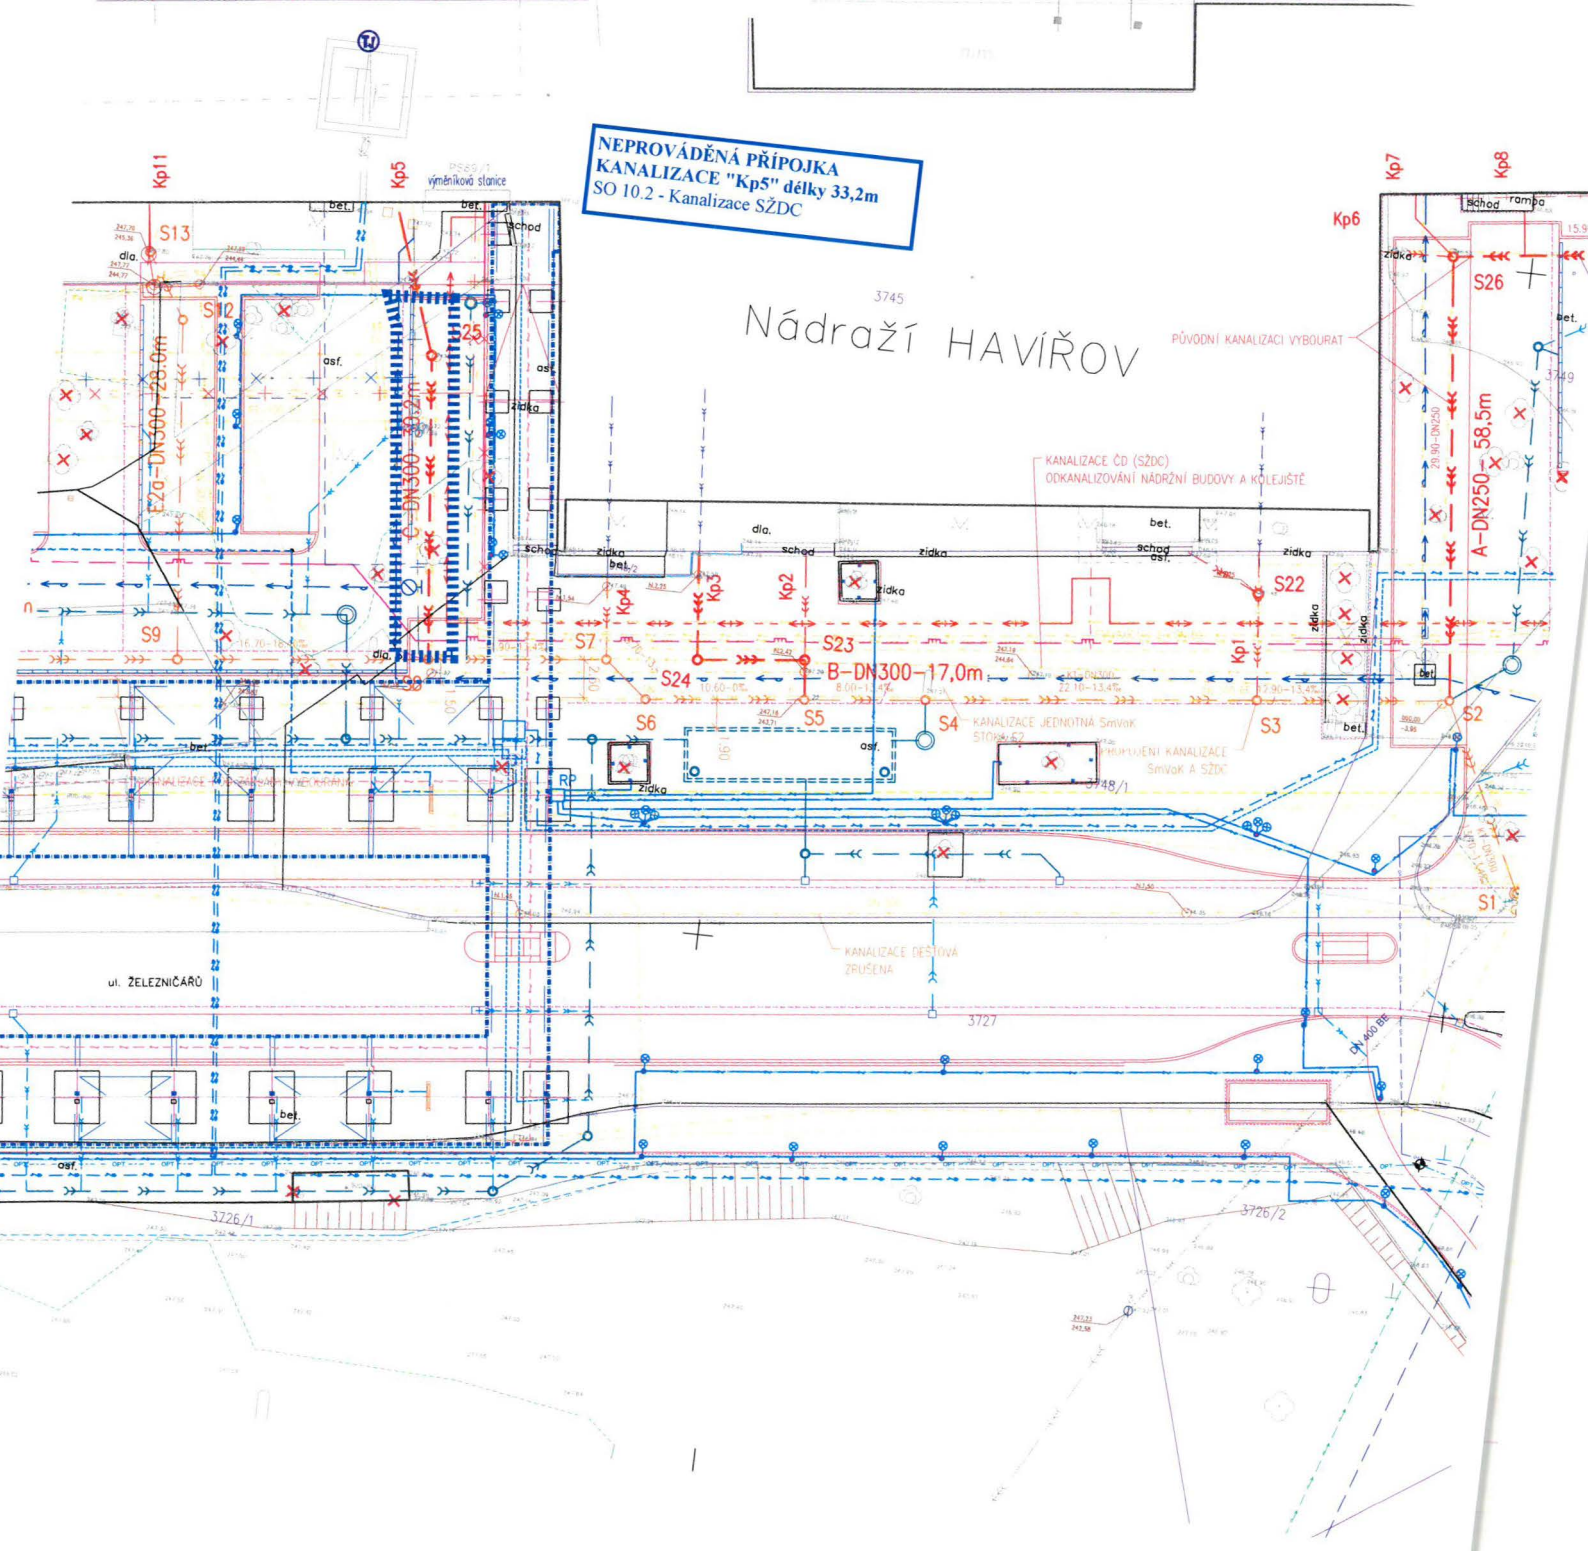

PZ-3.5 TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Stavba: Přednádražní prostor Havířov

AKTUALIZACE K: 30. 04. 2020

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)	
			Odpočet	Přípočet	Rozdíl							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SO 01 Příprava území	Změna způsobu sanace zemních plání ve SO komunikací a zpevněných ploch	0,00	1 937 542,50	1 937 542,50	1 937 542,50			1 937 542,50		1 937 542,50	
	SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy		996 060,33	4 566 455,28	3 570 394,95	5 562 515,61			5 562 515,61		3 570 394,95	
	ZL-1 Celkem		996 060,33	6 503 997,78	5 507 937,45	7 500 058,11						
2	SO 11 Přeložka Horkovodu	Vybourání sekundárního ŽB kanálu		835 080,26	835 080,26	835 080,26			835 080,26		835 080,26	
3	SO 04 - Kanalizace dešťová a OLK	Nepotřebnost realizací SO 04 a SO 10.2	109 961,54		-109 961,54	109 961,54			109 961,54		-109 961,54	
	SO 10.2 Kanalizace SŽDC		448 830,64		-448 830,64	448 830,64			448 830,64		-448 830,64	
	ZL-3 Celkem		558 792,18	0,00	-558 792,18	558 792,18						
4					0,00	0,00			0,00		0,00	
CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn			v Kč	1 554 852,51	7 339 078,04	5 784 225,53	8 893 930,55	0,00	0,00	8 893 930,55	0,00	5 784 225,53
			v % z původní hodnoty závazku	1,69%	7,98%	6,29%						
			LIMITY podle § 222 ZVZ	Kč	původní hodnota závazku	91 995 275,52	13 799 291,33	45 997 637,76	45 997 637,76		27 598 582,66	
			REZERVA (zbývající do vyčerpání LIMITU dle ZVZ)	Kč			13 799 291,33	45 997 637,76	37 103 707,21		21 814 357,13	
						% čerpání	0,00%	0,00%	19,34%		20,96%	
			NOVÁ CENA vč. změn	Kč		97 779 501,05						
