


## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2

STAVBA:	<b>Rekonstrukce Smetanovy ulice v České Třebové</b>
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/4167/2020/RMI/PKR/SML/8 ze dne 24.02.2020
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	RYDO spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová
Věc: Položení chrániček ČEZ Distribuce	
<b>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</b>  A) Během realizace bylo zjištěno, že ČEZ Distribuce předpokládá v roce 2021 zahájit akci IE-12-2006559 Česká Třebová, UNIFIKACE 35 kV, DTS-1.etapa. Z tohoto důvodu je dohodnuto s ČEZ Distribuce na založení chráničky do komunikace pro kabely nn vedoucí od trafostanice.  B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Založení chráničky do komunikace ul. Smetanova 2x PE110 pro kabely, 1x PE65 pro zemnicí pásek.  C) V souvislosti s uložením chrániček bude plněno v hodnotě <b>20.774,- Kč bez DPH.</b>	
<b>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</b> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<b>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</b> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**


<b>CENA:</b> Cena za provedení díla se navyšuje o 20.774,- Kč bez DPH	<b>TERMÍN:</b> beze změny	<b>JINÁ UJEDNÁNÍ:</b> nejsou
---	---------------------------	------------------------------

**Zhotovitel datum, podpis:**





24. 6. 2020

**Objednatel datum, podpis:**



24. 6. 2020

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její do



## Položkový rozpočet

Zakázka: **CN - Smetanova ulice, výkop kabelu pro NN - 1**  
**Česká Třebová, ul. Smetanova**

Zhotovitel: **Rydo, spol. s r.o.**  
**Podbranská 2194**  
**560 02 Česká Třebová**

IČO: **25918516**  
DIČ: **CZ25918516**

Objednatel: **MÚ česká Třebová**

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:


### Rozpis ceny

HSV	19 331,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 443,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	20 774,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 363,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem: 25 137,00 CZK**



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Místo

16.6.2020



\_\_\_\_\_  
Datum

Popis: Výkop rýhy, položení chrániček,  
zásyp a hutnění.


## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		13,59575
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
Celkem:			20 774,00	13,59575

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	132 20-0010.RA0 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	8,00000		
2	161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,00000		
3	162 70-1100.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	8,00000		
4	199 00-0005.R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m3	1,60000		
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
5	451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,00000		
6	174 10-0050.RA0 Zásyp jam,rýh a šachet - hutnění	m3	7,00000		
7	388 99-6141.R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm	m	16,00000		
8	388 99-6111.R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm	m	10,00000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>					
9	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	sou	1,00000		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					
10	x01 VRN	-	1,00000		

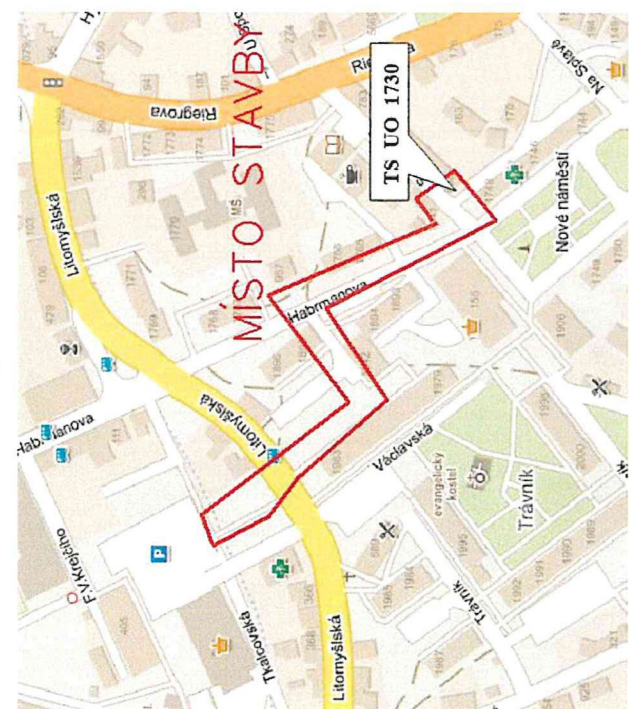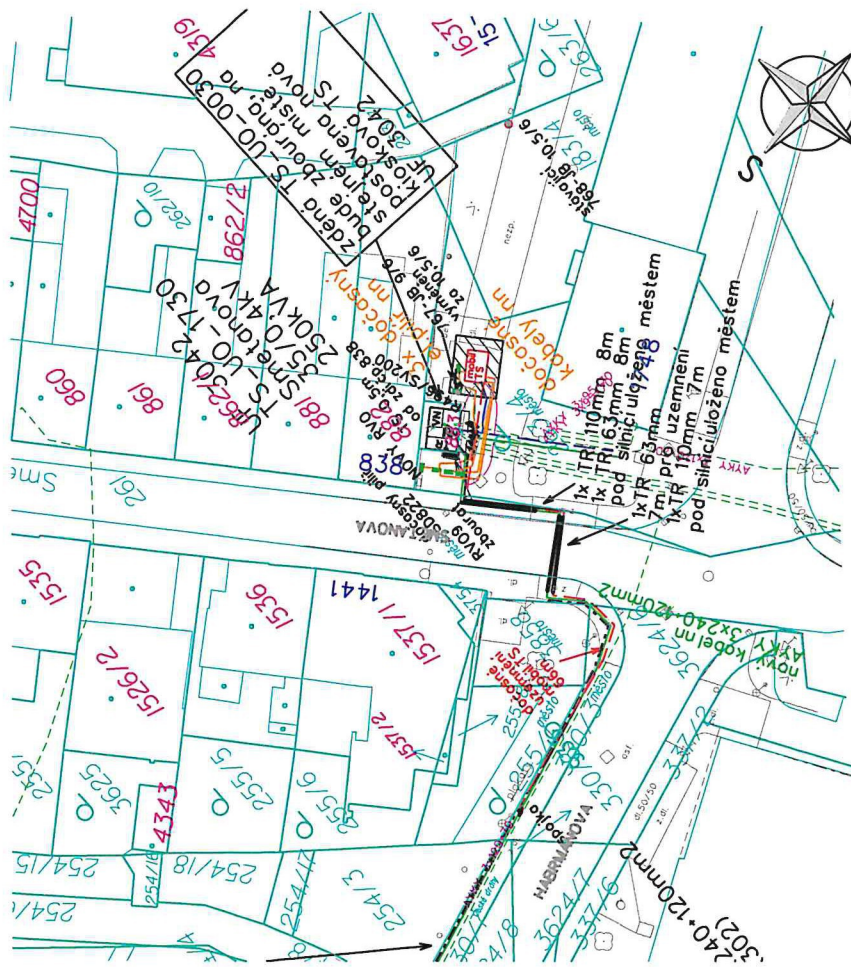

# DETAIL UMÍSTĚNÍ TRAFOSTANICE TS\_UO\_1730 Smetanova

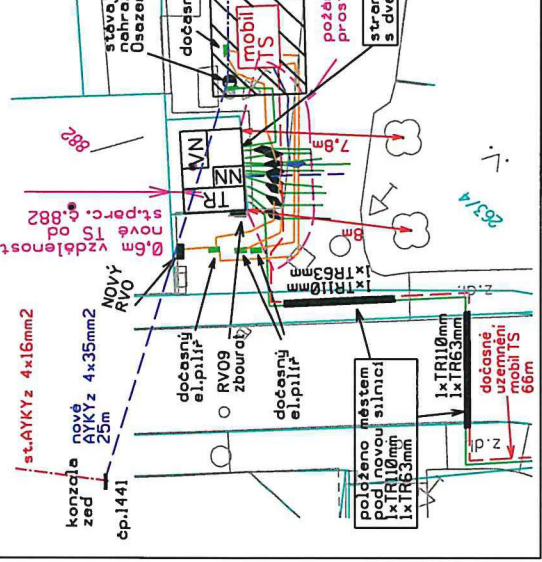

## LEGENDA:

- projektované kabelové vedení nn
  - stávající kabelové vedení nn
  - projektované dočasné kabelové vedení nn
  - stávající kabelové vedení nn
  - zemnicí pásek
  - projektovaná trasa dočasných kabelů nn
  - přípojují mobilní trafostanice
  - projektovaná / stávající kabelová skříně
  - polohopis
  - trubka
- hranice parcel
  - 520/10 číslo pozemkové parcely
  - 92 číslo popisné
  - 303 číslo stavební parcely
  - TS projektovaná kabelová spojka
  - TS stávající trafostanice
  - TS dočasná mobilní trafostanice
  - TS postavená pouze po dobu výstavby
  - TS vyměněný betonový sloup

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:** TN-C, 400/230V, 50Hz stř.

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA VN:** IT, 35kV

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:** dle PNE 330000-1

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:** dle PNE 330000-1

živých částí: izolací čl. 3.2.2.4

krýty nebo přeprážkami čl. 3.2.2.3

polohou čl. 3.2.2.1

neživých částí: ochrana automatickým odpojením od zdroje nadprodávými ochranným přístrojem dle čl. 3.3.2.5.

Návrzová oblast NI  
VETROVÁ OBLAST : II.

VNEJŠÍ VLIVY: dle PNE 330000-2

Kabelové skříně, spojky nejsou kresleny v měřítku.

Kreslí:	Projektovával:	Kontroloval:	Schválil:
Milan Šura	Milan Šura	Milan Dunda	Ing. Miroslav Mergl
Místo stavby:	K.ú. Česká Třebová	Investor:	ČEZ Distribuce, a.s.
Název stavby:	Česká Třebová, UNIFIKACE 35kV, DTS - 1.et.		
Část stavby:	TS_UO_1730 (původní TS_UO_0030 ), TS_UO_0512		
Obsah výkresu:	Celková situace u TS_UO_1730, TS_UO_0512		
Měřítko:	1 : 500		Č. výkresu: 1730-1
Období:	2020		projektující
Stupeň detailu:	DUP, DPS		
Č. listu, MONTÁŽNÍ A.S.:	2514_6130		
Č. listu, ČEZ Distribuce, a.s.:	IE-12-2006559		

