



2020004805

SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
uzavřená mezi

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Jednající: MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
Kontaktní osoba: [REDACTED]
IČO: 00346292
DIČ: CZ00346292
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

Jméno: **Moravia Containers, a.s. – divize PEGAS CONTAINER**
Sídlo: Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Jednající: Tomáš Flajsar, statutární ředitel
Kontaktní osoba: [REDACTED]
IČO: 056 61 986
DIČ: CZ 056 61 986
Zápis v OR: MS Praha, oddíl B, vložka 22132
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v

a) provedení stavby provozní budovy pro leteckou záchrannou službu, umístěné na pozemku p.č. 2251/3, k.ú. Tuřany, a

b) v provedení a vybavení této budovy nábytkem,

to vše způsobem a v rozsahu dle projektové dokumentace, které je pod označením „technická specifikace“ jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z přílohy č. 1 k této smlouvě. Součástí díla je rovněž ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a sutí, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.

2. Místem splnění závazku zhotovitele k provedení díla podle č. 1 této smlouvy se rozumí areál Letiště Brno – Tuřany 9041, Brno 627 00. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz v místě plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do **31. 10. 2020**.

4. Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat při jeho předání dokumenty potřebné k řádnému užívání díla. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: 3.549.548,- Kč bez DPH, tj. 4.294.953,- Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy.
7. V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.
8. Cena díla podle čl. 6 této smlouvy je splatná po splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jejího písemného vyúčtování (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: podatelna@zssjmk.cz. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P20V00001273**.
9. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 5 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
10. Zhotovitel se zavazuje vést o provádění díla podle čl. 1 této smlouvy nejméně ve dvojitě vyhotovení průběžnou písemnou dokumentaci (tzv. stavební deník), obsahující záznamy o všech skutečnostech důležitých pro plnění závazku zhotovitele podle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich objemu, rozsahu a jakosti, a změny a odchylky od přílohy č. 1 k této smlouvě. Objednatel je oprávněn nahlížet do této dokumentace a připojovat k ní svoje průběžná stanoviska a vyjádření. Bude-li to zhotovitel v zápise do této dokumentace výslovně požadovat, je objednatel povinen připojit k této dokumentaci v určitém konkrétním případě svoje písemné stanovisko ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad provedení všech předepsaných a obvyklých měření a zkoušek. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen alespoň tři dny předem vyzvat objednatele nebo jeho zástupce k provedení kontroly. Kontrolu je přitom třeba provést tak, aby nedošlo k narušení dohodnuté lhůty plnění. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole ve smyslu tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen na svůj náklad zakryté práce a konstrukce znovu odkryt. Nevyužije-li objednatel výzvy zhotovitele k provedení kontroly podle tohoto článku této smlouvy, má se po marném uplynutí příslušné lhůty zato, že kontrola byla provedena.
12. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v době:

- a) do 60 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy, a to pro rám kontejnerů, a
- b) do 24 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy, a to pro jednotlivá příslušenství a vnitřní vybavení kontejnerů.
13. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě nastoupit k odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
14. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výrok se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
15. Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 13 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
16. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 12 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 13 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý dne tohoto prodlení.
17. Zhotovitel je oprávněn provedení části díla zadat i jiné osobě, aniž tím je nějak dotčena jeho odpovědnost za dílo jako celek. Objednateli se vyhrazuje právo zakázat zhotoviteli zadání části díla osobě, s níž objednatel nesouhlasí, a s níž zhotovitel dosud neuzavřel příslušnou obchodně právní smlouvu, a zhotovitel se zavazuje tento zákaz respektovat. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje seznámit objednatele předem na jeho žádost s okruhem osob, s nimiž zhotovitel hodlá v tomto smyslu uzavřít příslušnou kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo. Pro případ porušení své povinnosti podle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.
18. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny.
19. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
20. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.
21. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
22. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
23. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 27 této smlouvy. Objednatel přitom

předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

24. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.
25. Zhotovitel uděluje objednateli z opatrnosti svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
26. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
27. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 29.6.2020

Ve Zlíně dne 29.6.2020

Zdravotní
Jihomoravský územní
Kamenice

MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka
za objednatele

Tomáš Flajsar
Statutární ředitel
za zhotovitele

Příloha č. 1 Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem zakázky je výstavba provozní budovy pro výjezdovou základnu letecké záchranné služby zadavatele na letišti Brno - Tuřany na již postavených základech s předpřipravenými přípojkami pitné vody a elektřiny. Součástí stavby je vybudování jímky splaškových vod dle dále uvedené specifikace.

Provozní budova bude postavena kombinací stavebních a montážních technologií jako dvoupodlažní z deseti obytných kontejnerů na půdorysné ploše 7 200 x 15 010 mm.

Budova bude vybavena elektrickými rozvody, strukturovanou kabeláží, nábytkem, definovaným vybavením pro provádění hygienické očisty zdravotnického materiálu a sociálním zařízením.

Nedílnou součástí této specifikace jsou přílohy:

Příloha č. 1 Provozní budova LZS – názvy místností

V půdorysném schématu udává požadavek zadavatele na finální podobu sestavy kontejnerů.

Příloha č. 2 Provozní budova LZS – vybavení nábytkem

Dodání a instalace nábytku jsou součástí této zakázky.

Příloha č. 3 Provozní budova LZS – elektrické zásuvky

Definuje požadavky zadavatele na počty a umístění zásuvek 230 V v jednotlivých místnostech budovy.

Příloha č. 4 Provozní budova LZS – strukturovaná kabeláž

Definuje požadavky zadavatele na instalaci strukturované kabeláže v jednotlivých místnostech.

Příloha č. 5 Provozní budova LZS – základy

Základy jsou již vybudovány a jejich výstavba tedy není součástí této zakázky. Příloha slouží jako informace uchazeči o podobě základů.

Příloha č. 6 Provozní budova LZS – pohledy

Udává požadavek zadavatele na podobu dokončené provozní budovy při pohledu z boků, v tomto smyslu doplňuje přílohu č. 1.

Příloha č. 7 Provozní budova LZS – řez pláštěm stavby

Udává požadavek zadavatele na konstrukci stěn, podlah a stropů provozní budovy.

Příloha č. 8 Projektová dokumentace – vnější kanalizace

Projektová dokumentace k vybudování jímky splaškových vod a k napojení provozní budovy k této jímce.

Požadavky zadavatele na obytné kontejnery, ze kterých bude provozní budova smontována, jsou uvedeny v následujícím textu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

S ohledem na skutečnost, že stavba bude prováděna v neveřejném prostoru mezinárodního letiště, je **naprosto nezbytné, aby uchazeč zahrnul do kalkulace svých nákladů i poplatek za služby ostrahy letiště**. Tato nutnost vyplývá z platné legislativy k zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy, v jejichž důsledku budou zaměstnanci zhotovitele stavby po celou dobu pobytu na letišti pracovat v doprovodu pracovníků zajišťujících ostrahu letiště. Poplatek zahrnuje použití nezbytného počtu zaměstnanců ostrahy s jejich vozidlem.

Zadavatel garantuje stejnou výši tohoto poplatku pro všechny uchazeče, a to v **kalkulační výši 550,- Kč za hodinu (Pětsetpadesát korun za hodinu) bez DPH**; (t.j. při uvažované době výstavby 100 pracovních hodin v neveřejném prostoru letiště 55 000,- Kč). (Padesátpěttisíc korun českých).

Fakturovaná celková cena za služby ostrahy letiště Brno – Tuřany bude samozřejmě závislá na skutečné době trvání výstavby v neveřejném prostoru letiště.

TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST STAVBY NA STRANĚ ZADAVATELE

- veřejnoprávní povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon;
- inženýrské sítě a napojení na ně,
- základy v souladu s výkresem základů,
- jeřáb pro vykládku a montáž kontejnerů,
- přistavení kontejneru na odpad,
- stavební proud 380V, 230V;
- zaizolování přívodu vody a svodu odpadu mezi připojovacím bodem v zemi a bodem v kontejneru
- ke staveništi vede obslužná dvousměrná komunikace se zpevněným povrchem,
- základy pro výstavbu provozní budovy jsou v přímém sousedství zpevněné plochy (asfaltový povrch), umožňující vybudovat potřebná zařízení staveniště (viz situační výkres v příloze č. 8).

1) ROZMĚRY A POČET OBYTNÝCH KONTEJNERŮ:

KONTEJNEROVÁ SESTAVA 10 ks kontejnerů o půdorysu 7 200 x 15 010 mm (šířka x délka), venkovní výška kontejneru 2 500 mm, venkovní výška sestavy nesmí přesáhnout 6000 mm (měřeno od spodní hrany podlahy kontejneru v 1. NP).

2) TECHNICKÝ POPIS RÁMU OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Ocelová konstrukce svařovaná z dutých a válcovaných profilů, samonosná, opatřená antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, v barvě RAL 7047; 8 ks kontejnerových rohů. Provedení dvakrát stohovatelné, kontejnery v patře standardní zatížení podlahy 250kg/1m² a stropu 125kg/1m².

3) SKLADBA PODLAHY OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Slepá podlaha: 0,5 mm pozinkovaný profilový plech volně vložený mezi příčné nosníky
Izolace: minerální vata, třída hořlavosti A1, EN 13501-1
Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie
Podlahová deska: 22 mm cementotřísková deska, třída A2-S1, EN 13501-1, třída D-S2, EN 13501-1, přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-profilem

Podlahovina - PVC: 1,4 mm PVC podlahová krytina Fatra LINO DOMO 3100 41 šedé, třída Bn-S1, EN 14041, položena v pásech, které jsou celoplošně přilepeny, spoje jsou homogenně svařeny,

Spoje mezi podlahou a stěnami jsou obloženy tvrzenými podlahovými lištami šedé barvy, cca. 60 mm vysokými,

V místnostech č. 1.07, 1.08, 1.09, 2.02, 2.05, 2.06, 2.09 a 2.11 spoje mezi podlahou a stěnami řešeny vytažením PVC tzv. „do vany“.

Podlahovina v místnosti 1.04 (s vanou):

keramická dlažba 200 x 200 mm Rako Taurus, včetně zatížení 5 000 kN, protiskluzná, barva šedá, spárovka šedá

Povolené zatížení podlahy: 2 500 N/m² ... 250kg/1m² plošně

Instalace obdélníkové akrylové vany 1900 x 900 mm s obezdívkou, barva bílá.

SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Profilový plech:	0,55 mm pozinkovaný profilový plech, trapézová vlna hloubky 10 mm, lakovaný v barvě RAL 7047, nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu.
Izolace:	minerální vata 160 mm, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1, EN 13501-1
Parozábrana:	0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie

Odvětrání přes obvodové stěny, z vnější strany pozinkovaný plech s prolisem, z vnitřní strany plastová mřížka se sítkou proti hmyzu – vždy 1 ks na jeden kontejner. Začištění otvoru PVC trubkou o průměru 100mm.

5) SKLADBA STŘECHY SESTAVY OBYTNÝCH KONTEJNERŮ:

Profilový plech:	0,75 mm pozinkovaný profilový plech, trapézová vlna hloubky 35 mm, odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován k rámové konstrukci
Izolace:	minerální vata 160 mm, třída hořlavosti A1, EN 13501-1
Parozábrana:	0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie

Povolené zatížení střechy: **1 250 N/m²**

ODVODNĚNÍ STŘECHY KONTEJNERŮ

Integrovaná spádovaná střecha: odvodnění zajištěno spádováním konstrukce střechy (směrem na kratší stěnu kontejneru) a to do kontejnerového žlabu a venkovním svodem v jednom místě – navýšení venkovní výšky o cca 1 cm na 1 m délky kontejneru– pozice viz. půdorys, odvětrávací komínky.

6) IZOLACE OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Izolace - podlaha:	160 mm Isover MULTIPLAT 0,035, $k = 0,287 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolace - venkovní stěny:	160 mm Isover MULTIPLAT 0,035, $k = 0,491 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolace - příčka:	60 mm Isover MULTIPLAT 0,035, $k = 0,698 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolace - stropu:	160 mm Isover MULTIPLAT 0,035, $k = 0,210 \text{ W/m}^2\text{K}$

7) VNITŘNÍ OBLOŽENÍ OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Strop:	10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska , omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, V 20, emisní třída E1, třída D-S2, EN 13501-1 , přínýtovaná k profilovým nosníkům, hlavičky nýtů opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, spoje opatřeny speciálními plastovými lištami
Stěny:	10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska , omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, V 20, emisní třída E1, třída D-S2, EN 13501-1 , přínýtovaná k pozinkovanému U-profilu, hlavičky nýtů opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, spoje včetně rohových opatřeny speciálními plastovými lištami
Příčka:	10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska , omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, V 20, emisní třída E1, třída D-S2, EN 13501-1 , oboustranně přínýtovaná k pozinkovanému U-profilu, hlavičky nýtů opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, spoje včetně rohových opatřeny speciálními plastovými lištami
Stěny v místnosti 1.04 (s vanou):	keramický obklad 200 x 200 mm, vč. sádkokartonu a zhuštěného rámečku, barva bílo-šedý melír

8) POŽÁRNÍ ODOLNOST OBYTNÉHO KONTEJNERU:

- bez požární odolnosti

9) VÝBAVA OBYTNÉHO KONTEJNERU / SESTAVY OBYTNÝCH KONTEJNERŮ:

VÝBAVA – 1.NP (kromě nábytku, jehož potřeba je specifikována v příloze č. 2)

Venkovní dveře

- 1 ks **ZK ocelové dveře** 875/2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, vč. rohové zárubně s třístranným těsněním, síla dvevního plátu 40 mm, standardně lakované v barvě kontejneru, kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči, vč. gumového dorazu
- 1 ks **ZK ocelové dveře** 1000/2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, vč. rohové zárubně s třístranným těsněním, síla dvevního plátu 40 mm, standardně lakované v barvě kontejneru, kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči, vč. gumového dorazu

Vnitřní dveře

- 5 ks **vnitřní dveře** 800/1970 mm s obložkovou zárubní, dvevní křídlo s voštinovou výplní, fólie v **barvě bílé**, plast. kování, dozický zámek s klíčkem
- 2 ks **vnitřní dveře** 1000/1970 mm s obložkovou zárubní, dvevní křídlo s voštinovou výplní, fólie v **barvě bílé**, plast. kování, dozický zámek s klíčkem – místnost 1.04 (s vanou)
- 2 ks **vnitřní dveře** 700/1970 mm s obložkovou zárubní, dvevní křídlo s voštinovou výplní, fólie v **barvě bílé**, zámek s ukazatelem volno/obsazeno – místnost 1.05 a 1.06

Okna

- 2 ks **plastové okno** 1800/1200 mm, 2-křl., +850mm, bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou
- 3 ks **plastové okno** 900/1200 mm, 1-křl., +850mm, bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou
- 5 ks **plastové okno** 600/600 mm, +1600mm, bílé, sklopné, zasklené dvojitým izolačním sklem – z vnitřní strany ornament

Elektroinstalace dle ČSN, 400/230 V,

včetně podružných rozvodů, rozvodné skříně s odpovídajícími jističi a FI - proudovým chráničem 4p/25A 003 připojení přes podlahu a rozvody kabelkanálem pod stropem, celá sestava odjištěna v obou podlažích

- 3 ks dvou-zásuvka 2 x 240 V, bílá
- 10 ks samostatně jištěná zásuvka na topení, bílá
- 4 ks samostatně jištěná zásuvka na bojler
- 14 ks zářivka 1 x 36 W s krytem + 2x do vlhka
- 6 ks vypínač, bílý
- 4 ks schodišťový vypínač
- 3 ks zásuvka u umyvadla 230V, bílá, 1400 mm nad podlahou, do vlhka IP54
- 2 ks světlo 60 W
- 2 ks dvou-zásuvka nad minikuchyňkou 2x230 V, bílá, 1100 mm nad podlahou, do vlhka IP54
- +kabelkanál, umístěný na podlaze a nebo pod okny, k propojení PC a telefonů
- +kabelkanál podstropní k propojení sestavy
- + další zásuvky 240V, požadované zadavatelem v příloze č. 3 pro zapojení spotřebičů, nezbytných k provozu výjezdové základny

Kuchyňka, místnost 1.03

- 6 ks horní skřínky s policemi – provedení lamino tl. 18mm, ABS hrana, odstín 112 Egger
- 5 ks spodní skřínky s policemi - provedení lamino tl. 18mm, ABS hrana, odstín 112 Egger, pracovní deska beton šedý
- 1 ks nerezový dřez s odkládací plochou a pákovou baterií
- 1 ks varná deska Gorenje, čtyři plotýnky
- 1 ks lednice vestavná,
- 1 ks myčka
- 1 ks odsavač par

Sanitární vybavení

- 3 ks **porcelánové umyvadlo** se směšovací baterií (teplá/studená voda), zrcadlo s poličkou a háčkem na ručník (místnosti č. 1.04, 1.05, 1.06)
- 2 ks **WC- porcelánový záchod s nádržíkou**, držák toal. papíru, háček na šaty (místnosti 1.05, 1.06)
- 2 ks **výlevka porcelánová s roštem** (místnosti č. 1.04 a 1.09)
- 2 ks **podlahová výpust'**, vč. sifónu, nepřipojená na odpadové vedení, provedení přímo přes podlahu
- 1 ks příprava pro vanu – voda/odpad, (místnost č. 1.04)
- 1 ks akrylová vana obdélníková 1900 x 900 mm, bílá, obezděná
- 5 ks 3/4" přívod a 100 mm odpad, přes podlahu, veškerá instalace vedena na stěně, odpadová roura: plastová, barva šedá

Odvětrání

- 2 ks **el. ventilátor** k odvětrání vnitřních sanitárních místností, extra jištění v rozvaděči, spouštění přes vypínač – odvětrání přes stěnu (místnosti 1.05 a 1.06)

Zabezpečení teplé vody

- 3 ks bojler 5 l (místnosti 1.03, 1.05 a 1.06)
- 1 ks bojler 100 l (1x vana + umyvadlo, místnost č. 1.04)

Topení

- 2ks hlídač mrazu 0,5 kW (místnosti 1.05 a 1.06)
- 4ks el. přímotop 2 kW (místnosti 1.02 2x, 1.03, 1.10) + 1x do vlhka (místnost č. 1.04)
- 3ks el. přímotop 1 kW (místnosti 1.07, 1.08, 1.09)

Ostatní

- 1 ks **ocelové venkovní schody**, jednoramenné, s podestou 1400/1130 mm z roštu (oka na podestě i nášlapech 30x10mm), po obou stranách zábradlí, vše pozinkováno, šířka schodů 1130 mm, výška šprušlového zábradlí 1100 mm, spodní hrana schodiště v rovině spodní hrany kontejneru

VÝBAVA 2.NP (kromě nábytku, jehož potřeba je specifikována v příloze č. 2)

Venkovní dveře

- 1ks **ZK ocelové dveře** 875/2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, vč. rohové zárubně s třístranným těsněním, síla dveřního plátu 40 mm, standardně lakované v barvě kontejneru, kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči, vč. gumového dorazu

Vnitřní dveře

- 6 ks **vnitřní dveře** 800/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v **barvě bílé**, plast. kování, dozický zámek s klíčkem
- 5 ks **vnitřní dveře** 700/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v **barvě bílé**, zámek s ukazatelem volno/obsazeno

Okna

- 6 ks **plastové okno** 1800/1200 mm, 2-křl., bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou
- 2 ks **plastové okno** 900/1200 mm, 1-křl., bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou

Elektroinstalace dle ČSN, 400/230 V,

včetně podružných rozvodů, rozvodné skříně s odpovídajícími jističi a FI - proudovým chráničem 4p/25A 003 připojení přes podlahu a rozvody kabelkanálem pod stropem, celá sestava odjištěna v obou podlažích

- 10 ks zásuvka 230 V, bílá
- 11 ks samostatně jištěná zásuvka na topení, bílá
- 5 ks samostatně jištěná zásuvka na bojler
- 12 ks zářivka 1 x 36 W s krytem + 5x do vlhka

- 1 ks vypínač, bílý
- 4 ks schodišťový vypínač
- 5 ks skupinový vypínač
- 5 ks zásuvka u umyvadla 230V, bílá, 1400 mm nad podlahou, do vlhka **IP54**
- + kabelkanál, umístěný na podlaze a nebo pod okny, k propojení PC + tel.
- + kabelkanál podstropní k projení sestavy
- + další zásuvky 230V, požadované zadavatelem v příloze č. 3 pro zapojení spotřebičů, nezbytných k provozu výjezdové základny

Sanitární vybavení

- 5 ks **porcelánové umyvadlo se směšovací baterií** (teplá/studená voda), zrcadlo s poličkou a háčkem na ručník
- 5 ks **WC- porcelánový záchod s nádržkou**, držák toal. papíru, háček na šaty
- 5 ks **podlahová výpust'**, vč. sifónu, nepřipojená na odpadové vedení, provedení přímo přes podlahu
- 5 ks **sprchovací plastová kabina se závěsem**, velikost 80/80 cm, vč. směšovací baterie na teplou a studenou vodu, hadice a sprchová růžice
- 5ks **3/4" přívod a 100 mm odpad**, přes podlahu, veškerá instalace vedena na stěně, odpadová roura: plastová, barva šedá

Odvětrání

- 5 ks **el. ventilátor** k odvětrání vnitřních sanitárních místností, extra jištění v rozvaděči, spouštění přes vypínač – odvětrání přes střechu
- + plastové větrací mřížky

Zabezpečení teplé vody

- 5 ks bojler 80 l

Topení



- 6 ks el. přímotop 2 kW
- 5 ks el. přímotop 2kW do vlhka

10. PŘIPOJENÍ BUDOVY K INŽENÝRSKÝM SÍTÍM

Přípojný bod budovy k elektrické síti řešit umístěním přípojové skříně ve vrchní části západní stěny budovy nad místností 1.07 (elektrická přípojka bude vedena vzduchem ze sousedního objektu).

Přívod vnějšího vodovodu bude zaveden k severní stěně technické místnosti č. 1.09. V této místnosti bude provedeno připojení budovy k vodovodu.

Připojení provozní budovy k jímce splaškových vod dle projektové dokumentace v příloze č. 8.

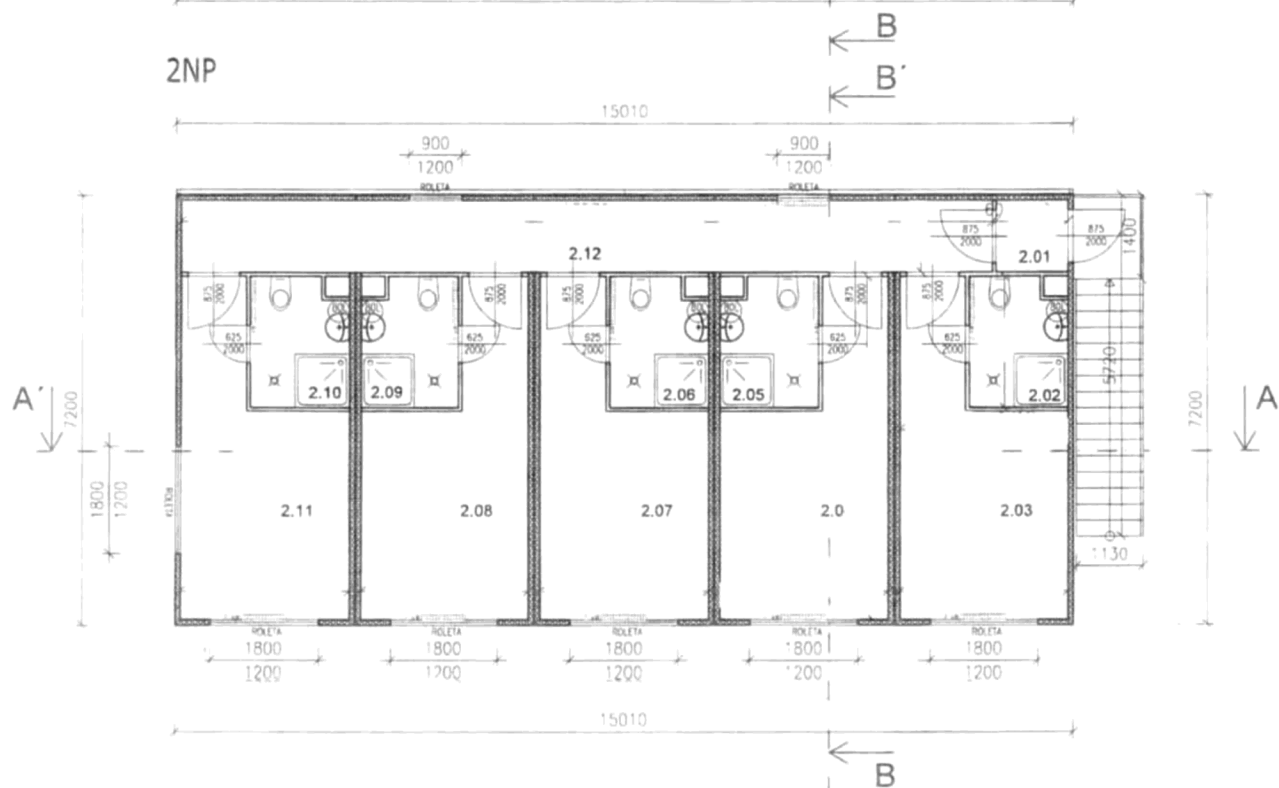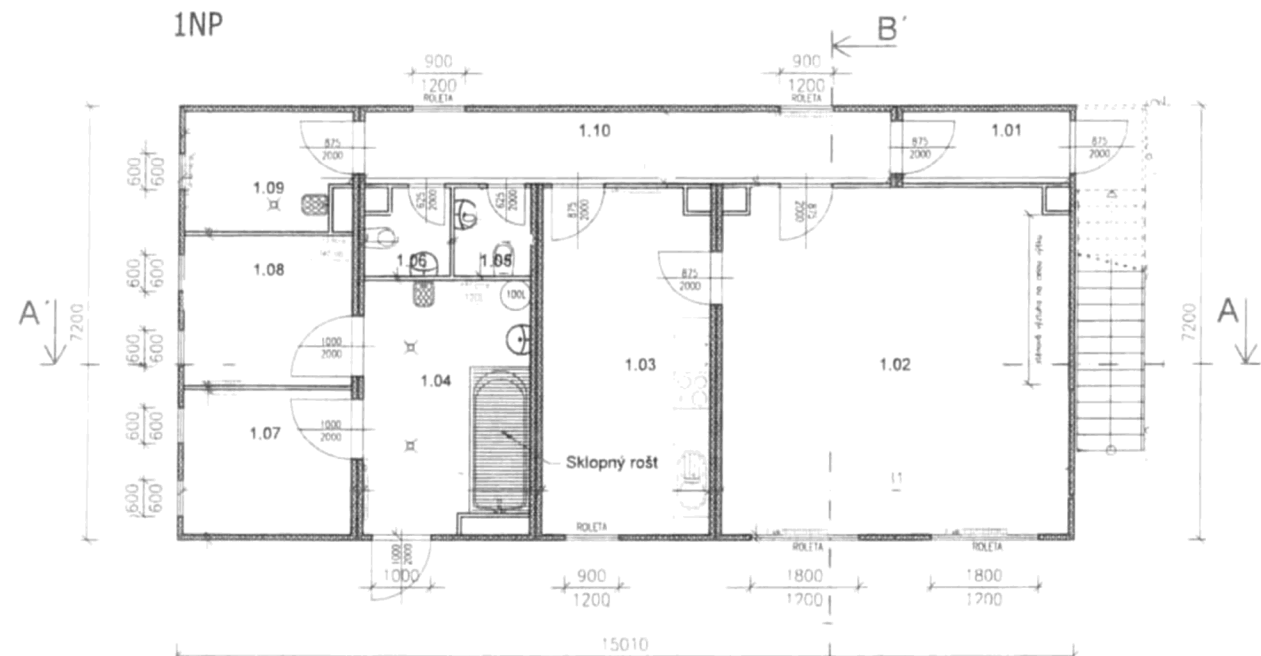


PROVOZNÍ BUDOVA

NÁZVY MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍSTNOSTI ROOM NUMBER	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA/ SQUARE [m ²]
1.01	ZÁOBERÍ	
1.02	KANCELÁŘ	
1.03	KUCHYŇKA	
1.04	HYGIENICKÁ OČISTA	
1.05	WC MUŽI	
1.06	WC ŽENY	
1.07	SKLAD STROJOPRŮMYŠLOVÝCH MATERIÁLŮ	
1.08	SKLAD LÉČIV	
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	
1.10	CHODBA	
Σ	CELKEM	


ČÍSLO MÍSTNOSTI ROOM NUMBER	NÁZEV MÍSTNOSTI / ROOM NAME:	PLOCHA/ SQUARE [m ²]
2.01	ZÁOBERÍ / ENTRANCE	
2.02	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1. PÍLOT	
2.03	MÍSTNOST 1. PÍLOTA	
2.04	MÍSTNOST 2. PÍLOTA	
2.05	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2. PÍLOT	
2.06	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ LÉKAŘ	
2.07	ZÁSTUPNÍ LÉKAŘ	
2.08	ZÁSTUPNÍ ZACHRANÁŘ	
2.09	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZACHRANÁŘ	
2.10	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STŘEDNÍ ÚPRAVY	
2.11	MÍSTNOST STŘEDNÍ ÚPRAVY	
2.12	CHODBA	
Σ	CELKEM	

PROVOZNÍ BUDOVA LZs VYBAVENÍ NÁBYTKEM

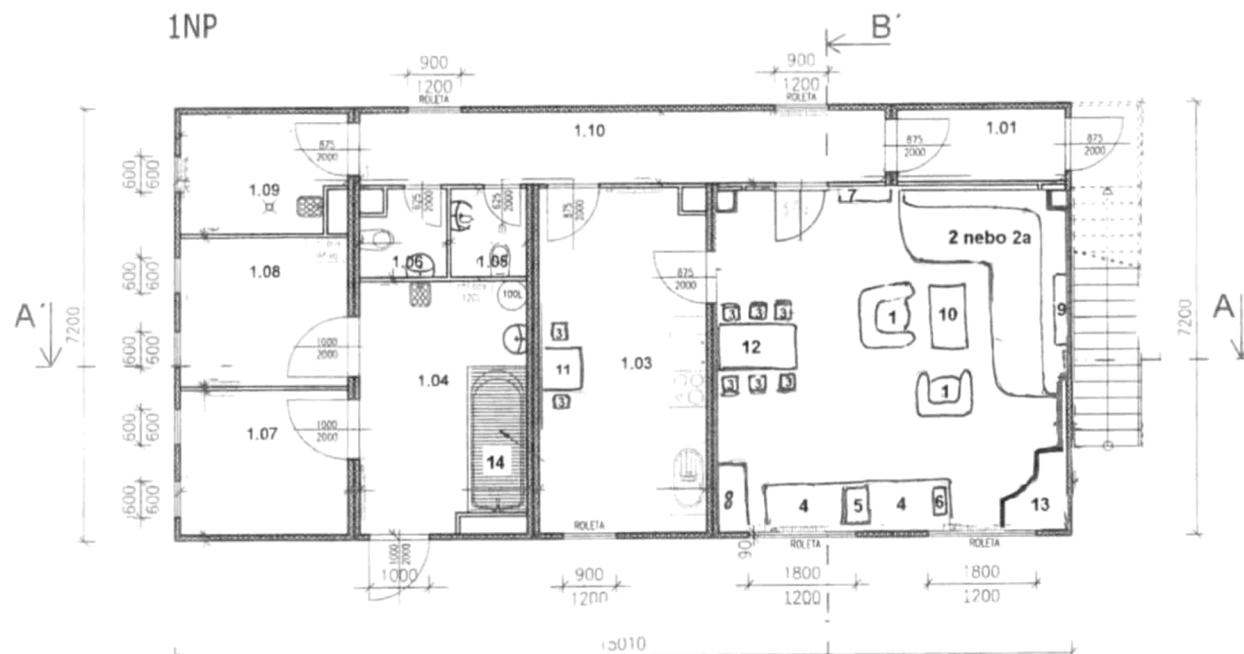

1. NP
- | | |
|--|----------------------|
| 1 konferenční křeslo | 2 ks, variantně 3 ks |
| 2 sedací souprava rohová 3+1+1 | 1 ks |
| 2a variantně sedací souprava 2+1+1+1 | |
| 3 židle jednací s omyvatelným potahem | 8 ks |
| 3a kancelářská židle s omyvatelným potahem | 2 ks |
| 4 stůl pracovní | 2 ks |
| 5 kontejner 4zásuvkový | 1 ks |
| 6 vozík na PC | 1 ks |
| 7 věšáková stěna | 1 ks |
| 8 skříň policová | 1 ks |
| 9 police 120 cm | 1 ks |
| 10 stůl konferenční | 10 ks |
| 11 stůl jídelní (rozměr dle možnosti) | 1 ks |
| 12 stůl jednací | 1 ks |
| 13 stůl manipulační rohový | 1 ks |
| 14 akrylová bílá obdélníková vana 1900 x 900mm | |

Poznámka: konferenční křesla (bod 1) jsou součástí sedací soupravy.

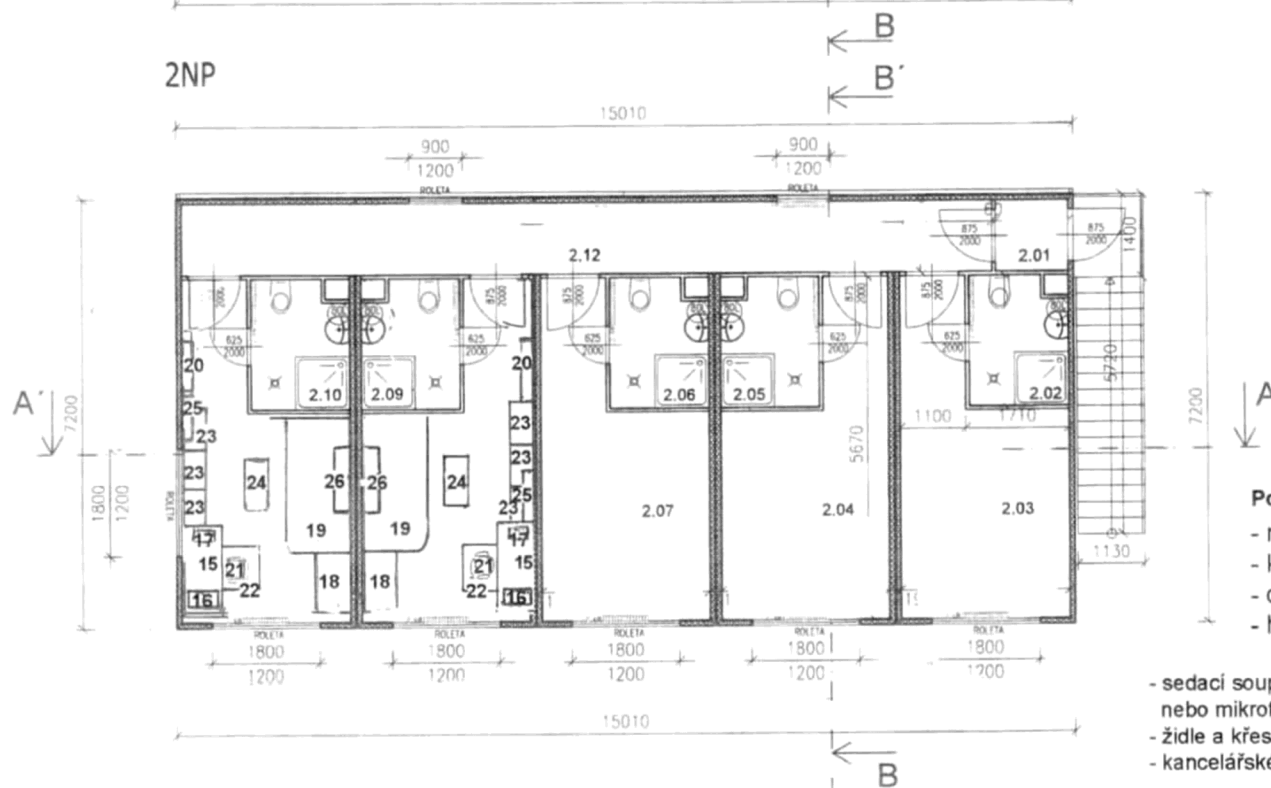

2. NP
- | | |
|--|-------|
| 15 stůl pracovní | 5 ks |
| 16 kontejner 4zásuvkový | 5 ks |
| 17 vozík na PC | 5 ks |
| 18 skříň šatní | 5 ks |
| 19 pohovka s úložným prostorem | 5 ks |
| 20 věšáková stěna | 5 ks |
| 21 kancelářská židle s textilním potahem | 5 ks |
| 22 podložka pod židli | 5 ks |
| 23 skříňka policová nízká | 15 ks |
| 24 konferenční stůl | 5 ks |
| 25 police na stěnu 80 cm | 5 ks |
| 26 police na stěnu 120 cm | 5 ks |


Poznámka: nábytek v místnostech č. 2.03, 2.04 a 2.07 je totožný jako v místnostech 2.08 a 2.11, jen přiměřeně "otočený" podle umístění sociálního zařízení

Povrchová úprava nábytku:

- materiál: laminovaná dřevotřísková deska, hrany ABS,
- korpus světle šedý (možný vzor KRONOSPAN 112),
- dvíčka reprodukcce dřeviny (možný vzor EGGER H3157),
- hliníkové úchytky matné, hranaté,

- sedací souprava v místnosti 1.02 s textilním potahem (mikrovlákno, mikroplýš nebo mikrofáze),
- židle a křesla v 1. NP s omyvatelným potahem,
- kancelářské židle a pohovky ve 2. NP s textilním potahem.


1NP


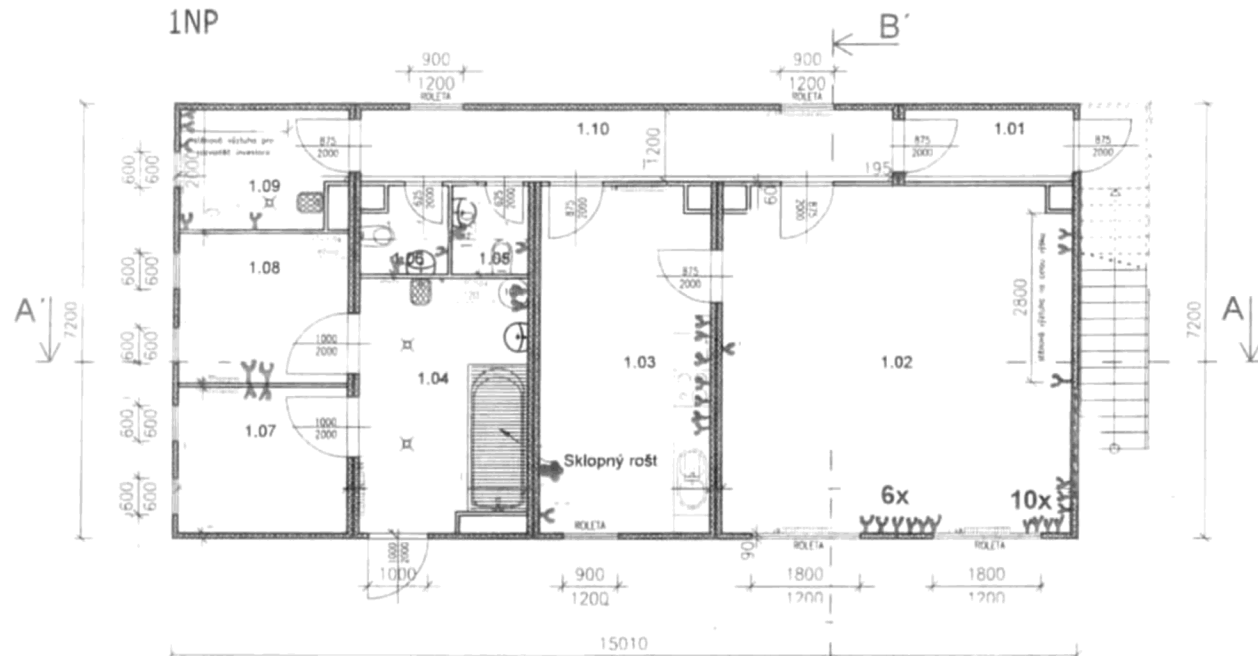


PROVOZNÍ BUDOVA LZS

ELEKTRICKÝ ROZVOD - ZÁSUVKY 230V
(požadované zadavatelem)

2NP

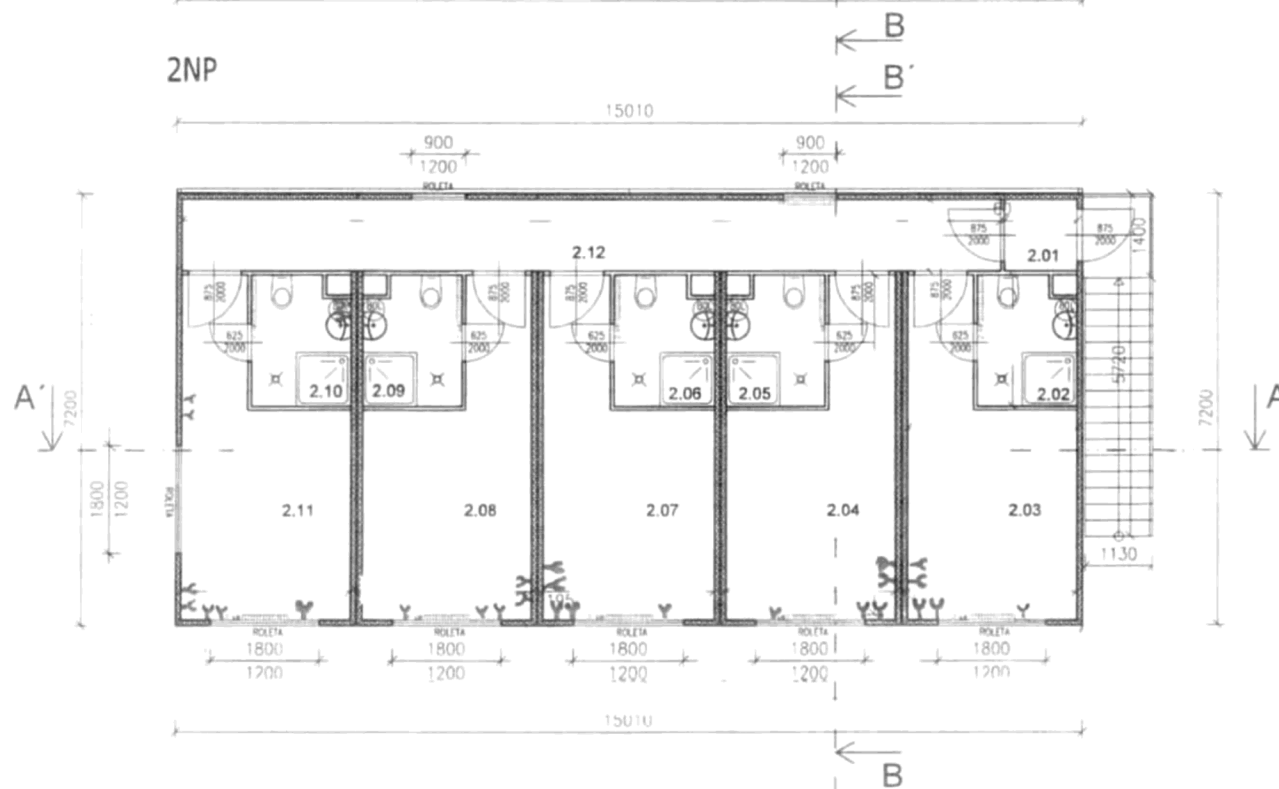

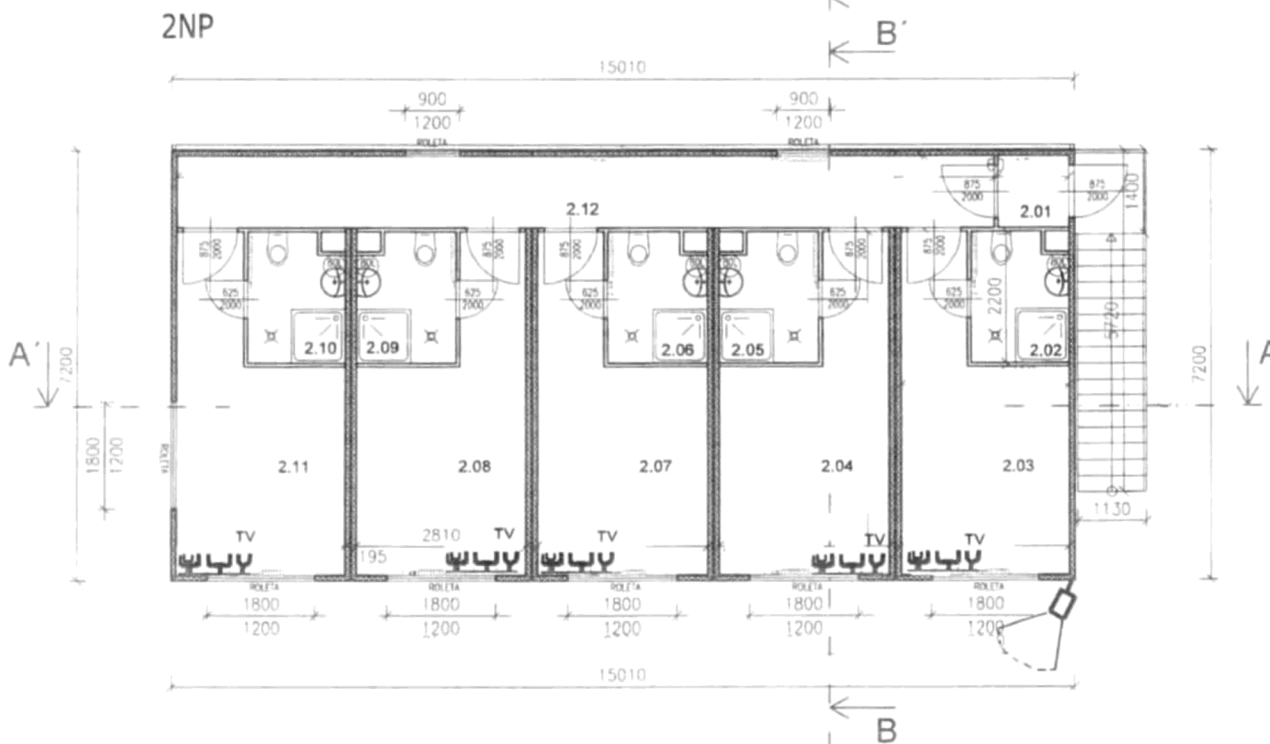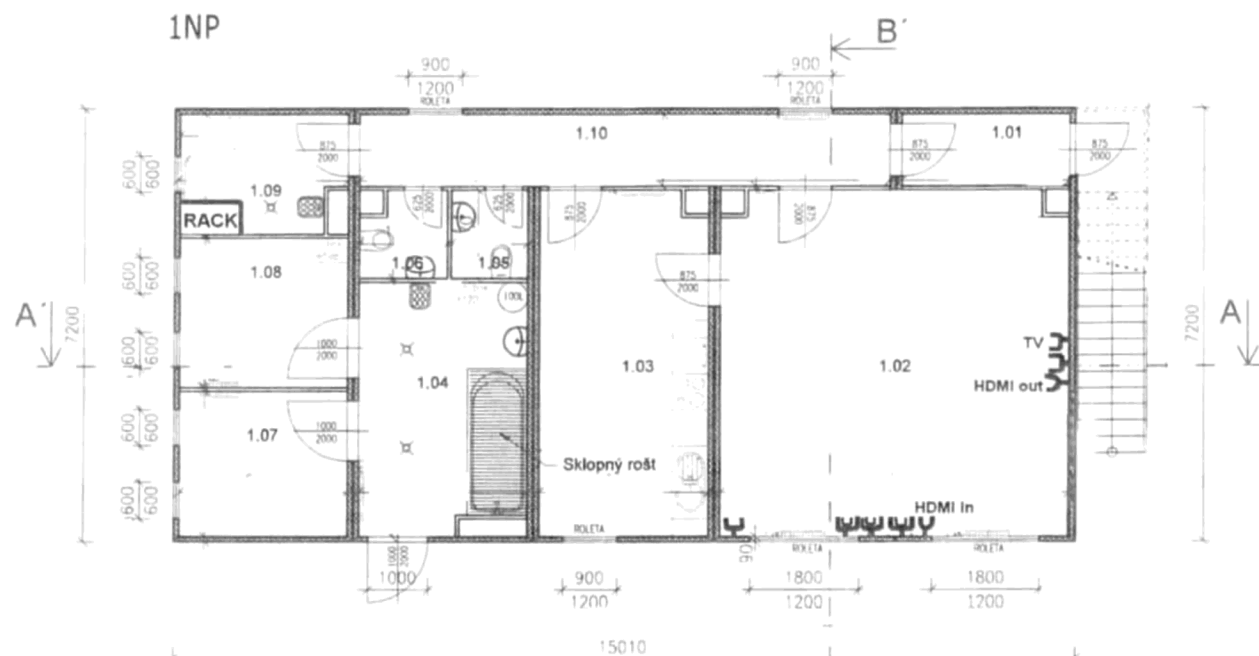

PROVOZNÍ BUDOVA LZS
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ



strukturovaná kabeláž RJ45, kat. 6, UTP



TV

TV koaxiální rozvod



kamera, 1x RJ 45 pro venkovní kameru

RACK

rozvaděč datový 22U/600x800

Poznámka:

umístění TV v provozní budově:




- velkoplošná v místnosti 1.02

na stěně u schodiště,

- v místnostech 2.03, 2.04, 2.07, 2.08 a 2.11

v rohu nad pracovním stolem.

PROVOZNÍ BUDOVA LZS ZÁKLADY

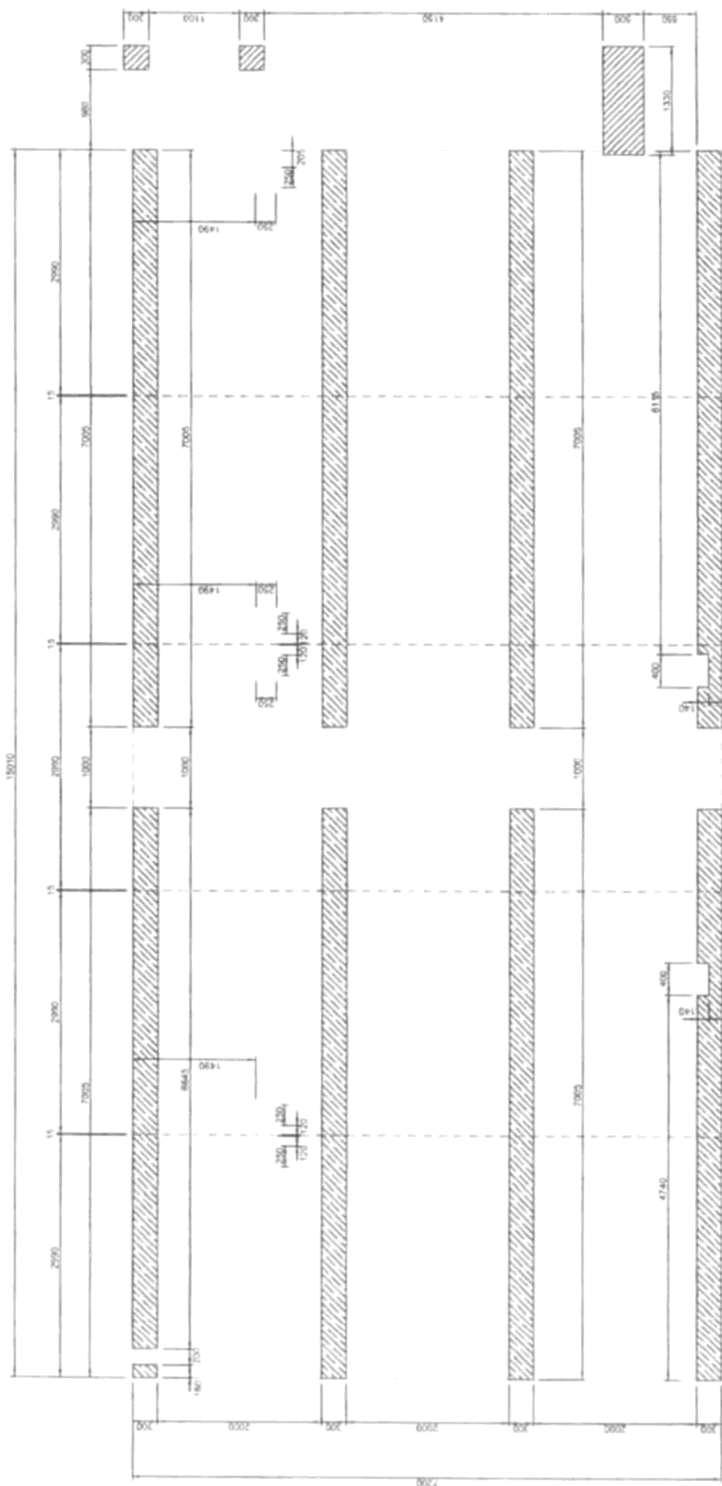


PROJEKTANT: MGR. J. KUBIŠKA
VYKRESLIL: MGR. J. KUBIŠKA
ČÍSLO: 1/2023


PROVOZNÍ BUDOVA LZS POHLEDY

SCHEMATICKÉ POHLEDY


POHLED 1

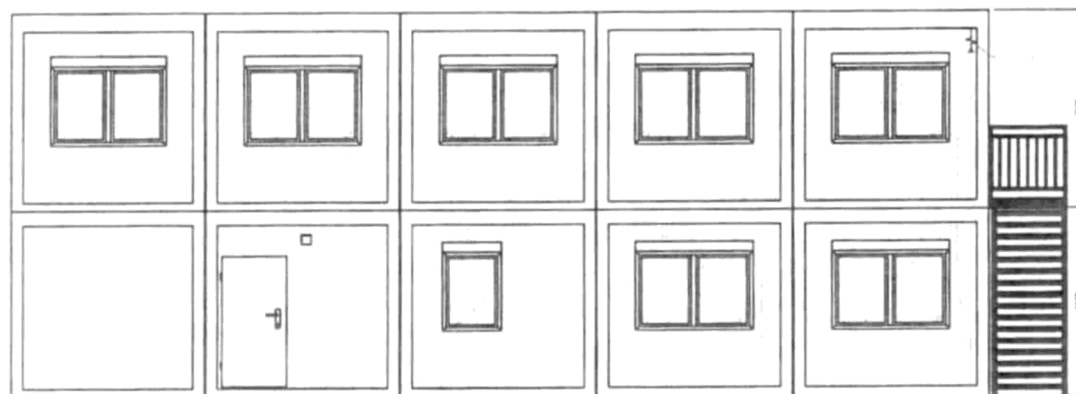


POHLED 2

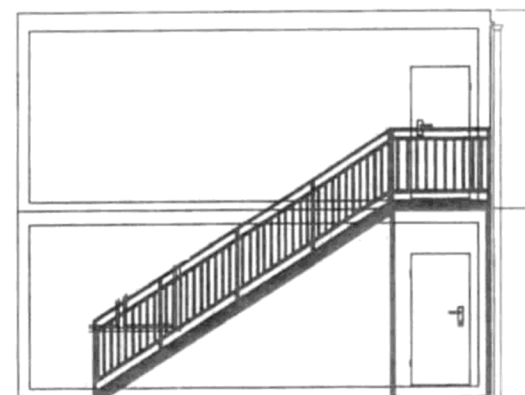


POHLED 3

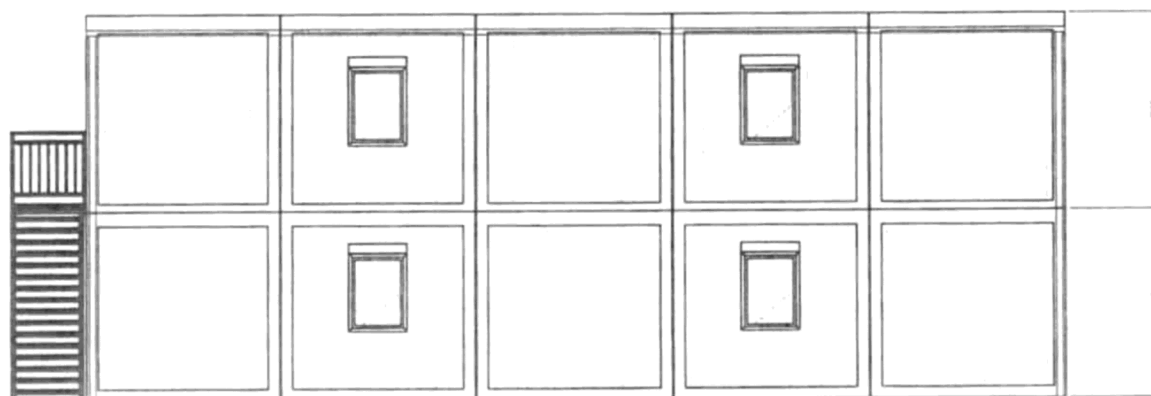

POHLED 4

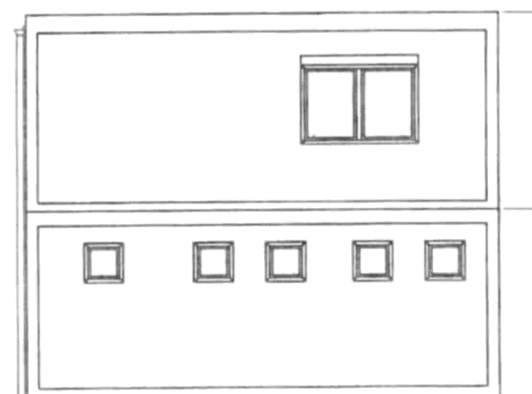

PROVOZNÍ BUDOVA LZS ŘEZ PLÁŠTĚM BUDOVY

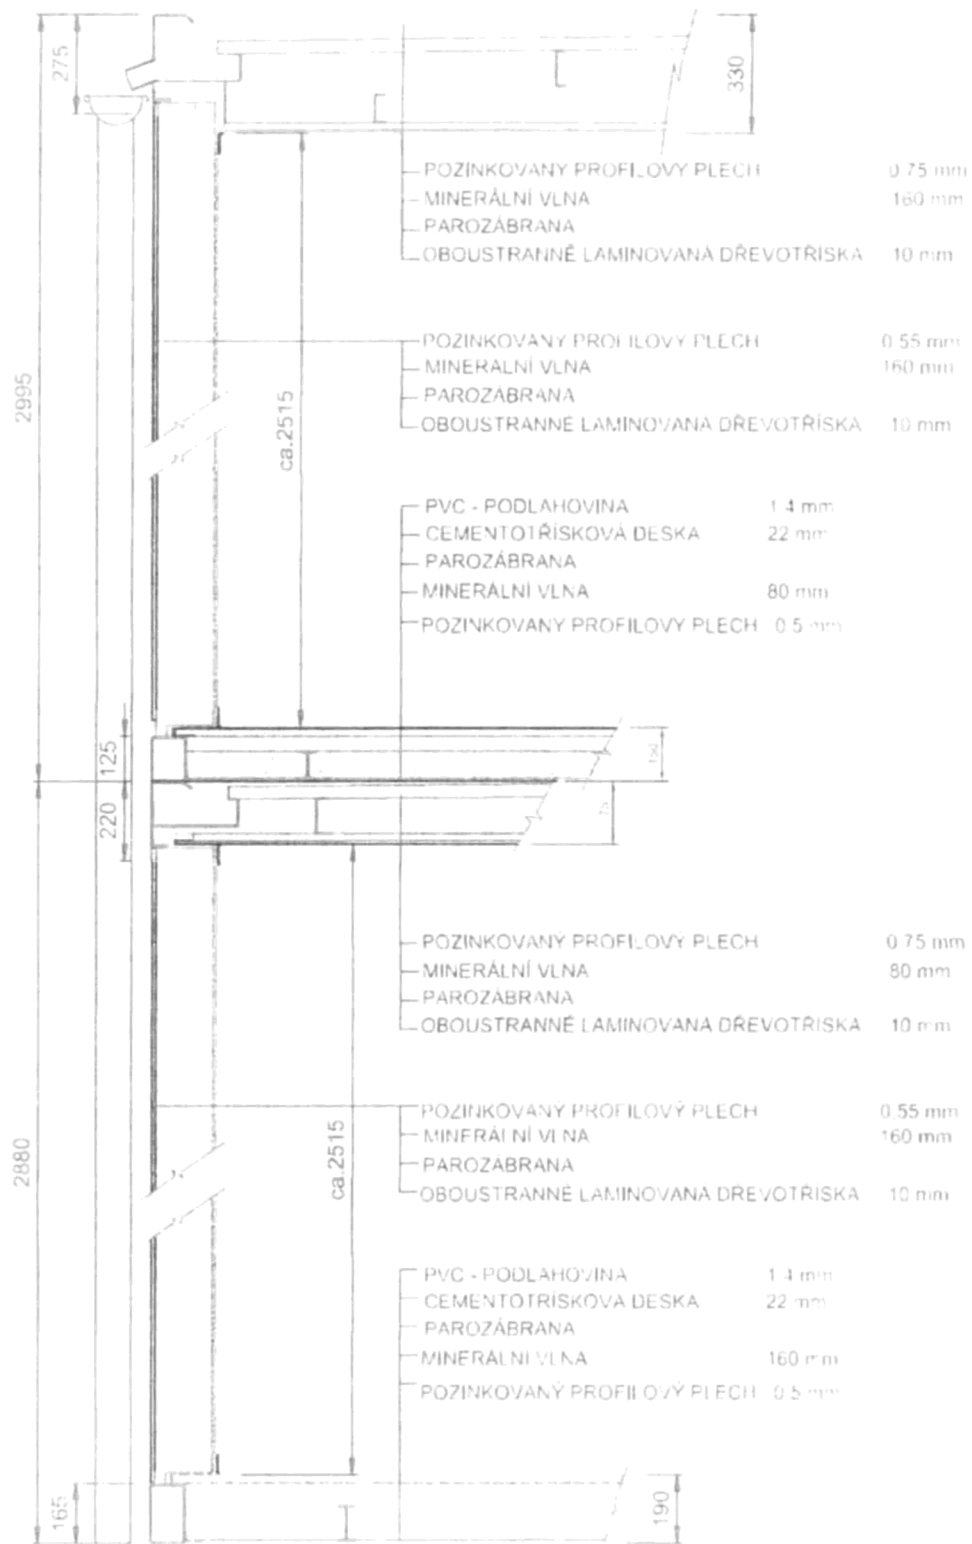

ROZMĚRY A POČET OBYTNÝCH KONTEJNERŮ:

KONTEJNEROVÁ SESTAVA 10 ks
jednotlivý kontejner o rozměrech
(délka x šířka x venkovní výška):

7 200 x 15 010 x 5 800 mm

Přízemí: 7 200 x 2 990 x 2 880 mm

Patro: 7 200 x 2 990 x 2 920 mm


světlá výška 2 500 mm

světla výška 2 500 mm

světla výška 2 500 mm

2./ TECHNICKÝ POPIS RÁMU OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Ocelová konstrukce svařovaná pod odborným dohledem z dutých a válcovaných profilů, samonosná, opatřena antikoročním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, v **barvě RAL 7047**; 8 ks kontejnerových rohů. Provedení dle statiky **dvakrát stohovatelné – za podmínky, že kontejnery v patře mají standardní zatížení podlahy 250kg/1m² a stropu 125kg/1m².**



Ilustrační foto

3./ SKLADBA PODLAHY OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Slepá podlaha:

0,5 mm pozinkovaný profilový plech volně vložený mezi příčné nosníky

Izolace:

minerální vata, třída hořlavosti **A1, EN 13501-1**

Parozábrana:

0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie

Podlahová deska:

22 mm cementotřísková deska, třída A2-S1, EN 13501-1, třída D-S2, EN 13501-1, přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-profilem

Podlahovina - PVC:


1,4 mm PVC podlahová krytina Fatra DOMO, třída Bn-S1, EN 14041, položena v pásech, které jsou celoplošně přilepeny, spoje jsou homogenně svařeny, **barva dle výběru**



Fatra Domo 3100-41

Spoje mezi podlahou a stěnami jsou obloženy tvrzenými podlahovými lištami, cca. 60 mm vysokými, **barva šedá**


V označených místnostech a místnostech se sprchami spoje mezi podlahou a stěnami řešeny **vytažením PVC tzv. „do vany“**

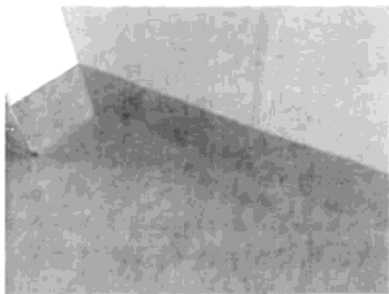

PVC vana

Podlahovina v místnosti s nerezovou vanou:

keramická dlažba 200 x 200 mm Rako Taurus, včetně zatížení 5 000 kN,
protiskluzná, barva šedá, spárovka šedá



Ilustrační foto

Povolené zatížení podlahy:

2 500 N/m² ... 250kg/1m² plošně

4./ SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Profilový plech:

0,55 mm pozinkovaný profilový plech, lakovaný v **barvě RAL 7047**, hloubka trapézové vlny 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu



Ilustrační foto


Izolace:

minerální vata, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti **A1, EN 13501-1**

Parozábrana:

0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie


Odvětrání přes obvodové stěny, z vnější strany **pozinkovaný plech s prolisem**, z **vnitřní strany plastová mřížka** se sít'kou proti hmyzu – **vždy 1 ks na jeden kontejner**. Začištění otvoru PVC trubkou o průměru 100mm.



Ilustrační foto

SKLADBA STŘECHY OBYTNÉHO KONTEJNERU:

<i>Profilový plech:</i>	0,75 mm pozinkovaný profilový plech, hloubka trapézové vlny 35 mm, odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován k rámové konstrukci
<i>Izolace:</i>	minerální vata, třída hořlavosti A1, EN 13501-1
<i>Parozábrana:</i>	0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie


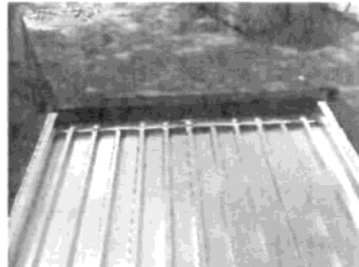


Ilustrační foto

UPOZORNĚNÍ: standardně se kontejnerová střecha nelakuje – pouze na vyžádání a za příplatek!!!

Povolené zatížení střechy: 1 250 N/m²

Odvodnění střechy kontejneru – „Integrovaná spádovaná střecha“: provedeno spádováním konstrukce střechy (směrem na kratší stěnu kontejneru) a to do kontejnerového žlabu a venkovním svodem v jednom místě – navýšení venkovní výšky o cca 1 cm na 1 m délky kontejneru – pozice viz. půdorys, odvětrávací komínky

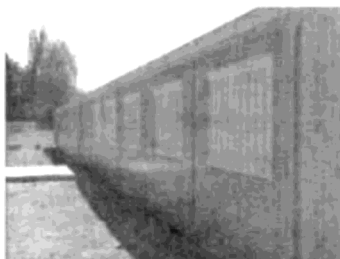

Ilustrační foto

6./ IZOLACE OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Izolace - podlaha: 160 mm Isover MULTIPLAT 0,035, $k = 0,287 \text{ W/m}^2\text{K}$

Izolace - venkovní stěny: 160 mm Isover MULTIPLAT 0,035, $k = 0,491 \text{ W/m}^2\text{K}$

Izolace - příčka: 60 mm Isover MULTIPLAT 0,035, $k = 0,698 \text{ W/m}^2\text{K}$

Izolace - stropu: 160 mm Isover MULTIPLAT 0,035, $k = 0,210 \text{ W/m}^2\text{K}$

7./ VNITŘNÍ OBLOŽENÍ OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Strop: 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, V 20, emisní třída E1, **třída D-S2, EN 13501-1**, přinýtovaná k profilovým nosníkům, hlavičky nýtů opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, spoje opatřeny speciálními plastovými lištami

Stěny: 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, V 20, emisní třída E1, **třída D-S2, EN 13501-1**, přinýtovaná k pozinkovanému U-profilu, hlavičky nýtů

Tel.: 00420 577 453 184, fax: 00420 577 019 216

Sídlo: Moravia Containers, a.s., Ovocný trh 573/12, 11000 Praha 1 – Staré Město, IČ: 05661986

<http://www.pegascontainer.cz>

opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, spoje včetně rohových opatřeny speciálními plastovými lištami

příčka:


10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, bez formaldehydů, *barva bílá*, V 20, emisní třída E1, **třída D-S2, EN 13501-1**, *oboustranně* přinýtovaná k pozinkovanému U-profilu, hlavičky nýtů opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, spoje včetně rohových opatřeny speciálními plastovými lištami



Ilustrační foto


Stěny v místnosti s nerezovou vanou:

keramický obklad 200 x 200 mm, vč. sádkartonu a zhuštěného rámečku, *barva bílo-šedý melír*

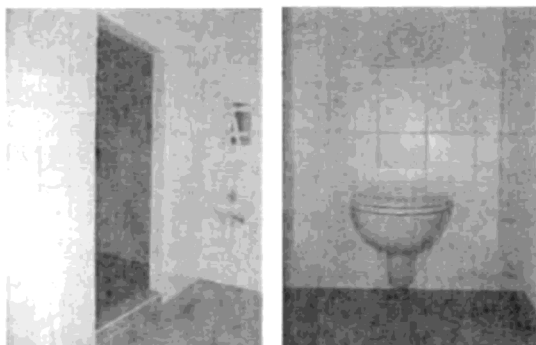

Ilustrační foto

Stěnový, stropní a podlahový přechod – sestava obytných kontejnerů:

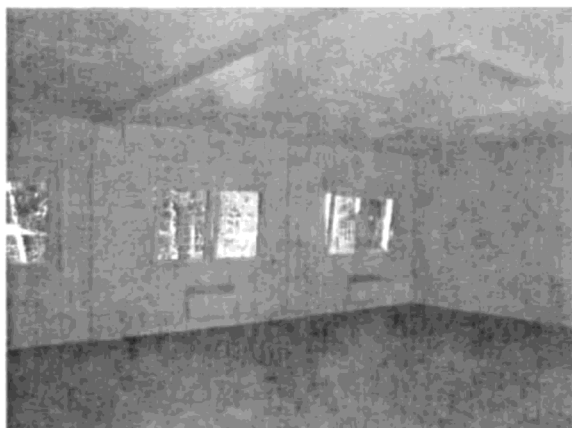

Lamino přechody a přelepované PVC na podlaze – „pomalý spoj“

8./ POŽÁRNÍ ODOLNOST OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Kontejnery jsou v uvedeném provedení bez jakékoliv požární odolnosti. Požární odolnost je za příplatek podle konkrétního zadání.

Tel.: 00420 577 453 184, fax: 00420 577 019 216

Sídlo: Moravia Containers, a.s., Ovocný trh 573/12, 11000 Praha 1 – Staré Město, IČ: 05661986


<http://www.pegascontainer.cz>

VÝBAVA OBYTNÉHO KONTEJNERU / SESTAVY OBYTNÝCH KONTEJNERŮ:

VÝBAVA – přízemí :

Venkovní dveře

- 1 ks **MZ ocelové dveře** 875/2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, vč. rohové zárubně s třístranným těsněním, síla dveřního plátu 40 mm, standardně lakované v barvě kontejneru, kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči, vč. gumového dorazu
- 1 ks **MZ ocelové dveře** 1000/2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, vč. rohové zárubně s třístranným těsněním, síla dveřního plátu 40 mm, standardně lakované v barvě kontejneru, kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči, vč. gumového dorazu



Ilustrační foto

Vnitřní dveře

- 5 ks **vnitřní dveře** 800/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílé, plast. kování, dozický zámek s klíčkem
- 2 ks **vnitřní dveře** 1000/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílé, plast. kování, dozický zámek s klíčkem
- 2 ks **vnitřní dveře** 700/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílé, zámek s ukazatelem volno/obsazeno



Ilustrační foto

Okna

- 2 ks **plastové okno** 1800/1200 mm, 2-křl., +850mm, bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou
- 3 ks **plastové okno** 900/1200 mm, 1-křl., +850mm, bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou
- 5 ks **plastové okno** 600/600 mm, +1600mm, bílé, sklopné, zasklené dvojitým izolačním sklem – z vnitřní strany ornament



Ilustrační foto

Tel.: 00420 577 453 184, fax: 00420 577 019 216

Sídlo: Moravia Containers, a.s., Ovocný trh 573/12, 11000 Praha 1 – Staré Město, IČ: 05661986

<http://www.pegascontainer.cz>

Elektroinstalace dle ČSN, 400/230 V,

včetně podružných rozvodů, rozvodné skříně s odpovídajícími jističi a FI - proudovým chráničem 4p/25A 003
připojení přes podlahu a rozvody kabelkanálem pod stropem, CELÁ SESTAVA JE ODJIŠTĚNA V OBOU
PODLAŽÍCH

- 19 ks zásuvka 230 V, bílá
- 4 ks dvou-zásuvka 2 x 240 V, bílá
- 10 ks samostatně jištěná zásuvka na topení, bílá
- 4 ks samostatně jištěná zásuvka na bojler
- 3 ks zásuvka pro TV – vč. kabeláže
- 2 ks HDMI zásuvka, vč. kabeláže
- 14 ks zářivka 1 x 36 W s krytem + 2x do vlhka
- 3 ks vypínač, bílý
- 3 ks skupinový vypínač, bílý
- 8 ks schodišťový vypínač
- 2 ks zásuvka u umyvadla 230V, bílá, 1400 mm nad podlahou, do vlhka **IP54**
- 4 ks zásuvka pro bojler – pevný přípoj
- 2 ks světlo 60 W
- 2 ks dvou-zásuvka nad minikuchyňkou 2x230 V, bílá, 1100 mm nad podlahou, do vlhka **IP54**
- 2 ks datová zásuvka – včetně kabeláže
- 3 ks datová dvou-zásuvka – včetně kabeláže

+kabelkanál, umístěný na podlaze a nebo pod okny, k propojení PC + tel.

+kabelkanál podstropní k propojení sestavy

Minikuchyňka

- 6 ks horní skříňky s policemi – provedení lamino tl. 18mm, ABS hrana, odstín 112 Kronospan – korpus, dvířka Egger H3157
- 5 ks spodní skříňky s policemi - provedení lamino tl. 18mm, ABS hrana, odstín 112 Kronospan – korpus, dvířka Egger H3157 + pracovní deska šedý beton
- 1 ks nerezový dřez s odkládací plochou a pákovou baterií
- 1 ks varná deska Gorenje, čtyři kola
- 1 ks lednice Gorenje, pod plát
- 1 ks myčka Gorenje
- 1 ks odsavač par Whirlpool



Ilustrační foto

Sanitární vybavení

- 3 ks **porcelánové umyvadlo** se směšovací baterií (teplá/studená voda), zrcadlo s poličkou a háčkem na ručník



Ilustrační foto

2 ks keramická výlevka vč. mřížky a pákové baterie na studenou vodu




Ilustrační foto

2 ks **WC- porcelánový záchod s nádržkou**, držák toal. papíru, háček na šaty





Ilustrační foto

1 ks **akrylátová vana 190x90cm**, vč. vanové baterie, růžice s hadicí, zvenku vany keramický obklad



Ilustrační foto


2 ks **podlahová výpust'**, vč. sifónu, nepřipojená na odpadové vedení, provedení přímo přes podlahu



Ilustrační foto

1 ks příprava pro vanu – voda/odpad

3/4" přívod a 100 mm odpad, přes podlahu, veškerá instalace vedena na stěně, odpadová roura: plastová, barva šedá

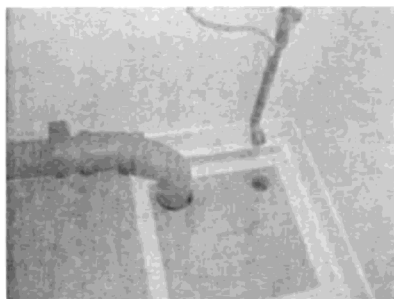


Ilustrační foto

Odvětrání

- 2 ks **el.-ventilátor** k odvětrání vnitřních sanitárních místností, extra jištění v rozvaděči, spouštění přes vypínač – odvětrání přes stěnu nebo do šachty

Zabezpečení teplé vody


- 3 ks bojler 5 l (kuchyňka + umyvadla)
1 ks bojler 100 l (1x vana + umyvadlo)



Ilustrační foto

Topení

- 2 ks hlídač mrazu 0,5 kW
4 ks el. přímotop 2 kW + 1x do vlhka
3 ks el. přímotop 1 kW



Ilustrační foto


Ostatní

- 1 ks **ocelové venkovní schody**, jednoramenné, s podestou 1400/1130 mm z roštu (oka na podestě i nášlapech 30x10mm), po obou stranách zábradlí, vše pozinkováno, šířka schodů 1130 mm, výška šprušlového zábradlí 1100mm, spodní hrana schodiště = spodní hrana kontejneru




Ilustrační foto

- 1 ks **betonová jímka** – betonová skruž, betonová nádrž, poklop 600x600mm, zatížení poklopu 400kN

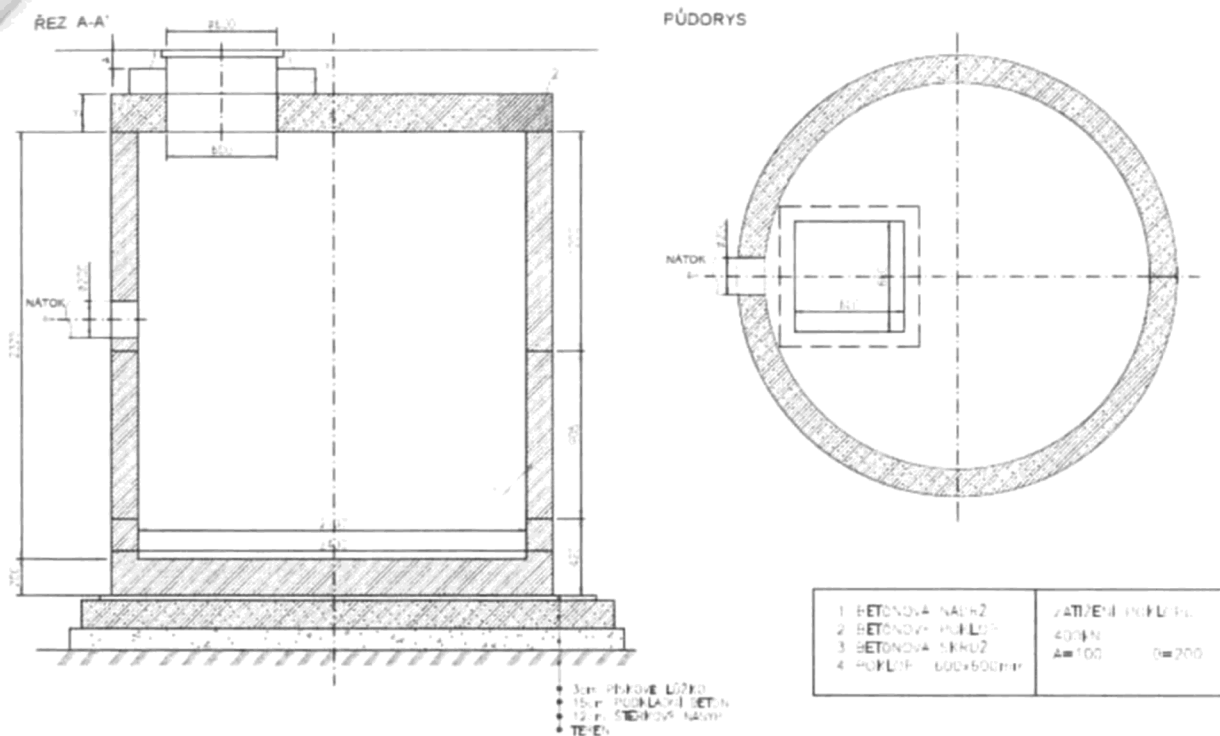

1 celek **nábytek do přizemí** – provedení lamino tl. 18mm, korpus Kronospan 112, dvířka a pláty Egger H3157, úchytky hranaté matný hliník



Ilustrační foto

konferenční křeslo	2 ks
sedací souprava rohová látková	1 ks
židle jedací	8 ks
Kancelářská židle omyvatelná	2 ks
stůl pracovní 160x80x75cm	2 ks
kontejner 4zásuvkový s centr. Zámkem	1 ks
police na stěnu 120 cm	1 ks
vozik na PC pod stůl	1 ks
stůl jedací 180x 80x75cm	1 ks
věšáková stěna 80 cm	1 ks
skříň policová 80 x min 40x200cm	1 ks
Stůl jídelní	1 ks
Stolek konferenční	1 ks
Stůl manipulační rohový	1 ks

Tel.: 00420 577 453 184, fax: 00420 577 019 216


Sídlo: Moravia Containers, a.s., Ovocný trh 573/12, 11000 Praha 1 – Staré Město, IČ: 05661986

<http://www.pegascontainer.cz>

YBAVA – patro :

Venkovní dveře

- 1 ks **MZ ocelové dveře** 875/2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, vč. rohové zárubně s třístranným těsněním, síla dveřního plátu 40 mm, standardně lakované v barvě kontejneru, kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči, vč. gumového dorazu



Ilustrační foto

Vnitřní dveře

- 6 ks **vnitřní dveře** 800/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílé, plast. kování, dozický zámek s klíčkem (z toho 5 ks s FAB zámkem)
- 5 ks **vnitřní dveře** 700/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílé, zámek s ukazatelem volno/obsazeno



Ilustrační foto

Okna

- 6 ks **plastové okno** 1800/1200 mm, 2-křl., bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou
- 2 ks **plastové okno** 900/1200 mm, 1-křl., bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou



Ilustrační foto

Elektroinstalace dle ČSN, 400/230 V,

včetně podružných rozvodů, rozvodné skříně s odpovídajícími jističi a FI - proudovým chráničem **4p/25A 003**
připojení přes podlahu a rozvody kabelkanálem pod stropem, CELÁ SESTAVA JE ODJIŠTĚNA V OBOU PODLAŽÍCH

- 5 ks zásuvka 230 V, bílá
- 11 ks dvou-zásuvka 2 x 240 V, bílá
- 6 ks samostatně jištěná zásuvka na topení, bílá

Tel.: 00420 577 453 184, fax: 00420 577 019 216


Sídlo: Moravia Containers, a.s., Ovocný trh 573/12, 11000 Praha 1 – Staré Město, IČ: 05661986

<http://www.pegascontainer.cz>

samostatně jištěná zásuvka na bojler
 zásuvka pro TV – vč. kabeláže
 zářivka 1 x 36 W s krytem + 2x do vlhka
 vypínač, bílý
 skupinový vypínač, bílý
 schodišťový vypínač
 5 ks zásuvka u umyvadla 230V, bílá, 1400 mm nad podlahou, do vlhka **IP54**
 4 ks zásuvka pro bojler – pevný přípoj
 1 ks světlo 60 W
 5 ks datová zásuvka – včetně kabeláže
 5 ks datová dvou-zásuvka – včetně kabeláže
 2 ks halogenová venkovní světla s čidlem – nasvětlení venkovního prostoru
+kabelkanál, umístěný na podlaze a nebo pod okny, k propojení PC + tel.
+kabelkanál podstropní k propojení sestavy

Sanitární vybavení

5 ks porcelánové umyvadlo se směšovací baterií (teplá/studená voda), zrcadlo s poličkou a háčkem na ručník





Ilustrační foto

5 ks WC- porcelánový záchod s nádržkou, držák toal. papíru, háček na šaty




Ilustrační foto

5 ks podlahová výpust', vč. sifónu, nepřipojená na odpadové vedení, provedení přímo přes podlahu



Ilustrační foto

5 ks sprchovací plastová kabina se závěsem, velikost 80/80 cm, vč. směšovací baterie na teplou a studenou vodu, hadice a sprchová růžice



Ilustrační foto

5ks 3/4" přívod a 100 mm odpad, přes podlahu, veškerá instalace vedena na stěně, odpadová roura: plastová, barva šedá




Ilustrační foto

Odvětrání

5 ks el.-ventilátor k odvětrání vnitřních sanitárních místností, extra jištění v rozvaděči, spouštění přes vypínač – odvětrání přes střechu
+ plastové větrací mřížky

Zabezpečení teplé vody

5 ks bojler 80 l




Ilustrační foto

Topení

6 ks el. přímotop 2 kW


5 ks el. přímotop 2kW do vlhka



Ilustrační foto

Ostatní


1 celek **nábytek do patra** – provedení lamino tl. 18mm, korpus Kronospan 112, dvířka a pláty Egger H3157, úchytky hranaté matný hliník




Ilustrační foto

stůl pracovní	5 ks
kontejner 4 zás. centr. zámkem	5 ks
police na stěnu 120 cm	5 ks
police na stěnu 80 cm	5 ks
vozík na PC (pod stůl)	5 ks
skříň šatní 80xmin. 180 s pol. vložkou	5 ks
skříň policová 80xmin. 40x75	15 ks
věšáková stěna š. 80 cm	5 ks
kancelářská židle s područkami pojízdná	5 ks
podložka pod židli 1200x900	5 ks
konferenční stolek 80x60x42	5 ks
pohovka s úložným prostorem	5 ks

PRÍZEMÍ

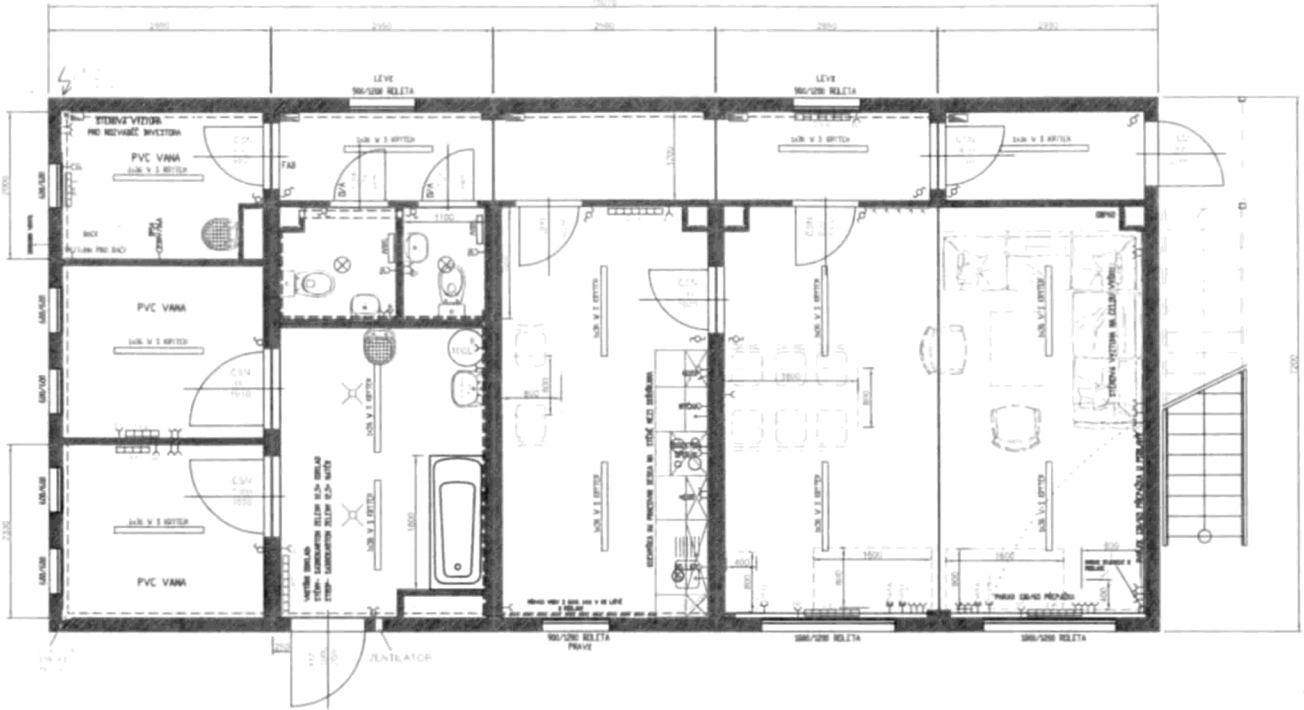

1.PATRO

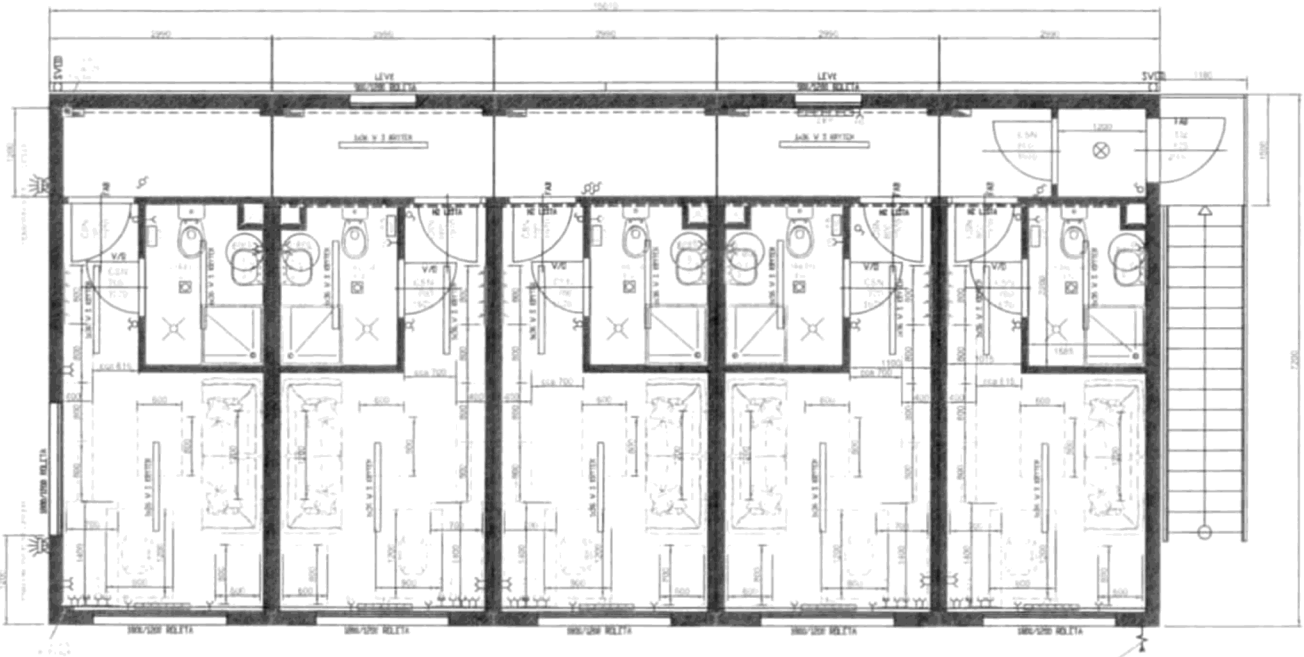

PRÍLOHA (KRESEL)	2000/01/01
DATUM	20.01.2001
VÝKONKOVÁ	ENR/01.01.01
