

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 02

Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	Datum: 04.06.2020

Název akce: ÚVN - VoFN Praha - objekty pro Oddělení pro výběr personálu AČR - rekonstrukce

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

SO 03 - napojení slaboproudu na areál ÚVN

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace z ekonomických důvodů řešila protažení kabelů optických a metalických prázdnou trubkou bývalého teplovodu do nejbližšího pavilonu „E“ a dále metalický kabel až do telefonní ústředny v pavilonu „A“. Projekt předpokládal obnažení ohybů trubek trasy do pavilonu „E“ výkopy a jejich přerušení pro možný ohyb kabelů. Po obnažení vstupu do kanálu v 1.PP byla zjištěna nedostačující možnost provést tímto způsobem. Byla konstatována špatná průchodnost trubek, tedy malý profil, zavařené konzoly a poloměry trubek nejen v horizontálním, ale i vertikálním směru.

Proto byla navržena nová trasa od rekonstruovaného objektu do pavilonu „C“ a dále kolektorem do pavilonu „E“. Nová trasa všech vedení (metalický kabel, optický kabel – Ethernet a ESSERnet, silový kabel pro napojení záložního zdroje datové sítě a ovládací kabel) vede výkopem do 1.PP pavilonu „C“. Metalická síť bude napojena na telefonní ústřednu ÚVN v 1.PP pavilonu „C“ v míst. č. 01.73, ve stejné trase bude tažena i optická síť ze stávající RACK v míst. č. 01.30 a záložní síť EL – UPS společně i s vyrážecím kabelem pro tlačítko TOTAL Stop, která pokračuje v chodbě prostupem do 2.PP, kde je ukončen v míst. č. 02.60 v rozvaděči RUPS. Pro připojení EPS na centrální areálový dispečink ÚVN vede optický kabel komunikační chodbou z 1.PP pavilonu „C“ do 1.PP pavilonu „E“, kde končí prostupem stropem v 1.NP v ústředně EPS.

Tyto okolnosti se nedaly předvídat a nejsou chybou zhotovitele.

Vzniklé vícepráce, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předem předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Příloha: č.1 - rozpočet, č.2 – Technická zpráva, č.3 – výkresová část

Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 5
Cena méněprací bez DPH: 0,00,-	Cena víceprací bez DPH: 378.433,20,-
Výsledná cena změny bez DPH: 378.433,20,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

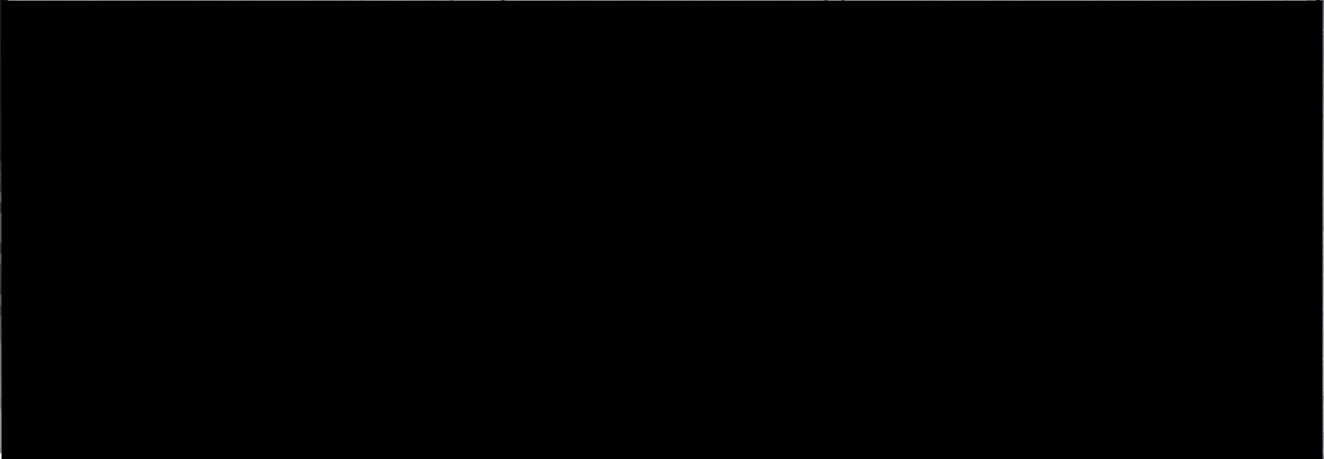

19-009

SO 03

D.1.4.5

Číslo po

M21h

M21-001

M21-002

M21-005

M21-007

R

R

R
