



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+			číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice				
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 4.5.2020			
Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší					
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	viz. příloha			
	na výkresy:	viz. příloha			
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha			
	na jinou část smlouvy:	-			
Stavební objekt (číslo a název): TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice TZ 02.1 Kanalizační stoky Mniší					
Původní řešení: Odvádění spodních vod čerpacími studnami přes drenážní potrubí.					
Návrh řešení: Čerpání spodních vod před potrubím v místě otevřeného výkopu z prohloubené rýhy.					
Zdůvodnění řešení: Drenážní potrubí během celé výstavby odvádí vodu pod položeným potrubím směrem k čerpacím jímkám. Čerpací jímky bývají umístěny u revizních šachet vzdálených až 50 m. Tímto dochází ke stahování spodní vody v celém čerpaném úseku. Změna spočívá v čerpání spodních vod v pracovním místě prohloubením rýhy. Tímto je zabráněno snižování hladiny spodních vod v delším úseku a díky prohloubení rýhy hlouběji, než je umístěno drenážní potrubí, dochází k lepšímu odvodnění pracovního prostoru.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: Navržená změna nemění povahu stavby, navržený materiál změny je kvalitativně vyšší než původně navržený materiál v projektové dokumentaci.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává: zhotovitel					
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem [redacted]					
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem [redacted]					
Přílohy: POZ 5/1 - položkový rozpočet POZ 5/2 - situace POZ 5/3 - schéma čerpání					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	11.6.2020	
Stavební objekt (číslo a název):		
Navržené řešení přináší úsporu, je jakostně adekvátní původnímu řešení a nemění jeho charakter. Z hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (6).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH: - 839 207,47 Kč	Cena víceprací bez DPH: 767 096,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -72 110,67 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Není předmětem změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce TDS:	Podpis zmocněnce projektanta:	
Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

POZ-5.1

Rozpočet více-méně prací

stavba: **Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší**

Rekapitulace rozpočtu ZL č.5

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena včetně DPH</i>
Vícepráce	767 096,80	161 090,33	928 187,13
Méněpráce	-839 207,47	-176 233,57	-1 015 441,04
<u>Více-méně práce celkem</u>	<u>-72 110,67</u>		<u>-87 253,91</u>

Rozpočet více prací

stavba: **Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší**

kód položky	popis	MJ	množství	cena	cekem	pozn.
--------------------	--------------	-----------	-----------------	-------------	--------------	--------------

Změna způsobu čerpání spodních vod

TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice

1 Zemní práce

132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes	m3	363,222	158,00	57 389,11	
132301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	108,967	66,60	7 257,18	
161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu	m3	363,222	20,00	7 264,44	
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny	m3	363,222	20,20	7 337,09	
Srov-980-R	Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozt	m3	363,222	150,00	54 483,33	
174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hul	m3	363,222	95,00	34 506,11	
122614300	zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dc	t	690,122	300,00	207 036,67	

TZ 02.1 Kanalizační stoky Mniší

1 Zemní práce

132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes	m3	379,556	158,00	59 969,78	
132301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	108,967	66,60	7 257,18	
161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu	m3	379,556	20,00	7 591,11	
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny	m3	379,556	20,20	7 667,02	
Srov-980-R	Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozt	m3	379,556	150,00	56 933,33	
174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hul	m3	379,556	95,00	36 057,78	
122614300	zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dc	t	721,156	300,00	216 346,67	

Vícepráce celkem

767 096,80

Rozpočet méně prací

stavba: **Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší**

<i>kód položky</i>	<i>popis</i>	<i>MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena</i>	<i>cekem</i>	<i>pozn.</i>
--------------------	--------------	-----------	-----------------	-------------	--------------	--------------

Změna způsobu čerpání spodních vod

TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice

4 Vodovodné konstrukce

919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrr	m2	-4 831,919	25,00	-120 797,98	
-----------	-----------------------------------------------------------	----	------------	-------	-------------	--

8 Trubní vedení

242111111-R	Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 500	kus	-31,000	4 000,00	-124 000,00	
-------------	--------------------------------------------------------	-----	---------	----------	-------------	--

871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do	m	-4 580,200	9,34	-42 779,07	
-----------	-----------------------------------------------------	---	------------	------	------------	--

286112230	trubka drenážní PVC DN 100 mm	m	-4 580,200	18,00	-82 443,60	
-----------	-------------------------------	---	------------	-------	------------	--

TZ 02.1 Kanalizační stoky Mniší

4 Vodovodné konstrukce

919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrr	m2	-8 155,079	25,00	-203 876,98	
-----------	-----------------------------------------------------------	----	------------	-------	-------------	--

8 Trubní vedení

242111111-R	Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 500	kus	-33,000	4 000,00	-132 000,00	
-------------	--------------------------------------------------------	-----	---------	----------	-------------	--

871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do	m	-4 876,000	9,34	-45 541,84	
-----------	-----------------------------------------------------	---	------------	------	------------	--

286112230	trubka drenážní PVC DN 100 mm	m	-4 876,000	18,00	-87 768,00	
-----------	-------------------------------	---	------------	-------	------------	--

Méněpráce celkem

-839 207,47

POZ-5.2

výtlačak A

bytové stádky za
odpadu

ČS-A

Kabuřív
vrch
370



Mniší

šterkopísky

Vlčovice

VLČOVICE



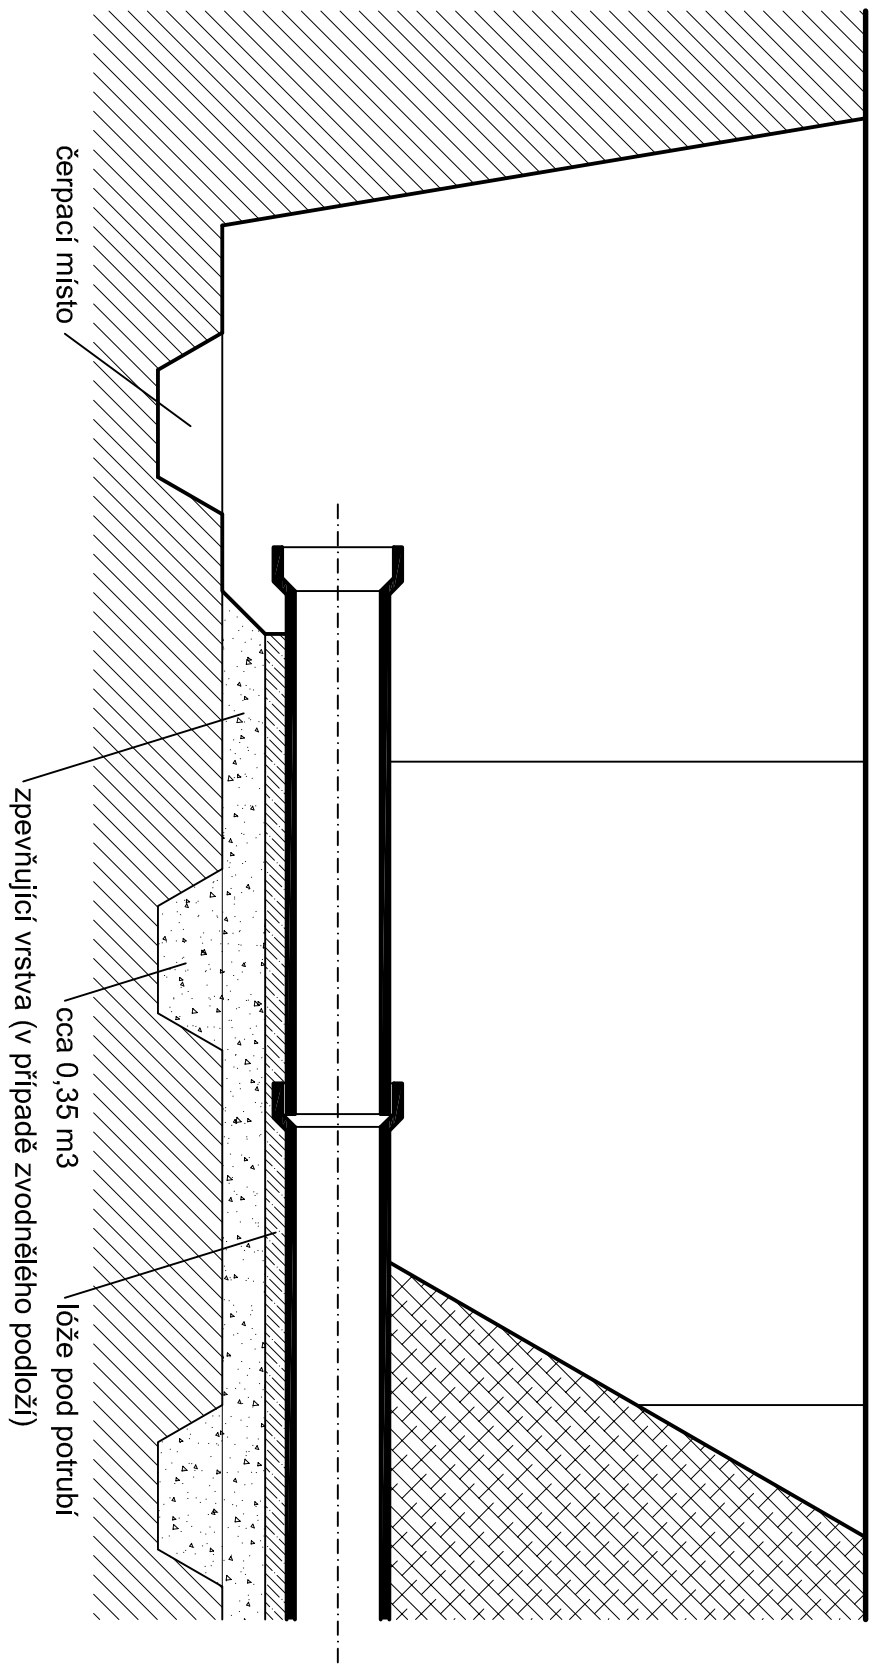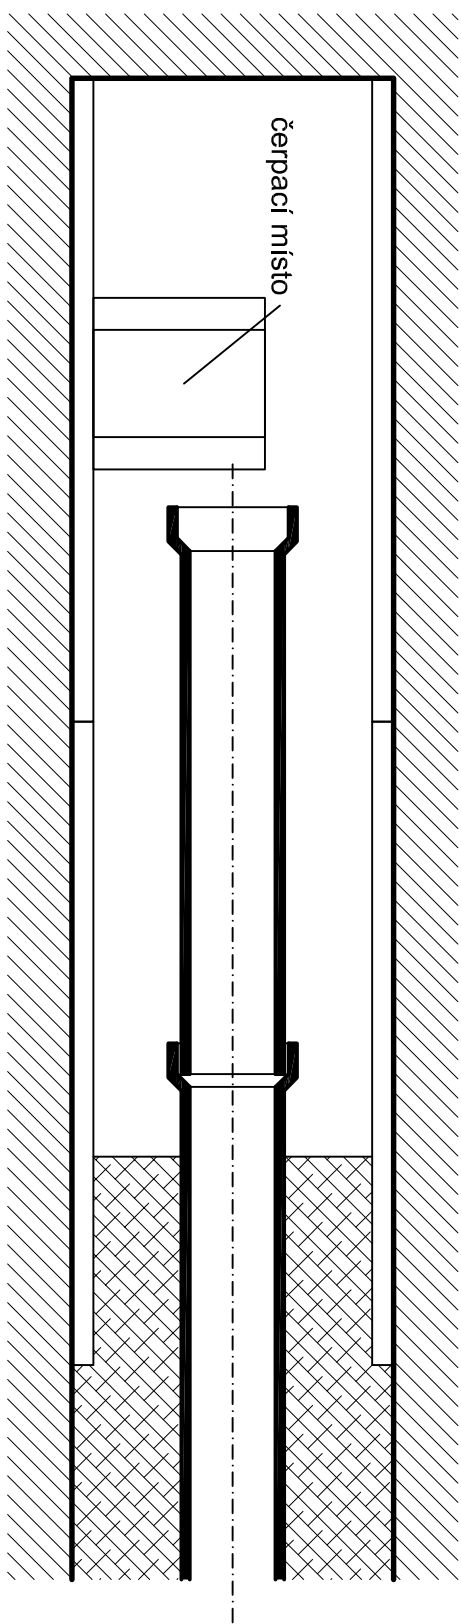

pracovní záběr pažicích boxů cca 7 m
čerpací jímka bude posouvána vždy na konec potrubí
