

**Změnový list číslo 21****Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

**Předmět změnového listu**

Dodatečná izolace stropů

**Část díla dotčená změnovým listem**

1.NP

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní projektové dokumentaci nebyla protizvuková izolace stropů řešena.

**Nové řešení :**

Provede se doplnění protihlukové izolace do SDK stropů z důvodu eliminování hluku provozem.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem změny je požadavek investora a budoucího uživatele na snížení hluku nad 1.NP vlivem provozu.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna bude vyžadovat úpravu PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č. 28 ze dne 13.5.2020.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.


Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	25 582,34 Kč
--------------------------------------	--------------

<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	
-------------------------------------	--

<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	25 582,34 Kč
---	--------------

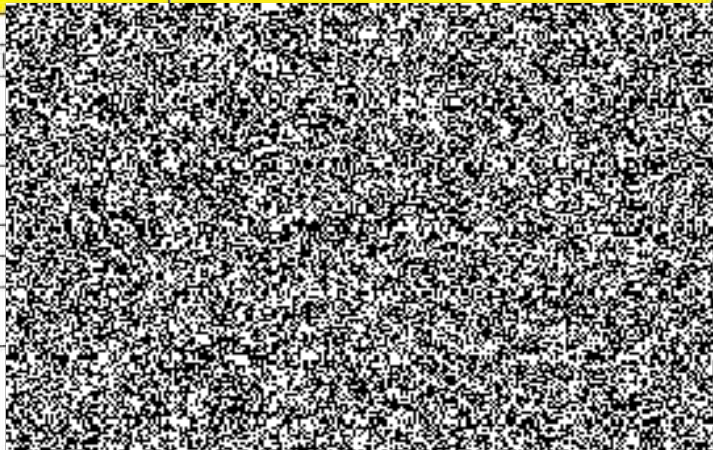



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa  
 E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY  
**Objekt:** ZL 21 Izolace dodatečná do stropů  
**Rozpočet:** ZL 21 Izolace dodatečná do stropů

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 582,34
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>25 582,34</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 582,34 CZK
Základní DPH	21 %	5 372,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **30 954,63 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 582,34	100
Cena celkem					25 582,34	100

### Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2( KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 21	Izolace dodatečná do stropů
R:	ZL 21	Izolace dodatečná do stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>25 582,34</b>
	342091061R00	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace 1.NP	m2	153,74000	59,70	9 178,28
	63151401R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 50 mm 153,74*1,1	m2	169,11400	97,00	16 404,06
				169,11400		





**Změnový list číslo 22****Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

**Předmět změnového listu**

Hliníkové dveře do vodojemu

**Část díla dotčená změnovým listem**

Vodojem

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní PD jsou vstupní dveře do vodojemu navrženy ocelové.

**Nové řešení :**

Nově se navrhují vstupní dveře do vodojemu hliníkové.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem změny je požadavek investora - objednatele na dodání a montáž exteriérových hliníkových dveří.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna bude vyžadovat úpravu PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č. 29 ze dne 20.5.2020.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

**Přípočty k ceně díla bez DPH:**


00 Kč

**Odpočty z ceny díla bez DPH:**

00 Kč

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:**

00 Kč

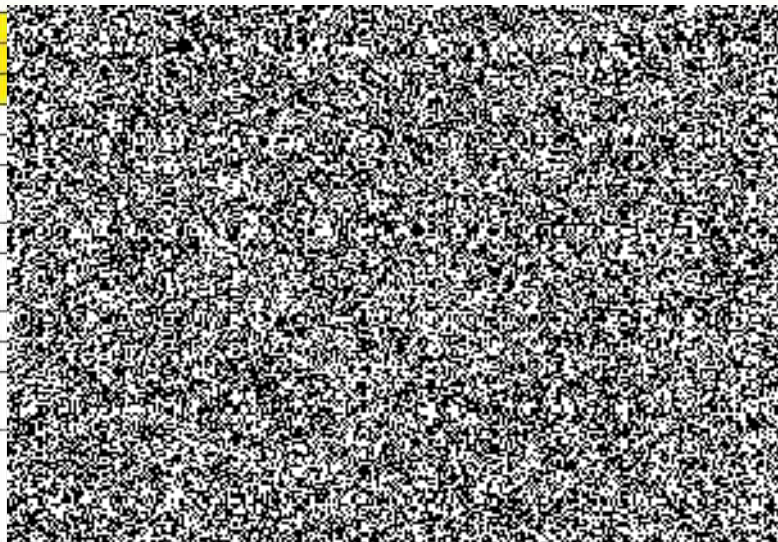





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC E 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 22 Hliníkové dveře - vodojem**

Rozpočet: **ZL 22 Dveře - vodojem ODPOČET**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-8 484,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-8 484,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-8 484,00 CZK
Základní DPH	21 %		-1 781,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -10 265,64 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M23	Montáže potrubí	MON			-8 484,00	100
Cena celkem					-8 484,00	100

## Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 22	Hliníkové dveře - vodojem
R:	ZL 22	Dveře - vodojem ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>-8 484,00</b>
	M23006.01	D + M Dveře ocel. do vodojemu vč.zárubně součástí položky č. 57 Vodojem D+M	ks	-1,00000	8 484,00	-8 484,00

vynětí z položky, která byla zadána jako komplet  
požadavku z naší strany v průběhu výběrového řízení o rozpoložování vodojemu nebylo vyhověno - viz dotazy ze dne 12.06.2019:

14) Reakce na vysvětlení ZD ze dne 10.06., DOTAZ č. 14:

**Prosíme o rozepsání jednotlivých položek pro D+M vodojemu a D+M ATS.** V případě jakýchkoliv zásahů do položky, upřesnění dodávek, víceprací, méněprací atd., nebude možné tyto změny v jedné souborové položce sledovat.

přesun hmot pro dveře je součástí této ceny jako komplet (dodrženo dle zadavatele, dle souborové položky pro vodojem)



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC E 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 22 Hliníkové dveře - vodojem**

Rozpočet: **ZL 22 Hliníkové dveře - vodojem**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	35 249,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>35 249,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 249,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 402,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 42 651,29 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele




## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 249,00	100
Cena celkem					35 249,00	100

### Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 22	Hliníkové dveře - vodojem
R:	ZL 22	Hliníkové dveře - vodojem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>35 249,00</b>
	767PCZn001	D+M EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE dle požadavku	ks	1,00000	34 900,00	34 900,00
545	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	349,00000	1,00	349,00

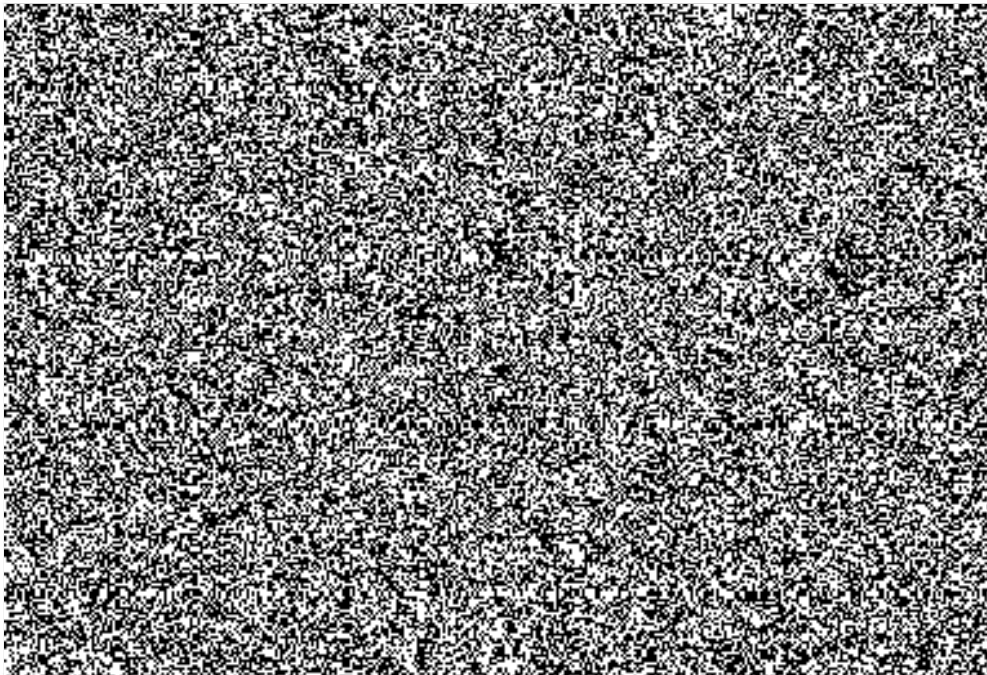

Zařazení: 053 YLP KSA 77 52 200 200  
IC:479 06 898 / DIČ:CZ47906898  
Email: [redacted]


AKCE: MANAG - UZ Plumlov II

Na základě předn [redacted] o uvedené v

2. Pí



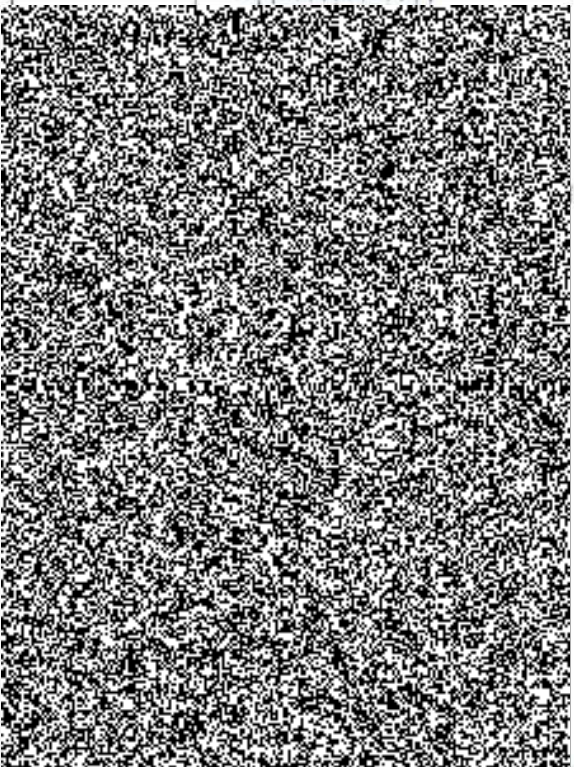
2.1. F  
příslu

2.2. V



[redacted] - RAL 7016

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

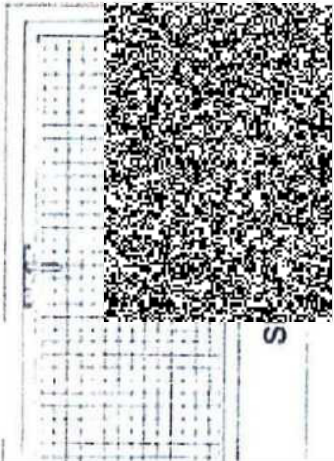Pozice	Počet Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	1 Ks 		
			





**Změnový list číslo 23****Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

**Předmět změnového listu**

WPC na stupních a podestách

**Část díla dotčená změnovým listem**

Vstupní schodiště

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní smluvní dokumentaci je vstupní schodiště do hlavní budovy navrženo jako pororošt.

**Nové řešení :**

Nově se navrhuje vstupní schodiště doplnit o obklad schodišťových stupňů a podest terasovými prkny WPC.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem změny je požadavek objednatele na sjednocení povrchu vstupního schodiště s povrchem venkovní terasy a zlepšení celkového vzhledu. Navíc pohyb osob po tomto nově navrženém povrchu bude bezpečnější.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna bude vyžadovat úpravu a doplnění PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**


Zápis z KD č. 29 ze dne 20.5.2020.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna bude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla selepší.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

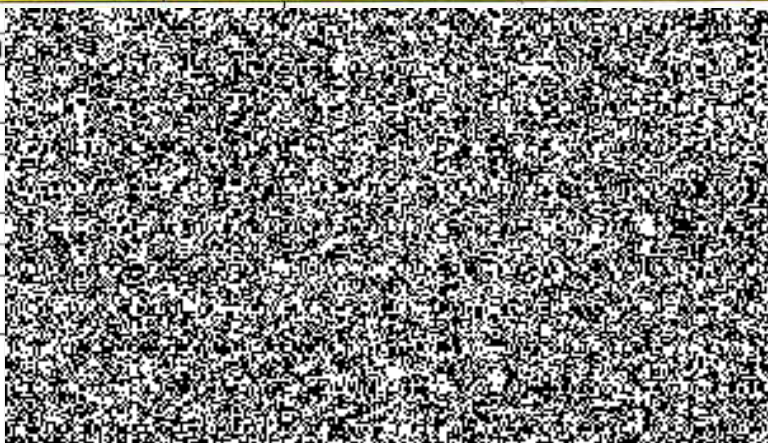**Přípočty k ceně díla bez DPH: 42 534,87 Kč****Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celková cena změny díla bez DPH: 42 534,87 Kč**



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 23 WPC na stupních, podestách**

Rozpočet: **ZL 23 WPC na stupních, podestách**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	42 534,87
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>42 534,87</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 534,87 CZK
Základní DPH	21 %	8 932,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **51 467,19 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			42 534,87	100
Cena celkem					42 534,87	100

### Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 23	WPC na stupních, podestách
R:	ZL 23	WPC na stupních, podestách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>42 534,87</b>
	766n001.1	Montáž podlaha terasová, schodiště exteriérová schodiště : 14,22 4,92	m2	19,14000 14,22000 4,92000	980,00	18 757,20
	766n002	WPC terasové prkno plné 20x140x2200, stone grey embossing Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,14000*1,1	kus	21,05400 21,05400	529,00	11 137,57
	766n003	Startovací sponka nerez pro prkno	kus	27,00000	10,00	270,00
	766n004	Podkladová sponka nerez	kus	500,00000	10,00	5 000,00
	766n011	Tex nerez na sponu	kus	518,00000	4,00	2 072,00
	766n012	Tex pozink kotevní	kus	43,00000	4,00	172,00
	766n013	Zinek šroub PH M05x20 + matice + podložka	kus	161,00000	5,00	805,00
	766n014	WPC lišta rohová 40x40x2200, brown	kus	20,00000	195,00	3 900,00
509	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	421,10000	1,00	421,10





**Změnový list číslo 24****Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D.,MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

**Předmět změnového listu**

Cementobetonový kryt vozovky

**Část díla dotčená změnovým listem**

Přístupová komunikace

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V PD se navrhuje přístupová komunikace k hlavní budově tvořená podkladem z kameniva s cementovou stabilizací a povrchem z cementobetonu.

**Nové řešení :**

Nově se navrhuje provést pouze podklad z kameniva stmelěného cementem a finální povrch s cementobetonovým krytem neprovádět.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem změny je plánovaná II.etapa prací, při jejichž realizaci by s největší pravděpodobností došlo k poškození asfaltobetonového krytu vozovky.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna nebude vyžadovat úpravu PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č. 29 ze dne 20.5.2020.


**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemění.

Vliv na cenu: Cena díla se snižuje.

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>95 550,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>645 400,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>549 850,00 Kč</b>

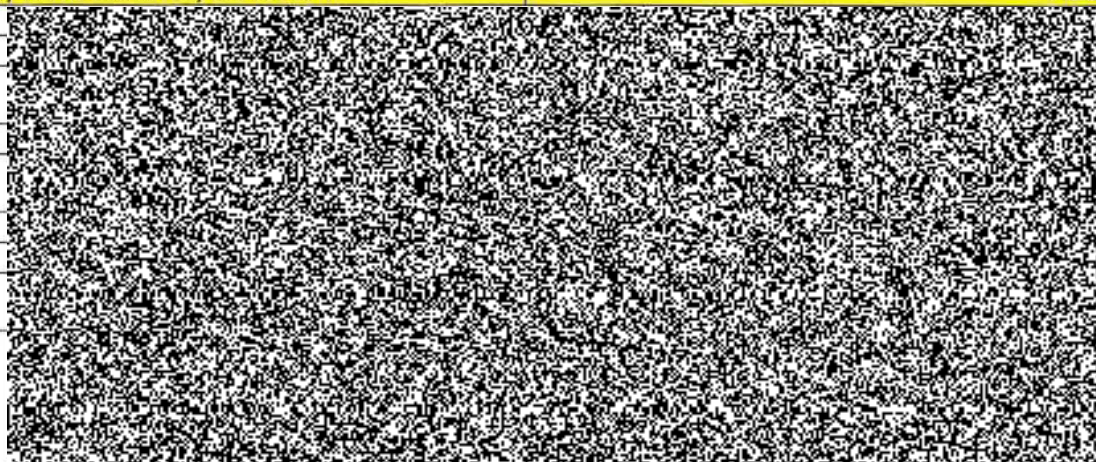



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa  
 E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY  
**Objekt:** ZL 24 CB kryt ODPOČET  
**Rozpočet:** ZL 24 CB kryt ODPOČET

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-549 850,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-549 850,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-549 850,00 CZK
Základní DPH	21 %	-115 468,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -665 318,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-549 850,00	100
Cena celkem					-549 850,00	100



### Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 24	CB kryt ODPOČET
R:	ZL 24	CB kryt ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-549 850,00</b>
	567123811RX	Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C8/10 tl.10 cm	m2	350,00000	273,00	95 550,00
	7 581200009RA0	Komunikace s CB krytem	m2	-350,00000	1 844,00	-645 400,00



**Změnový list číslo 25****Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92 , 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

**Předmět změnového listu**

Nový pokoj m.č. 214

**Část díla dotčená změnovým listem**

1.NP a 2.NP

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní PD se počítalo s tím, že vnitřní dřevěné schodiště mezi 1. NP a 2.NP bude zachováno a bude provedena pouze jeho repase.

**Nové řešení :**

Nově se navrhuje odstranění dřevěných schodišťových stupňů, demontáž nosných ocelových konstrukcí schodiště, montáž stropu z desek PZD a provedení betonové mazaniny včetně výztuže.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem zrušení schodiště vedoucího z 1. do 2.NP je navržená změna dispozice kuchyňského bloku, kdy přemístěním ohřivačů vody a dalšími drobnými změnami došlo k zvětšení podlahové plochy kuchyně. Navíc ve 2. NP se zvětšila ubytovací kapacita o jeden pokoj (m.č.214).

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna si vyžádá přepracování PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č. 13 ze dne 15.1.2020.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna bude mít vliv na termín dokončení díla.


Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	156 660,44 Kč
--------------------------------------	---------------

<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	- 35 000,00 Kč
-------------------------------------	----------------

<b>Celkový vliv změny na cenu díla bez DPH:</b>	121 660,44 Kč
---	---------------

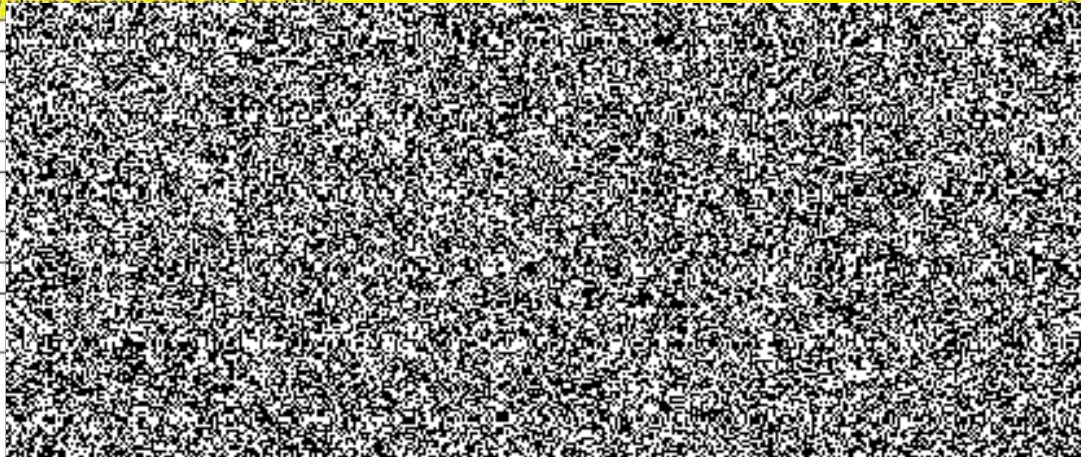



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa**  
**E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 25 Nová obytná místnost**

Rozpočet: **ZL 25 Nová obytná místnost PŘÍPOČET**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	19 160,44
PSV	137 500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>156 660,44</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 660,44 CZK
Základní DPH	21 %	32 898,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 189 559,13 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 690,72	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 107,50	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 799,92	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 575,60	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			986,70	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			137 500,00	88
Cena celkem					156 660,44	100

### Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2( KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 26	Nová obytná místnost
R:	ZL 26	Nová obytná místnost <b>PŘÍPOČET</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>						<b>1 690,72</b>
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
	389941012R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg L profil	kg	8,00000	157,00	1 256,00
	15411515R	Profil L rovnoramenný S235 10x10x2 mm 11375	t	0,00800	54 340,00	434,72
<b>Díl: 4</b>						<b>10 107,50</b>
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
	411120012RAB	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm desky PZD 149 x 29 x 9 cm 5,2*1,25	m2	6,50000	1 555,00	10 107,50
				6,50000		
<b>Díl: 63</b>						<b>4 799,92</b>
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
	268 631313611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , 5,2*1,25*0,12	m3	0,78000	3 305,00	2 577,90
				0,78000		
	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 6,5*7,9/1000*1,2	t	0,06162	36 060,00	2 222,02
				0,06162		
<b>Díl: 9</b>						<b>1 575,60</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
	974031264R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	5,20000	303,00	1 575,60
<b>Díl: 99</b>						<b>986,70</b>
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
	376 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	3,30000	299,00	986,70
<b>Díl: 767</b>						<b>137 500,00</b>
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg schodiště vč. zábradlí vč.přesunu, likvidace	kg	5 000,00000	27,50	137 500,00



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** REALIZACE 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa  
 ZMĚNOVÉ LISTY  
**Objekt:** ZL 25 Nová obytná místnost  
**Rozpočet:** ZL 25 Nová obytná místnost ODPOČET

**Objednatel:** IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-35 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-35 000,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-35 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-7 350,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-42 350,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-35 000,00	100
Cena celkem					-35 000,00	100



### Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 20 KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 25	Nová obytná místnost
R:	ZL 25	Nová obytná místnost ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>-35 000,00</b>
558	775PCD01	D+M - Repase stávajícího dřevěného schodiště - kompletní provedení	soub	-1,00000	35 000,00	-35 000,00



**Změnový list číslo 26****Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D.,MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

**Předmět změnového listu**

Mobilní stěna

**Část díla dotčená změnovým listem**

1.NP

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní PD je navržena dřevěná interiérová lamelová shrnovací stěna, která odděluje m.č. 108 a 109.

**Nové řešení :**

Nově se navrhuje dodávka a montáž interiérové mobilní stěny MULTIWAL SELECT 90U o čtyřech panelech, která bude oddělovat salonek (m.č. 108) a jídelnu (m.č. 109).

**Zdůvodnění změny :**

Jedná se o požadavek budoucího uživatele na vyšší standard shrnovací stěny a lepší zvukovou izolaci.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna si vyžádá doplnění PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č. 27 ze dne 6.5.2020.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	129 900,00 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	- 24 500,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	105 400,00 Kč

