


Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 18

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Přímotopy - úprava II

Část díla dotčená změnovým listem

celá stavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala dodávku a montáž 5 ks el. přímotopných konvertorů 500W a 1 ks el. akumulčních kamen 400V/4000W v přístavbě. Ve stávajícím objektu měly být ponechány stávající akumulční kamna.

Nové řešení :

Stávající objekty i přístavba byla osazena elektrickými přímotopy 2000W a 500W.

Zdůvodnění změny :

Nahrazení stávajících akumulčních kamen na přímotopy řešil změnový list č. 13. Na všechna místa však nešlo osadit přímotop 2000W, resp. by osazení tak výkonného přímotopu bylo v dané místnosti zbytečné. Ve pěti případech, kde osazení přímotopu o 500W předepisovala PD, byl proto osazen přímotop pouze o 500W.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Stavební deník - list č. 3441597.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení estetického vzhledu místností, zvýšení životnosti elektrického vytápění stávajícího objektu.


Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	12 280,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-12 210,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	70,00 Kč
DPH:	14,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	84,70 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický design investora:
		
datum:	datum:	2 6. 06. 2020
	zkontroloval:	
	LK	

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektroinstalace - silnoproud		12 280,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			12 280,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

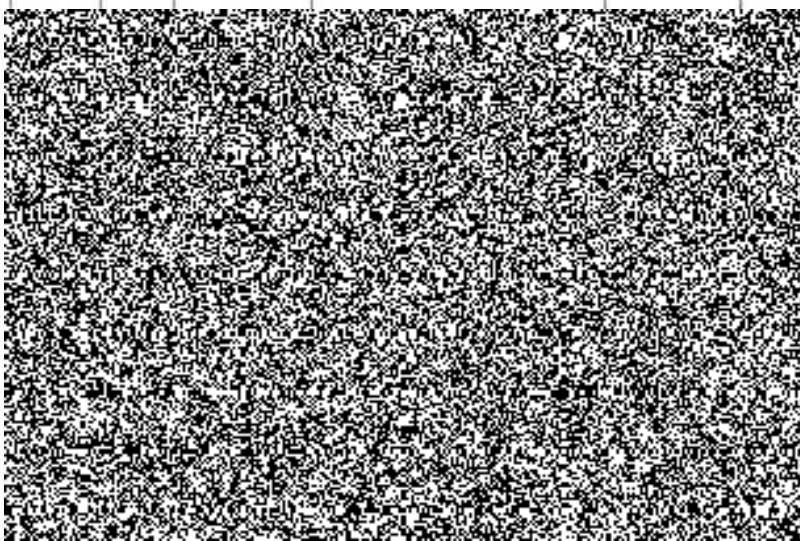
REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektroinstalace - silnoproud		-12 210,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-12 210,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-12 210,00	0,00
CELKEM VRN				0,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Odpočet

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IVAK s.r.o.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PSV					-12 210,00						
		Elektroinstalace - silnoproud					-12 210,00						
SoD	1	VCPZL13 1	Přímotop STIEBEL ELTRON 2000W vč. Montáže	ks	-3,00000	4 070,00	-12 210,00						
Celkem změnový list							-12 210,00						

Za zhotovitele	
Za projektanta	
Za objednatele	
Za technického zástupce	


ZMĚNOVÝ LIST č. 18

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV							12 280,00						
Elektroinstalace - silnoproud							12 280,00						
SOD	1	SoD silnoproud pol.č. 15	El. přímotopný konvertor 500W	ks	5,00000	2 456,00	12 280,00	1 856,00	9 280,00	600,00	3 000,00		
Celkem změnový list							12 280,00						


Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Za technický dozor:	

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 19

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Rampa

Část díla dotčená změnovým listem

Přístavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Bezbariérový přístup do nové přístavby, která bude sloužit užívání veřejnosti je projektovou dokumentací navržen přes rampu.

Nové řešení :

Přístupová rampa byla provedena dle požadavků NIPI.

Zdůvodnění změny :

Konzultační orgán NIPI požadoval úpravu rozměrů původně navržené rampy. Rozměry rampy byly proto ve stavebním řízení upraveny dle požadavků NIPI. Změna rozměrů se však neprojevila v soupisu prací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Stavební deník - list č. 3441597.


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne, kvalita i užité vlastnosti zůstávají zachovány.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	2 657,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 657,20 Kč
DPH:	558,01 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	3 215,21 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
datum:	datum:	datum:
		26. 08. 2020
		kontroloval:
		LK

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
IVAK s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767		2 657,20			
CELKEM OBJEKT	0,00	2 657,20	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			2 657,20	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
IVAK s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Za technický dozor inv	

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV							2 657,20						
767 Zámečnické výrobky vč. povrchové úpravy a přesunu hmot							2 657,20						
SOD	1	SoD pol.č. 122	Nosný profil rampy UE 200 mm	kg	25,30	49,00	1 239,70						
			původní výměra (3,0+1,5)*2*25,3	kg	227,70								
			nová výměra (3,0+2,0)*2*25,3	kg	253,00								
			rozdíl	kg	25,30								
SOD	2	SoD pol.č. 123	Slzičkový plech rampy tl.6 mm	m ²	0,75	1 890,00	1 417,50						
			původní výměra (3,0+1,5)*1,5	m ²	6,75								
			nová výměra (3,0+2,0)*1,5	m ²	7,50								
			rozdíl	m ²	0,75								
Celkem změnový list							2 657,20						

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Za technický doz:


NA ZALCADE EMAIL ZPRÁVY 6.5.2020

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 20

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Kanalizační přípojka

Část díla dotčená změnovým listem

ZTI

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala napojení odkanalizování nové přístavby do stávající kanalizační přípojky.

Nové řešení :

Byla provedena oprava potrubí části kanalizační přípojky.

Zdůvodnění změny :

Při přípravě připojení kanalizační přípojky přístavby objektu bylo zhotovitelem zjištěno, že splaškové vody se stávající kanalizační přípojkou vrací zpět do revizní šachty. Objednatel požádal zhotovitele o provedení vyčištění a kamerové prohlídky stávající přípojky, a to v úseku od septiku až po napojení na veřejnou stoku - viz změnový list č. 4. Prohlídkou bylo zjištěno poškození části potrubí na přípojce. Poškozená část potrubí byla opravena.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Stavební deník - list č. 3441597 a 3441584.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne, kvalita i užitné vlastnosti zůstávají zachovány.


Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	22 763,14 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	22 763,14 Kč
DPH:	4 780,26 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	27 543,40 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
datum:	datum:	26.03.2020
	zkontroloval:	
	P LK	

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 024,14				
8 Trubní vedení	6 359,00				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 380,00				
CELKEM OBJEKT	22 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			22 763,14	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 






REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
	
Za projektanta:	
	
Za objednatele:	
	
Za technický dozor investora:	
	

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvíkov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV							22 763,14						
1 Zemní práce							15 024,14						
ÚRS	1	139 60-0012.RA0	Ruční výkop v hornině 3 v cestě 5x0,6x1,4 mimo cestu 7x0,6x1,3	m ³	9,66	1 183,00	11 427,78			1 183,00	11 427,78		
ÚRS	2	174 10-0010.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 5x0,6x1,1 + 7x0,6x1,3	m ³	8,76	129,50	1 134,42			129,50	1 134,42		
ÚRS	3	175 10-0020.RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem 7x0,3x0,6	m ³	1,26	924,00	1 164,24	456,20	574,81	467,80	589,43		
ÚRS	4	174 10-0050.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, asfaltový recyklát 5x 0,6x0,3 + 5x0,2 (opr.plochy)	m ³	1,90	683,00	1 297,70	488,90	928,91	194,10	368,79		
8 Trubní vedení							6 359,00						
IK	5	VCPkanpřip1	Pokládka a dopojení KG 160	m	7,00	516,00	3 612,00			516,00	3 612,00		
IK	6	VCPkanpřip2	Dodávka a montáž revizní šachty DN160 průběžná	ks	1,00	1 467,00	1 467,00			1 467,00	1 467,00		
IK	7	VCPkanpřip3	Dodávka a montáž trubního nístavce 400	m	1,00	740,00	740,00			740,00	740,00		
IK	8	VCPkanpřip4	Dodávka a montáž poklopu 400	ks	1,00	540,00	540,00			540,00	540,00		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 380,00						
IK	9	VCPkanpřip5	použití stavební mechanizace, vibr.pěch, vibr.deska	den	1,00	1 380,00	1 380,00			1 380,00	1 380,00		
Celkem změnový list							22 763,14						

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:



Za technický dozor stavebníka:



