

ZMĚNOVÝ LIST č. 96

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Kotvení ocelových sloupů do stávajícího zdiva“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (5 stran A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika jsou ocelové sloupy kotveny do stávajícího zdiva či prokotveny mezi sebou (2.NP-5.NP) z důvodu provázání konstrukcí a ztužení objektu.

2) Technický popis:

Navrtání stávajícího zdiva, kotvení roxoru na chemii, přivaření k ocel.sloupu, nátěr či přivaření roxoru mezi dva protilehlé sloupy ve zdi, nátěr.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +82.366,57 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	9.6.2020
--------	----------

Změnový list č.96

Stavba:Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Kotvení ocelových sloupů do stávajícího zdiva

Místo:Dejvická 184/4

Datum:12.03.2020

Zadavatel:Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 366,57	
480	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	55,500			CS ÚRS 2020 01
			kotvení sloupů do zdi 0,15 m:					
			2.NP - 2 ks na výšku sloupu 37*2*0,15			11,100		
			3.NP - 2 ks na výšku sloupu 37*2*0,15			11,100		
			4.NP - 3 ks na výšku sloupu 37*3*0,15			16,650		
			5.NP - 3 ks na výšku sloupu 37*3*0,15			16,650		
481	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16 mm	t	0,267			
			kotvení sloupů do zdi: délka 30 cm					
			2.NP - 2 ks na výšku sloupu 37*2*0,3*1,15*1,58/1000			0,040		
			3.NP - 2 ks na výšku sloupu 37*2*0,3*1,15*1,58/1000			0,040		
			4.NP - 3 ks na výšku sloupu 37*3*0,3*1,15*1,58/1000			0,061		
			5.NP - 3 ks na výšku sloupu 37*3*0,3*1,15*1,58/1000			0,061		
			kotvení sloupů mezi sebou: délka 30 cm					
			2.NP - 2 ks na výšku sloupu 15*2*0,3*1,15*1,58/1000			0,016		
			3.NP - 2 ks na výšku sloupu 15*2*0,3*1,15*1,58/1000			0,016		
			4.NP - 3 ks na výšku sloupu 15*2*0,3*1,15*1,58/1000			0,016		
			5.NP - 3 ks na výšku sloupu 15*2*0,3*1,15*1,58/1000			0,016		
178	K	413941001R	Nosné svary stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků	m	42,700			
			kotvení sloupů do zdi: svar 7 cm					
			2.NP - 2 ks na výšku sloupu 37*2*0,07			5,180		
			3.NP - 2 ks na výšku sloupu 37*2*0,07			5,180		
			4.NP - 3 ks na výšku sloupu 37*3*0,07			7,770		
			5.NP - 3 ks na výšku sloupu 37*3*0,07			7,770		
			kotvení sloupů mezi sebou: 2x svar 7 cm					
			2.NP - 2 ks na výšku sloupu 15*2*0,07*2			4,200		
			3.NP - 2 ks na výšku sloupu 15*2*0,07*2			4,200		
			4.NP - 3 ks na výšku sloupu 15*2*0,07*2			4,200		
			5.NP - 3 ks na výšku sloupu 15*2*0,07*2			4,200		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,314			
		HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick (nátěr přivařených kotev a svarů)	hod	20,333			CS ÚRS 2020 01
			15 ks za hodinu - celkem 610 ks: 610/30			20,333		
0	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		%	10,170			

This architectural floor plan depicts a large building with a complex internal layout. A grid system is overlaid on the plan, with vertical grid lines labeled 1 through 10 and horizontal grid lines labeled A through S. The plan includes numerous rooms, corridors, and service areas, each identified by a unique alphanumeric code (e.g., 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 9

3.07



This architectural drawing is a detailed floor plan of a multi-story building. It features a grid system with horizontal and vertical dimensions. The plan includes numerous circular column footings, some labeled with numbers like 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Beams are shown as solid lines, and stairs are indicated by dashed lines and labels like 'STAIRS'. There are also various annotations such as 'E-122', 'E-123', 'E-124', 'E-125', 'E-126', 'E-127', 'E-128', 'E-129', 'E-130', 'E-131', 'E-132', 'E-133', 'E-134', 'E-135', 'E-136', 'E-137', 'E-138', 'E-139', 'E-140', 'E-141', 'E-142', 'E-143', 'E-144', 'E-145', 'E-146', 'E-147', 'E-148', 'E-149', 'E-150', 'E-151', 'E-152', 'E-153', 'E-154', 'E-155', 'E-156', 'E-157', 'E-158', 'E-159', 'E-160', 'E-161', 'E-162', 'E-163', 'E-164', 'E-165', 'E-166', 'E-167', 'E-168', 'E-169', 'E-170', 'E-171', 'E-172', 'E-173', 'E-174', 'E-175', 'E-176', 'E-177', 'E-178', 'E-179', 'E-180', 'E-181', 'E-182', 'E-183', 'E-184', 'E-185', 'E-186', 'E-187', 'E-188', 'E-189', 'E-190', 'E-191', 'E-192', 'E-193', 'E-194', 'E-195', 'E-196', 'E-197', 'E-198', 'E-199', 'E-200'. The drawing is oriented horizontally, with the top edge representing the north direction. The overall layout shows a large rectangular footprint with several internal divisions and a complex network of structural elements.





ZMĚNOVÝ LIST č. 98

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání a zazdívky pro ocelové sloupky 5.NP_1.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 - Fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Narovnání na skutečnost (5.NP sloupky - 1.část) - je nutné provést větší rýhy ve zdivu dostatečně velké pro manipulaci s ocelovou konstrukcí a pro provázání stávajícího a nového zdiva.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu pro osazení ocelových konstrukcí v 5.NP (kterých sloupů se zatím týká, je vyznačeno v přiloženém půdoryse), vč. větší zazdívky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 44.663,12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 10 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	17.6.2020	16.6.2020	16.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

16.6.2020

Datum:

Změnový list č.98

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání a zazdívký pro ocelové sloupy 5.NP_1.část

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

27.03.2020

Zadavatel:


Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 663,12	
			Od +15,300 (podlaha 5.NP) po +18,770 (podlaha 5.NP)					
435	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	-3,500			
	VV	1/2 objemu 5.NP	"pro profil ozn.452*3,5*2 * 1/2			-3,500		
436	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	-3,500			
	VV	1/2 objemu 5.NP	"pro profil ozn.452*3,5*2 * 1/2			-3,500		
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-1,750			
	VV	1/2 objemu 5.NP	"pro profil ozn.452*3,5 * 1/2			-1,750		
439	K	974031175R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 200 mm	m	-40,460			
	VV	1/2 objemu 5.NP	"pro profil ozn.452*3,5*28 * 1/2			-49,000		
			pozice 3: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 3,47 m			3,470		
			pozice 6: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 0,8 m			0,800		
			pozice 8: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 3,47 m			3,470		
			pozice 10: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 0,8 m			0,800		
440	K	974031176R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 300 mm	m	-5,280			
	VV	1/2 objemu 5.NP	"pro profil ozn.452*3,5*5 * 1/2			-8,750		
			pozice 2: 5.NP: š. 0,30, hl. 0,20, d. 3,47 m			3,470		
442	K	974031185R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 300 mm	m	15,600			
	VV	1/2 objemu 5.NP	"pro profil ozn.452*3,5*1/2			-1,750		
			pozice 4: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m			3,470		
			pozice 9: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m			3,470		
			pozice 12: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m			3,470		
			pozice 13: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m			3,470		
			pozice 14: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m			3,470		
443	K	974031193R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 500 mm	m	6,940			
			pozice 3 5.NP: š. 0,35, hl. 0,35, d. 3,47 m			3,470		
			pozice 11: 5.NP: š. 0,40, hl. 0,30, d. 3,47 m			3,470		
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupy ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	2,377			
			pozice 1: 5.NP: š. 0,40, hl. 0,50, d. 3,47 m			0,694		
			pozice 7: 5.NP: š. 0,70, hl. 0,35, d. 3,47 m			0,850		
			pozice 15: 5.NP: š. 0,60, hl. 0,40, d. 1,47 m			0,832		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	5,898			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,898			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,572			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	5,898			
131	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	10,502			
	VV		"sloupky ocel.kce"					
	VV		"4NP-5NP(0,2*9+0,12+0,18*1+0,24*1+0,16*1+0,28*3,03			-8,423		
			pozice 1: 5.NP: š. 0,40, hl. 0,50, d. 3,47 m			1,388		
			pozice 2: 5.NP: š. 0,30, hl. 0,20, d. 3,47 m			1,041		
			pozice 3 5.NP: š. 0,35, hl. 0,35, d. 3,47 m			1,215		
			pozice 4: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m			1,215		
			pozice 5: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 3,47 m			0,694		
			pozice 6: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 0,8 m			0,160		
			pozice 6: 5.NP: š. 0,40, hl. 0,50, d. (3,47-0,8) m			1,068		
			pozice 7: 5.NP: š. 0,70, hl. 0,35, d. 3,47 m			2,429		
			pozice 8: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 3,47 m			0,694		
			pozice 9: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m			1,215		
			pozice 10: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 3,47 m			0,694		
			pozice 11: 5.NP: š. 0,40, hl. 0,30, d. 3,47 m			1,388		
			pozice 12: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m			1,215		
			pozice 13: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m			1,215		
			pozice 14: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m			1,215		
			pozice 15: 5.NP: š. 0,60, hl. 0,40, d. 3,47 m			2,082		
72	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,581			
			pozice 1: 5.NP: š. 0,40, hl. 0,50, d. 3,47 m: 0,4*0,5*3,47-0,14*1,388			0,500		
			pozice 2: 5.NP: š. 0,30, hl. 0,20, d. 3,47 m: 0,3*0,2*3,47-0,14*1,041			0,062		
			pozice 3 5.NP: š. 0,35, hl. 0,35, d. 3,47 m: 0,35*0,35*3,47-0,14*1,215			0,255		
			pozice 4: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m: 0,35*0,3*3,47-0,14*1,215			0,194		
			pozice 5: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 3,47 m: 0,2*0,2*3,47-0,14*0,694			0,042		
			pozice 6: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 0,8 m: 0,2*0,2*0,8-0,14*0,16			0,010		
			pozice 6: 5.NP: š. 0,40, hl. 0,50, d. (3,47-0,8) m: 0,4*0,5*(3,47-0,8)-0,14*1,068			0,384		
			pozice 7: 5.NP: š. 0,70, hl. 0,35, d. 3,47 m: 0,7*0,35*3,47-0,14*2,429			0,510		
			pozice 8: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 3,47 m: 0,2*0,2*3,47-0,14*0,694			0,042		
			pozice 9: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m: 0,35*0,3*3,47-0,14*1,215			0,194		
			pozice 10: 5.NP: š. 0,20, hl. 0,20, d. 3,47 m: 0,2*0,2*3,47-0,14*0,694			0,042		
			pozice 11: 5.NP: š. 0,40, hl. 0,30, d. 3,47 m: 0,4*0,3*3,47-0,14*1,388			0,222		
			pozice 12: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m: 0,35*0,3*3,47-0,14*1,215			0,194		
			pozice 13: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m: 0,35*0,3*3,47-0,14*1,215			0,194		
			pozice 14: 5.NP: š. 0,35, hl. 0,30, d. 3,47 m: 0,35*0,3*3,47-0,14*1,215			0,194		
			pozice 15: 5.NP: š. 0,60, hl. 0,40, d. 3,47 m: 0,6*0,4*3,47-0,14*2,082			0,541		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	9,387			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

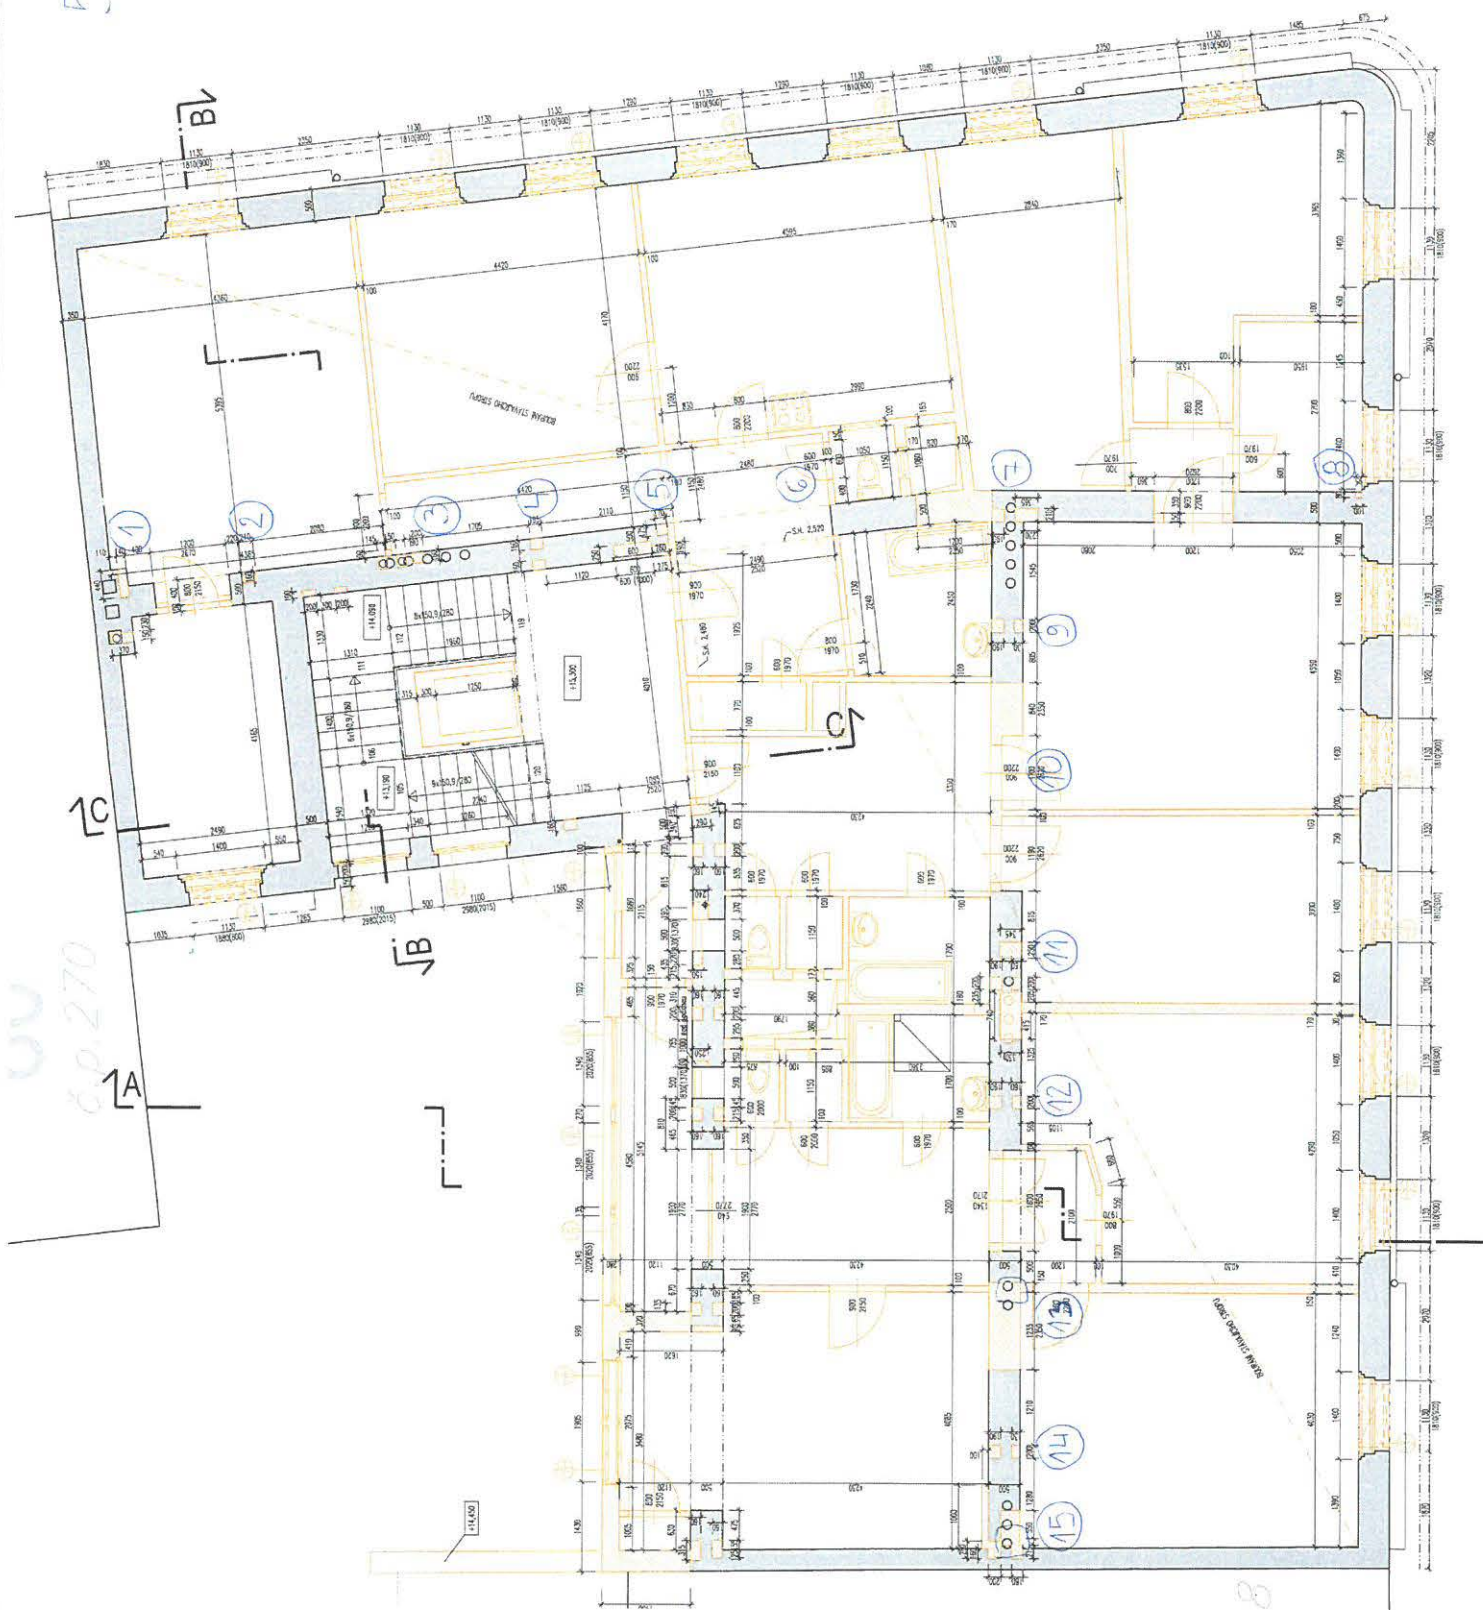

ZMĚNOVÝ LIST č. 99

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úpravy u stropní kce 4.NP_1.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací u stropní konstrukce 4.NP_1.část na základě požadavku statika - vybourání zdiva – vodorovné rýhy a kapsy (větší rozsah z důvodu manipulačního prostoru a ze statických důvodů – odbourání překladů nad okny....) a zazdění vodorovné ocelové konstrukce rámu, navíc kotvení ocelových nosníků do zdiva, úprava rozsahu kotvení výztuže do zdiva.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh a kapes ve zdivu pro osazení vodorovných částí ocelových rámu a s tím související větší rozsah zazdívek. Bourání rýh v ŽB věnci. Kotvení do zdiva ocelových nosníků uložených na ocelové rámy – vyvrtání+kotvy na chemii+přivaření na nosník+nátěr. Větší rozsah kotvení výztuže do zdiva – po celém obvodu stropu. Odpočet příslušných původních položek z rozpočtu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 52.387,12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	17.6.2020	17.6.2020	17.6.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:	17.6.2020			
Datum:				

Změnový list č.99

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt:

Úpravy u stropní kce 4.NP_1.část


Místo: Dejvická 184/4 Datum: 27.03.2020
Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
Uchazeč: KONSIT a.s. Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 387,12	
66	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	-108,000			
			VV: dle výkazu odpočet v 4.NP "rákosníky" 326/3		-108,000			
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	-75,000			
			VV: dle výkazu odpočet v 4.NP "po trámech strop nad "4NP"15*4+20*2+5*2		-110,000			
			ponecháno z výkazu v 4.NP jen v obvodových zdech "po trámech strop nad "2NP"15+18+2		35,000			
95	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	3,804			
			police 1-13: délka cca (16,6-5*0,3)*0,6*0,25+(7-3*0,3)*0,6*0,15+(7,5-3*0,3)*0,6*0,25		3,804			
97	K	317314101R	Podbetonování ocelových nosníků uložených na zdivu š.30 cm o výšce 25 cm betonem C 20/25 včetně bednění a odbednění	m	-27,700			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 4NP"4.NP - 1.část: 16,6+11,1		-27,700			
98	K	317314130R	Podbetonování zhlaví nosníků, uložení na zdivo do 300 mm	kus	1,000			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 4NP" - 1.část: 19		-19,000			
			skutečnost 4.NP 1.část: 20		20,000			
133	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-6,094			
			dle výkazu odpočet "4NP nosníky průvlaků vnitřních rámců" - 1.část: (16,6+11,1)*0,22		-6,094			
177	K	413233221R	Zabetonování zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	1,000			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 4NP" - 1.část: 19		-19,000			
			4.NP 1.část: 20		20,000			
479	K	985331211	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	21,876			
			výztuž do zdi - dle výkazu: "4.NP 88 kusů" -88*0,25		-22,000			
			výztuž do zdi - skutečnost-po 0,5m po celém obvodu stropu: (20,7+20,7+5,4+6,21+2,49+4,17+4,17+16,3+16,3+5,38+5,38)/0,5*0,2		43,876			
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,044			
			výztuž do zdi - 4.NP dle výkazu 0,75 m x 88 ks: -88*0,75*1,15*0,39/1000		-0,030			
			výztuž do zdi - skutečnost 0,75 m po 0,5m po celém obvodu stropu: (20,7+20,7+5,4+6,21+2,49+4,17+4,17+16,3+16,3+5,38+5,38)/0,5*0,75*1,15*0,39/1000		0,074			
480	K	985331215	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	17,800			
			kotvení nosníků do zdi: 89 ks 25 cm: 89*0,2		17,800			
481	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D16 mm	t	0,081			
			kotvení nosníků do zdi: 89 ks délka 50 cm: 89*0,5*1,15*1,58/1000		0,081			
178	K	413941001R	Nosné sváry stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků	m	6,230			
			89*0,07		6,230			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-3,594			
426	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	-5,000			
			dle výkazu odpočet: "4NP" - 1.část: 19		-19,000			
			skutečnost 4.NP 1.část: 14		14,000			
444	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	3,010			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 4NP"4.NP - 1.část: 16,6+11,1		-27,700			
			police 1-13: délka cca (16,3+14,4)* výška 0,3 m zdivo -0,3 beton, hloubka 0,25: 32,56		30,71			
445	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	-83,100			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 4.NP"4.NP - 1.část (16,6+11,1)*3		-83,100			
			police 1-13: viz. položka 9730411511		0,000			
		974049167	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 300 mm	m	6,100			
			7-3*0,3		6,100			
		974049169	Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	6,100			
			7-3*0,3		6,100			
		974049187	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 300 mm	m	21,600			

			16,6+7,4+5*0,3+3*0,3		21,600	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,154	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,154	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,151	
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,154	
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170	

1. $\frac{1}{2} \log 2$

4. NP

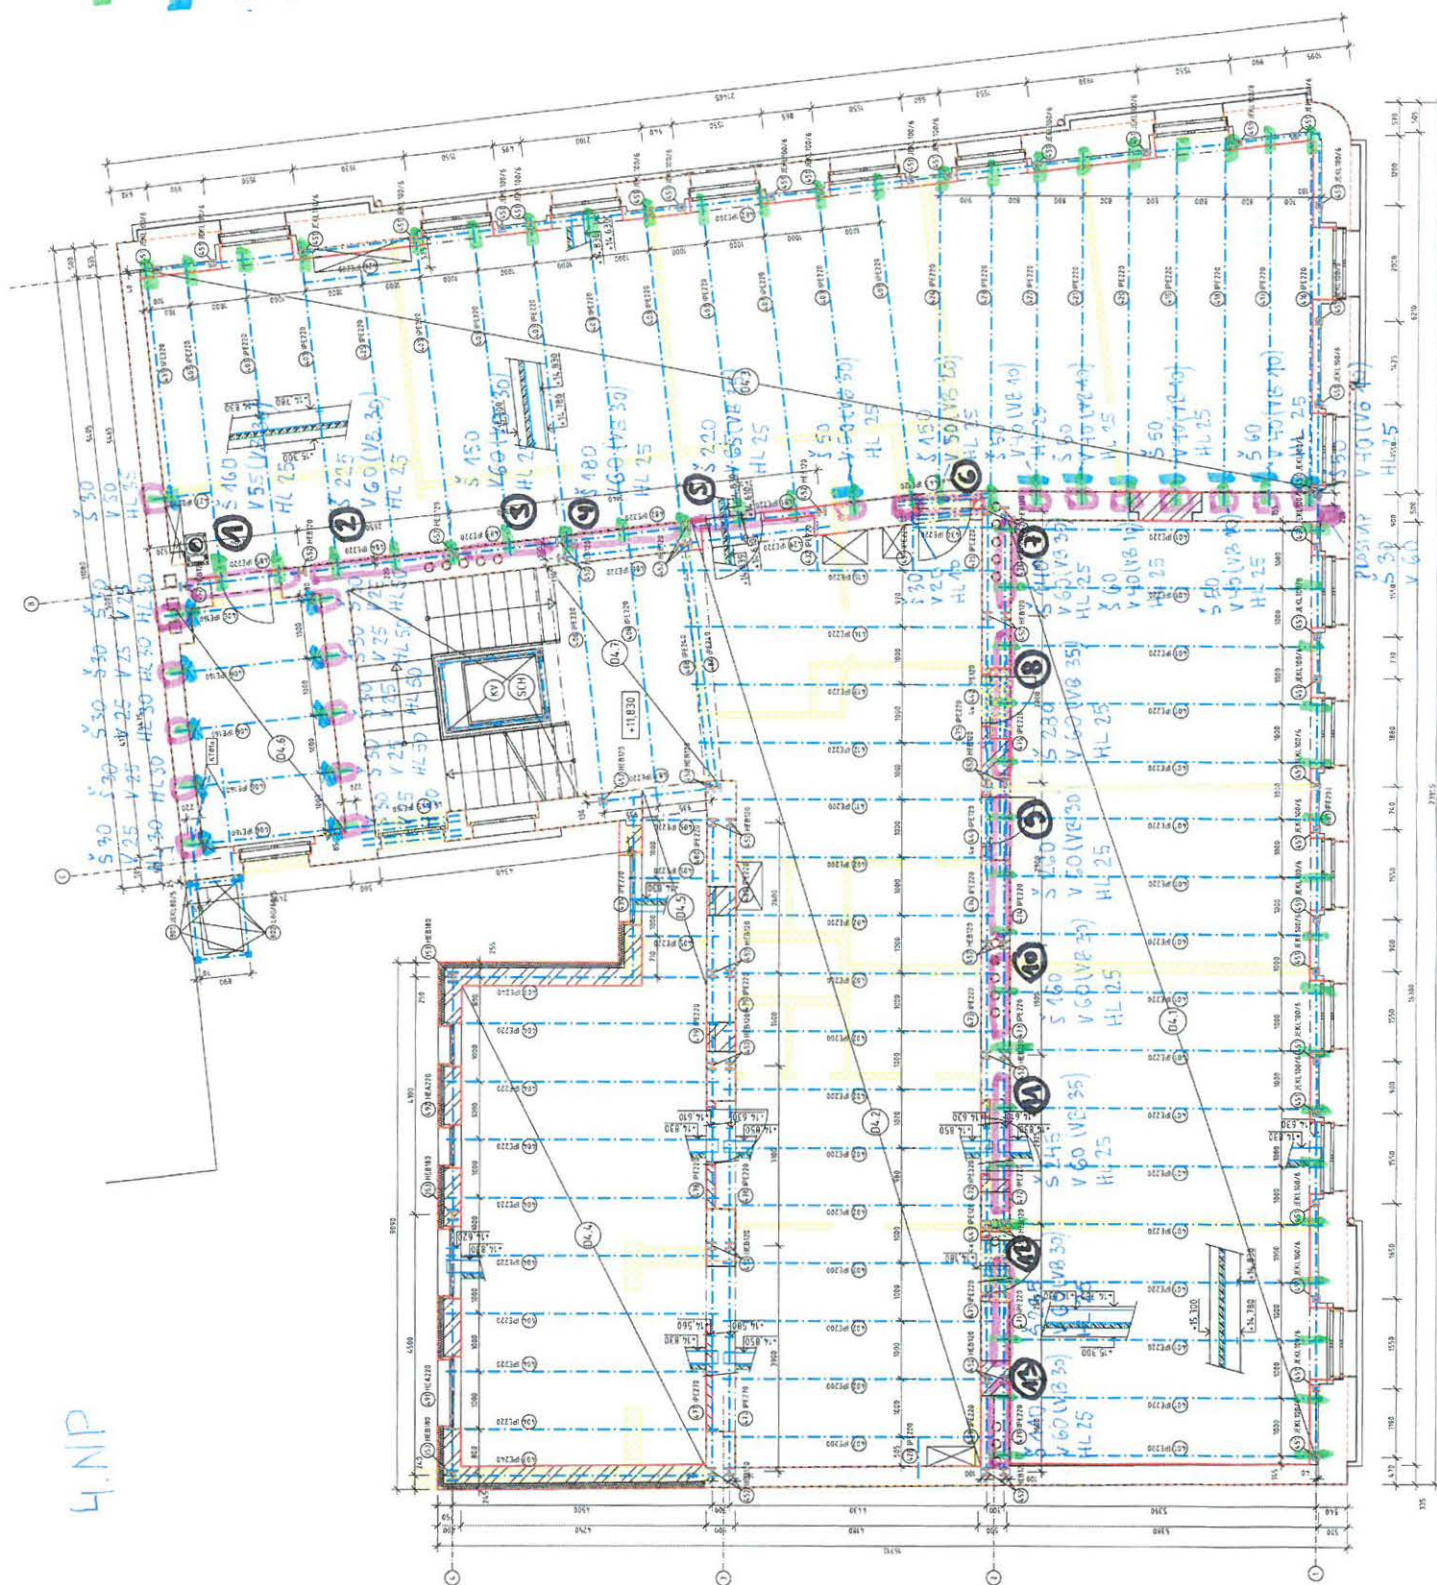

ZMĚNOVÝ LIST č. 101

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úpravy u stropní kce 1.PP_1.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením(1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací u stropní konstrukce 1.PP_1.část na základě požadavku statika - vybourání zdiva – vodorovné rýhy a kapsy (větší rozsah z důvodu manipulačního prostoru a ze statických důvodů) a zazdění ocelových konstrukcí, navíc kotvení ocelových nosníků do zdiva, úprava rozsahu kotvení výztuže do zdiva.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh a kapes ve zdivu pro osazení vodorovných částí ocelové kce a s tím související větší rozsah zazdívek. Kotvení do zdiva ocelových nosníků– vyvrtání+kotvy na chemii+přivaření na nosník+nátěr. Větší rozsah kotvení výztuže do zdiva – po celém obvodu stropu. Odpočet příslušných původních položek z rozpočtu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 50.350,10 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	23.6.2020	23.6.2020	23.6.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:	23.6.			
Datum:				

Změnový list č.101

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: Úpravy u stropní kce 1.PP_1.část

Místo: Dejvická 184/4

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Uchazeč: KONSIT a.s.


Datum: 31.03.2020

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 350,10	
95	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,245			
			odpočet dle výkazu: "ozn.043"1,35*0,8*0,16 (1 ks odečet, 1 ks zůstává)		-0,173			
			skutečnost 1.PP 1.část: 1,2*0,5*0,35+1,2*(0,5-0,1)*0,35+1,3*0,5*0,4*2+1,3*0,5*0,4*2		1,418			
97	K	317314101R	Podbetonování ocelových nosníků uložených na zdivu š.30 cm o výšce 25 cm betonem C 20/25 včetně bednění a odbednění	m	1,200			
			skutečnost 1.PP 1.část: 1,2		1,200			
98	K	317314130R	Podbetonování zhlaví nosníků, uložení na zdivo do 300 mm	kus	11,000			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 1PP" - 1.část: 26		-26,000			
			skutečnost 1.PP 1.část:37		37,000			
132	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-1,851			
			dle výkaz odpočet "nosník 041"1,4*2*0,12		-0,336			
			dle výkaz odpočet "nosník 042"1,46*1*0,12 (1 ks zbyde)		-0,175			
			dle výkaz odpočet "nosník 043"1,86*3*0,16 (2 ks zbydou)		-0,893			
			dle výkaz odpočet "nosník 045"1,36*0,12		-0,163			
			dle výkaz odpočet "nosník 046"1,84*0,16		-0,294			
177	K	413233221R	Zabetonování zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	11,000			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 1PP" - 1.část: 26		-26,000			
			1.PP 1.část:37		37,000			
479	K	985331211	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	14,260			
			výztuž do zdi - dle výkazu: "1PP kusů -36*0,25		-9,000			
			výztuž do zdi - skutečnost po 0,5m po celém obvodu stropu: (3,58+3,58+6,725+6,725+8,36+8,36+4,69+4,69+2,11+2,11+3,61+3,61)/0,5 * 0,2		23,260			
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,028			
			výztuž do zdi - 1.NP dle výkazu 0,75 m x 36 ks: -36*0,75*1,15*0,39/1000		-0,012			
			výztuž do zdi - skutečnost 0,75 m po 0,5m po celém obvodu stropu: (3,58+3,58+6,725+6,725+8,36+8,36+4,69+4,69+2,11+2,11+3,61+3,61)/0,5 * 0,75*1,15*0,4/1000		0,040			
480	K	985331215	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,800			
			kotvení nosníků do zdi: 39 ks 20 cm: 39*0,2		7,800			
481	M	13021015	tyč ocelova žebírkova jakost Bst 5005 výztuž do betonu D 16 mm	t	0,035			
			kotvení nosníků do zdi: 839ks délka 50 cm: 39*0,5*1,15*1,58/1000		0,035			
178	K	413941001R	Nosné sváry stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků	m	2,730			
			39*0,07		2,730			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,242			
426	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	-26,000			
			dle výkazu odpočet: "1PP" - 1.část: 26		-26,000			
427	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	4,000			
			1.PP 1.část:3+1		4,000			
428	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	16,000			
			1.PP 1.část:10+4+1+1		16,000			
		973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	10,000			
			1.PP 1.část:4+4+2		10,000			
444	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	7,600			
			skutečnost 1.PP 1.část: 1,2+1,2		2,400			
			skutečnost 1.PP 1.část: 2*1,3+2*1,3		5,200			
445	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	15,200			
			skutečnost 1.PP 1.část: (1,2+1,2)*2		4,800			
			skutečnost 1.PP 1.část: (2*1,3+2*1,3)*2		10,400			

		973041511	Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pl přes 0,25 m2	m3	0,216		CS ÚRS 2020 01
			skutečnost 1. BP 1. část - vysekání v 28 konstrukcích-prahy: 0,35*0,3*0,3+0,35*0,3*0,3-0,35*0,3*0,3+0,35*0,3*0,3+0,3*0,3*0,3+0,35*0,3*0,3-0,35*0,3*0,3+0,35*0,3*0,3 0,3		0,216		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	3,638		
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,638		
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,929		
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,638		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170		

0.5 million

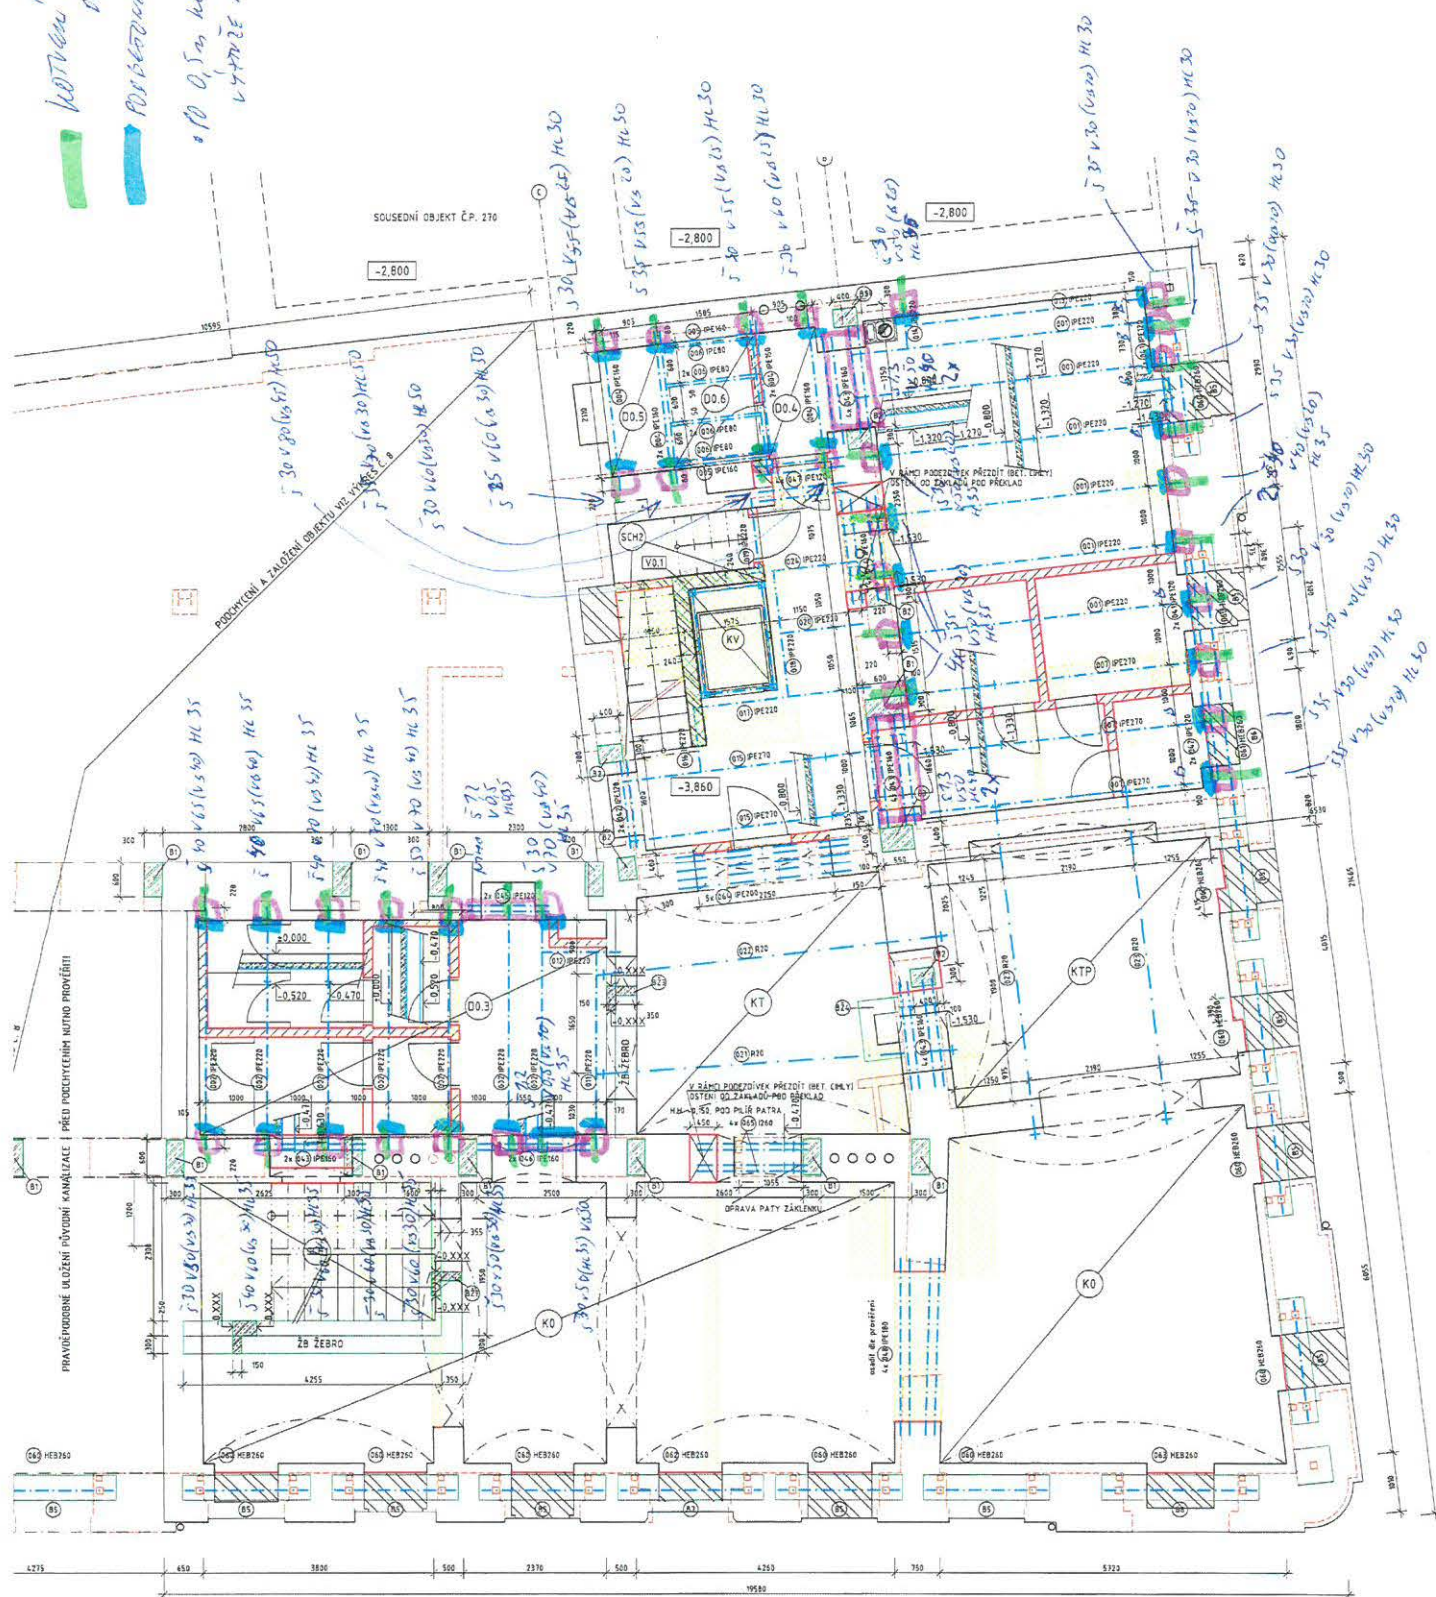

7. pp

ZMĚNOVÝ LIST č. 104

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Napojení na sousední objekty, oplechování“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

N základě požadavku objednatele bude provedeno napojení na sousední objekty v 1.NP v místě původního dvora, vč. oplechování.

2) Technický popis:

K sousední parcele č.82 bude vybetonován sokl na úroveň stávajícího žlabu a provedeno oplechování z TiZn 0,7 mm lesklého, vč. podkladní OSB desky. K sousední parcele č.80 bude stávající zídka zbavena TERACO dlažby, prostor mezi stávající zídou a novým zdívem bude oddílován XPS tl. 100 mm a zbytek vyplněn betonem s KARI sítí. Bude nadbetonován spádovaný věnec, který bude následně oplechován z Pz plechu s povrch.úpravou barvou RAL 8004, vč. podkladní OSB desky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zapracuje do PD pro provedení stavby

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce + 25.101.25,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní (Bez provedení nešlo pokračovat ve zdivu přístavby)

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum: 10.6.2020

Změnový list č.104

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: Napojení na sousední objekty, oplechování

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:

Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 101,25

Sousední parcela č.80


379	K	965081332	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2	m2	2,030	
			voarovně: 5,8°0,35		2,030	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,183	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,183	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,558	
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,183	
191	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,551	
			světle: 5,8°0,1°0,6		0,348	
			voarovně: 5,8°0,35°0,1		0,203	
192	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,580	
			5,8°0,1		0,580	
193	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,580	
194	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,060	
			KARI síť 8x100x100: 1°5,8°0,0079°1,3		0,060	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,418	
665	K	762441113R	Obložení atiky,OSB desky tl.12 mm,1vrst.,kotvenými do podkladního hranolu	m2	2,610	
			voarovně: 5,8°0,45		2,610	
666	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	2,610	
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	6,000	
744	K	764-K05R	Oplechování atiky z Pz plechu s povrch.úpravou barvou rš 770 mm vč.všech kotevních,spojovacích a ukončovcích prvků kompletní provedení tabulky výrobků ozn.K05	m	5,800	
783	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	2,000	

Sousední parcela č.82

191	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,252	
			4,2°0,4°0,15		0,252	
192	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,630	
			4,2°0,15		0,630	
193	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,630	
194	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,017	
			KARI síť 8x100x100: 0,4°4,2°0,0079°1,3		0,017	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,540	
665	K	762441113R	Obložení atiky,OSB desky tl.12 mm,1vrst.,kotvenými do podkladního hranolu	m2	2,100	
			4,2°0,5		2,100	
666	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	2,100	
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	6,000	
		764244409	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 800 mm	m	4,200	
783	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	2,000	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170	





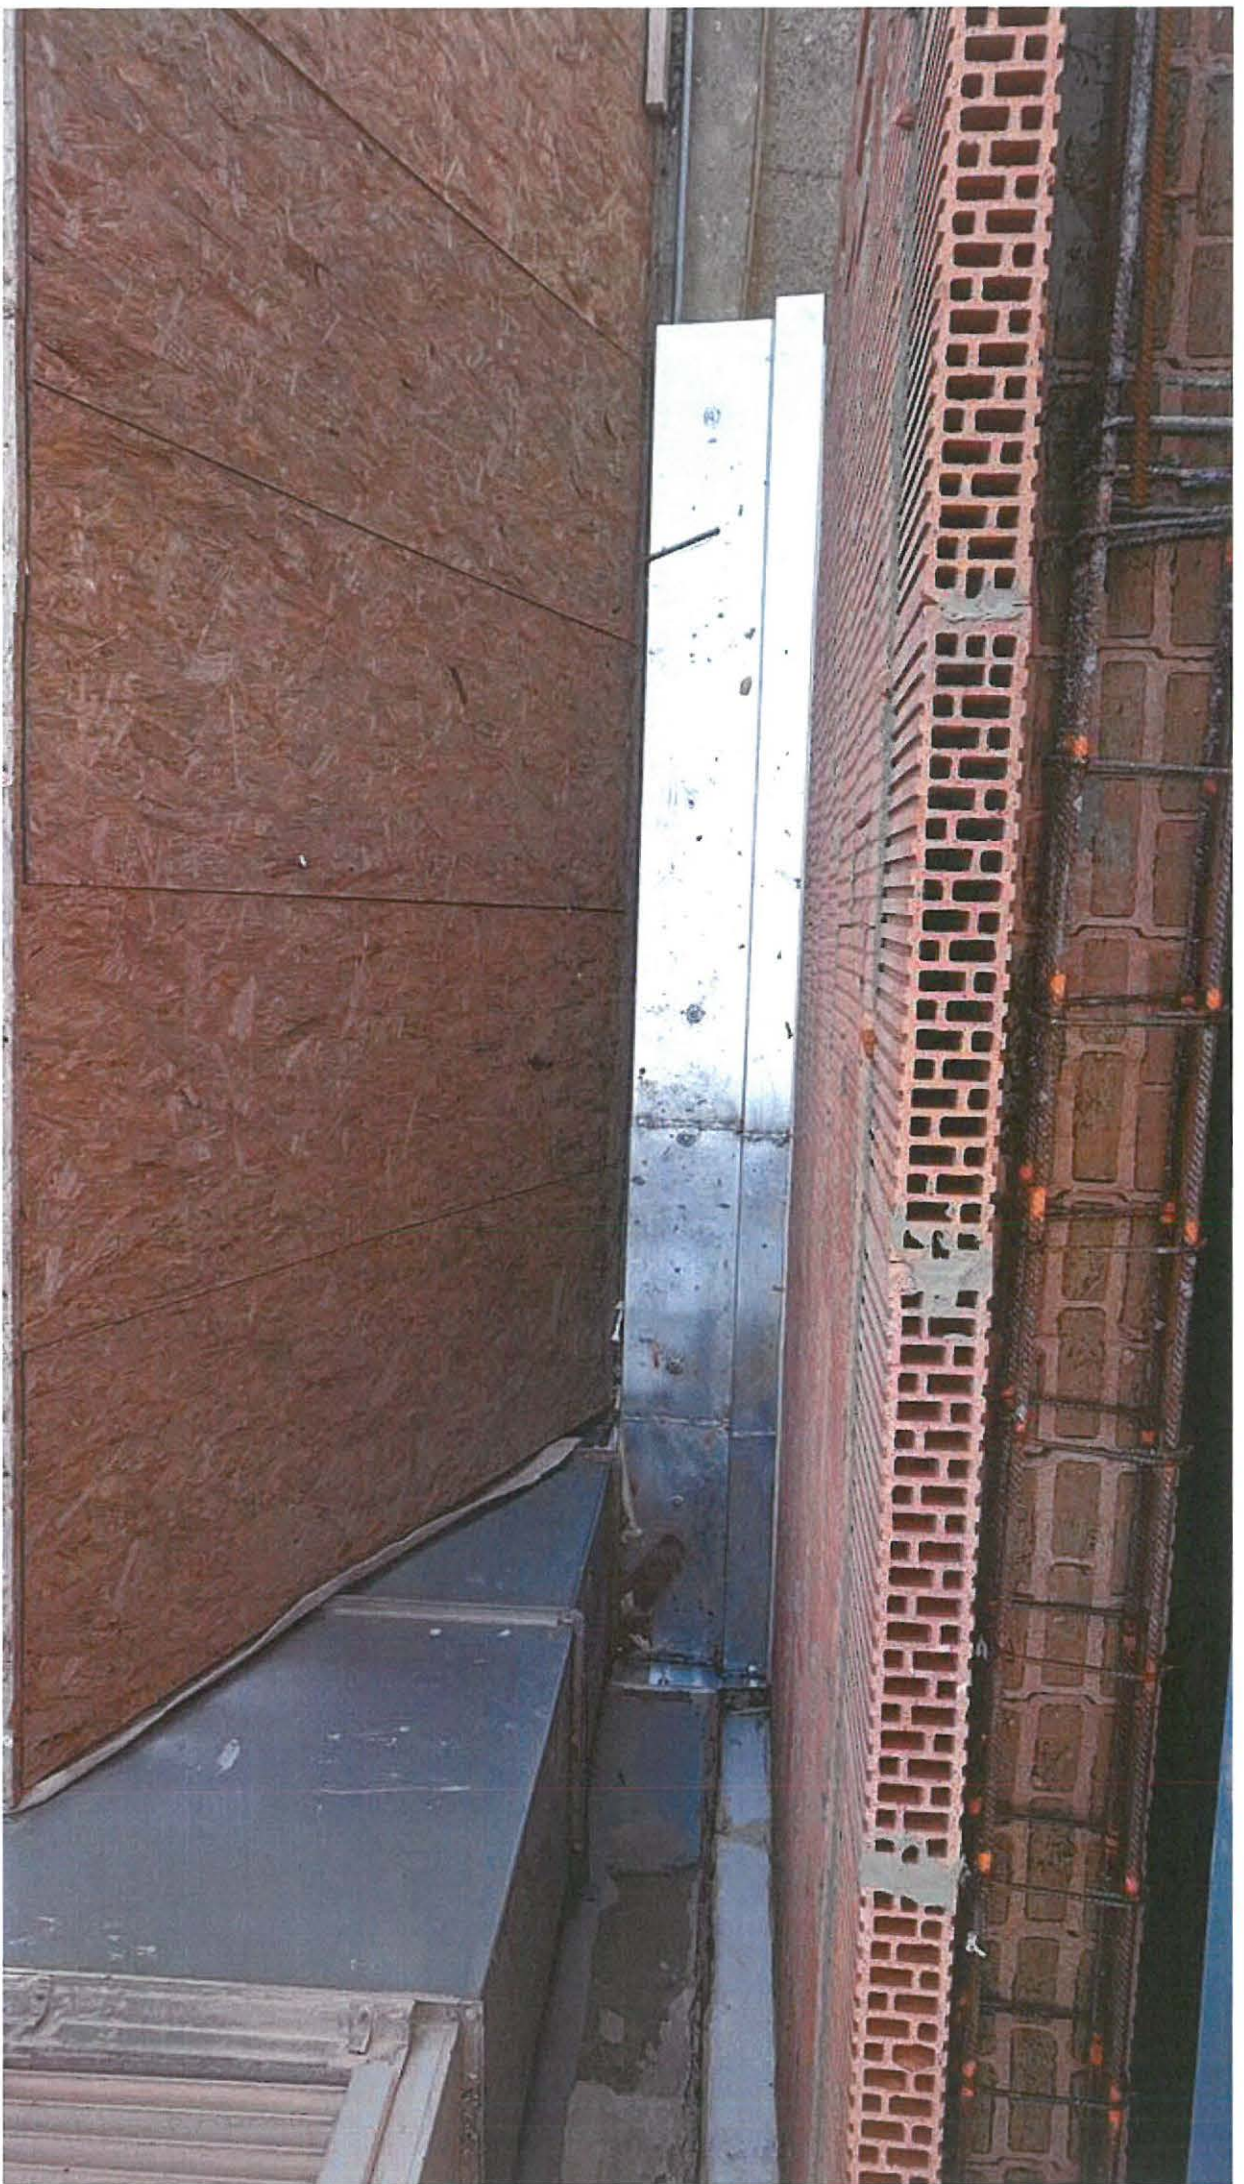

ZMĚNOVÝ LIST č. 106

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Stažení objektu v 3.NP - táhla“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí statika bude provedeno provizorní statické stažení objektu v 3.NP pomocí táhel.

2) Technický popis:

Dodávka a montáž ocelových táhel, vč. jejich ukotvení přes kotvící desku a dřevěné trámky. Předpoklad trvání statických opatření – do doby než rozhodne statik o odstranění.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 19.311,55 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum: 10.6.2020

Změnový list č.106

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvicka 184/4

Objekt:

Stažení objektu v 3.NP - táhla

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

30.04.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNED a.s.


Projektant:

Uchazeč:


KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 311,55	
483	K	985622221	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm s napínací maticí	m	16,500			
			3 ks x 5,5 m		16,5			
		977131118	Vrty příklepovými vrtáky D do 28 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,600			CS ÚRS 2020 I
			4 x 0,65		2,6			
651	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I	m3	0,070			
			Podklad mezi zdívkou a šrouby					
			(1.6+1.6+2.2+1.6)*0.1*0.1		0.070			
		767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	3,510			CS ÚRS 2020 I
			3*0.2*0.2*7800*0.003+3*0.1*0.1*7800*0.003		3.510			
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	3,510			
			kotevní desky PS: 3*0.2*0.2*7800*0.003+ 3*0.1*0.1*7800*0.003		3.51			
949	M	13010970	ocel profilová jakost I1 375	t	0,004			
			kotevní desky PS: (2*0.2*0.2*7800*0.003+ 3*0.1*0.1*7800*0.003)*1.06/1000		0.0037206			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

3.NP

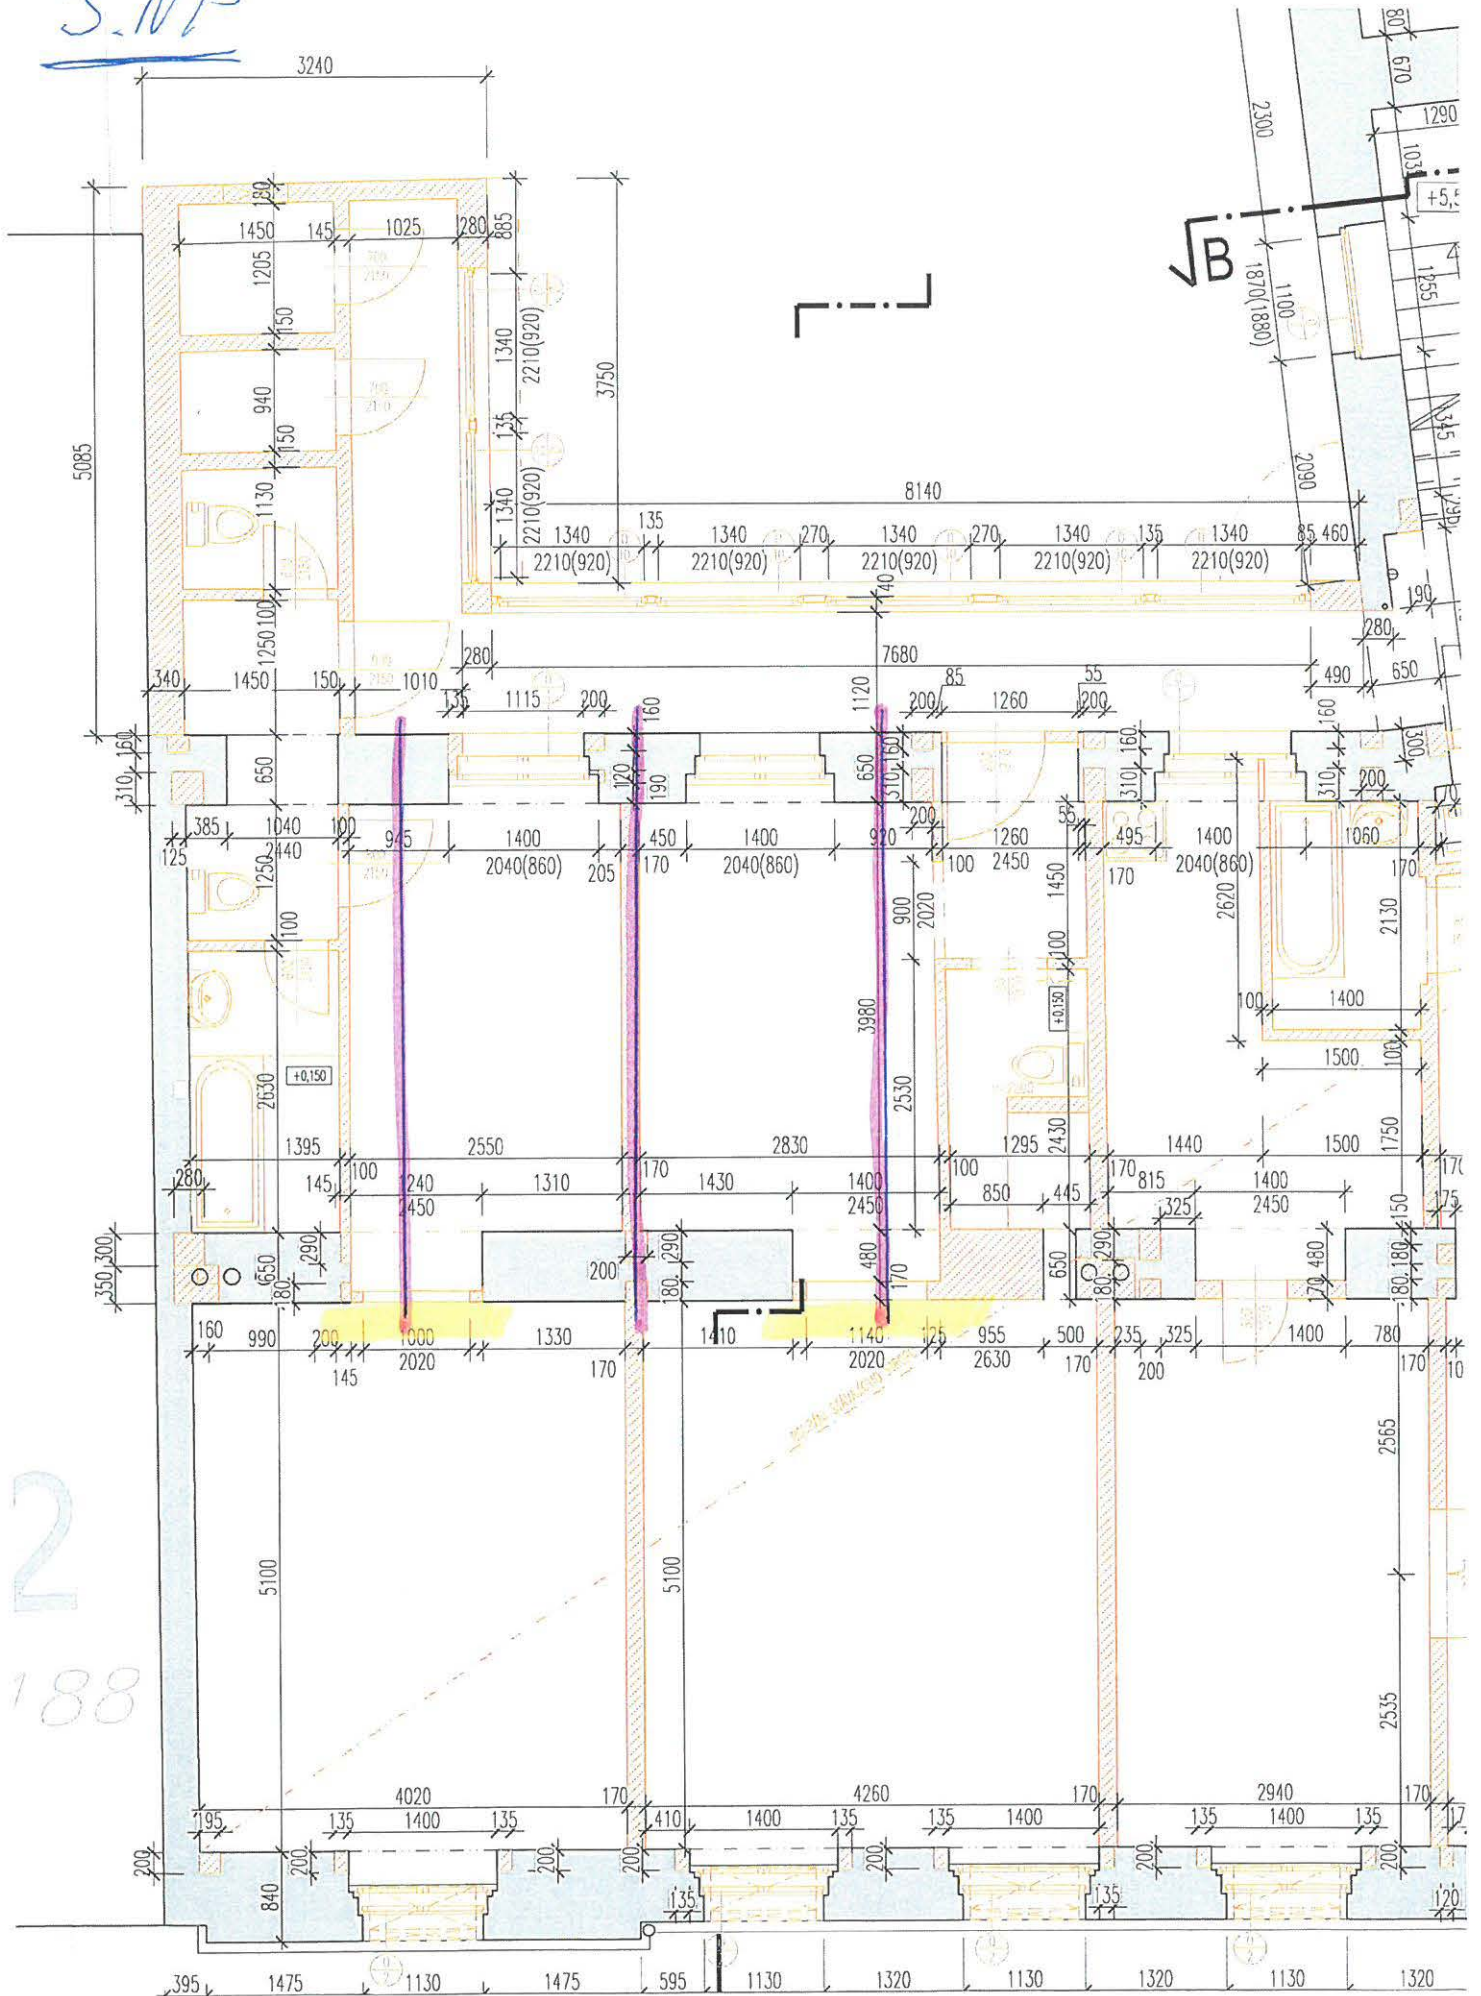



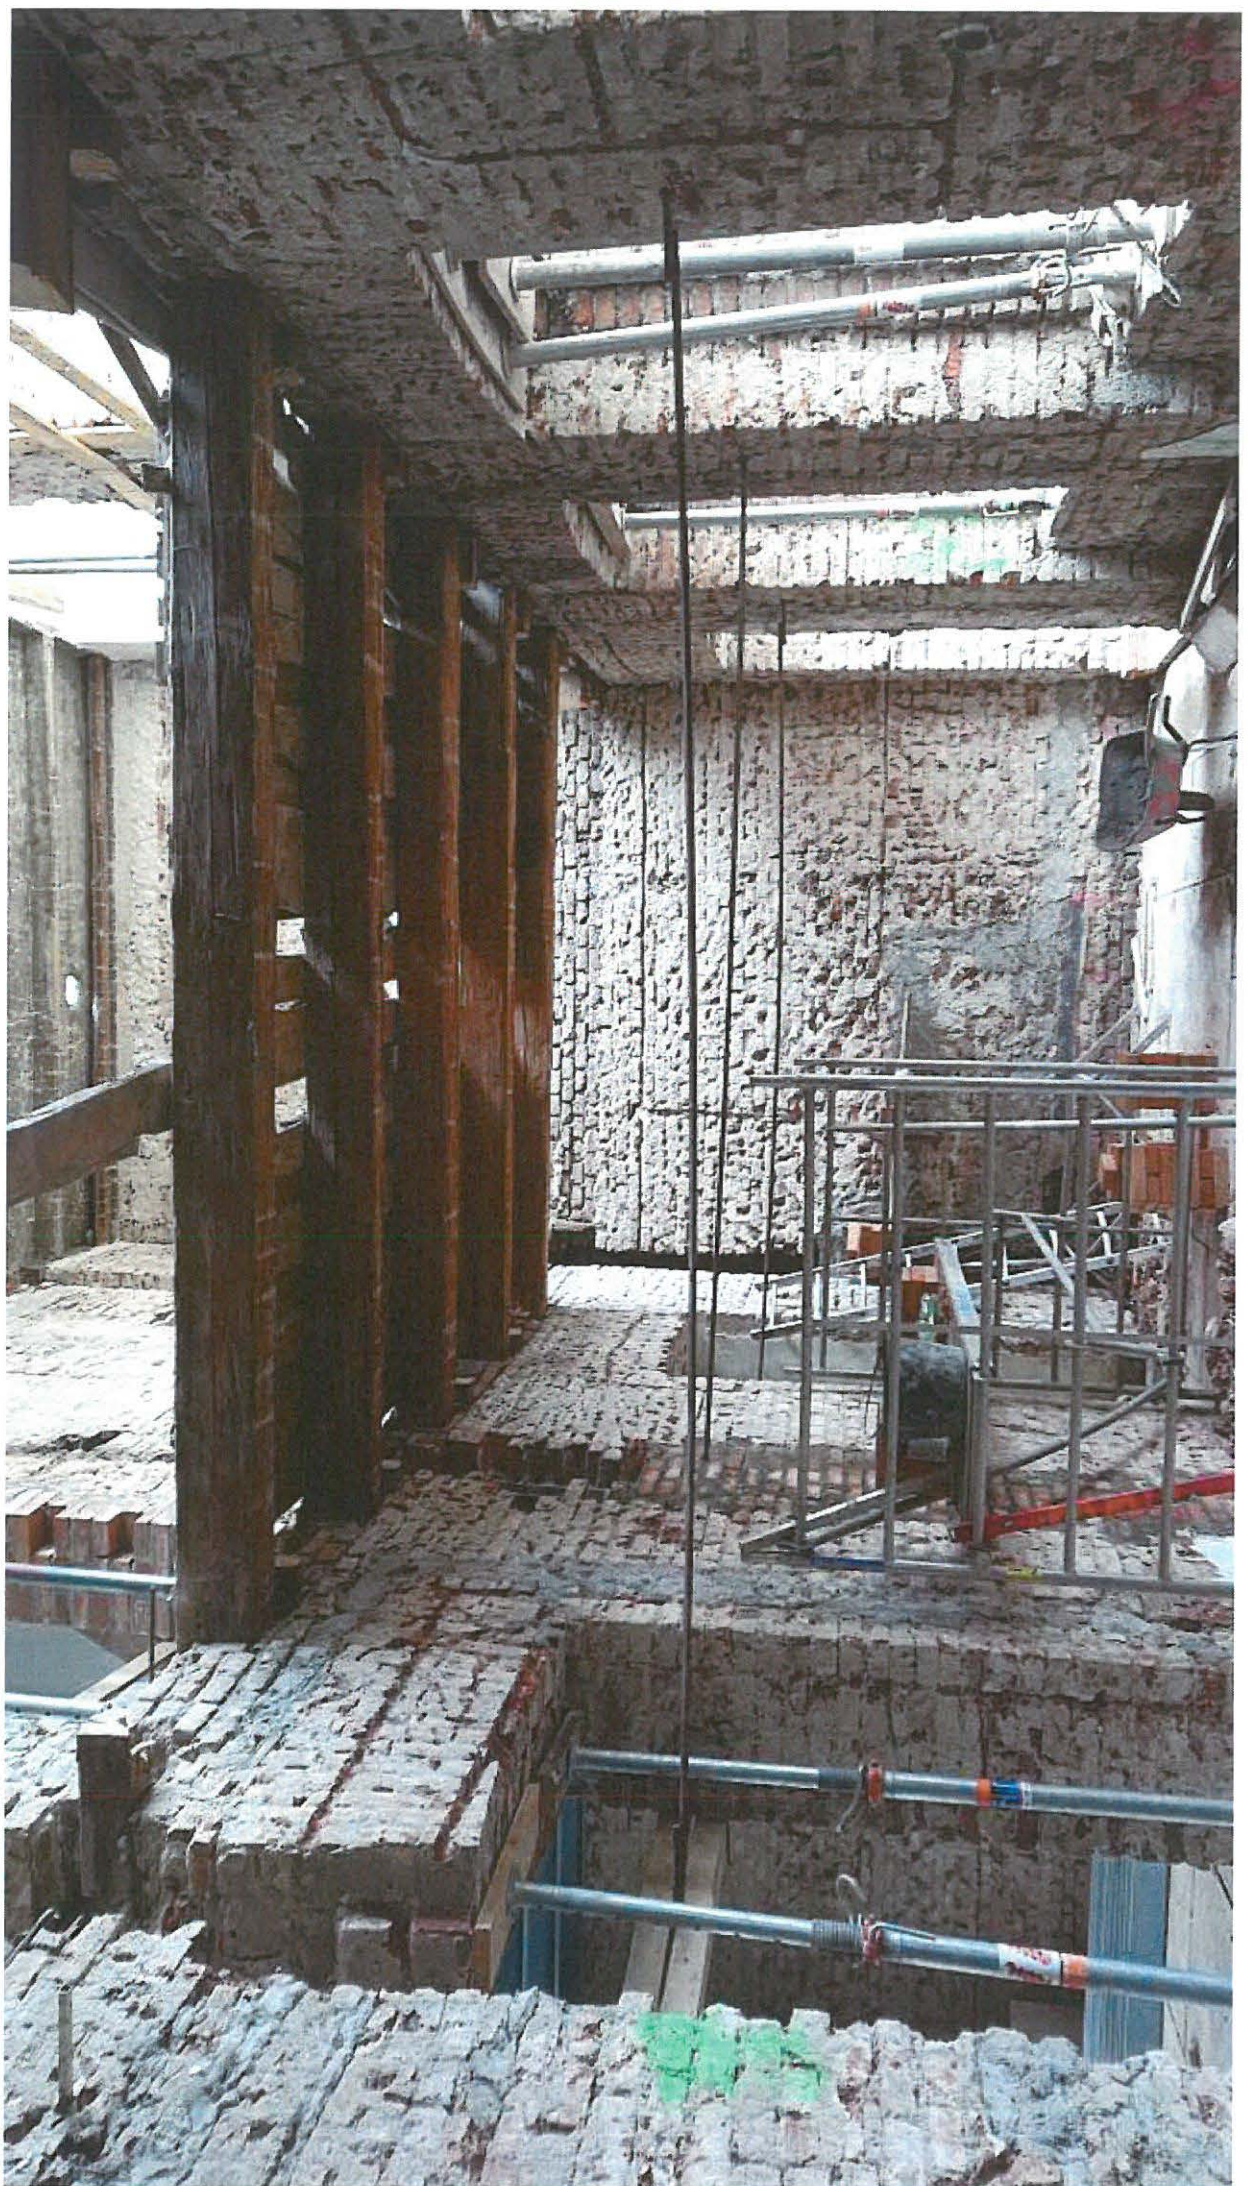



ZMĚNOVÝ LIST č. 107

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání a zazdívka ocel.sloupků č.195 v 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys 1.NP s vyznačením (3 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statiky se musí v místě ocelových sloupků č.195 v 1.NP ubourat kus stěny a vytvořit prostup do 1.PP k ocelovým překladům. Po osazení sloupků č.195 dojde ke zpětnému zazdění.

2) Technický popis:

Vybourání stávající železobetonové stěny v 1.NP v místě ocel.sloupků č.195 a zpětná zazdívka z plných cihel až po stávající překlad v 1.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

GP zapracuje do PD pro provádění stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 8.506,06 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny..

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	10.6.2020	10.6.2020	10.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

10.6.2020

Změnový list č. 107

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání a zazdívka ocel.sloupků č.195 v 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

30.04.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:


KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 506,06	
		962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,351			ÚRS 2020 I
			0,2*0,65*2,7		0,351			
418	K	972033361	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	1,000			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,977			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,977			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,684			
489	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,842			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,135			
136	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,755			
			0,65*2,7		1,755			
138	K	411237221	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v klenbách cihlami tl do 300 mm	kus	1,000			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,935			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

[illegible]

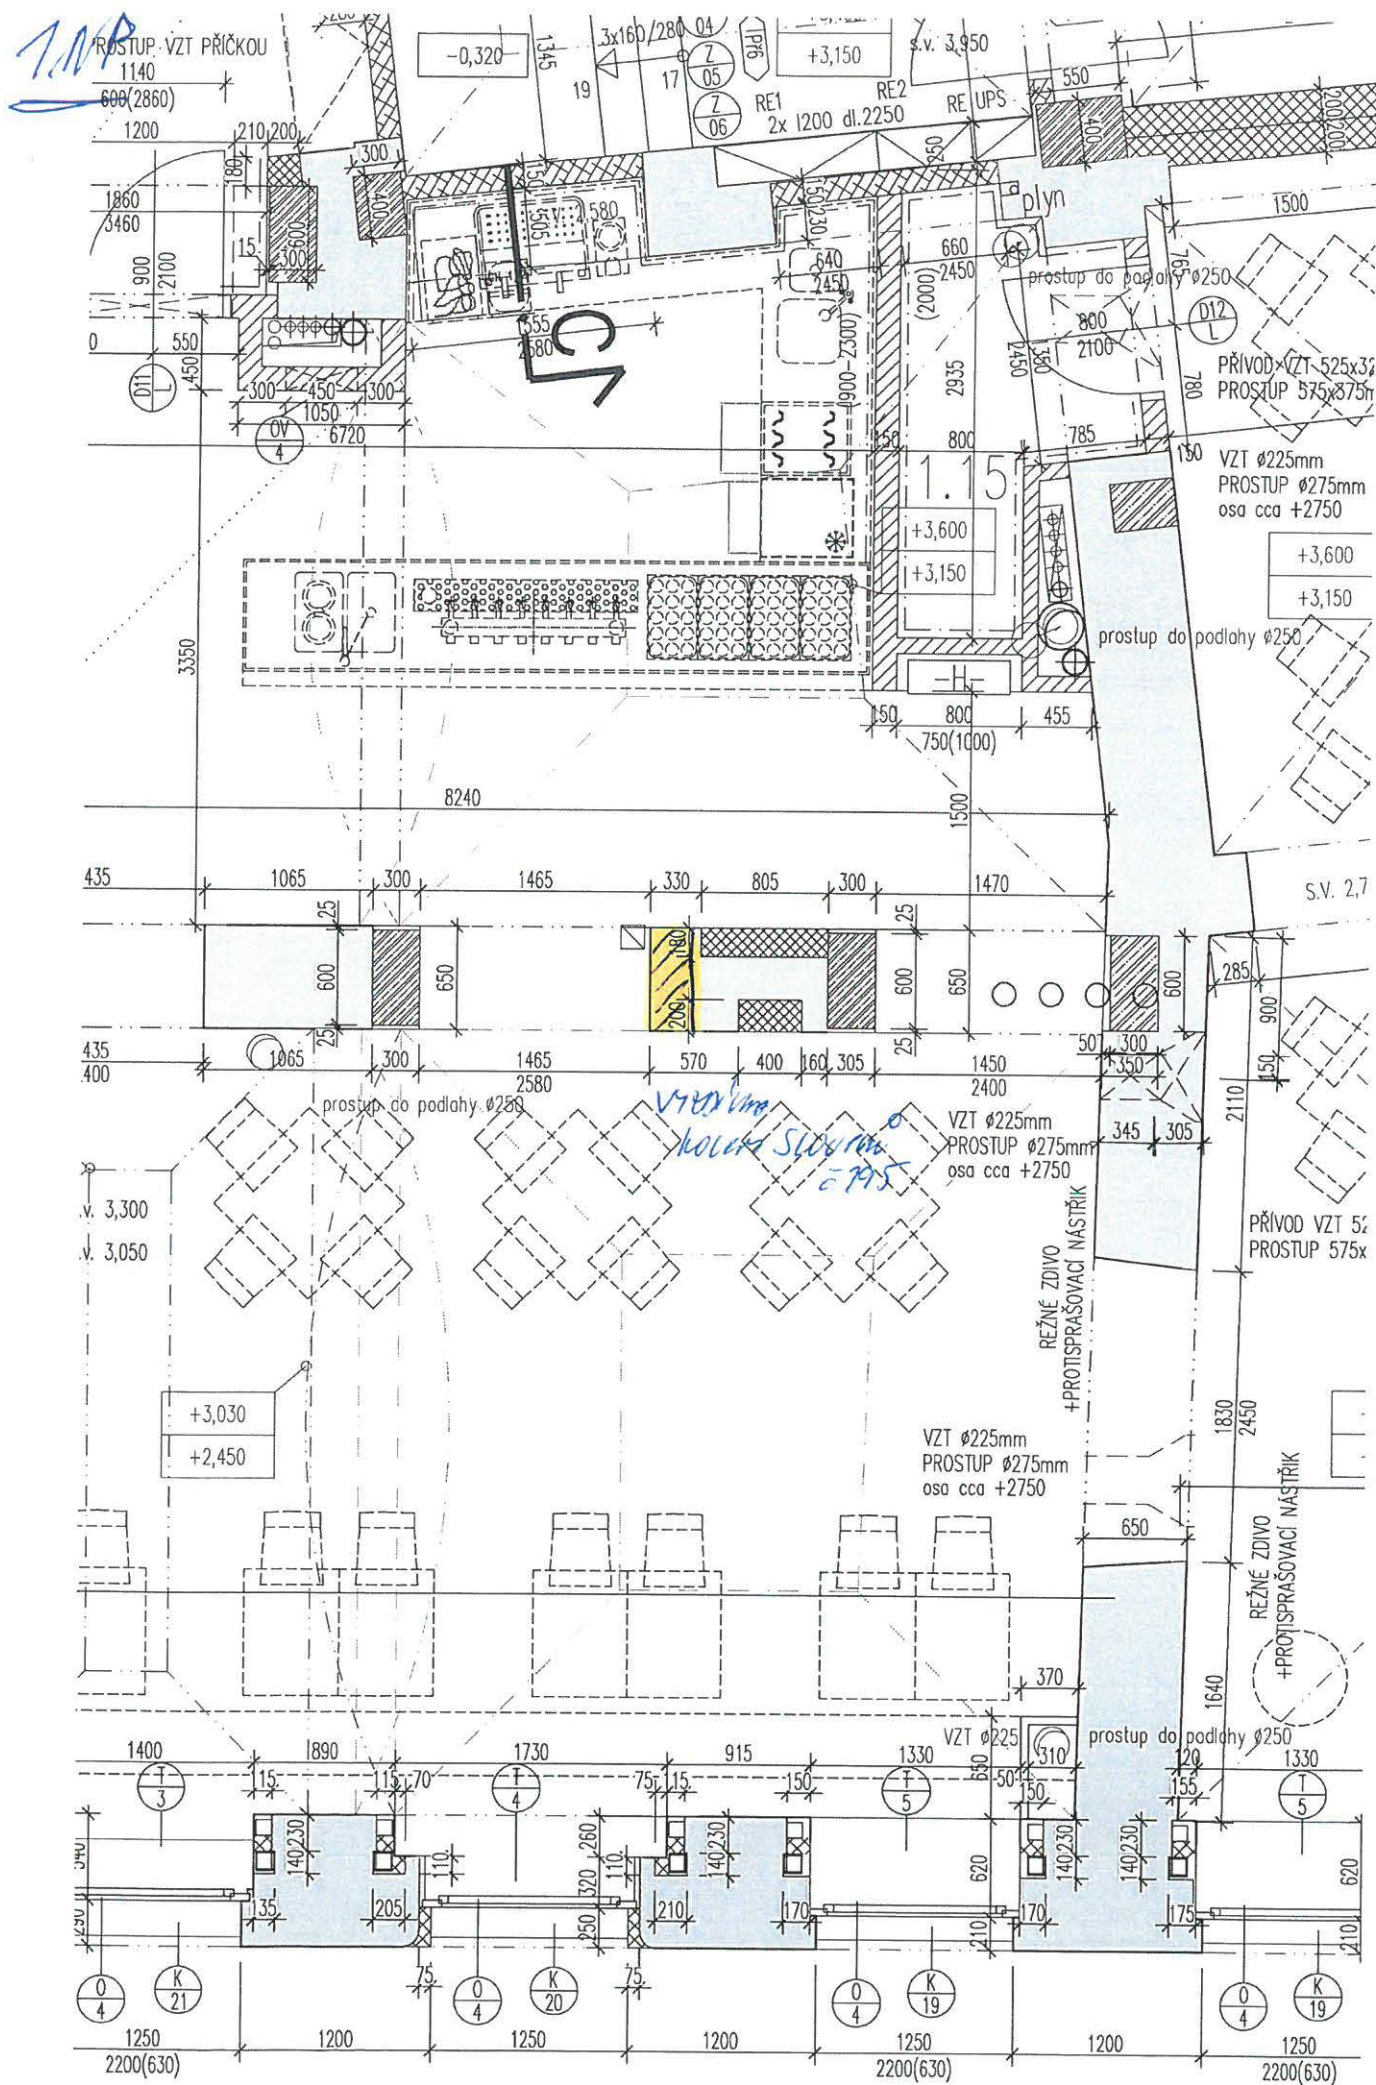

STATION - 7. KP

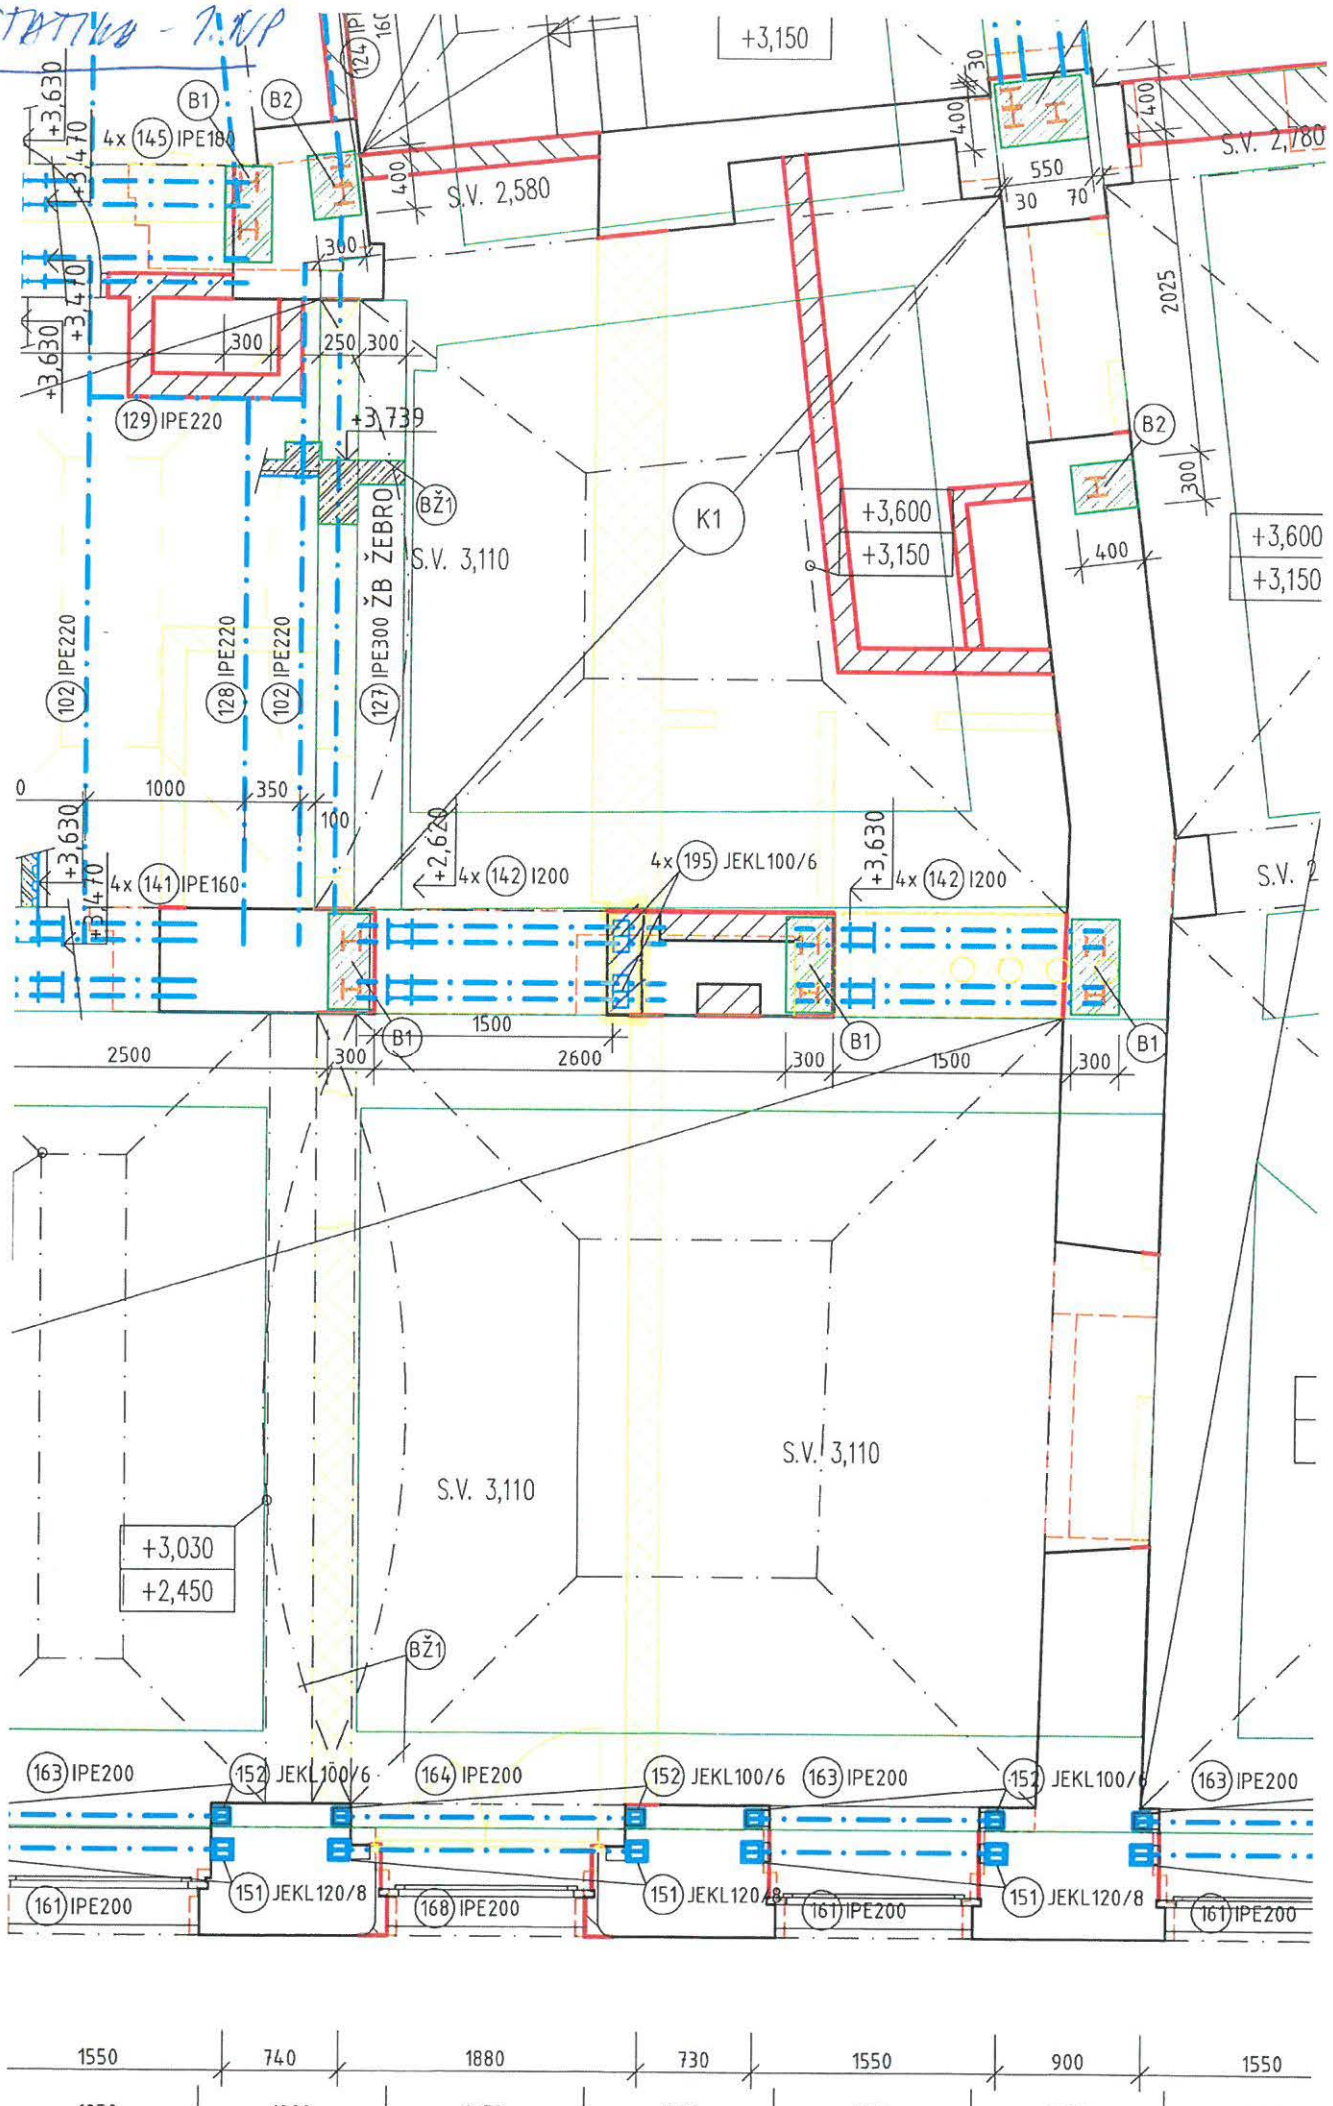

ZMĚNOVÝ LIST č. 108

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Posun odvětrání podlahy u rozvaděče“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele, z důvodu kolize umístění el.rozvaděče PRE a přívodního potrubí do podlahy, došlo k vybourání stávajícího potrubí, upravení trasy potrubí a vyzdívky parapetu.

2) Technický popis:

Vysekání stávajícího potrubí z betonové kce, dodávka a montáž nového potrubí v nové trase, zpětné dobetonování a zazdění, vč. vyzdění parapetu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provádění stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +13.864,94 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	10.6.2020	10.6.2020	10.6.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k re				
Datum:	10.6.2020			

Změnový list č.108

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Posun odvětrání podlahy u rozvaděče

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

14.05.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 864,94	
69	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000			
	VV		Prostup polrubí na fasádu					
	VV	1					1,000	
72	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,213			
	VV		1,47*1,5*0,55				1,213	
323	K	953731315R	Odvětrání svislé troubami plastovými KG DN do 160 mm včetně ukotvení a tvarovek	m	4,500			
	VV		2,5*2,0				4,500	
410	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600	kus	1,000			
	VV		t				1,000	
		972054491	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,125			CS ÚRS 2020 I
			1,0*0,5*0,25		0,125			
		631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,125			CS ÚRS 2020 I
			1,0*0,5*0,25		0,125			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,576			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,576			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,064			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,576			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zčéné v do 36 m	t	2,722			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

1. PP - 7. NP

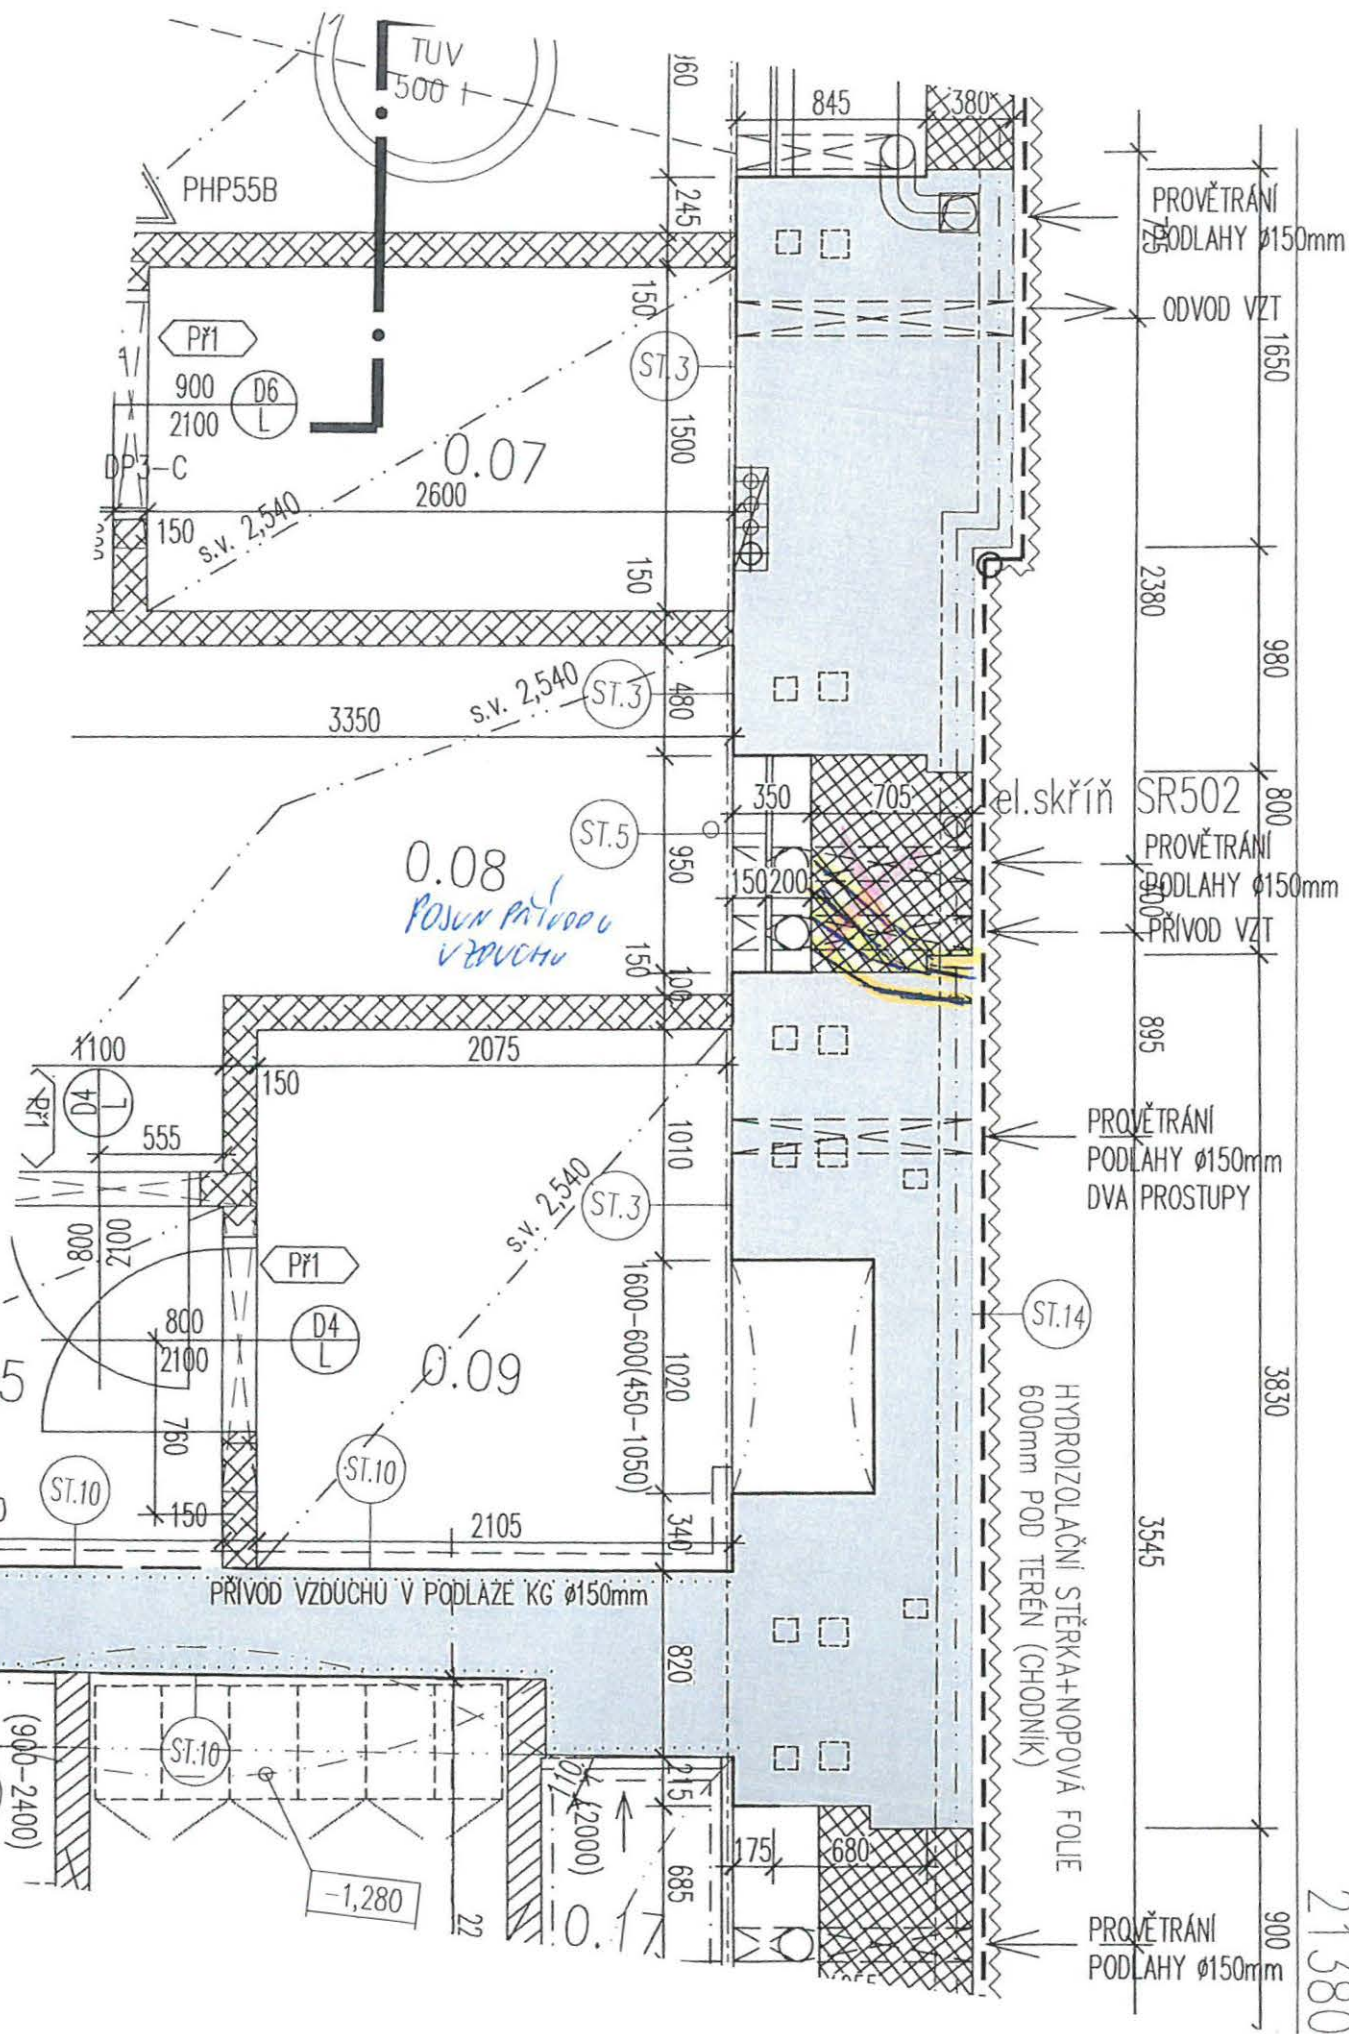

BUBENČEK





ZMĚNOVÝ LIST č. 109

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna žeber BŽ2 a BŽ3“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Po odkrytí konstrukcí navrhl statik na základě zjištěné skutečnosti úpravu žeber BŽ2 a BŽ3.

2) Technický popis:

Úprava tvaru ŽB konstrukce, výztuže a bednění, vč. vybourání stávajících konstrukcí. Vč. doplnění 9 ks táhel u BŽ3.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +60.069,70,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 21 dní. (také prodleva v dodání platných podkladů)

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	24.6.2020	14.6.2020	24.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	24.6.2020
Datum:	

Změnový list č.109

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna žeber BŽŽ a BŽ3

Adresa:

Dejvická 184/4

Datum:

14.05.2020

Základní údaje:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
KONSIT a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 069,70	
150	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 část BŽ1 - patří do BŽ2 (4110,25*0,4+0,1*0,15) BŽ2 (2,25*0,15*0,4+0,35*0,15) BŽ3 (2,38*0,15*0,4+0,35*0,15)	m3	-1,101	-0,580 0,253 -0,268		
154	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm BŽ2 (4,625+2,25*0,15+1,1+1,67*0,4+4,255+1,95*0,25+2,25*0,15+4*0,55+2,25*0,4) BŽ3 (2,38*0,5+0,4*2)	m2	-11,872	-8,778 -3,094		
155	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	-11,872			
158	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm BŽ2 (2,25*0,5+4*0,55) BŽ3 (2,38*0,5)	m2	-4,515	-3,325 -1,190		
159	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	-4,515			
160	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 S05 "ostatní žebra" - 1,101*150/1000	t	-0,165	-0,165		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-2,938			
skutečnost								
347	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 u BŽA: 0,4*0,5*4,85 u BŽ3: 0,5*0,4*3,8	m3	1,750	0,962 0,788		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	3,150			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,150			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,100			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,150			
150	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 BŽ1: 4,2*0,5*0,4+4,3*0,25*0,95+0,25*0,2+4,8*0,1*0,4 BŽ3: 0,55*2,3+1,1*2*1,8	m3	5,313	1,656 3,658		
154	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm BŽ2 část 1: 4,2*0,4+0,4*1 BŽ3: 3,8*0,55+0,3*1	m2	6,590	3,360 3,230		
155	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	6,590			
		272354111	Bednění základových kleneb - zřízení BŽ2 část 2: 4,3*0,6+0,3*1+1,8*0,1+4,3*0,6	m2	7,790	7,790		CS ÚRS 2020 I
		272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	m2	7,790			CS ÚRS 2020 I
		272354191	Příplatek k základovým klenbám za zakřivení bednění průměru do 7,5 m BŽ2 část 2: 4,3*0,6	m2	2,580	2,580		CS ÚRS 2020 I
158	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm BŽ2 část 2: 4,3*0,6 BŽ3: 3,8*0,3	m2	3,720	2,580 1,140		
159	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	3,720			
160	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 S05 BŽ2 část 2: 15,9*1000 BŽ2 část 1 - přírůstek pr. 12 u třísky pr. 10: 18*4,2*0,89+29*2,1*0,52*1000 BŽ3: 1162*13,5*0,89*1000	t	0,264	0,042 -0,068 0,150		
149	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari BŽ2 100*100*6+8*0,4*1,1*4,44*1000	t	0,011	0,011		
479	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru BŽ2 do stěn klenby 15 x 0,15	m	2,250	2,250		
481	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8 16 mm BŽ2 do stěn klenby 15 x 0,25*1,1*0,1*1000	t	0,002	0,002		
		977131210	Vrty dovrchní přiklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměr vrtáku 0,75 mm; 9*0,75	m	6,750	6,750		CS ÚRS 2020 I
		985622211	Spinání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	13,500			CS ÚRS 2020 I

		985622491	Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě	m	13,500	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	13,435	
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	16,200	
			<i>Katovní dráhy P10 150x150 P100 P110 150x150</i>		<i>16,2</i>	
949	M	13010970	ocel profilová jakost II 375	t	0,018	
			<i>Katovní dráhy P10 150x150 P100 P110 150x150</i>		<i>11,078</i>	
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000	
	p	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170	

ZMĚNOVÝ LIST č. 110

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání a zazdívky pro ocelové sloupky 2.NP_2.část, 3.část, 4.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením polohy sloupů (1 strana A4) Příloha č.3 - Fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Narovnání na skutečnost (2.NP sloupky - 2.část, 3.část, 4.část) - je nutné provést větší rýhy ve zdivu dostatečně velké pro manipulaci s ocelovou konstrukcí a pro provázání stávajícího a nového zdiva.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu pro osazení ocelových konstrukcí v 2.NP (kterých sloupů se zatím týká, je vyznačeno v přiloženém půdoryse), vč. větší zazdívky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 169.679,50 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2019	14.6.2019	17.6.2019	16.6.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	16.6.2019
--------	-----------

Změnový list č.110

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání a zazdívky pro ocelové sloupy 2.NP_2.část, 3.část, 4.část

Místo: Dejvická 184/4

Datum: 21.05.2020


Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							169 679,50	
			Od +4,000 (podlaha 2.NP) po +7,970 (podlaha 3.NP)					
435	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	-3,930			
	VV	1/2 objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*3,93 * 1/2			-1,965		
	VV	zbytek objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*3,93 * 1/2			-1,965		
436	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	-3,970			
	VV	1/2 objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*3,97 * 1/2			-1,985		
	VV	zbytek objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*3,97 * 1/2			-1,985		
439	K	974031175R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 200 mm	m	-58,540			
	VV	1/2 objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*(3,97*12+2,45*2+3,93*2) * 1/2			-25,100		
	VV	zbytek objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*(3,97*12+2,45*2+3,93*2) * 1/2			-25,100		
		komplet 2.NP	"pro profil ozn.253*3,97*2			-7,940		
441	K	974031184R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 200 mm	m	-74,140			
	VV	1/2 objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*(3,97*12+3,94+3,97+2,45*2+3,93*2) * 1/2			-35,085		
	VV	zbytek objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*(3,97*12+3,94+3,97+2,45*2+3,93*2) * 1/2			-35,085		
		komplet 2.NP	"pro profil ozn.253*3,97			-3,970		
442	K	974031185R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 300 mm	m	6,150			
	VV	1/2 objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*(3,97+3,93+3,9*2)*1/2			-7,850		
	VV	zbytek objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*(3,97+3,93+3,9*2)*1/2			-7,850		
		komplet 2.NP	"pro profil ozn.253*3,97			-3,970		
			pozice 46 (1.část): 2.NP: š 0,35, hl 0,35, d 3,97 m			3,970		
			pozice 47: 2.NP: š 0,30, hl 0,35, d 1,0 m			1,000		
			pozice 48 (2.část): 2.NP: š 0,35, hl 0,25, d 3,97 m (proti sloup 46)			3,970		
			pozice 49: 2.NP: š 0,30, hl 0,35, d 1,0 m			1,000		
			pozice 51: 2.NP: š 0,30, hl 0,30, d 3,97 m (proti sloup 44)			3,970		
			pozice 58: 2.NP: š 0,30 hl 0,35, d 3,97 m (proti sloup 63)			3,970		
			pozice 61: 2.NP: š 0,3, hl 0,30, d 3,97 m (proti sloup 60)			3,970		
			pozice 64: 2.NP: š 0,3, hl 0,3, d 3,97 m (proti sloup 57)			3,970		
443	K	974031193R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 500 mm	m	79,916			
	VV	1/2 objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*3,93 * 1/2			-1,965		
	VV	zbytek objemu 2.NP	"pro profil ozn.252*3,93 * 1/2			-1,965		
			pozice 35: 2.NP: š 0,35 hl 0,35, d 3,97 m			3,970		
			pozice 36: 2.NP: š 0,40, hl 0,35, d 3,97 m			3,970		
			pozice 37: 2.NP: š 0,40, hl 0,35, d 3,97 m (proti sloup 68)			3,970		
			pozice 41: 2.NP: š 0,30, hl 0,35, d 3,97 m (proti sloup 54)			3,970		
			pozice 42: 2.NP: š 0,45, hl 0,35, d 3,97 m (proti sloup 53)			3,970		
			pozice 44: 2.NP: š 0,35, hl 0,35, d 3,97 m (proti sloup 51)			3,970		
			pozice 45: 2.NP: š 0,40, hl 0,35, d 3,97 m (proti sloup 50)			3,970		
			pozice 48 (1.část): 2.NP: š 0,50, hl 0,35, d 3,97 m			3,970		
			pozice 50: 2.NP: š 0,40, hl 0,30, d 3,97 m (proti sloup 45)			3,970		
			pozice 52: 2.NP: š 0,4, hl 0,25, d 3,97 m (proti sloup 43)			3,970		
			pozice 53: 2.NP: š 0,40 hl 0,30, d 3,97 m (proti sloup 42)			3,970		
			pozice 54: 2.NP: š 0,50 hl 0,30, d 3,97 m (proti sloup 41)			3,970		
			pozice 55: 2.NP: š 0,40 hl 0,20, d 3,97 m (proti sloup 38)			3,970		
			pozice 56: 2.NP: š 0,40, hl 0,35, d 3,97 m (proti sloup 65)			3,970		
			pozice 57: 2.NP: š 0,43 hl 0,35, d 3,97 m (proti sloup 64)			3,970		
			pozice 59: 2.NP: š 0,40 hl 0,35, d 3,97 m (pro sloup 62)			3,970		
			pozice 60: 2.NP: š 0,45, hl 0,35, d 3,97 m (proti sloup 61)			3,970		
			pozice 62: 2.NP: š 0,4, hl 0,3, d 3,97 m (proti sloup 59)			3,970		
			pozice 63: 2.NP: š 0,35, hl 0,3, d 3,97 m (proti sloup 58)			3,970		
			pozice 65: 2.NP: š 0,35, hl 0,3, d 3,97 m (proti sloup 56)			3,970		
			pozice 67: 2.NP: š 0,4, hl 0,3, d 3,97 m			0,476		
			pozice 68: 2.NP: š 0,4, hl 0,3, d 3,97 m (proti sloup 37)			3,970		
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	8,714			
			pozice 39: 2.NP: š 0,45 hl 0,40, d 3,97 m			0,715		
			pozice 43: 2.NP: š 0,50 hl 0,40, d 3,97 m (proti sloup 52)			0,794		
			pozice 34: 2.NP: š 0,4, hl 0,45, d 3,97 m			0,715		
			pozice 46 (2.část): 2.NP: š 0,8, hl 0,40, d 3,97 m (proti sloup 48)			1,770		
			pozice 38: 2.NP: š 0,50 hl 0,55, d 3,97 m (proti sloup 55)			1,092		
			pozice 40: 2.NP: š 0,65 hl 0,8, d 3,97 m			2,064		
			pozice 66: 2.NP: š 0,8, hl 0,65, d 3,97 m			2,064		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	30,615			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,615			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	428,607			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	30,615			
131	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	6,476			
	VV		"sloupky ocel.kce"					
	VV		"2NP-3NP"(0,1*9+0,16*1+0,15*1+0,5+0,29*2)*3,97			-12,664		

			zazdívký přední část rýhy:		
			pozice 34: 2.NP: š 0,4, hl. 0,45, d. 3,97 m	1,588	
			pozice 35: 2.NP: š 0,35 hl. 0,35, d. 3,97 m	1,390	
			pozice 36: 2.NP: š 0,40, hl. 0,35, d. 3,97 m	1,588	
			pozice 37: 2.NP: š 0,40, hl. 0,35, d. 3,97 m (proti sloup 68)	1,588	
			pozice 38: 2.NP: š 0,50 hl. 0,55, d. 3,97 m (proti sloup 55)	1,985	
			pozice 39: 2.NP: š 0,45 hl. 0,40, d. 3,97 m	1,787	
			pozice 40: 2.NP: 0	0,000	
			pozice 41: 2.NP: š 0,30, hl. 0,35, d. 3,97 m (proti sloup 54)	1,191	
			pozice 42: 2.NP: š 0,45, hl. 0,35, d. 3,97 m (proti sloup 53)	1,787	
			pozice 43: 2.NP: š 0,50 hl. 0,40, d. 3,97 m (proti sloup 52)	1,985	
			pozice 44: 2.NP: š 0,35, hl. 0,35, d. 3,97 m (proti sloup 51)	1,390	
			pozice 45: 2.NP: š 0,40, hl. 0,35, d. 3,97 m (proti sloup 50)	1,588	
			pozice 46 (1.část): 2.NP: š 0,35, hl. 0,35, d. 3,97 m	1,390	
			pozice 46 (2.část): 2.NP: š 0,8, hl. 0,40, d. 3,97 m (proti sloup 48)	3,176	
			pozice 48 (1.část): 2.NP: š 0,50, hl. 0,35, d. 3,97 m	1,849	
			pozice 48 (2.část): 2.NP: š 0,35, hl. 0,25, d. 3,97 m (proti sloup 46)	1,390	
			pozice 50: 2.NP: š 0,40, hl. 0,30, d. 3,97 m (proti sloup 45)	1,588	
			pozice 51: 2.NP: š 0,30, hl. 0,30, d. 3,97 m	1,191	
			pozice 52: 2.NP: š 0,4, hl. 0,25, d. 3,97 m (proti sloup 43)	1,747	
			pozice 53: 2.NP: š 0,40 hl. 0,30, d. 3,97 m	1,588	
			pozice 54: 2.NP: š 0,50 hl. 0,30, d. 3,97 m (proti sloup 41)	1,849	
			pozice 55: 2.NP: š 0,40 hl. 0,20, d. 3,97 m (proti sloup 38)	1,588	
			pozice 56: 2.NP: š 0,40, hl. 0,35, d. 3,97 m	1,588	
			pozice 57: 2.NP: š 0,45 hl. 0,35, d. 3,97 m	1,787	
			pozice 58: 2.NP: š 0,30 hl. 0,35, d. 3,97 m	1,191	
			pozice 59: 2.NP: š 0,40 hl. 0,35, d. 3,97 m	1,588	
			pozice 60: 2.NP: š 0,45, hl. 0,35, d. 3,97 m	1,787	
			pozice 61: 2.NP: š 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m (proti sloup 60)	1,191	
			pozice 62: 2.NP: š 0,4, hl. 0,3, d. 3,97 m (proti sloup 59)	1,588	
			pozice 63: 2.NP: š 0,35, hl. 0,3, d. 3,97 m (proti sloup 58)	1,390	
			pozice 64: 2.NP: š 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m (proti sloup 57)	1,191	
			pozice 65: 2.NP: š 0,35, hl. 0,3, d. 3,97 m (proti sloup 56)	1,390	
			pozice 66: 2.NP: 0	0,000	
			pozice 67: 2.NP: 0	0,000	
			pozice 68: 2.NP: š 0,4, hl. 0,3, d. 3,97 m (proti sloup 37)	1,588	
72	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	15,647
			zazdívký zadní část rýhy:		
			pozice 34: 2.NP: š 0,4, hl. 0,45, d. 3,97 m: 0,4°0,45°3,97-1,588°0,14	0,492	
			pozice 35: 2.NP: š 0,35 hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,35°0,35°3,97-1,39°0,14	0,292	
			pozice 36: 2.NP: š 0,40, hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,4°0,35°3,97-1,588°0,14	0,333	
			pozice 37: 2.NP: š 0,40, hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,4°0,35°3,97-1,588°0,14	0,333	
			pozice 38: 2.NP: š 0,50 hl. 0,55, d. 3,97 m: 0,5°0,55°3,97-1,985°0,14	0,814	
			pozice 39: 2.NP: š 0,45 hl. 0,40, d. 3,97 m: 0,45°0,4°3,97-1,787°0,14	0,464	
			pozice 40: 2.NP: š 0,65 hl. 0,8, d. 3,97 m: 0,65°0,8°3,97	2,064	
			pozice 41: 2.NP: š 0,30, hl. 0,25, d. 3,97 m: 0,3°0,35°3,97-1,191°0,14	0,250	
			pozice 42: 2.NP: š 0,45, hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,45°0,35°3,97-1,787°0,14	0,375	
			pozice 43: 2.NP: š 0,50 hl. 0,40, d. 3,97 m: 0,5°0,4°3,97-1,985°0,14	0,516	
			pozice 44: 2.NP: š 0,35, hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,35°0,35°3,97-1,39°0,14	0,292	
			pozice 45: 2.NP: š 0,40, hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,4°0,35°3,97-1,588°0,14	0,333	
			pozice 46 (1.část): 2.NP: š 0,35, hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,35°0,35°3,97-1,39°0,14	0,292	
			pozice 46 (2.část): 2.NP: š 0,8, hl. 0,4, d. 3,97 m: 0,8°0,4°3,97-3,176°0,14	0,826	
			pozice 48 (1.část): 2.NP: š 0,50, hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,5°0,35°3,97-1,849°0,14	0,436	
			pozice 48 (2.část): 2.NP: š 0,35, hl. 0,25, d. 3,97 m: 0,35°0,25°3,97-1,39°0,14	0,153	
			pozice 50: 2.NP: š 0,40, hl. 0,3, d. 3,97 m: 0,4°0,3°3,97-1,588°0,14	0,254	
			pozice 51: 2.NP: š 0,30, hl. 0,30, d. 3,97 m: 0,3°0,3°3,97-1,191°0,14	0,191	
			pozice 52: 2.NP: š 0,4, hl. 0,25, d. 3,97 m: 0,4°0,25°3,97-1,747°0,14	0,152	
			pozice 53: 2.NP: š 0,40 hl. 0,30, d. 3,97 m: 0,4°0,3°3,97-1,588°0,14	0,254	
			pozice 54: 2.NP: š 0,50 hl. 0,30, d. 3,97 m: 0,5°0,3°3,97-1,849°0,14	0,337	
			pozice 55: 2.NP: š 0,40 hl. 0,20, d. 3,97 m: 0,4°0,2°3,97-1,588°0,14	0,095	
			pozice 56: 2.NP: š 0,40, hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,4°0,35°3,97-1,588°0,14	0,333	
			pozice 57: 2.NP: š 0,45 hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,45°0,35°3,97-1,787°0,14	0,375	
			pozice 58: 2.NP: š 0,30 hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,3°0,25°3,97-1,191°0,14	0,250	
			pozice 59: 2.NP: š 0,40 hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,4°0,35°3,97-1,588°0,14	0,333	
			pozice 60: 2.NP: š 0,45, hl. 0,35, d. 3,97 m: 0,45°0,35°3,97-1,787°0,14	0,375	
			pozice 61: 2.NP: š 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m: 0,3°0,3°3,97-1,191°0,14	0,191	
			pozice 62: 2.NP: š 0,4, hl. 0,3, d. 3,97 m: 0,4°0,3°3,97-1,588°0,14	0,254	
			pozice 63: 2.NP: š 0,35, hl. 0,3, d. 3,97 m: 0,35°0,3°3,97-1,390°0,14	0,222	
			pozice 64: 2.NP: š 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m: 0,3°0,3°3,97-1,191°0,14	0,191	
			pozice 65: 2.NP: š 0,35, hl. 0,3, d. 3,97 m: 0,35°0,3°3,97-1,390°0,14	0,222	
			pozice 66: 2.NP: š 0,65, hl. 0,8, d. 3,97 m: 0,65°0,8°3,97	2,064	
			pozice 67: 2.NP: š 0,4, hl. 0,65, d. 3,97 m: 0,4°0,65°3,97	1,032	
			pozice 68: 2.NP: š 0,4, hl. 0,3, d. 3,97 m: 0,4°0,3°3,97-1,588°0,14	0,254	
71	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,285
			2.NP - u pozice 36 zazdívká kapsy - Rozměr š.cca 50 cm, v. cca 90 cm, hl. cca 30 cm: 0,5°1,0°0,3	0,135	
			2.NP - u pozice 40 zazdívká kapsy - Rozměr š.cca 50 cm, v. cca 100 cm, hl. cca 30 cm: 0,5°1,0°0,3	0,15	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	31,555
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		%	10,170

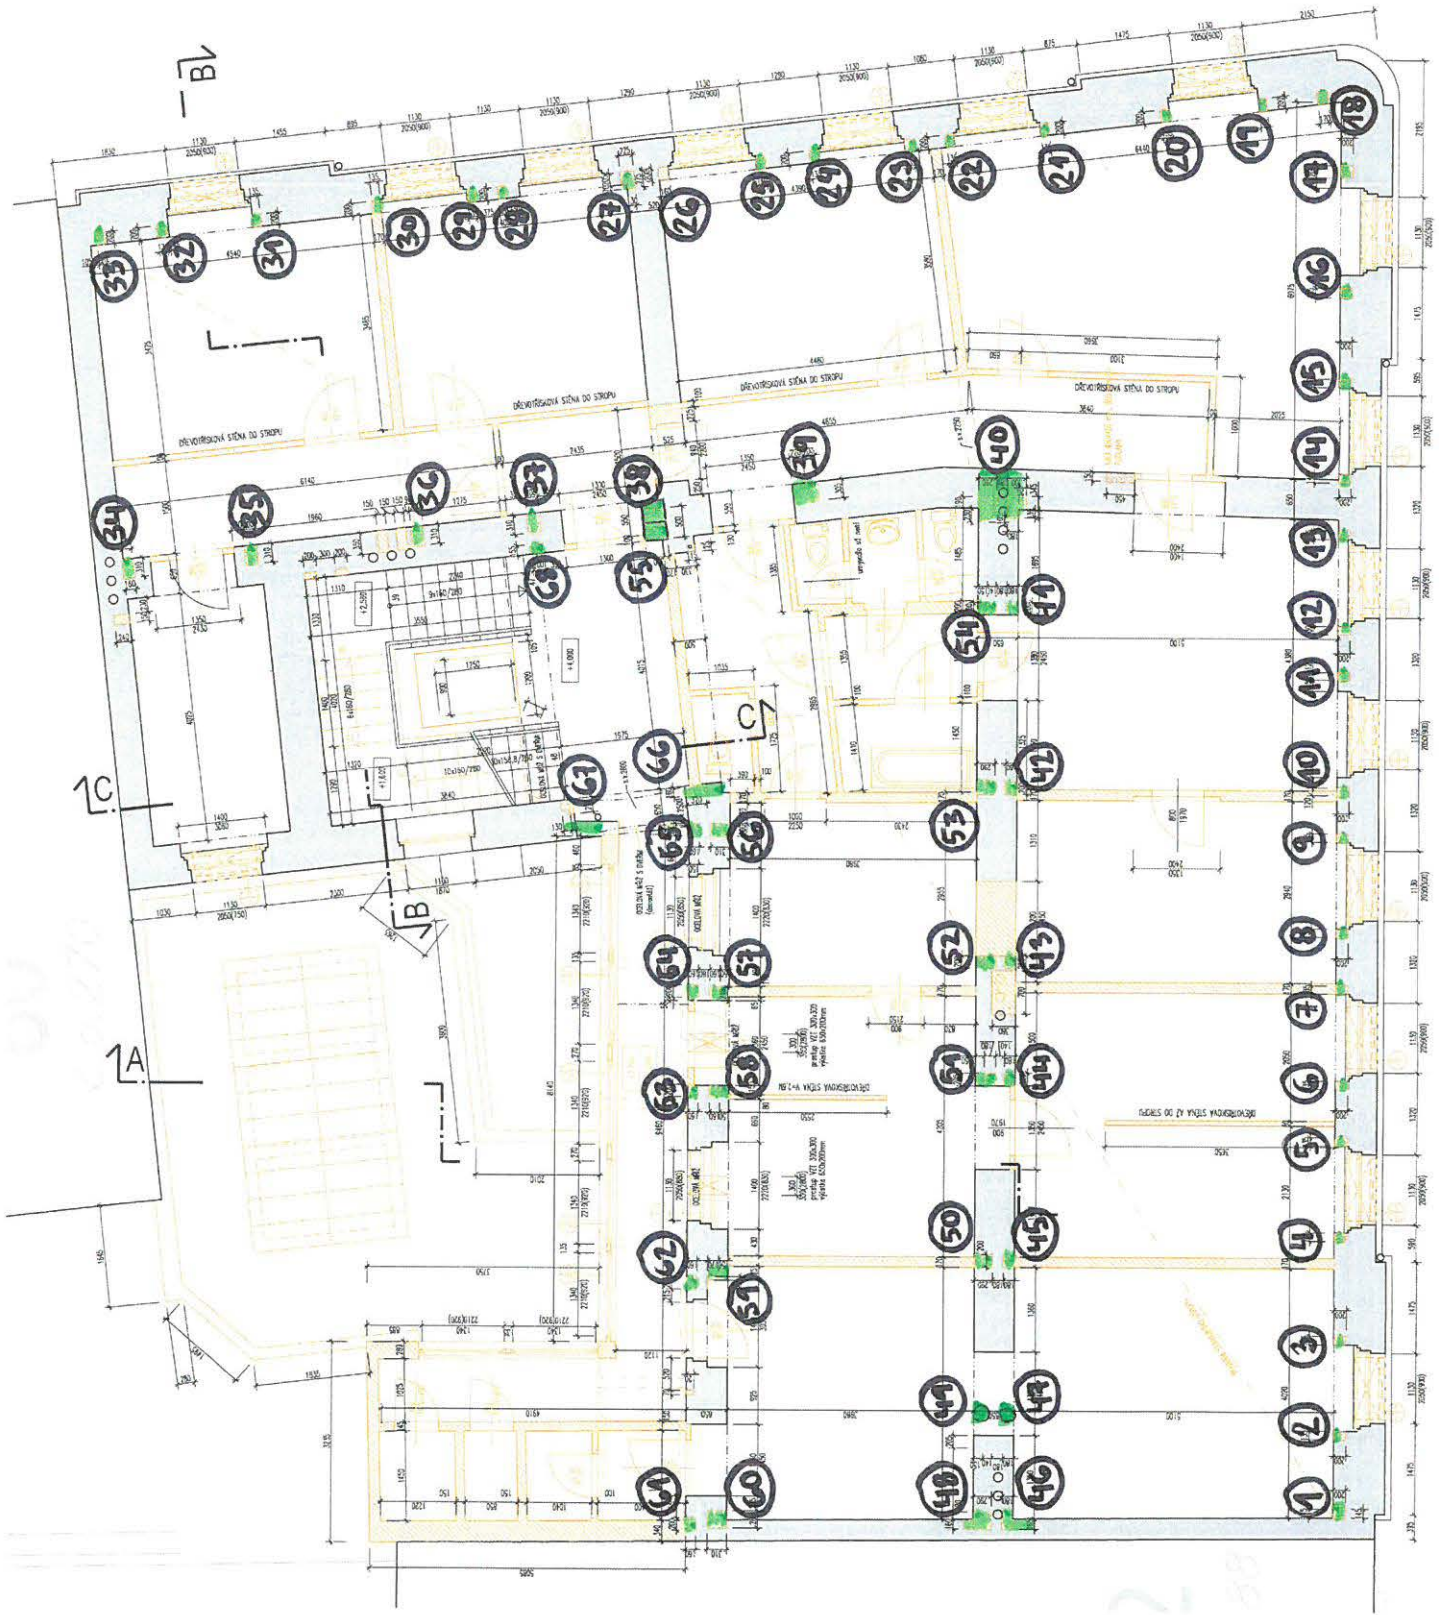

ZMĚNOVÝ LIST č. 111

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úpravy u stropní kce 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (3 strany A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením(3 strany A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací u stropní konstrukce 2.NP_ na základě požadavku statika - vybourání zdiva – vodorovné rýhy a kapsy (větší rozsah z důvodu manipulačního prostoru a ze statických důvodů – odbourání překladů nad okny....) a zazdění vodorovné ocelové konstrukce rámu, navíc kotvení ocelových nosníků do zdiva, úprava rozsahu kotvení výztuže do zdiva, pomocná ocelová konstrukce pro zpětné vyzdění překladů nad okny. Navíc ŽB průvlak u podesty schodiště.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh a kapes ve zdivu pro osazení vodorovných částí ocelových rámu a s tím související větší rozsah zazdívek., Vybourání zděných překladů nad okny a zpětná vyzdívka do pomocné ocelové konstrukce. Kotvení do zdiva ocelových nosníků uložených na ocelové rámy – vyvrtání+kotvy na chemii+přivaření na nosník+nátěr. Větší rozsah kotvení výztuže do zdiva – po celém obvodu stropu. Odpočet příslušných původních položek z rozpočtu. Navíc ŽB průvlak u podesty schodiště vč. podchycení stáv.nosníku. Vyzdívka mezi nosníky podesty, vč. podchycení pomocnou OK.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 83.578,91 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:				
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:	7.6.2020			
Datum:				

Změnový list č.111

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: Úpravy u stropní kce 2.NP

Místo: Dejvická 184/4

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Uchazeč: KONSIT a.s.

Datum: 21.05.2020

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 578,91	
66	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	-61,000			
	VV		dle výkazu odpočet v 2.NP mimo obvodových zdí "rákosníky"326/3		-108,000			
			ponecháno z výkazu v 2.NP jen v obvodových zdech "2NP"15+18+2		35,000			
	VV		dle výkazu odpočet v 2.NP mimo obvodových zdí "rákosníky" - odečteno již v rámci 1.části		-0,000			
			ponecháno z výkazu v 2.NP jen v obvodových zdech "2NP"12		12			
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	-59,000			
	VV		dle výkazu odpočet v 2.NP "po trámech strop nad "2NP"15+4+18+2+5+2		-106,000			
			ponecháno z výkazu v 2.NP jen v obvodových zdech "po trámech strop nad "2NP"15+18+2		35,000			
	VV		dle výkazu odpočet v 2.NP "po trámech strop nad "2NP" - odečteno již v rámci 1.části		-0,000			
			ponecháno z výkazu v 2.NP jen v obvodových zdech "po trámech strop nad "2NP"12		12			
95	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	16,773			
			odpočet dle výkazu: "ozn.241"1,84*0,35*0,16		-0,103			
			(96,1)*0,7*0,3		20,181			
			(11,81+2,79*2)*0,5*0,3		2,609			
			-(33+8*2+8+7+5)*0,35*0,25		-6,038			
			2.NP u podesty: 3,3*0,15*0,25		0,124			
97	K	317314101R	Podbetonování ocelových nosníků uložených na zdivu š.30 cm o výšce 25 cm betonem C 20/25 včetně bednění a odbednění	m	-100,310			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 2NP"2.NP - 1.část: 23+20,3 + 16,6+11,3		-71,200			
			skutečnost 2.NP 1.část: 2,7		2,700			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 2NP"2.NP - 2.část: 16,6+11,2+1,87+2,14		-31,910			
98	K	317314130R	Podbetonování zhlaví nosníků, uložení na zdivo do 300 mm	kus	0,000			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 2NP" - 1.část: 15		-15,000			
			skutečnost 2.NP 1.část:21		21,000			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 2NP" - 2.část: 10		-10,000			
			skutečnost 2.NP 2.část:4		4,000			
132	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-8,560			
			dle výkaz odpočet "2NP nosníky průvlaků vnějších ráků"43,3*0,2		-8,660			
133	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-17,460			
			dle výkaz odpočet "2NP nosníky průvlaků vnitřních ráků" - 1.část: (16,6+11,3)*0,24		-6,696			
			dle výkaz odpočet "2NP nosníky průvlaků vnitřních ráků" - 1.část: 8,076		-8,076			
			"2NP nosníky průvlaků vnitřních ráků" zbytek		-2,688			
177	K	413233221R	Zabetonování zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	0,000			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 2NP" - 1.část: 15		-15,000			
			2.NP 1.část:21		21,000			
			dle výkazu odpočet: "strop nad 2NP" - 2.část: 10		-10,000			
			2.NP 2.část:4		4,000			
150	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,267			
			4,2*0,14*0,34+1,4*(0,28+0,14)*0,34		0,267			
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	1,260			
			4,2*0,3		1,260			
153	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	1,260			
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,260			
157	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,260			
160	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 S05	t	0,050			
			7x tvar U délky 1,5 m pr. 12: 7*1,5*1,1*0,00089		0,010			
			4x rovný délky 4,5 m pr. 12: 4*4,5*1,1*0,00089		0,018			
			23x třmínky délky 0,7 m pr. 8: 23*0,7*1,1*0,0004		0,007			

			AŘL štít při horním povrchu 8x10x10 šíře 1,0 m; 1,5°; 0°1,3'0,0079		0,015
338	K	953946101R	Montáž a dodávka atypických ocelových kcí sloupů a rámu z profilů včetně potřebného podepření a pomocného materiálu 2xL profil 50x50x4 překlad okna: 3,43°(1,4+1,4+1,4+1,4+1,42+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4)°2 roxar pr.12 vodorovně pro zpevnění - přivařený - kraje+uprostřed 0,3m: 15°3'0,3'0,888 roxar pr.12 svisle jako tahla zavěšení - přivařený - 2x uprostřed 0,5m: 15°2'0,5'0,888 2xL profil 50x50x4 překlad okna: 3,43°(1,4+1,4+1,4)°2 roxar pr.12 vodorovně pro zpevnění - přivařený - kraje+uprostřed 0,3m: 3°3'0,3'0,888 roxar pr.12 svisle jako tahla zavěšení - přivařený - 2x uprostřed 0,5m: 3°2'0,5'0,888 montážní IPE 120 délky 0,8 m přivařené: 0,8°10,6 botka pro ukotvení stáv.nosniku IPE 220 délky 0,3 m: 0,3°26,2	kg	222,806
479	K	985331211	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru výztuž do zdi - dle výkazu: "Z.NP 90 kusů" -90°0,25 výztuž do zdi - dle výkazu: "Z.NP 90 kusů" odečteno již v 1.části (3,143°2+0,68°2+0,15°2+4,735°2+1,5°2+0,15°2+3,43°2+6,105°2+0,15°2+4,63°2)/0,5°0,2 (1,5+0,15+3,44+6,075+1,85°2+1,4°2+1,84°2+16,1°2-5,1+3,8°2+7,14+0,15)/0,5°0,2 (0,385+1,26+0,9+4,025°2+2,2°+1,92°2+0,56°2)/0,5°0,2 10/0,5°0,2	m	38,628
					-22,500
					0,000
					19,740
					29,414
					7,974
					4,000
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 S05 výztuž do zdi - Z.NP dle výkazu 0,75 m x 90 ks: -90°0,75°1,15°0,39/1000 výztuž do zdi - Z.NP dle výkazu 0,75 m x 90 ks: odečteno již v 1.části výztuž do zdi - skutečnost 0,75 m po 0,5m po celém obvodu stropu: 56,357/0,2°0,75°1,15°0,395/1000	t	0,066
					-0,030
					0,000
					0,09e
480	K	985331215	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru kotvení nosníků do zdi: 88 ks 25 cm: 88°0,20 kotvení nosníků do zdi: 31 ks 25 cm: 31°0,2 kotvení nosníků do zdi: 12 ks 20 cm: 12°0,20 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm kotvení nosníků do zdi: 88 ks délka 50 cm: 88°0,5°1,15°1,58/1000 kotvení nosníků do zdi: 31 ks délka 50 cm: 31°0,5°1,15°1,58/1000 kotvení nosníků do zdi: 12 ks délka 50 cm: 12°0,5°1,15°1,58/1000	m	26,200
					17,600
					6,200
					2,400
481	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm kotvení nosníků do zdi: 88 ks délka 50 cm: 88°0,5°1,15°1,58/1000 kotvení nosníků do zdi: 31 ks délka 50 cm: 31°0,5°1,15°1,58/1000 kotvení nosníků do zdi: 12 ks délka 50 cm: 12°0,5°1,15°1,58/1000	t	0,119
					0,080
					0,028
					0,011
108	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, lE, U, UE nebo L do č 22 IPE 140 délky 1 m: 1°12,9/1000	t	0,013
					0,013
949	M	13010970	ocel profilová jakost 11 375 IPE 140 12,9°1,06/1000 podchycení stáv.nosniku 16,34°1,06/1000	t	0,031
					0,014
					0,017
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	6,914
426	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm dle výkazu odpočet: "ZNP" - 1.část: 15 dle výkazu odpočet: "ZNP" - 2.část: 10 skutečnost Z.NP 2.část: 1	kus	-24,000
					-15,000
					-10,000
					1,000
427	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm "pro ocel.nosniky stropu ZNP"3 Z.NP 1.část:21 Z.NP 2.část:3	kus	21,000
					-3,000
					21,000
					3,000
444	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm dle výkazu odpočet: "strop nad ZNP"2.NP - 1.část: 23+20,3 + 16,6+11,3 dle výkazu odpočet: "strop nad ZNP"2.NP - 2.část: 16,6+11,2+1,78+2,14 dle výkazu odpočet: "strop nad ZNP"2.NP - dvůr: 11,2 96,1+11,8+2,79°2 -(33+8°2+8+7+5)°0,35	m	-24,790
					-71,200
					-31,720
					-11,200
					113,480
					-24,150
445	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy dle výkazu odpočet: "strop nad ZNP"2.NP - 1.část (23+20,3 + 16,6+11,3)*3 dle výkazu odpočet: "strop nad ZNP"2.NP - 2.část (16,6+11,2+1,78+2,14)*3 dle výkazu odpočet: "strop nad ZNP"2.NP - dvůr: 11,2°3 96,1°4+11,8°2+2,79°2°2 -(33+8°2+8+7+5)	m	7,800
					-213,600
					-95,160
					-33,600
					419,160
					-69,000
345	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm vyzdvika na kraji podesty k výtahu:1,5°0,3	m2	0,450
					0

487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-21,061	
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-1,504	
178	K	413941001R	Nosné sváry stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků	m	9,870	
			88*0,07		6,160	
			31*0,07		2,170	
			12*0,07		0,840	
			přivaření výztuže k nosníku: 7 *0,05*2		0,700	
1040	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,639	
			IPE 140 1 m		0,560	
			IPE 220 0,3 m		0,264	
			L 505*50/5			
			51,5*0,21		10,815	
			Roxory			
			3		3,000	
d	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			%	10,170

— Росветлячки

2.NP - 2.ČST

kotlanice
 00 201/03
 010 0,5m kotlanice vstavek
 00 201/03
 0070 cm okna
 00 201/03
 000 0,5m kotlanice



2. NP - DVIR

KOTVEN, NOSNIKA

DO 3DIVA

• PO 0,5 M KOTVENI

VÝZTVĚ DO ŽDVA

