

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých  
jatek pro účely Galerie Plato“**

**ZMĚNOVÝ LIST****ZL - 04e**

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Přezdění okna

Objednatel: Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 OstravaZhotovitel: Zlínstav, a.s.  
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :

Datum : 29.09.2020

**Popis změny:**

Přezdění nesymetrického kruhového okna

**Zdůvodnění:**

Zástupci NPÚ upozornili na současný stav provedení kruhové vyzdívky lemu okna ve věži, který byl v minulosti nevhodně opraven. Tento lem je ve spodní části zploštělý a nutno je provést v pravidelném kruhovém tvaru. Úpravou vyzdění do kruhového tvaru se navrátí původní řešení lemu okna tak, jak je tomu u ostatních kruhových oken.

**Řešení:**

Rozebrání části zdiva ve spodním okraji kruhového lemu okna a následné zpětné vyzdění.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

**Předpoklad dopadu do ceny :**zvýšení: bez DPH  
vč. 21% DPH9 473,52 Kč  
11 462,96 Kč**Seznam příloh:**

1. Rozpočet
2. Výkres
3. Fotodokumentace

Za Zhotovitele :

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:


zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

**SOUPIS VÍCEPRACÍ**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
920	K	985221021	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	0,402	2 329,19	936,15	CS ÚRS 2020 01
			3,14*(1,1*1,1-0,9*0,9)/2*0,64		0,40192			
921	K	985222101	Sbírání a třídění cihel ručně ze sutí s očištěním	m3	0,402	1 852,56	744,58	CS ÚRS 2020 01
923	K	985223110	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,402	14 208,94	5 710,86	CS ÚRS 2020 01
924	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,608	1 294,99	2 081,93	CS ÚRS 2020 01
<b>Celkem VÍCEPRÁCE</b>							<b>9 473,52</b>	
<b>Celkem ZL 04e</b>							<b>9 473,52</b>	

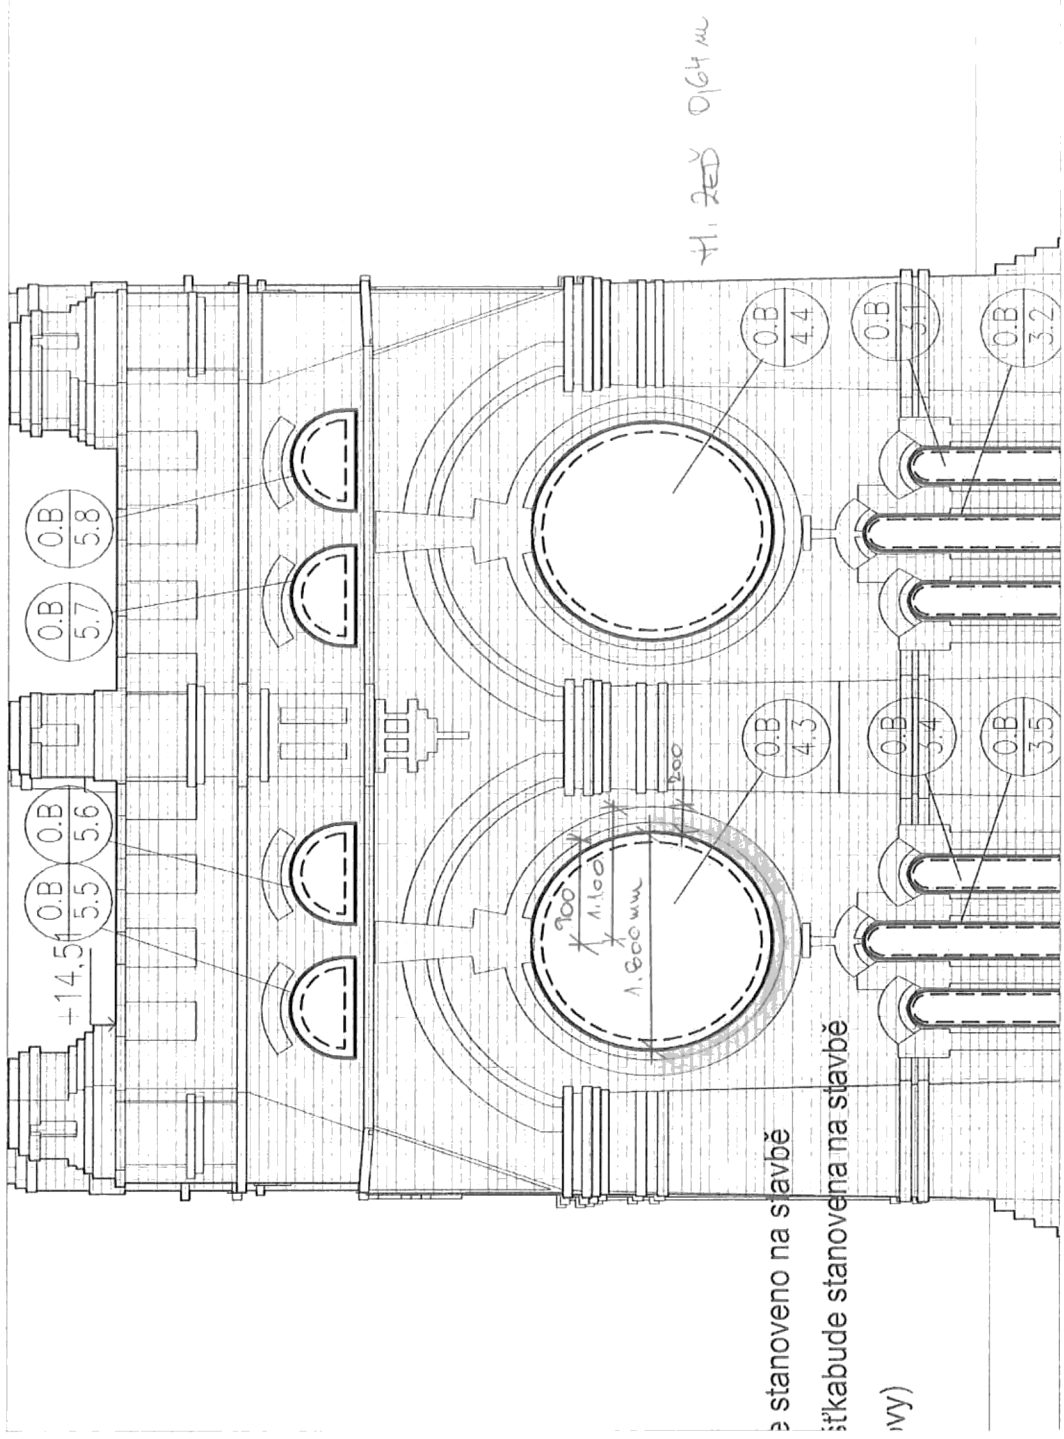

stanoveno na stavbě  
 šikabude stanovena na stavbě  
 vy)

