

Změnový list č. 7

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

1.1.2021

Adresa objednatele:
**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

OPRAVA PODLAHY V M.Č. 1.17 A 1.16

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.


Nové řešení:

Po odkrytí stávajících krytin v m.č. 1.17 a 1.16 bylo zjištěno, že stávající podlaha je provedena dřevěná (prkenná) a vykazuje značný průhyb pod zatížením.

Po provedení sondy bylo zjištěno, že stávající podlaha je nekvalitní a několikrát byla vyspravovaná. Pro finální úpravu (PVC povlaková krytina / keramická dlažba) je nevhodná. Projektantem navrženo vybourat kompletně podlahové vrstvy až na nosnou železobetonovou stropní desku a realizovat novou skladbu v ploše obou místností 1.17 a 1.16.

Nová skladba:

- Povlaková vrstva PVC / keramická dlažba (dle místnosti)
- Betonová mazanina tl. 50 mm vyztužená ocelovou sítí 100x100x4 mm
- EPS 150 tl. 30-50 mm

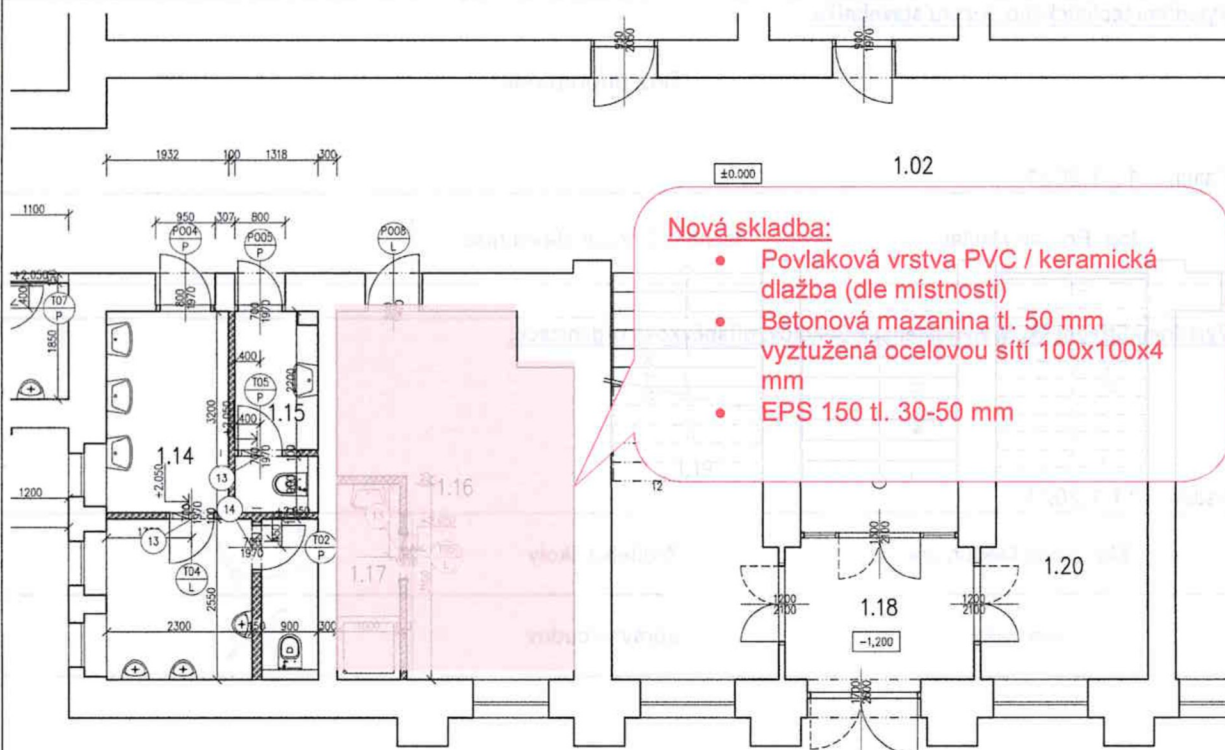

Zdůvodnění změny:

Stávající podlaha je pro finální úpravu (PVC povlaková krytina / keramická dlažba) nevhodná.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Změnový list č. 7

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV**

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **18 250,21,- Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

Lukáš Havel	prokurista	
-------------	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

	projektant	
--	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

	technický dozor stavebníka	
--	----------------------------	--

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

bez připomínek

Datum: 11.1.2021

	ředitelka školy	
	správce budov	

Změnový list č. 7

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 11.1.2021

bez připomínek

		zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
		vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Vyjádření objednatele:

bez připomínek

Datum:

11.1.2021

		Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
		Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 7

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Objednatel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

		Celkem				
		Vícepráce				
		Méněpráce				
		Změnový list č. 07 - Oprava podlahy v m.č. 1.17				
95	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,86		
96	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,86		
97	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,48		
98	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kódu odpadu 17 09 04	t	1,48		
99	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,63		
17	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,08		
3	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,02		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

4	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,02		
	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,86		
	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,03		
	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,03		
	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	27,34		
	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,06		
	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 17 02 01	t	0,38		
	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,68		
		Deska z polystyrenu EPS 150, hrana rovná tl. 30-50mm	m2	22,75		
	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	21,13		
