






## SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo objednatele: 62-2-7442/2021  
číslo zhotovitele: 053210085

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících (dále jen „**smlouva**“) mezi následujícími smluvními stranami

### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 950 630 160,   
Fax: 950 630 207  
Datová schránka: ybiaiuv  
(dále jen „objednatel“)


a

#### KOMA MODULAR s.r.o.

Sídlo: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice  
Kontaktní adresa: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice  
IČO: 46966170  
DIČ: CZ46966170  
Její jménem jedná:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
E-mail: prodej@koma-modular.cz  
Telefon: 577 007 713, 606 734 155  
Fax: -  
Datová schránka: jthqvzr  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6807  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit, dodat, provést montáž a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.



2. Specifikace díla: **HS Žebětín – provizorní stanice** (dodávka 6 ks mobilních kontejnerů, repase 6 ks mobilních kontejnerů, jejich montáž a systémové kompatibilní propojení do sestavy, položkový rozpočet vč. specifikace předmětu plnění v příloze č. 1).
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 3. 2021, jejíž součástí je položkový rozpočet a specifikace předmětu plnění, a která byla podána na základě výzvy č. HSBM-333/2021.

### Článek III.


#### Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
3. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla: repase, dodávka a kompatibilní systémové napojení a montáž mobilních kontejnerů – do 30. 7. 2021.
4. Termín předání podkladů od zhotovitele pro založení kontejnerů – do 14 dnů od účinnosti smlouvy.
5. Místem předání díla je areál **Hostislavova, 641 00 Brno-Žebětín**, Katastrální území: Žebětín (okres Brno-město); 795674, parcelní číslo: 939/1, 1048/3.
6. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
8. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 2 (slovy: dvou) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III. odst. 5. a 6.
9. Přípravné základové konstrukce, které nejsou předmětem této smlouvy, budou provedeny do 15. 7. 2021.

### Článek IV.

#### Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od zhotovitele.



2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

#### Článek V.

##### Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1 968 500,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondevětsetšedesátosmtisícipětset Kč) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 2 381 885,00 Kč s DPH (slovy: dvamilionytřistaosmdesátjednatisícosmsetosmdesát pět Kč), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacená na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvláště ceny za zboží v Kč bez DPH, zvláště DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu a položkově rozpis fakturované částky.
4. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet zhotovitele uvedený v čl. I. smlouvy. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

#### Článek VI.

##### Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se



kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

#### Článek VII.

##### Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, maximálně však 3 roky.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

#### Článek VIII.

##### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. odst. 3 ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. III. odst. 8 a čl. IX. odst. 3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodloužení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodloužení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodloužení ve výši 0,3 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodloužení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodloužení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodloužení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.



6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
  - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. odst. 8 a čl. IX. odst. 3;
  - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
  - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
  - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

#### Článek IX.

##### Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě, telefonicky, faxem, datovou zprávou nebo emailem na adresy uvedené v čl. I. smlouvy. Na ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení..
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení reklamace objednatele zhotoviteli nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Bude-li pro zhotovitele technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném objednatelem.
4. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny kontaktní osobou.




**Článek X.**  
**Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
7. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu díla a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy pro stavební činnost.
9. Zhotovitel odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě podle ČSN a dalších norem platných na území České republiky a technologických postupů a ve stanovených termínech. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
10. Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců poddodavatelů.

**Článek XI.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Oprávněné osoby ve věci předání a převzetí díla:
  - a) za objednatele [REDACTED]
  - b) za zhotovitele [REDACTED]
3. Tato smlouva nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,




ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinností dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Dále se smluvní strany dohodly, že osobní údaje lze před zveřejněním anonymizovat.
5. Tato smlouva se řídí podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
6. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
12. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele vč. položkového rozpočtu a specifikace předmětu plnění č. nabídky 210085


Příloha č. 2: Plná moc pro pana 

22.3.2021



Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
plk. Ing. Jiří Pelikán  
ředitel HZS Jihomoravského kraje

**KOMA** L12  
KOMA MODULAR s.r.o.



Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
46

## PLNÁ MOC

KOMA MODULAR s.r.o.


Říčanská 1191, 763 12 Vizovice

IČO: 46966170

Jednající:



Zmocňuje





K tomu, aby jménem společnosti KOMA MODULAR s.r.o. podepisoval kupní smlouvy, nebo smlouvy o dílo na dodávky modulárních staveb, obytných, sanitárních kontejnerů do výše **3.000.000,- Kč**.

Ve Vizovicích, dne 1.2.2021

Zplnomocnění přijímám:

Ing



Pravoz Brno  
Železná 697/4, 619 00 Brno 19 - Horní Heršpice  
T +420 549 522 211

T +420 577 007 711 ústředna / reception  
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170  
společnost zapsána o KOS Brno  
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.  
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice  
Česká republika / Czech Republic  
e-mail: info@koma-modular.cz  
www.koma-modular.cz

# KOMA



## Technický popis / položkový výměr

### Kontejnery:

4	ks	901	9010777000	kontejner C3 6058x2438x2940(2600) PON-120, PI-100, SI-100, 2xST; * Rám s celopozinkovaným rámem svařeným z válcovaných a ohýbaných pozinkovaných ocelových profilů do tloušťky plechu 4 mm, stohovatelný do 3 podlaží. Obsahuje 8 ISO kostek pro manipulaci a spojování.
2	ks	901	9011902000	kontejner C3 8000x2438x2940(2600) PON-120, PI-120, SI-100, 2xST; * Rám s celopozinkovaným rámem svařeným z válcovaných a ohýbaných pozinkovaných ocelových profilů do tloušťky plechu 4 mm, stohovatelný do 3 podlaží. Obsahuje 8 ISO kostek pro manipulaci a spojování.

### Střecha:

100	m2	909	9090101012	strop izolace tl. 100 (60, 40kg+40, 20kg) dřevo/LTD 10mm bílá, REW 15, DP3; *
-----	----	-----	------------	---

### Stěny:

6	ks	903	9035001000	odvětrání kontejneru pr. 110mm; *
230	m2	903	9030101905	stěna obv. izolace 60mm (40kg/m3 $\lambda=0,035$ ), REW 45/REI 15-DP3, dřevo/LTD[2,485](bílá) 10 mm, KOM
6	m2	903	9031301016	příčka rovná, tl. izolace 40mm, dřevo, GKBi 12,5/GKBi 12,5; *

### Podlaha:

2	ks	906	90604xx300	šachta - otvor do podlahy dle výkresové dokumentace; *
100	m2	906	9060101000	podlaha izolace 80mm, (20 kg/m3) $U=0,720$ W/m2K; * Standardní podlahová konstrukce ve složení ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, tepelná izolace URSA tl. 80 mm, parozábrana tl. 0,15 mm.
100	m2	906	9060122050	deska podlahová Cetris 22x1250x2435mm, (obě podélné strany otevřené); *

### Lakování:

286	m2	907	9071109010	nástřik PE 81 RAL 9010/7, bílá; *
-----	----	-----	------------	-----------------------------------

### Podlahová krytina:

1	ks	905	9050601051	vpust' podlahová Joti, M-Sluk Hoey 50 (pouze pro PVC); *
5	ks	905	9050104131	lišta vrtaná Al ukončovací pro pvc fabion L=2700mm; * Hliníkový profil překrývající přechod mezi podlahovinou vytaženou na stěnu a stěnou.
130	m2	905	9050104000	PVC Tarkett Standard Plus 3067 495/1,5, tl. 1,5mm, šedá; * Univerzální homogenní PVC o tloušťce 1,5 mm, oblast použití dle EN 685 je 32/41, protiskluznost je R9 dle DIN 51130 a $\mu \geq 0,3$ dle EN 13893, požární odolnost Bfl-s1.
10	m2	905	9050111038	PVC Tarkett Granit Multisafe 3476740, tl. 2,5mm, tmavě šedá; * Homogenní PVC o tloušťce 2,5 mm určené do mokrych prostor, se zaobleným pobitím, doporučované pouze do prostor, kde se šlape bosýma nohama, oblast použití dle EN 685 je 31, protiskluznost je R10 dle DIN 51130 a $\mu > 0,3$ dle EN 13893, požární odolnost Bfl-s
16	m	905	9050111046	fabion k PVC Tarkett Granit Multisafe 3476740, tl. 2,5mm, tmavě šedá; *

### Vnitřní příčky:

1	ks	908	9031213100	příčka sani SV30 do 900mm bez dveří; *
2	ks	908	9031103000	příčka rovná (max. 3bm), izolace 40mm, bílá, LTD, $R_w=32$ dB; *
2	ks	908	9031212200	příčka sani SV30 do 1250mm s dveřma O/Z; *
1	ks	908	9031105000	příčka rovná max 3m, izolace 40mm, Simona/LDT; * Příčka pláštěná z jedné strany koextrudovanou pěnovou PVC deskou Simona COPLAST-AS-X a z druhé strany laminovanou dřevotřískou na dřevěném rastru. Desky jsou kotveny vruty do dřevěných hranolů, vruty jsou následně opatřeny krytkami. Spojení dvou desek se
10	m2	908	9031402000	příčka instalační předsazená SIMONA 10mm/dřevo, bílá; *

### Dveře:

3	ks	913	9131104484	dveře vnit.vč.zár. 875x2000, pravé, kování, větr.mřížka, DIN; *
2	ks	913	9130601000	dveřní otvor pro průchod do druhého kontejneru; *
2	ks	913	91311044xx	dveře vnit.vč.zár. 875x2000, pravé, kování, DIN; *
2	ks	913	9131104559	dveře vnit.vč.zár. 875x2000, levé, kování, DIN; *
7	ks	913	9130405301	vložka FAB (ČSN); *

### Okna:

1	ks	911	9110101100	okno plastové 600x450, bez rolety, S, ornament, SF 70 AD, U-1,1 (O); *
1	ks	911	9110103000	okno plastové 900x1335, s roletou, OS, pravé, SF 70 AD, U-1,1, (O); *
3	ks	911	9110601065	otvor ve stěně dle VD s průchodkou v RAL 9010; *
2	ks	911	9110105110	okno plastové 1200x1335, s roletou, OS, levé, SF 70 AD, U-1,1 (O)*
3	ks	911	9110107200	okno plastové 1765x1335, s rol., OS/OS, SF 70 AD, U-1,1, (O); *

**Technický popis / položkový výměr****Mříže:**

1	ks	912	9120208007	mříž pro okno 900x1335mm, pozinkovaná, kulatina, pásovina, (výr. Koma); *
1	ks	912	9120208002	mříž pro okno 600x450mm, pozinkovaná, kulatina, pásovina, roz. 700x700mm, (výr. Koma); *
3	ks	912	9120101000	mříž pro okno 1765x1335mm, pozinkovaná, kulatina, pásovina, (výr. Koma); *
2	ks	912	9120208001	mříž pro okno 1200x1200(1335)mm, pozinkovaná, kulatina, pásovina, (výr. Koma); *

**Osvětlení:**

1	ks	916	9160214091	vývod kabelu (bez kabelu); *
2	ks	916	9160203080	svítidlo zářivkové 1x36W s krytem IP65 s předřadníkem; *
3	ks	916	9160207126	svítidlo venkov. LED PHILIPS 4,5W(44W)IP44, 16484/93/P3 Bustan, 1000lm, 4000K, soumr-pohyb čidlo; *
12	ks	916	9160203070	svítidlo zářivkové 1x36W s krytem IP20 s předřadníkem; *

**Topení, klimatizace:**

1	ks	917	9170690000	čidlo vlhkosti Hyg 6001; *
2	ks	917	9170604002	ventilátor MAICO AWB 100 TC + vnější mřížka AP 100, s doběhem; *
2	ks	917	9170102033	topidlo 1 kW Stiebel CNS 100 Trend, IP 24; *
5	ks	917	9170106037	topidlo 2 kW Stiebel CNS 200 Trend, IP 24; *
5	m	917	9170616010	ventilační potrubí L-3000 mm, SPIRO D-100mm (bez upevňovacích dílů); *

**Elektroinstalace:**

1	ks	920	9200513000	rozvaděč dle projektu
1	ks	920	9200109005	zásuvka na fasádě 400V/16A/5P IP44, ČSN; *
1	ks	920	9200101198	zásuvka na fasádě přisazená 230V 16A, IP 55, DIN; *
3	ks	920	9200409000	vypínač IP44; *
2	ks	920	9200612000	přívod kabelu přes podlahu; *
5	ks	920	9200404000	vypínač IP20; *
2	ks	920	9200401000	vypínač schodišťový IP20; *
2	ks	920	9200201010	krabička s vypínačem (doutnavka) pro topidlo, bojler do 3 kW, NIKO 2-pólový; *
5	ks	920	9200604734	zásuvka vnitřní 230 V, dvojitá, ČSN, IP20, do kabelkanálu; *
35	m	920	9200705000	kabelkanál 170/70 Bettermann; *
6	ks	920	9200501500	jističová skříňka IP40 ČSN 5x extra jištěná; *
19	ks	920	9200104000	zásuvka vnitřní 230 V, dvojitá, ČSN, IP20; *
6	ks	920	9200106001	zásuvka vnitřní 230 V, dvojitá, ČSN, IP44; *
10	ks	920	9200106000	zásuvka vnitřní 230 V, ČSN, IP44; *
100	m	920	9200702000	kabelkanál 40/20 MALPRO; *
60	m	920	9200306020	husí krk 32mm s protahovacím drátem; *
10	ks	920	9200307015	vývod husího krku 32mm s protahovacím drátem; *
20	ks	920	9200106200	zásuvka vnitřní 230 V, na omítku, ČSN, IP44; *
18	ks	920	9980000846	dvozásuvka vnitřní 230 V, na omítku, OP 210085
7	ks	920	9200101000	zásuvka vnitřní 230 V, ČSN, IP20; *

**Ohřivače vody:**

1	ks	918	9180207024	bojler 200l, Stiebel Eltron PSH200 Trend 232086; *
1	ks	918	9180101100	ohřivač vody tlakový Stiebel Eltron SHU 5l SL 222152, spodní; *

**Sanitární vybavení:**

1	ks	919	9191104000	ostydová stěna u pisoáru - SV30; *
1	ks	919	9190603100	příplatek za odvětrání odpadu - přísávací hlavice; *
2	ks	919	9190101000	WC standard Euro se splachovací nádrží, držák toal.pap., háček; *
2	ks	919	9190902000	pisoár Ecco s tlakovým ventilem; *
2	ks	919	9191202000	komplet (redukční, uzavírací a vypouštěcí ventil); *
3	ks	919	9190321000	umyvadlo President š.550mm SV+TV, police, zrcadlo (300x400mm), háček, baterie; *
3	ks	919	9191500014	zkouška těsnosti a tlaková zkouška sociálního kontejneru; *
4	ks	919	9191207000	příprava vody k (umyvadlu, žlabu, pračce, myčce..) studená voda (1x vývod); *
2	ks	919	9190701119	sprcha vanička Stella (800x800) dvířka zalam. Ravak, typ SDZ3 80, háček, bat. Kludi; *
80	m	919	9190801000	vodovodní potrubí plastové; *
70	m	919	9190803000	odpadní potrubí; *
15	m	919	9190602000	zadeklování odpadů, rozvodů a odvětrání, Simona tl. 10mm, bílá; *
6	m	919	9190602041	zadeklování odvětrání laminem tl. 10mm, (jen u stropu); *

**Příplatky:**

2	ks	904	9039901210	záděl celého kontejneru L=10 bm; *
18	m2	904	9040306000	obklad standardní stěny vnitřní Simona deskou 10mm; *
7,5	m2	904	9040306002	obklad standardního stropu vnitřní Simona deskou 10mm (délka 2510mm); *
19	m2	904	9040102000	obklad keramický RAKO 150/150mm, bílý matný; *

**Technický popis / položkový výměr****Montáž:**

1 ks 951 9510300029 Montáže; \*

**Doprava:**

1 ks 952 9520200001 Doprava kontejnerů

**Ostatní a atypické položky:**

1	ks	910	9100303010	otvor ve střeše dle výkresové dokumentace;*
1	ks	943	9430490000	příplatek k přístřešku - jen práce (montáž + demontáž v závodě); *
1	kpl	955	9980000090	Demontáž příčky + nová příčka 75mm (40mm vata) do dl. 3m; OP 210085
1	kpl	955	9980000092	Demontáž klimatizací + zaslepení otvorů po stěnových klimatizacích, OP 210085
1	ks	943	9430407040	přístřešek 2438x1050mm, lakovaný RAL dle VD, plechový typ KOMA; *
1	kpl	955	9980000091	Stožár na střeše (prostup přes střechu) pro antény, V=1,5m; OP 210085
1	kpl	955	9980000093	D+M Kuchyňné vč. spotřebičů (trouba, sklokeram. deska, myčka); OP 210085
3	ks	955	9550200004	revize elektro ČSN sanitární, (kontejner); *
5	ks	940	9400104100	spoj pouze pro vnitřní dveřní průchod přetahované PVC; *
35,5	ks	940	9400500000	spoj stěna spoj LTD, výška spoje 1 bm; *
25	ks	940	9400500030	spoj strop rovný spoj LTD, délka spoje 1 bm; *
25	ks	940	9400500070	spoj podlaha, délka spoje 1 bm; * - obecná položka do nabídek
6	ks	940	9400500080	spoj dveřní spoj LTD + šedým hříbek; *
50	m	949	9490000262	kabel NYM-J 3x2,5mm;*
20	ks	940	9400105000	wago spojka; *
12	ks	902	9020501000	otvor ve stojíně/v rámu vypálený + pozink. průchodka + výřez v panelu; *
115	ks	940	9400101101	spoj standard 1m (vnější spoj-hříbek, sp. šrouby, kryty);*
1	ks	955	9550200007	revize elektro ČSN sestavy kontejnerů (na montáži)
9	ks	955	9550200002	revize elektro ČSN obytný, (kontejner); *
20	m2	949	9490000487	výztuha do stěny/stropu - překližka 21mm;*
50	m	949	9490000269	kabel NYM-J 3x1,5mm;*
20	m2	949	9490000697	hydroizolace vč.osazení bandáže (pod dlažbu, obklad) (D+M) *

Kalkulace č.: 500 210431

Vypracoval:





## H2S Žebětín\_slepý rozpočet

Pořadí	Název 1	Množství	Jednotka	JC bez DPH	CC bez DPH
01	rám 6058x2438x2940[s.v.2600] PON-120, PI-100, SI-100, 2xSF; celopozinkovaná konstrukce	4	ks	69 923,00 Kč	279 692,00 Kč
02	rám 8000x2438x2940[s.v.2600] PON-120, PI-100, SI-100, 2xSF; celopozinkovaná konstrukce	2	ks	79 741,00 Kč	159 482,00 Kč
03	stěna obv. izolace 60mm (40kg/m3 A- 0,03S), REW 45/REI 15-DP3, dřevo/LTD(2,48S)(bílá) 10 mm, trap. plech	230	m2	795,00 Kč	182 850,00 Kč
04	příčka rovná, tl. izolace 40mm,dřevo, GKBi 12,5/GKBi 12,5;	6	m2	1 127,00 Kč	6 762,00 Kč
05	odvětrání kontejneru pr. 110mm;	6	ks	297,00 Kč	1 782,00 Kč
06	zdivo celého kontejneru	2	ks	4 585,00 Kč	9 170,00 Kč
07	obklad keramický 150/150mm,bílý matný;	19	m2	1 592,00 Kč	30 248,00 Kč
08	obklad standardní stěny vnitřní voděodolnou deskou 10mm;	18	m2	577,00 Kč	10 386,00 Kč
09	obklad standardního stropu vnitřní voděodolnou deskou 10mm	7,5	m2	607,00 Kč	4 552,50 Kč
10	PVC tl. 1,5mm, šedá;	130	m2	295,00 Kč	38 350,00 Kč
11	PVC tl. 2,5mm, tmavě šedá;	10	m2	1 938,00 Kč	19 380,00 Kč
12	vpust' podlahová	1	ks	2 765,00 Kč	2 765,00 Kč
13	podlaha izolace 80mm, (20 kg/m3) U=0,720 W/m2K;	100	m2	301,00 Kč	30 100,00 Kč
14	deska podlahová Cetris 22x1250x2435mm	100	m2	682,00 Kč	68 200,00 Kč
15	řachta - otvor do podlahy dle výkresové dokumentace;	2	ks	1 007,00 Kč	2 014,00 Kč
16	nástřík RAL 9010, bílá;	286	m2	59,00 Kč	16 874,00 Kč
17	příčka rovná (max. 3bm), izolace 40mm, bílá, LTD, Rw=32dB;	2	ks	5 865,00 Kč	11 730,00 Kč
18	příčka rovná max 3m, izolace 40mm, voděodolná deska/LDT;	1	ks	8 341,00 Kč	8 341,00 Kč
19	příčka sanitární do 1250mm s dvěma O/Z;	2	ks	7 145,00 Kč	14 290,00 Kč
20	příčka sanitární do 900mm bez dveří;	1	ks	3 023,00 Kč	3 023,00 Kč
21	příčka instalační předsazená voděodolná deska 10mm/dřevo, bílá;	10	m2	893,00 Kč	8 930,00 Kč
22	strop izolace tl. 100 (60, 40kg+40, 20kg) dřevo/LTD 10mm bílá, REW 15, DP3	100	m2	612,00 Kč	61 200,00 Kč
23	otvor ve střeše dle výkresové dokumentace;	1	ks	999,00 Kč	999,00 Kč
24	okno plastové 600x450, bez rolety, S, ornament, Sf 70 AD, U-1,1	1	ks	2 773,00 Kč	2 773,00 Kč
25	okno plastové 900x1335, s roletou, OS, pravé, SF 70 AD, U-1,1	1	ks	7 202,00 Kč	7 202,00 Kč
26	okno plastové 1200x1335, s roletou, OS, levé, SF 70 AD, U-1,1	2	ks	7 921,00 Kč	15 842,00 Kč
27	okno plastové 1765x1335, s rol.,OS/OS,SF 70 AD,U-1,1,	3	ks	11 093,00 Kč	33 279,00 Kč
28	otvor ve stěně dle VD s průchodkou v RAL 9010;	3	ks	715,00 Kč	2 145,00 Kč
29	mříž pro okno 1765x1335mm,pozinkovaná,kulatina,pásovina	3	ks	4 081,00 Kč	12 243,00 Kč
30	mříž pro okno 1200x1200(1335)mm,pozinkovaná,kulatina,pásovina	2	ks	2 406,00 Kč	4 812,00 Kč
31	mříž pro okno 600x450mm,pozinkovaná,kulatina,pásovina	1	ks	1 327,00 Kč	1 327,00 Kč
32	mříž pro okno 900x1335mm,pozinkovaná,kulatina,pásovina	1	ks	2 421,00 Kč	2 421,00 Kč
33	vložka FAB (ČSN);	7	ks	220,00 Kč	1 540,00 Kč
34	dveřní otvor pro průchod do druhého kontejneru;	2	ks	1 257,00 Kč	2 514,00 Kč
35	dveře vnit.vč.zár. 875x2000,pravé,kování,větr.mřížka	3	ks	4 218,00 Kč	12 654,00 Kč
36	dveře vnit.vč.zár. 875x2000,pravé,kování	2	ks	3 928,00 Kč	7 856,00 Kč
37	dveře vnit.vč.zár. 875x2000,levé,kování	2	ks	3 928,00 Kč	7 856,00 Kč
38	svítidlo vnitřní 1x36W s krytem IP20 s předřadníkem	12	ks	1 055,00 Kč	12 660,00 Kč
39	svítidlo vnitřní 1x36W s krytem IP65 s předřadníkem	2	ks	1 086,00 Kč	2 172,00 Kč
40	svítidlo venkov.LED 4,5W(44W)IP44,soumr-pohyb čidlo	3	ks	2 396,00 Kč	7 188,00 Kč
41	topidlo 1 kW, IP 24	2	ks	2 796,00 Kč	5 592,00 Kč
42	topidlo 2 kW, IP 24	5	ks	3 472,00 Kč	17 360,00 Kč
43	ventilátor + vnější mřížka, s doběhem	2	ks	2 764,00 Kč	5 528,00 Kč
44	čidlo vlhkosti	1	ks	2 290,00 Kč	2 290,00 Kč
12569	ohříváč vody tlakový 5l,spodní;	1	ks	11 194,00 Kč	11 194,00 Kč
46	bojler 200l	1	ks	19 258,00 Kč	19 258,00 Kč
47	WC standard se splachovací nádržíkou, držák toal.pap., háček;	2	ks	4 061,00 Kč	8 122,00 Kč
48	umyvadlo 1.550mm SV+TV,police,zrcadlo (300x400mm),háček,baterie;	3	ks	4 713,00 Kč	14 139,00 Kč
49	zadeklování odpadů,rozvodů a odvětrání voděodolnou deskou tl. 10mm, bílá;	15	bm	910,00 Kč	13 650,00 Kč
50	zadeklování odvětrání laminem tl. 10mm, (jen u stropu);	6	bm	689,00 Kč	4 134,00 Kč
51	příplatek za odvětrání odpadu - přisávací hlavice;	1	ks	605,00 Kč	605,00 Kč
52	sprcha vanička (800x800) dvířka zalam., háček, baterie	2	ks	19 583,00 Kč	39 166,00 Kč
53	vodovodní potrubí plastové;	80	bm	258,00 Kč	20 640,00 Kč
54	odpadní potrubí;	70	bm	603,00 Kč	42 210,00 Kč
55	pisoiár Ecco s tlakovým ventilem;	2	ks	3 555,00 Kč	7 110,00 Kč
56	ostydová stěna u pisoiáru	1	ks	2 429,00 Kč	2 429,00 Kč
57	komplet (redukční, uzavírací a vypouštěcí ventil);	2	ks	1 726,00 Kč	3 452,00 Kč
58	příprava vody k (umyvadlu, žlabu, pračce, myčce...) studená voda (1x vývod);	4	ks	827,00 Kč	3 308,00 Kč
59	zkouška těsnosti a tlaková zkouška sociálního kontejneru;	3	ks	725,00 Kč	2 175,00 Kč
60	zásuvka vnitřní 230 V, ČSN, IP20;	7	ks	310,00 Kč	2 170,00 Kč
61	zásuvka na fasádě přisázená 230V 16A, IP 55, DIN;	1	ks	650,00 Kč	650,00 Kč
62	zásuvka vnitřní 230 V, dvojitá, ČSN, IP20;	19	ks	490,00 Kč	9 310,00 Kč
63	zásuvka vnitřní 230 V, ČSN, IP44;	10	ks	589,00 Kč	5 890,00 Kč
64	zásuvka vnitřní 230 V, dvojitá, ČSN, IP44;	6	ks	921,00 Kč	5 526,00 Kč
65	zásuvka vnitřní 230 V, na omítku, ČSN, IP44;	20	ks	305,00 Kč	6 100,00 Kč
66	zásuvka na fasádě 400V/16A/5P IP44, ČSN;	1	ks	1 199,00 Kč	1 199,00 Kč
67	krabička s vypínačem (doutnavka) pro topidlo, bojler do 3 kW	2	ks	969,00 Kč	1 938,00 Kč
68	hustý křk 32mm s protahovacím drátem	60	bm	87,70 Kč	5 262,00 Kč
69	vypínač schodiškový IP20;	2	ks	352,00 Kč	704,00 Kč
70	vypínač IP20;	5	ks	314,00 Kč	1 570,00 Kč
71	vypínač IP44;	3	ks	458,00 Kč	1 374,00 Kč
72	jističová skříňka IP40 ČSN 5x extra píštěná;	6	ks	4 799,00 Kč	28 794,00 Kč
73	zásuvka vnitřní 230 V, dvojitá, ČSN, IP20, do kabelkanálu;	5	ks	576,00 Kč	2 880,00 Kč
74	přívod kabelu přes podlahu;	2	ks	94,00 Kč	188,00 Kč
75	kabelkanál 40/20	100	bm	89,00 Kč	8 900,00 Kč
76	kabelkanál 170/70	35	bm	395,00 Kč	13 825,00 Kč
77	dvojitá zásuvka vnitřní 230 V, na omítku,	18	ks	449,00 Kč	8 082,00 Kč
78	spoj standard 1m (vnější spoj-hříbek,sp.šrouby,kryty)	115	ks	608,00 Kč	69 920,00 Kč
79	spoj pouze pro vnitřní dveřní průchod přetahované PVC	5	ks	421,00 Kč	2 105,00 Kč
80	wago spojka	20	ks	196,00 Kč	3 920,00 Kč
81	spoj stěna spoj LTD, výška spoje 1 bm	35,5	ks	186,00 Kč	6 603,00 Kč
82	spoj strop rovný spoj LTD, délka spoje 1 bm;	25	ks	70,00 Kč	1 750,00 Kč
83	spoj podlaha, délka spoje 1 bm;	25	ks	700,00 Kč	17 500,00 Kč
84	spoj dveřní spoj LTD + šedým hříbek;	6	ks	352,00 Kč	2 112,00 Kč
85	přístřešek 2438x1050mm, lakovaný RAL dle VD, plechový	1	ks	12 894,50 Kč	12 894,50 Kč

86	kabel NYM-J 3x2,5mm;	50	bm	22,00 Kč	1 100,00 Kč
87	kabel NYM-J 3x1,5mm;	50	bm	15,00 Kč	750,00 Kč
88	výztuha do stěny/stropu - překližka 21mm;	10	m <sup>2</sup>	695,00 Kč	6 950,00 Kč
89	hydroizolace vč. osazení bandáže	20	m <sup>2</sup>	551,00 Kč	11 020,00 Kč
90	Montáž + repasování	1	kpl	128 000,00 Kč	128 000,00 Kč
91	Doprava kontejnerů	1	kpl	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
92	revize elektro ČSN obytný, (kontejner);	9	ks	470,00 Kč	4 230,00 Kč
93	revize elektro ČSN sanitární, (kontejner);	3	ks	514,00 Kč	1 542,00 Kč
94	revize elektro ČSN sestavy kontejnerů (na montáž)	1	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
95	Demontáž příčky + nová příčka 75mm (40mm vata) do dl. 3m;	1	kpl	8 800,00	8 800,00 Kč
96	Stožár na střeše (prostup přes střechu) pro antény, V=1,5m;	1	kpl	9 350,00	9 350,00 Kč
97	Demontáž klimatizací + zaslepení otvorů po stěnových klimatizacích	1	kpl	18 125,00	18 125,00 Kč
98	D+M Kuchyňné vč. spotřebičů (trouba, sklokeram. deska, myčka)	1	ks	197 500,00 Kč	197 500,00 Kč
Celkemv bez DPH					1 968 500,00 Kč

9. března 2021

## NABÍDKA 210085-V1

V případě dotazů uvádějte výše uvedené číslo.

**Projekt:**  
**ZÁZEMÍ HZS ŽEBĚTÍN**



Pro:

HZS Jihomoravského kraje

Kontakt: plk. Ing. Jiří Pelikán  
Telefon:  
Telefax:  
Mobil: +420 950 630 101  
e-mail: jiri.pelikan@firebrno.cz

Zpracoval:


KOMA MODULAR s.r.o.

Kontakt:  
Telefon:  
Telefax:  
Mobil:  
e-mail:



### Skladba nabídky:

1. Naše řešení
2. Záruka
3. Dodací termíny
4. Investice
5. Platební podmínky
6. Reference

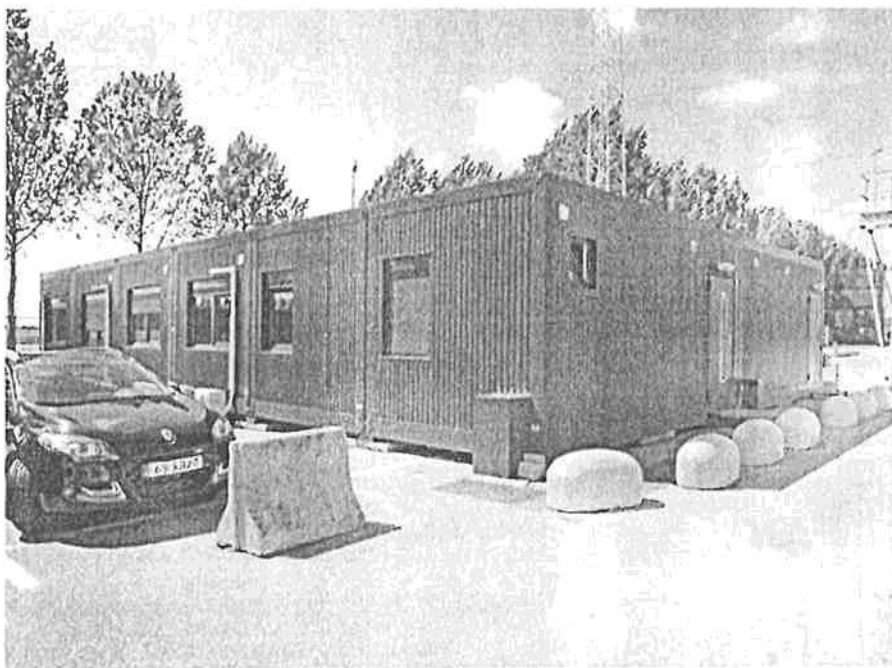

Provoz Brno  
Železná 697/4, 619 00 Brno 19 - Horní Herčovice  
T +420 649 622 211

T +420 577 007 711 ústředna / reception  
IČ: 46996170, DIČ: CZ 46996170  
společnost zapsána u KOS Brno  
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.  
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice  
Česká republika / Czech Republic  
e-mail: info@koma-modular.cz  
www.koma-modular.cz

# KOMA







- Dřevěný hranol
- Parotésná fólie
- Laminovaná dřevotřísková deska 10 mm, v sanitární části se sprchou voděodolná deska Simona 10 mm

<b>VNĚJŠÍ DVEŘE</b>	Součástí starých modulů,
<b>VNITŘNÍ DVEŘE</b>	Bílé s ocelovými zárubněmi
<b>OKNA</b>	Plastová okna sklopná / otevíravo-sklopná dovnitř, plastové pětikomorové profily, dvojitě zasklení, čiré sklo, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , s venkovními plastovými roletami.
<b>VYTÁPĚNÍ</b>	Nástěnné elektrické přímotopy Stiebel
<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>	Větrání je řešeno přirozenou cestou - okny Větrání v místnostech se sanitárním vybavením je nucené pomocí ventilátorů v odpovídajícím výkonu. Klimatizace není součástí nabídky.
<b>SANITÁRNÍ KERAMIKA</b>	Standard WC, držák toaletního papíru a háček na ručník plastový. Keramika od výrobce Cersanit, typ President.  Umyvadlo š. 550 mm na studenou a teplou vodu, zrcadlo 300x400 mm, keramická polička a plastový háček na ručník. Keramika od výrobce Cersanit, typ President.  Sprchová vanička Stella (800 x 800 mm) se zalamovacími sprchovými dveřmi Ravak, typ SDZ3 80, sprchová baterie Kludi, háček.  Pisoár Ecco s tlakovým ventilem.
<b>OHŘEV TUV</b>	Elektrické bojleru PSH Trend
<b>ROZVODY VODY</b>	Rozvody vody a odpadů jsou u WC zadeklované a u umyvadel a pisoárů jsou schovány v instalační předstěně, $v=1,2\text{m}$ . Rozvody vody jsou vedeny v plastových trubkách bez izolace, rozvody odpadů v plastových trubkách. Připojení vody a odpadů je vedeno šachtou v podlaze.
<b>OSTATNÍ</b>	Kuchyň a kuchyňské spotřebiče včetně montáže jsou součástí nabídky. Korpus skříní W930St2, dveře - W980ST2, Zásuvky a závěsy - Blum s integrovaným tlumením, Výklopy - 1*Aventos HK, Osvětlení - přisazené neutrální, sokl 100mm nerez, Electrolux trouba KOFGH70TX, Electrolux Sklokeramická deska EHF6240XXX, Electrolux Myčka EEA27200L, Elíca odsavač ERA S IX/A5, Franke dřez SKN 611-63, Franke sorter 600-3-0 1
<b>FASÁDA</b>	Standardní ocelový pozinkovaný plech, barva RAL 9010
<b>VENKOVNÍ PRVKY</b>	Přístřešek plechový typ KOMA.

## ZÁRUKA


- 96 měsíců na celopozinkovaný rám
  - 24 měsíců na ostatní zařízení
- Jako jediní standardně vyrábíme rámy z žárově zinkovaných plechů s nadstandardní životností.

Provoz Brno  
Záložná 697/4, 618 00 Brno 19 - Horní Heráňovice  
T +420 549 500 211

T +420 577 007 711 (obchodní / recepční)  
ID: 45669110, DIČ: CZ 45669110  
Správní portál Zápisky u KOS Brno  
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.  
Křemelská 1891, 260 02 Vodňany  
Ceska republika / Czech Republic  
e-mail: info@koma-modular.cz  
www.koma-modular.cz

# KOMA



## DODACÍ TERMÍNY

- Termín dodání je 30.7.2021

## INVESTICE

Položky:	Investice v Kč
Moduly vč. mříží (technický popis v příloze)	1 623 000 Kč
Montáž	128 000 Kč
Doprava Vizovice - Žebětín	20 000 Kč
D+M Kuchyně dle nákresu	197 500 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 968 500 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>413 385 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>2 381 885 Kč</b>

### V ceně není zahrnuto:

- vybudování základů pro stavbu
- vyvedení přívodů vody a elektřiny na pozemku
- jeřáb potřebný ke složení kontejnerů z aut - cena za jeřáb bude případně upřesněna po předání informací potřebných pro jeho ocenění (přístupnost až k základům, příjezdová cesta)
- kontejner na odpad (při montáži)
- dodávka slaboproudu – bude provedena pouze příprava (husí krky s protahovacími dráty a kabelkanály)

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dle SOD: 333-02-P2-HS Žebětín - provizorní stanice-návrh SoD\_7442\_doplneno\_KOMA MODULAR s.r.o.

## REFERENCE

Reference dle témat naleznete na našich internetových stránkách <http://www.koma-modular.cz/> → Referencie.

Budu se těšit na naši případnou spolupráci. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem,



**KOMA**  
KOMA MODULAR s.r.o.  
Říčanská 1191, CZ 763 12 Vizovice  
IČ: 46966170 T +420 577 007 711

# KOMA

Pravoz Brno  
Železná 697/4, 619 00 Brno 19 - Horní Heršpice  
T +420 548 522 211

T +420 677 007 711 ústředna / reception  
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170  
společnost zapsána o KOS Brno  
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.  
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice  
Česká republika / Czech Republic  
e-mail: info@koma-modular.cz  
www.koma-modular.cz

