

ZL 22



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 22
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v místnosti č.1.02 provést kontrolu stávajícího obkladu stěn dřevotřískovými plotnami a jeho doplnění v rozsahu 20%.

Nové řešení:

Nově bude provedena demontáž obložení stěn bez náhrady novými konstrukcemi.

Zdůvodnění změny:

Po provedené kontrole obkladu stěn bylo zjištěno, že stěny nejsou obloženy dřevotřískovými plotnami, ale celoplošnými dřevotřískovými deskami. Jelikož pod deskami dochází k hromadění vlhkosti a jejich degradaci, bylo s uživatelem dohodnuto, že desky budou plnoplošně demontovány bez náhrady a stěny budou ponechány v neupraveném stavu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 22



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 22
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemá další připomínky

Datum:


Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ZS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL22b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.


7L 22

PROJEKOVANÉ PRÁCE
MŮŽE VYŠTĚT, ČPA
POVRCH OTVORŮ ČELI
PŘI PRÁCI

D.1.1.
02

TŮDORYS 1. NADZEMNÍHO TOLDAŽÍ

VÝŘEZ Z VÝKRESU

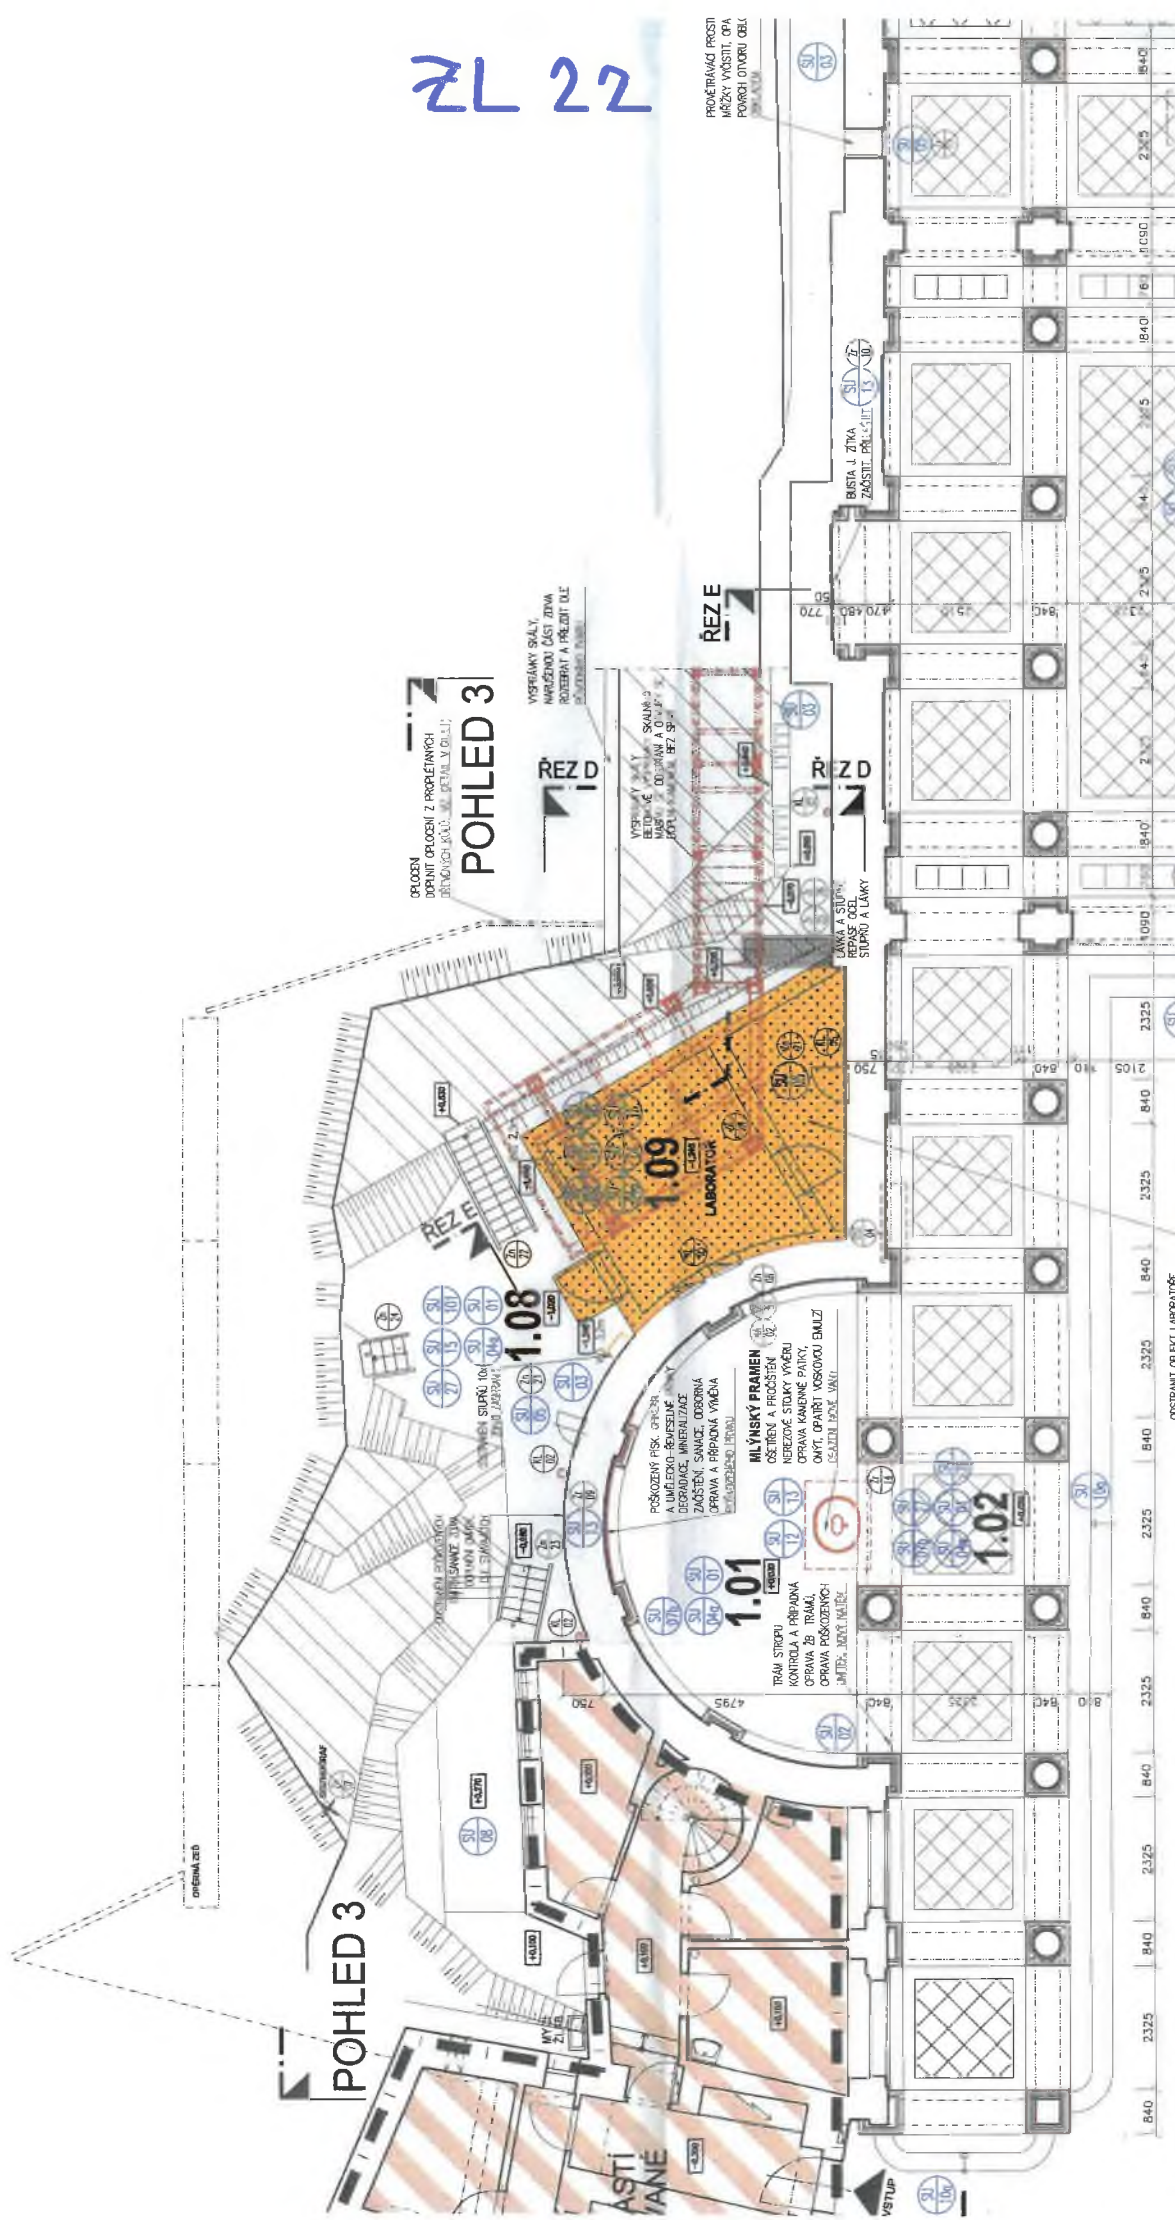

PROJEKT
DOPLNĚNÍ ÚROVNÍ Z PROJEKTŮ
BRANĚNÍ (VĚTRNÉ PŘESILY, ČELI);
POHLED 3

REZE D

REZE E

POHLED 3

ASTI
VĀNĚ

OSTRANTŮ OKRESY LABORATORŮ
STĚNY – ŽELEZA VOS KERAM. OKRESY ŽELEZNĚ
STĚNY – ARMOVANÝ BETON (OSTRANTŮ REZANĚ)
PÓDLAHA – ARMOVANÝ BETON (OSTRANTŮ REZANĚ), ČELIAMA TL.
NA ČELIACH MĀTU (RŮŽNE ROZĚRAT)
KRYTINA – AS. PÁSY (SEPAROVAT A DO OPĀSU ODĚLT)
OSTRANTŮ PROSTOR 7m²
POVRCH PO VYBĚRANÍ NĀPRACŮ KĀMĚNĀMI DESKAMI DO



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 22a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 22a - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02
(vícepráce)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 789,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 789,37	21,00%	2 265,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 055,14

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 22a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 22a - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02
(vícepráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 789,37
HSV - Práce a dodávky HSV	1 929,26
997 - Přesun sutě	1 929,26
PSV - Práce a dodávky PSV	8 860,11
766 - Konstrukce truhlářské	8 860,11



ZL 22a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 22a - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02
(vícepráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**10 789,37**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 929,26

D 997 Přesun sutě 1 929,26

1	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	1,2640	116,14	146,80
2	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,2640	157,73	199,37
3	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	36,6560	11,26	412,75
4	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,2640	219,02	276,84
5	K	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	1,2640	507,56	641,56
6	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	1,2640	199,32	251,94

D PSV Práce a dodávky PSV 8 860,11

D 766 Konstrukce truhlářské 8 860,11

7	K	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	M2	94,0564	45,10	4 241,94
8	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz přibíjených	M2	94,0564	49,10	4 618,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 22b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 22b - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02
(méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-51 362,79


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 362,79	21,00%	-10 786,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-62 148,98

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 22b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 22b - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02
(méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-51 362,79

PSV - Práce a dodávky PSV

-51 362,79

766 - Konstrukce truhlářské

-51 362,79

ZL 22b

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 22b - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02
(méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-51 362,79
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-51 362,79
	D	766	Konstrukce truhlářské				-51 362,79
1	K	766.1.12	Stávající obklad stěn dřevotřískovými plotnami, výměna degradovaných kusů (20%), revize zdiva pod obložení	M2	-94,0564	537,75	-50 578,83
2	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	-505,7800	1,55	-783,96

