

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 93b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Navýšení rozsahu odstranění zpevněných ploch s živičným povrchem		
Objekt:	IO 310 Příprava území		
Důvod a popis změny:			
Technické řešení změny:			
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-51 850,40 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednacích závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 18.5.21	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 12.5.21	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 12.5.2021	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 18.5.2021	jméno: Milan Kerekanič	podpis:



Příloha č.1a - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 93b
 Název ZL: **Navýšení rozsáhu odstranění zpevněných ploch s živícným povrchem**
 Objekt: IO 310 Příprava území
 Část objektu: 310.2.2 Odstranění zpevněných ploch s živícným povrchem

Por. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		Zemní práce										
1E	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 zpevněných s 150 mm	m2	1 576,00	32,90	51 850,40	0,00	32,90	0,00	-1 576,00	32,90	-51 850,40
CELKEM (BEZ DPH)						51 850,40			0,00			-51 850,40

	méněpráce
	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 97a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Řešení povrchové úpravy exteriérových stěn kolem plochy po odbourání kina		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Při přípravě oprav povrchů zdí v severozápadní části pozemku (v lokalitě původního kina) bylo zjištěno, že na původní stěny nelze aplikovat nové omítké souvrství, protože podkladová konstrukce stěn je nestabilní. Z tohoto důvodu bude nutné opravit tuto část objektu formou přestěny z cetrisových desek a navazujících klempířských konstrukcí. Jedná se o nálezovou situaci, kterou nemohl GP předpokládat v rámci PD.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce) Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. 763ZL97R1 Příloha č.1d - rozbor přímých nákladů položky č. 622ZL97R1 Příloha č.2 - fotodokumentace		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	231 630,53 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29. 1. 2017	jméno: Ing. Pavel Bečvář	
		podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29. 1. 2017	jméno: Martin Pražský	
		podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29. 1. 2017	jméno: Ing. Martin Košťál	
		podpis:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29. 1. 2017	jméno: Milan Kerekanič	
		podpis:	



Príloha č. 1 - Změnový rozpočet (vícepráce)

Objekt: ANP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2 Praha 6 - Bubeneč
 Účel: 37a
 Název ZL: Řešení povrchové úpravy exteriérových stěn kolem plochy po odbourání klíva
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Název dílčích: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kon.	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	Zakládání										
257 1	274315511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,00	0,00	0,00	1,73	2 630,00	4 555,48	1,73	2 630,00	4 555,48
	5	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
257 2	522325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitost 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	0,00	0,00	0,00	49,80	47,10	2 345,58	49,80	47,10	2 345,58
257 3	522325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitost 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	0,00	0,00	0,00	13,66	127,00	1 780,22	13,66	127,00	1 780,22
257 4	522131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn s mechanickým kotvením do tenkovrstvé hmoty	m2	100,00	130,40	13 048,00	135,18	130,40	16 148,52	135,18	130,40	16 148,52
257 5	5222157R1	Potázení vnějších stěn exteriérovou štukovou stěrkou arkkovateinou na fasádní stěrku vč. svislého nátěru	m2	0,00	0,00	0,00	19,18	46,80	935,78	19,18	46,80	935,78
257 6	52221611	Montáž kontaktního zatečení vnějších stěn lepením s mechanickým kotvením polystyrenových osek II do 50 mm	m2	0,00	0,00	0,00	19,18	426,68	9 181,53	19,18	426,68	9 181,53
257 7	52221631	deska fasádní polystyrenová izolační Panellet N PER 30 (EPS) 1250 x 600 x 80 mm	m2	14,30	251,00	3 589,30	20,15	251,00	5 056,98	20,15	251,00	5 056,98
	5	Ostatní konstrukce a práce, bourání										
257 8	835131111	Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah tlakovou vodou	m2	0,00	0,00	0,00	66,98	116,00	8 139,14	66,98	116,00	8 139,14
257 9	783	Konstrukce suché výstavby										
257 10	7827197R1	Dodávka a montáž předstěny z desek Cevis Finish II 12 mm s řáskem z profilu UA 100	m2	0,00	0,00	0,00	55,72	2 692,81	15 035,28	55,72	2 692,81	15 035,28
	784	Konstrukce klempířské										
257 11	754032812	Demontáž oplechování horních ploch zář. a nedeždívek v galštinu použítí	m	0,00	0,00	0,00	22,00	240,00	5 360,00	22,00	240,00	5 360,00
257 12	754204105	Montáž oplechování horních ploch z alik. bez rohů rš do 400 mm	m	0,00	0,00	0,00	22,00	409,00	8 998,00	22,00	409,00	8 998,00
257 13	754234411	Oplechování horních ploch a nedeždívek (alík) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 600 mm	m2	0,00	0,00	0,00	12,97	1 200,00	15 565,44	12,97	1 200,00	15 565,44
257 14	754234407	Oplechování horních ploch a nedeždívek (alík) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	0,00	0,00	0,00	9,70	951,00	9 642,70	9,70	891,00	8 642,70
257 15	754235404	Oplechování filmů rovinně mechanicky kotvené z Al plechu rš 830 mm	m	0,00	0,00	0,00	7,70	329,00	2 533,30	7,70	329,00	2 533,30
257 16	385184201	Přísun hmot pro konstrukce klempířské v objektech s šky 24 m	%	37 725,39	1,50	57 905,70	37 509,77	1,80	68 957,69	34,38	1,80	151,86
257 17	78305811	Dokončovací práce - nátěry										
257 18	78305811	Odstředění nátěru z omítek odrušením	m2	0,00	0,00	0,00	16,68	88,60	1 477,85	16,68	88,60	1 477,85
257 19	783023133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, lanokovrtných zrnitých nebo štukových omítek	m2	0,00	0,00	0,00	49,80	38,90	1 937,22	49,80	38,90	1 937,22
257 20	783027123	Krycí leonoděsný silikátový nátěr omítek stěnné členělosti 1 a 2	m2	0,00	0,00	0,00	49,80	81,10	4 038,78	49,80	81,10	4 038,78
CELKEM (BEZ DPH)						87 143,00		318 773,54		231 630,53		

měnící
 vícepráce - nové položky
 vícepráce - staré a úč. položky

Příloha č.1b - Individuální kalkulace R - položek

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 97a
 Nazev ZL: Řešení povrchové úpravy exteriérových stěn kolem plochy po odbourání kina
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Č.p.	Položka	MJ	Přímé náklady					Nečímé náklady		Základ	Odbytá/úplata
			Přímý materiál	Přímé mzdy	Stroje	DPH	Suboděvky	Uprávnění	Správní náhr.		
763ZL97R1	Dodávka a montáž předstěny z desek Cetins Finish II, 12 mm s rastrm z profilů UA 100	m2	1 815,06	447,94	0,00	0,00	0,00	219,51	94,34	115,96	2 692,81
622ZL97R1	Polázení vnějších stěn exteriérovou štukovou stěrkou aplikovatelnou na fasádní stěrku vč. silikonového nátěru	m2	184,36	174,20	0,00	0,00	0,00	34,78	14,95	19,37	426,66

Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. 763ZL97R1

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Poř. č.

763ZL97R1

MJ:

m2

Dodávka a montáž předstěny z desek Cetris Finish tl. 12 mm s rastroem z profilů UA 100

PŘÍMÝ MATERIÁL

Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Výztužný profil UA 100 - 40/100/40 3000 mm	m	3,12	138,70	432,10
	deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl. 1,2 cm	m2	1,10	1 093,72	1 203,09
	pomocný a kotvicí materiál	kpl	1,00	179,87	179,87
Celkem přímý materiál					1 815,06

PŘÍMÉ MZDY

Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	montér SDK	Nh	1,29	260,00	334,29
	odvody	%	34,00		113,66
Celkem přímé mzdy					447,94

Příloha č.1d - rozbor přímých nákladů položky č. 622ZL97R1

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Pol. č.

622ZL97R1

MJ:

m2


Potažení vnějších stěn exteriérovou štukovou stěrkou aplikovatelnou na fasádní stěrku vč. silikonového nátěru

PŘÍMÝ MATERIÁL

Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	weberdur stěrka	kg	4,00	9,55	38,20
	silikonový podkladní nátěr G500	kg	0,10	150,00	15,00
	silikonový vrchní nátěr Weberton silikon	kg	0,65	176,00	114,40
	doprava, ztrátě (10%)	kpl	1,00	16,76	16,76
Celkem přímý materiál					184,36

PŘÍMÉ MZDY

Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	omítkář	Nh	0,50	260,00	130,00
	odvody	%	34,00		44,20
Celkem přímé mzdy					174,20

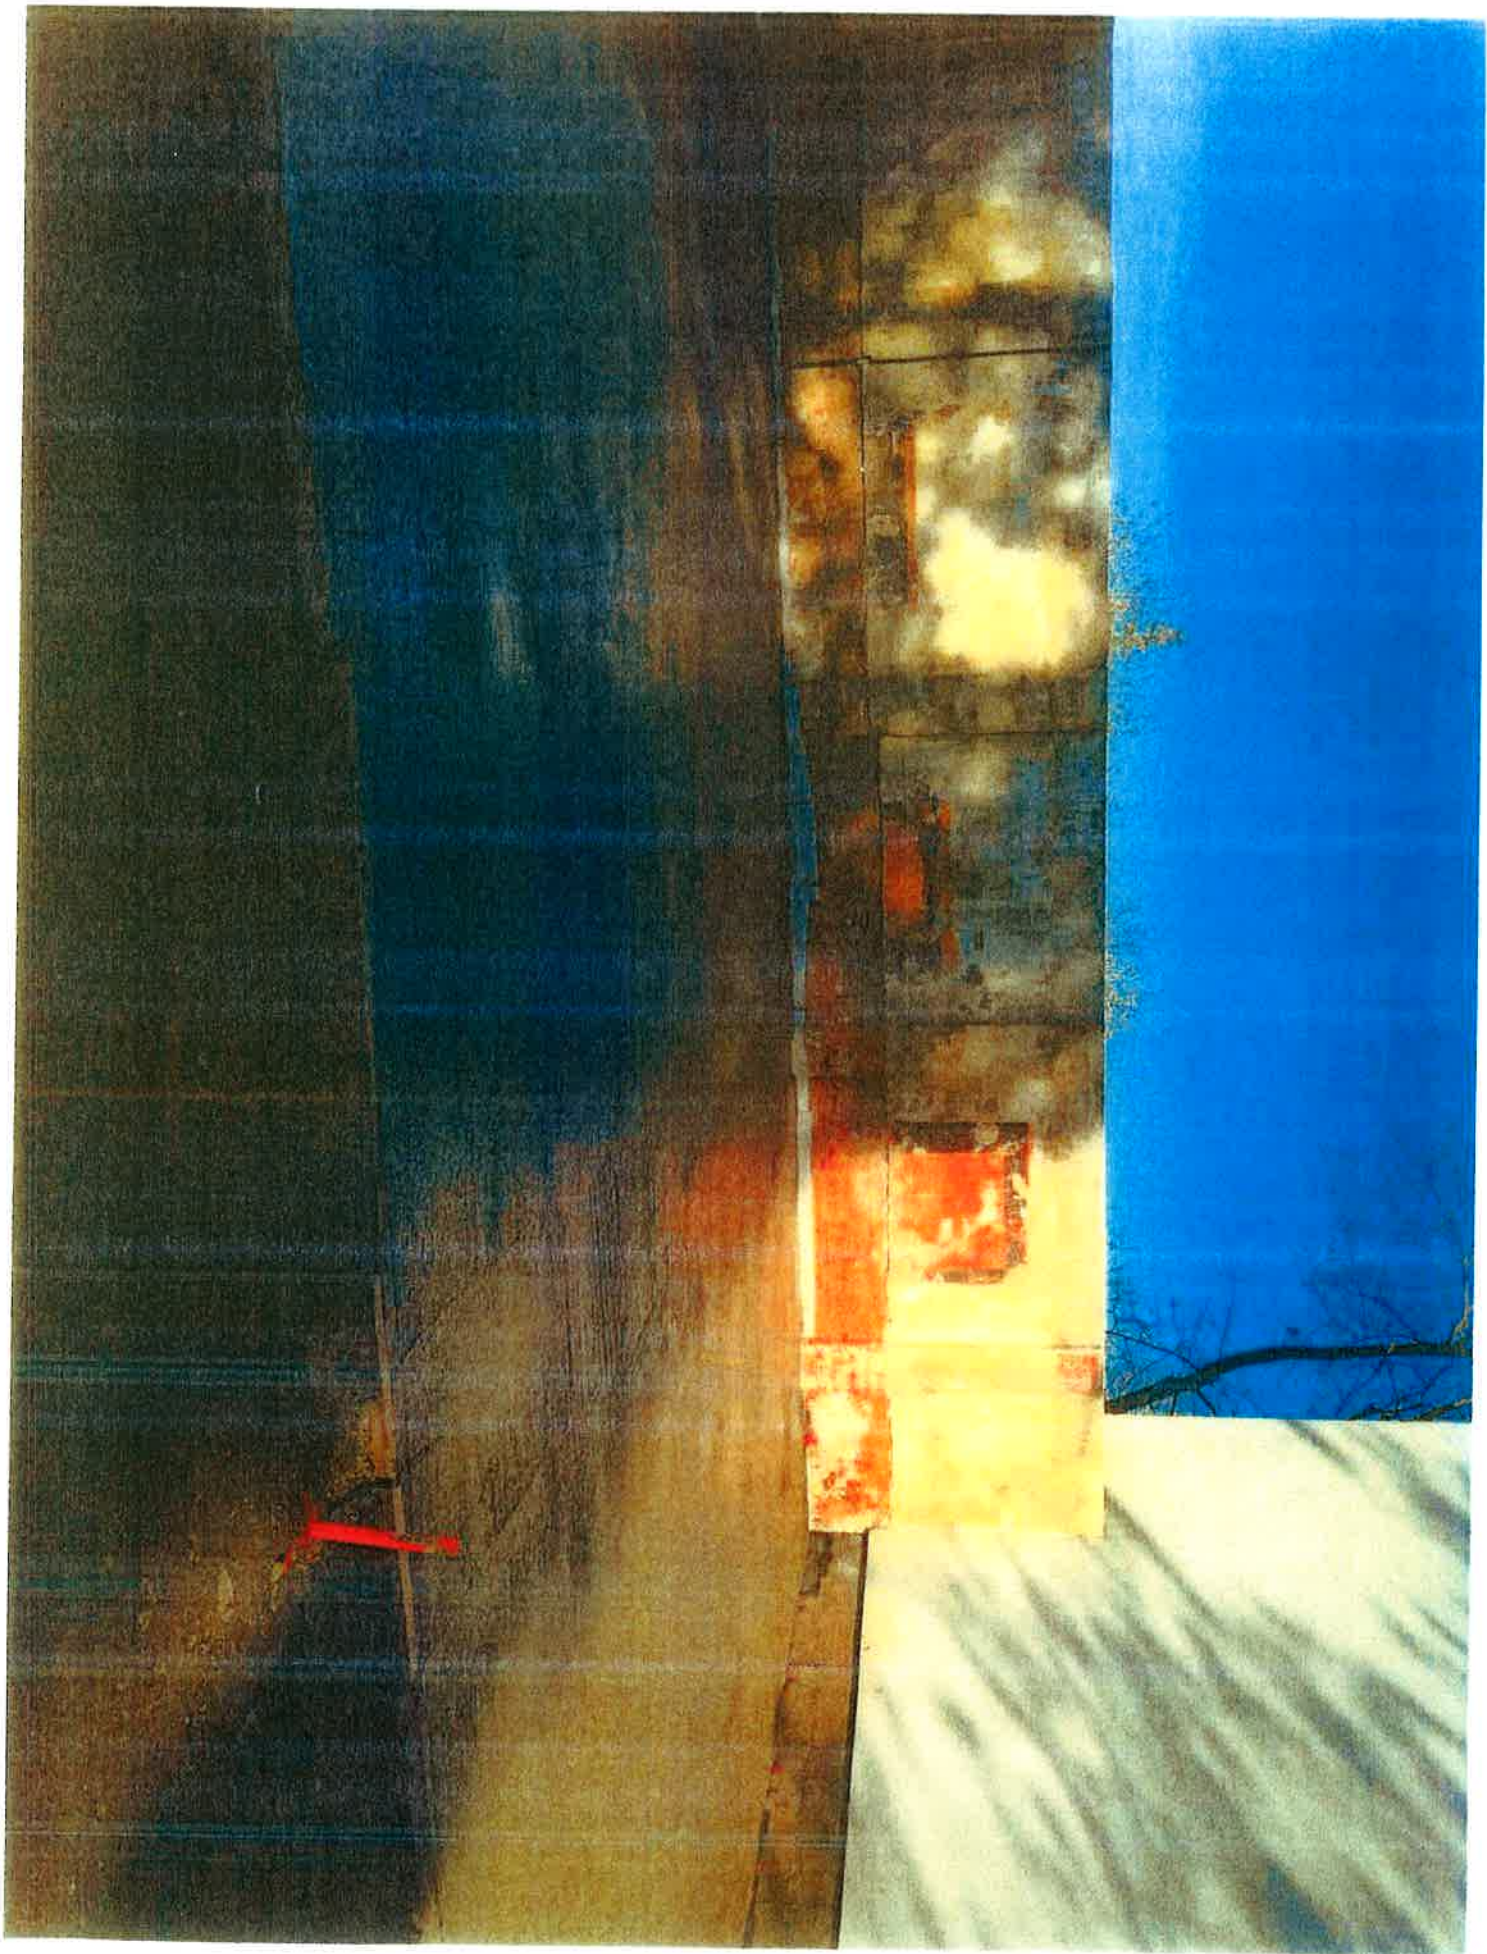

PRILONA c.2

Priloha č. 2




PRÍLOHA Č. 2



**PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 -
Bubeneč**

ZMĚNOVÝ LIST č. 97b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Řešení povrchové úpravy exterierních stěn kolem plochy po odbourání kina		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:			
Technické řešení změny:			
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-18 303,40 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.21	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.21	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2021	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2021	jméno: Milan Kerekanič	podpis:



Příloha č.1 - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubenec
 Ústředí: 97b
 Název ŽL: Řešení povrchové úpravy exterierních stěn kolem plochy po odbourání klína
 Dleží: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Časť objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Položka	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce			
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
	753	Konstrukce suché výstavby											
		K 21 01-M oplechování stěny 100 mm U-M, plech 0,475, šedofialový kempotický prvek	m	10,40	892,00	9 276,80	0,00	892,00	0,00	-10,40	892,00	-9 276,80	
		K 21 01-M oplechování stěny 100 mm U-M, plech 0,475, šedofialový kempotický prvek	m	10,70	1 039,00	11 117,30	0,00	1 039,00	0,00	-10,70	1 039,00	-11 117,30	
CELKEM (BEZ DPH)						18 393,40		0,00				-18 393,40	

	meněpráce
	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 98a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Nový kamenný podstavec plastiky Iva		
Objekt:	SO240 - Přemístění plastiky Iva s čís. znakem		
Důvod a popis změny:	<p>V rámci přípravy realizace SO240 byl prověřen aktuální stav pískovcového fundamentu sochy Iva na nádvoří Strahovského kláštera. Prověřením stavu byla ze strany GD pověřena odborná kamenická firma, která konstatovala, že za současného stavu není možné zrealizovat SO240 dle postupu uvedeného v PD, t.j. zdemontovat původní pískovcový podstavec vč. zdobného písma a přemístit ho na novou pozici na stavbě PNP v Bubeneči. Důvodem nemožnosti přemístění je vysoká míra degradace pískovcových bloků, kdy při jakékoliv manipulaci dojde k nevratnému poškození těchto konstrukcí. Jediným možným řešením se proto jeví zhotovení tohoto fundamentu z nových pískovcových bloků. Tuto skutečnost nemohl GP předpokládat při tvorbě zadávací PD a jedná se proto o nálezovou situaci.</p>		
Technické řešení změny:			
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.2 - vyjádření odborné firmy ke stavu pískovcového podstavce		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	198 822,02 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 18.5.21	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 12.5.21	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 12.5.2021	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 18.5.2021	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Příloha č.1 - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 98a
 Název ZL: Nový kamenný podstavec plastíky Iva
 Objekt: SO240 - Přemístění plastíky Iva s čs. znakem
 Část objektu: SO240 - Přemístění plastíky Iva s čs. znakem

Por. č.	Kod	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	997	Přesun sutě										
21	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,82	68,70	331,22	8,89	68,70	611,01	4,07	68,70	279,79
22	997013508	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,82	3,00	14,46	61,84	3,00	185,51	57,02	3,00	171,05
23	997013901	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,82	137,70	663,89	8,89	137,70	1 224,68	4,07	137,70	560,79
	782	Dokončovací práce - obklady z kamene										
29	782R03005	Demontáž obkladu soklu z pískovcových desek tl 17 cm do sutí	m2	2,43	896,50	2 180,29	11,55	896,50	10 352,65	9,12	896,50	8 172,36
30	782R03005	Dodávka obkladu soklu z desek Božanovského pískovce tl 17 cm	m2	2,43	11 002,50	26 758,08	8,91	11 002,50	98 026,77	6,48	11 002,50	71 268,69
ZL98_1	782ZL98R1	Dodávka římsy z desek Božanovského pískovce (1230x715x250mm)	ks	0,00	0,00	0,00	3,00	16 494,77	49 484,31	3,00	16 494,77	49 484,31
ZL98_2	782ZL98R2	Demontáž písmen stávebního nápisu	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	14 909,78	14 909,78	1,00	14 909,78	14 909,78
ZL98_3	782ZL98R3	Montáž písmen nápisu	ks	0,00	0,00	0,00	63,00	856,75	53 975,25	53,00	856,75	53 975,25
CELKEM (BEZ DPH)						28 938,37			226 748,76			198 822,02

	méněpráce
	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky

Příloha č.1b - Individuální kalkulace R - položek

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 98a
 Název ZL: Nový kamenný podstavec plastiky Iva
 Objekt: SO240 - Přemístění plastiky Iva s čís. znakem
 Část objektu: SO240 - Přemístění plastiky Iva s čís. znakem

Č.p.	Položka	MJ	Přímé náklady					Nepřímé náklady		Zisk	Odbytová cena
			Přímý materiál	Přímé mzdy	Stroje	OPN	Subdodávky	Výrobní režie	Správní režie		
782ZL95R1	Dodávka římsy z desek Božanovského pískovce (1230x715x250mm)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,00	1 344,51	577,85	710,30	16 494,77
782ZL95R2	Demontáž písmen stávajícího nápisu	kpí	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00	1 215,41	522,33	642,05	14 909,78
782ZL95R3	Montáž písmen nápisu	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	69,84	30,01	36,89	856,75



JEŽ KAMENICKÉ PRÁCE

- 8 -01- 2021

Dobrý den,

Na základě požadavku objednatele OHL ŽS, a.s. jsme byli jakožto odborná firma požádáni o sdělení odborného stanoviska k současnému stavu podstavce sochy Iva na nádvoří Strahovského kláštera a možnosti jeho sanace. K této problematice sdělujeme následující.

Vzhledem k současnému stavu pískovcových bloků podstavce Iva není možné žádnou dostupnou technologií demontovat tyto bloky a následně je nainstalovat v novém sídle PNP v Praze Bubenči, tak aniž by došlo k nevratnému poškození těchto pískovcových bloků. Vlivem dlouhodobého působení klimatických podmínek dochází k postupné degradaci pískovcových bloků a k soudržnosti kamene a v praxi je znemožněna demontáž kotvení a opětovné nakotvení prvků aniž by docházelo rozpadání se jednotlivých desek. Z hlediska naší dlouhodobé zkušenosti doporučujeme zhotovit podstavec Iva z nových pískovcových bloků, jedině takto bude možné garantovat bezvadné provedení této části díla.

S pozdravem
Jiří Tomší

JEŽ – KAMENICKÉ PRÁCE, spol. s r.o.

Jungmannova 23/II
110 00 Praha I - Nove Město

Korespondenční adresa:
K Nouzovu 446 267 12 Loděnice

T

@z.cz

ICO 28228316
DIC CZ28228316
Č. Ú 35 8942810257/0100



KAMENICKÁ PROVOZOVNA

Karlštejská 82
267 12 Loděnice

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 98b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Nový kamenný podstavec plastiky lva		
Objekt:	SO240 - Přemístění plastiky lva s čs. znakem		
Důvod a popis změny:			
Technické řešení změny:			
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-10 797,12 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 18.5.2017	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 12.5.2017	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 12.5.2017	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 18.5.2017	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Příloha č.1 - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 98b
 Název ZL: Nový kamenný podstavec plastíky Iva
 Objekt: SO240 - Přemístění plastíky Iva s čs. znakem
 Část objektu: SO240 - Přemístění plastíky Iva s čs. znakem

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	782	Dokončovací práce - obklady z kamene										
32	782R0008	Demontáž desky výšu 95*185*17 cm vč. obalení geotextilií a přípravy na transport	ks	1,00	1 222,50	1 222,50	0,00	1 222,50	0,00	-1,00	1 222,50	-1 222,50
34	782R0010	Demontáž desek římsy 123*71,5*25 cm vč. obalení geotextilií a přípravy na transport	ks	3,00	2 037,50	6 112,50	0,00	2 037,50	0,00	-3,00	2 037,50	-6 112,50
36	782R0012	Demontáž desek římsy vč. obalení geotextilií a přípravy na transport	m2	4,72	733,50	3 462,12	0,00	733,50	0,00	-4,72	733,50	-3 462,12
CELKEM (BEZ DPH)						10 797,12			0,00			-10 797,12

	méněpráce
	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky

**PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 -
Bubeneč**

ZMĚNOVÝ LIST č. 99a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Vnitřní výplně otvorů		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Důvodem vzniku tohoto změnového listu je projekční změna, která byla vyvolaná úpravou projekčního řešení expozic. Konkrétně se jedná o doplnění ELM zámku ke dveřím D064. Dalším důvodem je doplnění protipožárních dveří do m.č. 159 z důvodu snížení přístupu a obsluhy VZT jednotek, které jsou umístěné v této místnosti.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce) Příloha č.1b - Individuální kalkulace R - položek		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	43 157,95 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.21	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.21	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2017	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 28.1.2017	jméno: Milan Kerekanič	podpis:



Příloha č. 1a - Změnový rozpočet (vícepráce)

Stavba: FNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 4412, Praha 6 - Bubeneč
 Místní číslo: 99a
 Účel: Vnitřní výpné otvorů
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Číslo projektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu, SO110.K22 - Elektrická kontrola vstupu (EKV) a intercom

Index	Kod	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu										
	767	Konstrukce zámečnické										
2.39	767Z_99R1	Dodávka a montáž doplňkových ocelových dveří (š. 700 mm v 1970 mm, EI 45 DP1, včetně záručné, samozavírací, kování klíka - klíka) do místnosti č. 159	kp	0,00	0,00	0,00	0,00	31 262,95	31 262,95	1,00	31 262,95	31 262,95
		SO110.K22 - Elektrická kontrola vstupu (EKV) a intercom.										
	D1	Elektrická kontrola vstupu (EKV) a intercom										
	P0135	Elektromechanický zámek, vč. příslušenství (kování, kabelová průstřelka, vločka)	ks	32,00	9 150,00	292 800,00	33,00	9 150,00	301 950,00	1,00	9 150,00	9 150,00
2.39	K22ZL99R1	doplnění kabeláže k zámku dveří D054	kp	0,00	0,00	0,00	1,00	2 745,00	2 745,00	1,00	2 745,00	2 745,00
CELKEM (BEZ DPH)						292 800,00			335 957,95			43 157,95

Příloha č.1b - Individuální kalkulace R - položek

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 99a
 Název ZL: Vnitřní výpíné otvorů
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu, SO110.K22 - Elektrická kontrola vstupu (EKV) a intercom

Č.p.	Položka	MJ	Přímé náklady				Nepřímé náklady		Zisk	Cenové označ.	
			Přímý materiál	Přímé mzdy	Stroje	OPN	Subdodávky	Výrobní režie			Správní režie
767ZL99R1	Dodávka a montáž doplňkových ocelových dveří (š. 700 mm, v.1970 mm, EI 45 DP1, včetně zárubně, samozavírače, kování klika - klika) do místnosti č. 159	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,00	2 548,48	1 095,22	1 346,23	31 262,95

**PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 -
Bubeneč**

ZMĚNOVÝ LIST č. 99b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Vnitřní výplně otvorů		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Důvodem vzniku tohoto odpočtového změnového listu je projekční změna, která byla vyvolaná úpravou projekčního řešení expozic.		
Technické řešení změny:			
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-867 019,89 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <u>nesouhlasí</u>		
	dne: 29.1.21	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <u>nesouhlasí</u>		
	dne: 29.1.21	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <u>nesouhlasí</u>		
	dne: 27.1.21	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / <u>neschvaluje</u>		
	dne: 24.1.21	jméno: Milan Kerekanič	podpis:



Příloha č.1a - Změnový rozpočet (mãněpráce)

Objekt: RNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubenec
 Disloc: 93b
 Kód: ZL Vnitřní výplně otvorů
 Objekt: SO110 Rekonstrukce objektu vltvy
 Úseň objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Popis	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/mãněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu												
Konstrukce truhlářské												
756	D020	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	5 563,50	5 563,50	0,00	5 563,50	0,00	1,00	5 563,50	5 563,50
		Přičiněním procentní pro záměrné konstrukce - objekty do 24 m	%	163,809 03	1,80	196 573,64	163,809 04	1,80	196 565,07	-83,84	1,30	-165,78
757	Konstrukce zámečnické											
	D031	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	22 749,50	22 749,50	0,00	22 749,50	0,00	1,00	22 749,50	22 749,50
	D032	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	0,00	22 749,50	0,00	22 749,50	2,00	22 749,50	0,00	-1,00	-22 749,50
	D035	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	22 749,50	22 749,50	0,00	22 749,50	0,00	1,00	22 749,50	22 749,50
	D077	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	94 501,30	94 501,30	0,00	94 501,30	0,00	1,00	94 501,30	94 501,30
	D078	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	125 727,80	125 727,80	0,00	125 727,80	0,00	1,00	125 727,80	125 727,80
	D080	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	92 511,80	92 511,80	0,00	92 511,80	0,00	1,00	92 511,80	92 511,80
	D081	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	38 100,30	38 100,30	0,00	38 100,30	0,00	1,00	38 100,30	38 100,30
	D082	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	35 335,30	35 335,30	0,00	35 335,30	0,00	1,00	35 335,30	35 335,30
	D107	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	28 415,30	28 415,30	0,00	28 415,30	0,00	1,00	28 415,30	28 415,30
	D110	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	35 335,30	35 335,30	0,00	35 335,30	0,00	1,00	35 335,30	35 335,30
	D111	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	28 415,30	28 415,30	0,00	28 415,30	0,00	1,00	28 415,30	28 415,30
	D112	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	35 335,30	35 335,30	0,00	35 335,30	0,00	1,00	35 335,30	35 335,30
	D113	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	28 415,30	28 415,30	0,00	28 415,30	0,00	1,00	28 415,30	28 415,30
	D114	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	35 335,30	35 335,30	0,00	35 335,30	0,00	1,00	35 335,30	35 335,30
	D115	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	28 415,30	28 415,30	0,00	28 415,30	0,00	1,00	28 415,30	28 415,30
	D116	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	35 335,30	35 335,30	0,00	35 335,30	0,00	1,00	35 335,30	35 335,30
	D117	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	28 415,30	28 415,30	0,00	28 415,30	0,00	1,00	28 415,30	28 415,30
	D118	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	34 729,80	34 729,80	0,00	34 729,80	0,00	1,00	34 729,80	34 729,80
	D120	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	28 415,30	28 415,30	0,00	28 415,30	0,00	1,00	28 415,30	28 415,30
	D403	D+M nových vnitřních výplň otvorů dř. tabulek dveří a prosklených stěn	kp	1,00	7 525,50	7 525,50	0,00	7 525,50	0,00	1,00	7 525,50	7 525,50
		Přičiněním procentní pro záměrné konstrukce - objekty do 24 m	%	126 121,02	1,80	227 117,84	126 039,84	1,80	212 417,73	-83 111,19	1,80	-14 400,22
D1	SO110.K22 - Elektrická kontrola vstupu (EKV) a intercom											
	Elektrický obvodové vstř.											
			ks	3,00	1 372,50	4 117,50	2,00	1 372,50	2 745,00	1,00	1 372,50	4 117,50
CELKEM (BEZ DPH)						1 278 650,67			411 630,79			-867 019,89

- mãněpráce
- vícepráce - nové položky
- vícepráce - stávající položky

**PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 -
Bubeneč**

ZMĚNOVÝ LIST č. 101

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Zasypání stávajícího energokanálu		
Objekt:	IO310 - Příprava území		
Důvod a popis změny:	V rámci výkopových prací v severozápadní části objektu (u objektu bývalého kina) byl zjištěn původní energokanál. Tento kanál je nutné zdemontovat a zasypat. Jedná se o nálezovou situaci, kterou nemohl GP přijímat v rámci PD.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet		
	Příloha č.2 - zakres energokanálu do situace		
	Příloha č.3 - fotodokumentace		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	20 271,93 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2017	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2017	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 27.1.2017	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 26.1.2017	jméno: Milan Kerekanič	podpis:






Průběh c.1 - Změnový rozpočet

Objekt: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech š.p. 44/2, Praha 6 - Bubenec
 Účel: Zásypání stávajícího energokanálu
 Práce: 10310 - Příprava území

Položka	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepraceménopráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	1	Zemní práce										
103	5530120	Hloubení vrt 300x2000 mm v termíně tr. 3-4 objemu do 100 m3 - kompletní provedení dle PD (situace, PP a TZ, vč. všech souvisejících prací)	m3	5,94	205,40	1 220,08	11,94	205,40	2 452,48	6,00	205,40	1 232,40
203	5530120	Zásyp jam, šachet vrt nebo kolben objektu sypáním se zhutněním	m3	81,30	56,40	4 595,08	89,30	56,40	5 036,28	8,00	56,40	451,20
203	55341197	šterkodní frakce 0/65	t	0,00	0,00	0,00	15,20	394,00	5 988,80	15,20	394,00	5 988,80
	5	Ostatní konstrukce a práce, bourání										
203	55301611	Demontáž pretažkových krycích desek kanálů šachet nebo žump do hloubky 0,06 t	ks	0,00	0,00	0,00	74,00	122,00	9 028,00	74,00	122,00	9 028,00
	997	Přesun sutě										
203	55301651	Vodorovné ohrabování s náložením a složením na skládku do 1 km	t	652,01	42,20	27 514,99	656,46	42,20	27 702,77	4,45	42,20	187,79
203	55301651	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16 648,33	3,80	63 463,67	15 753,13	3,80	59 889,59	106,69	3,80	405,84
203	55301382	Poplatek za uložení stavebního zelezobetónového odpadu na skládce (skládovné)	t	225,70	689,20	155 035,76	230,15	689,20	154 013,67	4,45	689,20	2 977,90
CELKEM (BEZ DPH)						243 818,57			264 091,50			26 271,83

menopráce
 víceprac - nové položky
 víceprac - stávající položky


Poloha kanálu

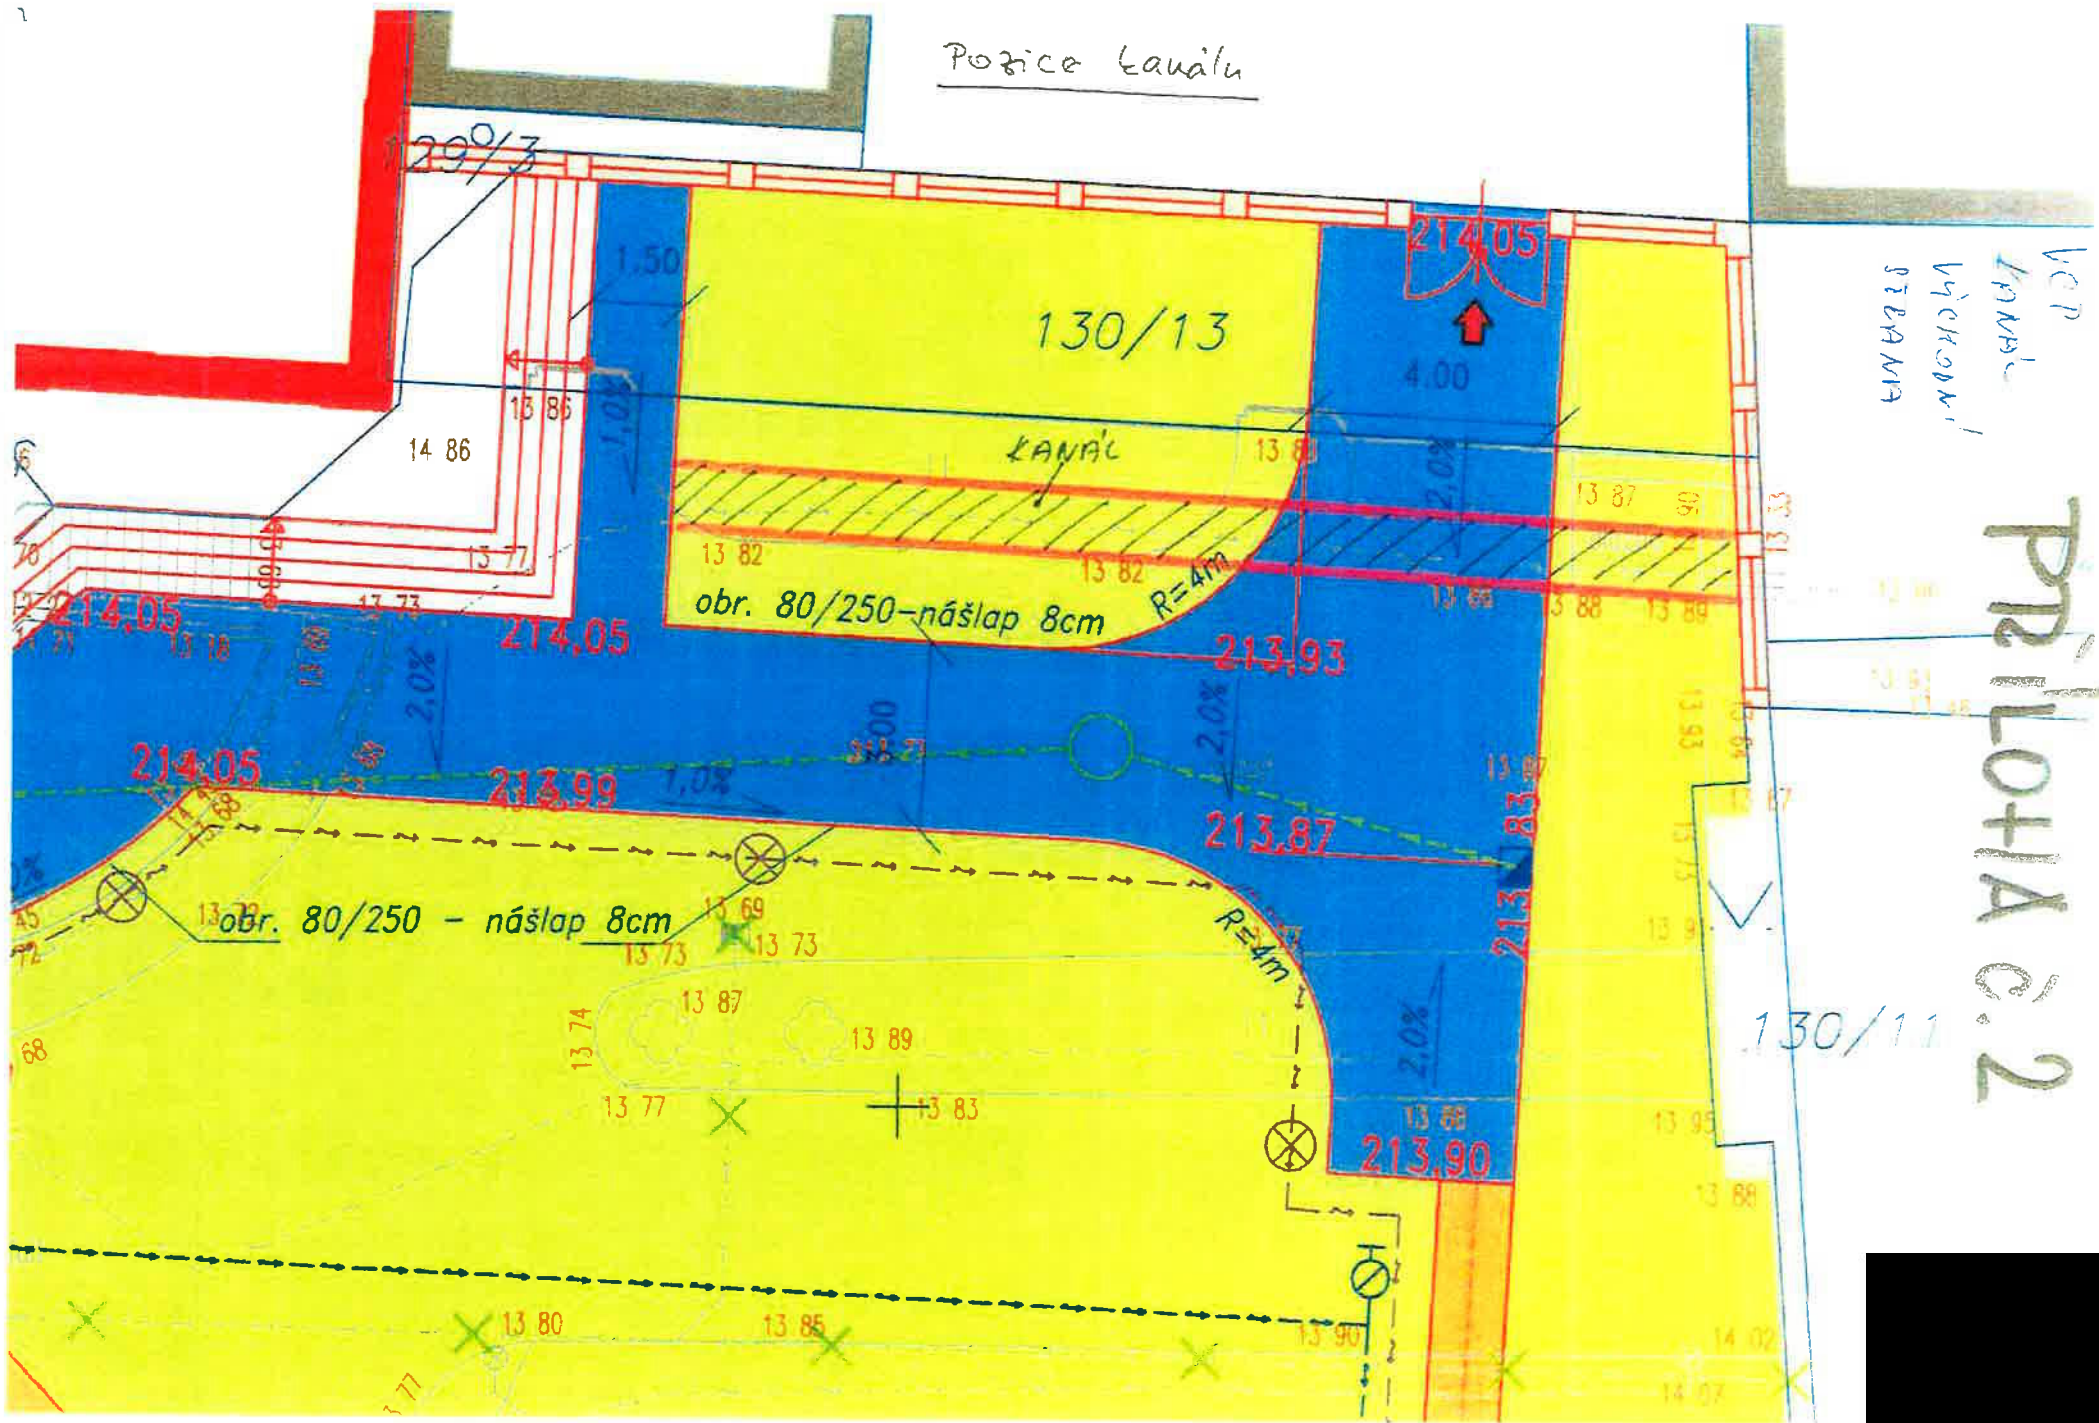

VOP
KANÁL
VÝCHOV
SIEŤAMA

PRÍLOHA č. 2

130/11



PRÍLOHA č. 3

1000 mm





ПРИЛОЖА 2.3

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 107

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017			
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.			
Název změnového listu:	Úprava zámečnických konstrukcí oplocení			
Objekt:	SO 220 Oplocení			
Důvod a popis změny:	Předmětem změny je změna pevného plotového dílce ZV05 v rámci plotu v ul. V Sadech na otevíravou branku a dále se jedná o doplnění kování a zámečnických prvků brány ZV01. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.			
Technické řešení změny:	-			
Dokumentace / příloha ZL:				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet Příloha č.1b - Individuální kalkulace R - položek			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	33 723,71 Kč			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE		
	Dopad do konečného termínu:	NE		
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:				
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne: 18.5.21	jméno: Ing. Pavel Bečvář		
	podpis:			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne: 12.5.21	jméno: Martin Pražský		
	podpis:			
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne: 17.5.2021	jméno: Ing. Martin Košťál		
	podpis:			
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje			
	dne: 18.5.2021	jméno: Milan Kerekanič		
	podpis:			

Příloha č.1 - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 107
 Název ZL: Úprava zámečnických konstrukcí oplacení
 Objekt: SO 220 Oplacení
 Část objektu: -

Poř. č.	Kód	POPIS	M.J	SoD			Po změně			Vícepráce/ménepráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	767	Konstrukce zámečnické										
ZL107_1	767ZL107R1	Doplnění plotových polí ZV01	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	1 783,70	3 567,40	2,00	1 783,70	3 567,40
ZL107_2	767ZL107R2	Prodloužení ocelových rámečků z ploché oceli (dodávka + montáž) prodlužovaného pole ZV01	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	2 220,40	4 440,80	2,00	2 220,40	4 440,80
ZL107_3	767ZL107R3	Zkrácení ocelových rámečků z ploché oceli zkracovaného pole ZV01	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	1 612,35	3 224,70	2,00	1 612,35	3 224,70
ZL107_4	767ZL107R4	Sestavení a svaření upravených plotových polí - zkracovaný prvek ZV01	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	3 873,21	3 873,21	1,00	3 873,21	3 873,21
ZL107_5	767ZL107R5	Sestavení a svaření upravených plotových polí - prodlužovaný prvek ZV01	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	6 204,28	6 204,28	1,00	6 204,28	6 204,28
ZL107_6	767ZL107R6	Zámečnická přírava pro osazení pantu a montáž pantu na křídlo k plotovému poli ZV05	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	729,43	1 458,86	2,00	729,43	1 458,86
ZL107_7	767ZL107R7	Dodávka ocelového pantu - regulovatelný HP-24-S - M24	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	500,91	1 001,82	2,00	500,91	1 001,82
ZL107_8	767ZL107R8	Zámečnické přírava pro osazení zámku, výroba schránky zámku a montáž zámku do branky plotového pole ZV05	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	2 244,20	2 244,20	1,00	2 244,20	2 244,20
ZL107_9	767ZL107R9	Dodávka zámku HOBES 02-04A PP	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	354,60	354,60	1,00	354,60	354,60
ZL107_10	767ZL107R10	Montáž kování na ocelovou branku plotového pole ZV05	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	606,66	606,66	1,00	606,66	606,66
ZL107_11	767ZL107R11	Dodávka kování ROSTEX BK R1/0 (s trojm. nerez)	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	2 588,09	2 588,09	1,00	2 588,09	2 588,09
ZL107_12	767ZL107R12	Výroba a montáž profilu zámku branky plotového pole ZV05 - atyp. výrobek	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	3 958,89	3 958,89	1,00	3 958,89	3 958,89
CELKEM (BEZ DPH)						0,00			33 723,71			33 723,71

	menepráce
	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky

Příloha č.1b - Individuální kalkulace R - položek

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 107
 Název ZL: Úprava zámečnických konstrukcí oplocení
 Objekt: SO 220 Oplocení
 Část objektu: -

Č.p.	Položka	MJ	Přímé náklady					Nepřímé náklady		Zisk	Odbytová cena
			Přímý materiál	Přímé mzdy	Stroje	OPN	Subdodávky	Výrobní režie	Správní režie		
767ZL107R1	Doplnění plotových polí ZV01	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00	145,40	62,49	76,81	1 783,70
767ZL107R2	Prodloužení ocelových rámečků z ploché oceli (dodávka + montáž) prodlouženého pole ZV01	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	181,00	77,79	95,62	2 220,40
767ZL107R3	Zkrácení ocelových rámečků z ploché oceli zkrácovaného pole ZV01	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00	131,44	58,48	69,43	1 612,35
767ZL107R4	Sestavení a svaření upravených plotových polí - zkrácovaný prvek ZV01	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,00	315,74	135,59	166,79	3 873,21
767ZL107R5	Sestavení a svaření upravených plotových polí - prodloužený prvek ZV01	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,00	505,76	217,35	267,17	6 204,28
767ZL107R6	Zámečnická příprava pro osazení pantu a montáž pantu na křídlo k plotovému poli ZV05	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	59,46	25,55	31,41	729,43
767ZL107R7	dodávka ocelového pantu - regulovatelný HP-24-S - M24	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	49,99	21,25	25,88	600,91
767ZL107R8	Zámečnická příprava pro osazení zámku, výroba schránky zámku a montáž zámku do branky plotového pole ZV05	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	182,94	78,62	96,64	2 244,20
767ZL107R9	dodávka zámku HOBES 02-04A PP	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	28,91	12,42	15,27	354,60
767ZL107R10	Montáž kování na ocelovou branku plotového pole ZV05	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	49,47	21,26	26,13	606,86
767ZL107R11	dodávka kování ROSTEX BK R1/C (chrom nerez)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	210,96	90,67	111,45	2 588,09
767ZL107R12	Výroba a montáž protikusu zámku branky plotového pole ZV05 - atyp výrobek	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,00	322,72	138,69	170,48	3 958,89

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubenec

ZMĚNOVÝ LIST č. 111a

Smlouva o dílo: č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017

Navrhovatel změny: OHL ŽS, a.s.

Název změnového listu: Sloupy vjezdové brány

Objekt: SO220 - Oplocení

Důvod a popis změny: Na základě provedení mechanických sond stávajícího zděného sloupku oplocení, na který měla být dle předpokladu projektové dokumentace zavěšena nová vjezdová brána, bylo statikem konstatováno, že stávající konstrukce sloupku nevyhovuje předpokládanému zatížení od zámečnické konstrukce. Projektant zpracoval projektovou instrukci PI_60, která řeší demolici stávajícího sloupku a provedení dvou nových monolitických sloupů včetně železobetonových základů. Jedná se o náleзовou situaci, kterou nemohl projektant předvídat v rámci zpracování zadávací dokumentace,

Technické řešení změny: Viz příloha č.2

Dokumentace / příloha ZL: Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 60

Cenová kalkulace / příloha ZL:

Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce)	
Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek	
Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č.	33ZL111R1
Příloha č.1d - rozbor přímých nákladů položky č.	33ZL111R2
Příloha č.1e - rozbor přímých nákladů položky č.	99ZL111R1

Dopad do smluvní ceny (bez DPH): **85 169,85 Kč**

Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO
	Dopad do konečného termínu:	ANO (+40 dní)

Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:

Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 10. 3. 21	Jméno: Ing. Pavel Bečvář podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 10. 3. 21	Jméno: Martin Pražský podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 10. 3. 2021	Jméno: Ing. Martin Košťál podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 10. 3. 2021	Jméno: Milan Kerekanič podpis:





Příloha č. 1a - Změnový rozpočet (vícepráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 111a
 Název ZL: Sloupy vjezdové brány
 Objekt: SO220 - Oplocení
 Část objektu: -

Por. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Formální			Výpočetní		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	1	Zemní práce										
1	151201103	Hroubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,32	445,50	141,13	7,25	445,50	3 231,26	6,94	445,50	3 090,12
2	151201104	Příplatek za teplotu u hroubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	0,32	89,40	28,32	7,25	89,40	648,43	6,94	89,40	620,11
3	152101105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	28,57	141,30	4 038,98	31,88	141,30	4 504,16	3,31	141,30	467,18
4	152101106	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	428,55	11,10	4 756,95	478,15	11,10	5 307,45	48,69	11,10	530,50
5	171001201	Uložení sypání na skládky	m3	28,57	8,60	245,70	31,88	8,60	274,14	3,31	8,60	28,43
6	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládko-ovně)	l	53,96	140,00	7 399,71	58,81	140,00	8 232,00	5,95	140,00	833,19
ZL89_2	174111101	Zasyp jam, šachet, ryh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím ručně	m3	17,22	213,00	3 667,89	20,95	213,00	4 441,05	3,63	213,00	773,19
	2	Zakládání										
SO110_4_1_28	275313611	Zakladové desky z betonu tř. C 15/20	m3	18,77	1 793,90	33 672,40	19,22	1 793,90	34 472,12	0,45	1 793,90	799,72
11	275322511	Zakladové patky ze ŽB obojnáho profilu agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA	m3	0,33	1 994,90	660,71	1,46	1 994,90	2 907,97	1,13	1 994,90	2 247,25
ZL111_1	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,00	0,00	0,00	4,39	326,00	1 431,79	4,39	326,00	1 431,79
ZL111_2	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,00	0,00	0,00	4,39	65,80	289,43	4,39	65,90	289,43
12	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	l	0,04	22 958,70	911,46	0,10	22 958,70	2 165,39	0,06	22 958,70	1 283,93
	3	Svislé a kompletní konstrukce										
ZL111_3	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,00	0,00	0,00	1,37	4 080,00	5 202,02	1,27	4 080,00	5 202,02
ZL111_4	332L111R1	Příplatek za betonáž sloupů vjezdové brány pomocí čerpadla betonu	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	5 694,99	5 694,99	1,00	5 694,99	5 694,99
ZL111_5	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	0,00	0,00	0,00	9,32	540,00	5 031,18	9,32	540,00	5 031,18
ZL111_6	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	0,00	0,00	0,00	9,32	128,00	1 192,58	9,32	128,00	1 192,58
ZL111_7	332L111R2	Příplatek za ukládání prvků do bednění dle Projektové instrukce č. 60	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	1 339,38	1 339,38	1,00	1 339,38	1 339,38
16	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	l	0,07	24 581,70	1 828,68	0,14	24 581,70	3 333,19	0,06	24 581,70	1 504,32
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
22	623131101	Cementový posítek vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	65,92	45,90	3 025,91	74,25	45,90	3 408,12	8,33	45,90	382,21
20	622321R02	Vápenná omítka bílá, štuková dvoubvrstvá vnějších pilířů nanášená ručně	m2	65,92	250,30	16 500,78	74,25	250,30	18 585,03	8,33	250,30	2 084,25
ZL111_8	62ZL111R2	Dodávka a montáž hlavice pravého sloupku atypického půdorysu s povrchem z teraca	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	26 416,38	26 416,38	1,00	26 416,38	26 416,38
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání										
ZL111_9	953312111	Vložky do svislých dilatačních soar z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm	m2	0,00	0,00	0,00	1,45	83,70	120,95	1,45	83,70	120,95
IO31_35	962032314	Bourání pilířů ohebných z dutých nebo prázdných ohebných i nepálených na jakoukoli maltu	m3	7,79	591,00	4 606,55	8,42	591,00	4 975,92	0,63	591,00	369,36
SO210_27	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,28	2 100,00	15 240,33	8,40	2 100,00	17 648,93	1,15	2 100,00	2 406,90
ZL89_13	914045153	Vysekaní ryh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,00	397,00	4 764,00	12,50	397,00	4 982,50	0,50	397,00	198,50
ZL41_9	955921111	Dotatečně rebování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvorů	m	0,90	1 670,00	1 503,00	1,90	1 670,00	3 173,00	1,00	1 670,00	1 670,00
	997	Přesun sutě										
ZL89_16	997013011	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	l	22,23	781,00	17 361,94	29,00	781,00	20 307,26	3,77	781,00	2 945,31
SO11100_70	997013501	Odváž sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	l	5 404,22	68,70	371 269,59	5 407,99	68,70	371 528,67	3,77	68,70	259,08

ZMĚNOVÝ ROZPOČET



Stavba PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL 111a
 Název ZL Sloupy vjezdové brány
 Objekt SO220 - Oplocení
 Část objektu -

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Fe změny			Vícepráce/menší práce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
SO110_00_01	997013509	Poplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	129 701,17	3,00	389 103,50	129 701,68	3,00	389 375,03	90,51	3,00	271,53
SO110_00_02	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skladkovně)	t	2 730,60	137,70	376 003,63	2 731,85	137,70	376 175,76	1,25	137,70	172,13
SO110_00_03	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skladkovně)	t	1 450,00	114,80	166 607,44	1 452,92	114,80	167 896,87	2,52	114,80	289,43
ZL111_10	99ZL111R1	Sondy k posouzení aktuálního technického stavu stávajícího plotového pilíře	kol	0,00	0,00	0,00	1,00	4 592,17	4 592,17	1,00	4 592,17	4 592,17
	767	Konstrukce zámečnické										
ZL111_11	76ZL111R1	Dodávka kotvících úhelníků 120x120x6mm d. 2,6 a 2,35 m pro závěsy vrat	kol	0,00	0,00	0,00	1,00	9 471,82	9 471,82	1,00	9 471,82	9 471,82
	783	Dokončovací práce - nátěry										
ZL111_12	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	0,00	0,00	0,00	8,33	44,50	370,55	8,33	44,50	370,55
ZL111_13	783827125	Krycí jednorázový silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	0,00	0,00	0,00	8,33	92,50	770,25	8,33	92,50	770,25
CELKEM (BEZ DPH)						1 424 336,90			1 508 065,63			85 189,85

- méněpráce
- vícepráce - nové položky
- vícepráce - stávající položky

Příloha č.1b - Individuální kalkulace R - položek

Slavba FNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL 111a
 Název ZL Sloupy vjezdové brány
 Objekt SO220 - Oplocení
 Část objektu -

Č.p.	Položka	MJ	První náklady				Náklady na řízení				Celkový výsledek	
			Přímý materiál	Přímá mzdy	Sluhy	OPV	Subjekt	Objekt	Projekt	Průběh		
33ZL111R1	Příplatek za betonáž sloupů vjezdové brány pomocí čerpadla betonu	kpl	0,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	464,24	198,51	245,24	5 694,99
76ZL111R1	Dodávka kolejnic ůhelníku 120x120x5mm d. 2,6 a 2,35 m pro závěsy vrat	kpl	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,12	331,82	407,85	9 471,82
99ZL111R1	Sondy k posouzení aktuálního technického stavu stávajícího plotového pilíře	kpl	0,00	3 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	374,34	160,67	197,75	4 592,17
33ZL111R2	Příplatek za vřídání prvků do bednění dle Projektové instrukce č. 60	kpl	0,00	1 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109,18	45,82	57,69	1 339,39
62ZL111R2	Dodávka a montáž hlavice pravého sloupku atypického půdorysu s povrchem z terca	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	2 153,40	925,43	1 137,55	26 416,38

Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č.

33ZL111R1

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Pol. č.

33ZL111R1

MJ:

kpl

Příplatek za betonář sloupů ujetého brány pomocí čerpadla betonu

STROJE					
Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	pobyt stroje na stavbě	hod	1,00	2 200,00	2 200,00
	doprava	km	18,00	52,00	936,00
	mytí čerpadla	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
	přistavení čerpadla	kpl	1,00	550,00	550,00
Celkem stroje					4 786,00

Příloha č.1d - rozbor přímých nákladů položky č. 33ZL111R2

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Pol. č.

33ZL111R2

MJ:

kpl

Příplatek za ukládání prvků do budnění dle Projektové Instrukce č. 60

PŘÍMÉ MZDY					
Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	tesař	Nh	3,00	280,00	840,00
	odvody	%	34,00		285,60
Celkem přímé mzdy					1 125,60

Příloha č.1e - rozbor přímých nákladů položky č. 99ZL111R1

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Pol. č.

99ZL111R1

MJ:

kpl

Sondy k posouzení aktuálního technického stavu stavebního plošového pilíře

PŘÍMÉ MZDY

Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	dělník	Nh	8,00	180,00	1 280,00
	stavební technik	Nh	4,00	400,00	1 600,00
	odvody	%	34,00		979,20
Celkem přímé mzdy					3 859,20

