

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19**

**Termín plnění: září 2019 – duben 2021**

**Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.**

**IČO: 26768607**

**Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí**

**Telefonní spojení:** 

**Popis předmětu informace: ZL č. 38 – SO-01 Vyrovnávací schodiště ve 3. NP**

**Popis problému: rozhodnutí o změně konstrukce vyrovnávacího schodiště na terasu.  
Konstrukce vyrovnávacích stupňů je z dřevěných hranolů, opláštěných OSB deskami  
s pískovou penetrací, boky naštukovány, nášlap tvoří podlahovina vinil**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, který sníží cenu díla**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu**

**Datum, podpis oprávněné osoby**      **26.04.2021**



**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892  
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 39

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19  
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: VRN3 Zařízení staveniště – změna předmětu díla

DATUM: 04/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Nevyužitě stavební buňky pro TDS a koordinátora BOZP, zařízení na staveništi.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o :	101.100,00 Kč
Cena díla se zvýší o :	0 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	101.100,00 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dnů


Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 31.03. 2021

Termín dokončení díla do: 04/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.  
(ředitel – Ing. Tomáš Ongráček)

CL-EVANS s.r.o.  
(jednatelem – Ing. Jan Neužil)

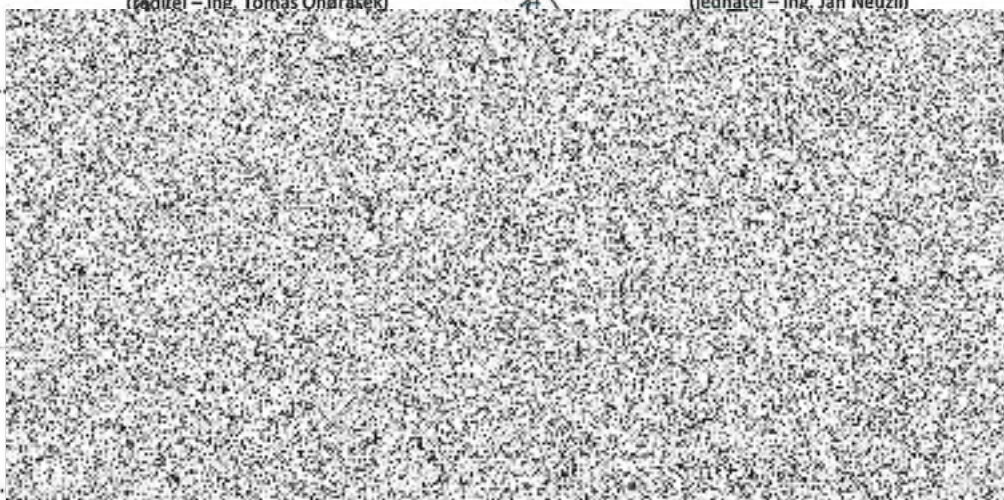

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.  
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
tel.: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.4.2021

**Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.39 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“**

V rámci realizace stavby nebylo provedeno zařízení staveniště – samostatné buňky pro technický dozor stavby a koordinátora bezpečnosti prací. Dochází tedy ke snížení ceny. Za AD souhlasíme.



**KANIA**

S pozdravem

KANIA a.s., Špálova 80/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....  
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky



**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY  
V Kladně, p.o.  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

**VRN3 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ**

POR.C.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>					
8	030001000	Zařízení staveniště - buňky pro TDS a koordinátora	měsíc	-19,000	2 250,00	-42 750,00
8	030001000	Zařízení staveniště - buňky pro TDS a koordinátora	měsíc	-19,000	2 250,00	-42 750,00
9	030001100	El. energie pro provoz buňky (svícení, topení - prac. dny, část dne	den	-390,000	20,00	-7 800,00
9	030001100	El. energie pro provoz buňky (svícení, topení - prac. dny, část dne	den	-390,000	20,00	-7 800,00
	<b>VRN3 Zařízení staveniště - celkem</b>					<b>-101 100,00</b>

**VRN3 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) - 101 100,00 Kč**

Poznámka : nevyužité buňky pro TDS a koordinátora BOZP

Zpracoval : Miloš Pávek  
V České Lípě dne 10. května 2021

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19**

**Termín plnění: září 2019 – duben 2021**

**Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.**

**IČO: 26768607**

**Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí**

**Telefonní spojení: **

**Popis předmětu informace: ZL č. 39 – VRN3 Zařízení staveniště**

**Popis problému: rozhodnutí o změně rozsahu předmětu díla – nevyužití staveništní  
buňky pro TDS a koordinátora BOZP**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke  
snížení ceny stavby**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu**

**Datum, podpis oprávněné osoby 26.04.2021**



**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892  
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 40

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19  
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: IO 03 + IO 05 + IO 06 Inženýrské sítě - povrchy

DATUM: 04/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Nerealizované finální povrchy ul. Divadelní, asfaltový povrch nahrazen betonovým krytem – požadavek MÚ Kladno

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o :	4.473,55 Kč
Cena díla se zvýší o :	0 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	4.473,55 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dnů


Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 31.03. 2021

Termín dokončení díla do: 04/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.  
(žadatel - Ing. Tomáš Čudtšák)

CL-EVANS s.r.o.  
(zhotovitel - Ing. Jan Nouzžil)

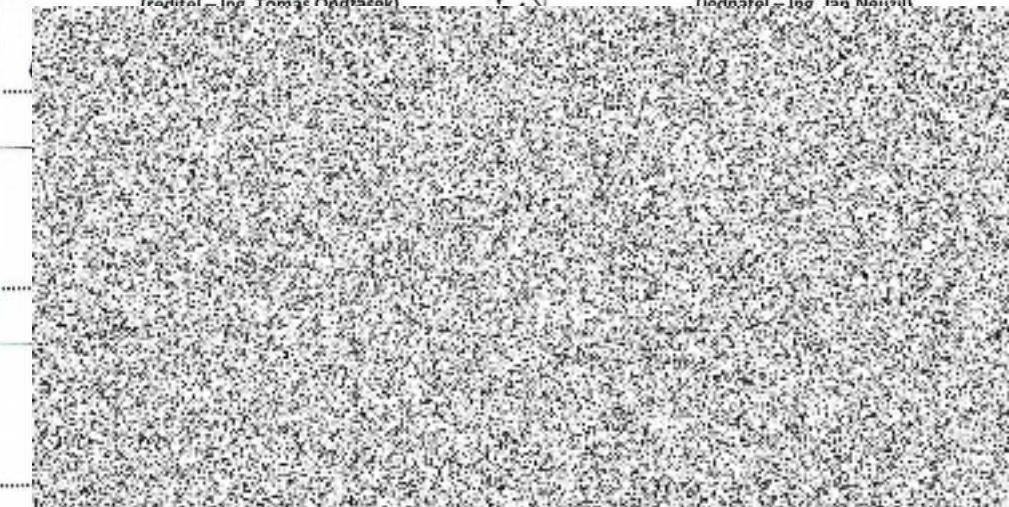

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.  
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
tel.: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
www.cl-evans.cz



Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.4.2021

**Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.40 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“**

V rámci realizace stavby bylo na základě požadavku MÚ Kladno nahrazen asfaltový povrch vozovky betonovým. Dochází tedy ke snížení ceny. Za AD souhlasíme.

Úprava je součástí dokumentace skutečného provedení stavby.



**KANIA**

S pozdravem

KANIA a.s., Špálova 80/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....  
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY  
V Kladně, p.o.  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

**IO 03 + IO 05 + IO 06 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - POVRCHY**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ**

POR.C.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
<b>IO 03 PŘÍPOJKA VODY</b>						
<b>D1 - Vodovod vč. montáže</b>						
9	R101-R9	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-IV-1-IV-PII, bez výkopových prací - vrchní vrstva ACO 11 tl. 4 cm a ACP 16+ tl. 8 cm	m2	-4,000	845,00	-3 380,00
10	581121212	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CBII tl. 120 mm	m2	4,000	568,00	2 272,00
<b>D1 - Vodovod vč. montáže - celkem</b>						<b>-1 108,00</b>
<b>IO 05 PŘÍPOJKA PLYNU</b>						
<b>D3 - Komunikace</b>						
37	577000003RAB	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-IV-1-IV-PII, bez výkopových prací - vrchní vrstva ACO 11 tl. 4 cm a ACP 16+ tl. 8 cm	m2	-4,150	845,00	-3 506,75
41	581121212	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CBII tl. 120 mm	m2	4,150	568,00	2 357,20
<b>D3 - Komunikace - celkem</b>						<b>-1 149,55</b>
<b>IO 06 PŘÍPOJKA KANALIZACE</b>						
<b>D1 - Vodovod vč. montáže</b>						
10	R101-R10	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-IV-1-IV-PII, bez výkopových prací - vrchní vrstva ACO 11 tl. 4 cm a ACP 16+ tl. 8 cm	m2	-8,000	845,00	-6 760,00
11	581121212	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CBII tl. 120 mm	m2	8,000	568,00	4 544,00
<b>D1 - Vodovod vč. montáže - celkem</b>						<b>-2 216,00</b>

**IO 03 + IO 05 + IO 06 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA - CELKEM (bez DPH) - 4 473,55 Kč**

Poznámka : požadavek Magistrátu Kladno na změnu finálního povrchu ulice Divadelní s ohledem na budoucí generální rekonstrukci předmětné ulice

Zpracoval : Miloš Pávek  
V České Lípě dne 26. dubna 2021



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19**

**Termín plnění: září 2019 – duben 2021**

**Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.**

**IČO: 26768607**

**Oprávněná osoba: Josef Paťočka, hlavní stavbyvedoucí**

**Telefonní spojení:** 

**Popis předmětu informace: ZL č. 40 – IO 03 + IO 05 + IO 06 Inženýrské sítě - povrchy**

**Popis problému: nerealizované finální povrchy v ulici Divadelní, navržený asfaltový povrch nahrazen betonovým krytem-požadavek MÚ Kladno**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, který sníží cenu díla**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu**

**Datum, podpis oprávněné osoby** 26.04.2021 

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892  
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 41

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19  
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: Opěrná stěna – změna předmětu díla

DATUM: 04/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změny předmětu díla dle zápisu geologa ve SD a skutečného rozsahu realizovaných prací.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1


Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	36.612,61 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	36.612,61 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	15 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	10.05. 2021
Termín dokončení díla do:	05/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.

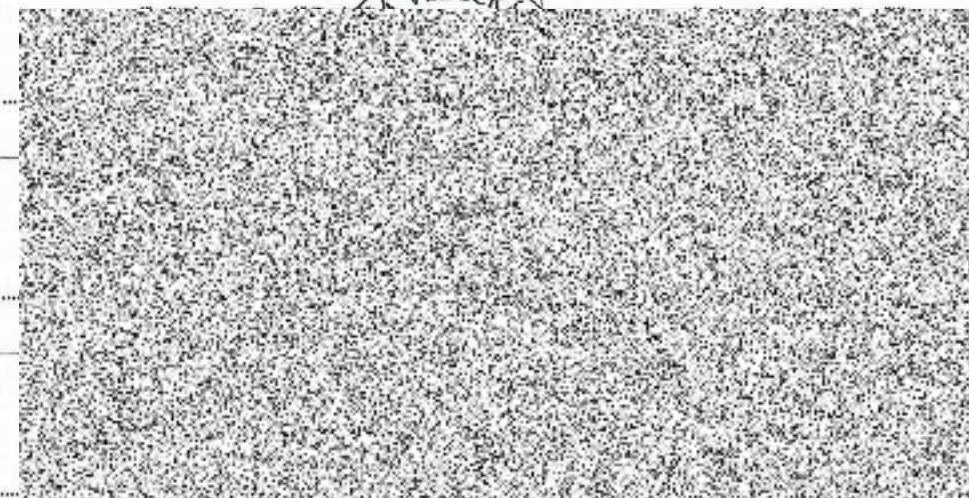

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.  
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
tel.: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.4.2021

**Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.41 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“**

V rámci realizace stavby provedení opěrné stěny bylo na základě závěrů geologa, které jsou zapsány do stavebního deníku a skutečného rozsahu prováděných prací nutno upravit rozsah prací. Dochází tedy ke zvýšení ceny. Za AD souhlasíme.

Úprava je součástí dokumentace skutečného provedení stavby.



**KANIA**

S pozdravem

KANIA a.s., Špálova 80/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....  
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky



**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY  
V Kladně, p.o.  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

**OPĚRNÁ STĚNA - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ**

POR.C.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
<b>1 - Zemní práce</b>						
2	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl. Přes 50 m2	m2	-13,540	21,75	-294,50
4	113107163	Odstranění podkladu z kameniva tl. 300 mm strojně pl. přes 50 do 200 m2	m2	-13,540	47,80	-647,21
5	113107176	Odstranění krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl. 150 mm strojně pl. přes 50 do 200 m2	m2	172,980	184,40	31 897,51
7	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	-110,770	254,20	-28 157,73
15	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-23,260	122,70	-2 854,00
16	5834419R	externí drcený zásyrový nenamrzavý, zhutnitelný materiál	t	-46,520	275,00	-12 793,00
<b>1 - Zemní práce - celkem</b>						<b>-12 848,93</b>
<b>2 - Zakládání</b>						
24	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	-7,909	1 095,00	-8 660,36
<b>2 - Zakládání - celkem</b>						<b>-8 660,36</b>
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>						
30	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl. do 200 mm	m2	78,800	624,00	49 171,20
30.1	451315134	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl. do 200 mm	m2	37,500	585,00	21 937,50
<b>4 - Vodorovné konstrukce - celkem</b>						<b>71 108,70</b>
<b>5 - Komunikace pozemní</b>						
33	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 250 mm	m2	-35,150	290,00	-10 193,50
35	581121115	Kryt cementobetonový CB tl. 150 mm	m2	-46,160	664,20	-30 659,47
36	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-1,440	248,10	-357,26
37	5924800R	dlažba plošná betonová chodníková	m2	-1,584	450,00	-712,80
39	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. do 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	-35,150	297,80	-10 467,67
40	59245R00	dlažba zámková tl. do 80 mm	m2	-38,665	403,00	-15 582,00
<b>5 - Komunikace pozemní - celkem</b>						<b>-67 972,70</b>
<b>997 - Přesun sutě</b>						
49	997013RR31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t	57,083	245,00	13 985,34
50	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	57,083	108,85	6 213,48
51	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	1 141,660	24,40	27 856,50
52	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,000	142,60	142,60
<b>997 - Přesun sutě - celkem</b>						<b>48 197,92</b>
<b>998 - Přesun hmot</b>						
53	99815211R	Přesun hmot	t	28,885	235,00	6 787,98
<b>998 - Přesun hmot - celkem</b>						<b>6 787,98</b>

**OPĚRNÁ STĚNA - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA - CELKEM (bez DPH)**

**36 612,61 Kč**

Poznámka : změna předmětu díla - dle zápisu geologa (viz zápisy ve SD) a skutečného provedení

Zpracoval : Miloš Pávek  
V České Lípě dne 08. dubna 2021



práci a sloužit. TDS a objednatel  
 provádí kontrolu mentaře opěrné  
 zdi. TDS upozorňuje na místo  
 určení prefabrikáty, je nutné  
 mít beton prefabrikáty uvolněný  
 jak směrem, tak výškově. TDS  
 a objednatel upozorní, zkontroluje,  
 že odjaty (směrem a výškově) také  
 jak je momentálně zedř uvolněné  
 mohou být překážkou v převahu  
 dokončení zdi. Dále TDS upozorňuje,  
 že prefabrikáty jsou na lícové  
 straně uspiněny (potečle), penetraci  
 proti zemi v hloubku, kde to je  
 pravidelně na straně směrem k objektu  
 deponitáře. Při předání musí  
 být prefabrikáty na lícové straně  
 čisté, dále je nutné opravit  
 určení části a zasnovat místo  
 s plotnění z výšky

## Zápis geologa:

25.2.2021

Účetního dne byla provedena prohlídka  
 zákl. spáry útěru N3 směrem zdi. Základová  
 spára je v celém rozsahu rovinná a uvolněná,  
 která bude nutno odstranit, prohloubením  
 zákl. spáry na úroveň jila nové konzistence.  
 Prohloubenou část nedoplnění vyplnit  
 stejnou uhlí z betonu! Zákl.  
 spára v jilu je potřeba oděrat před ukon-  
 čením a prohloubením. Doplnění beton  
 metrů. Příklad prohloubení zákl. kříže





Zapís geologa:

25.2.2021

Základová spára částei P3 byla prohloubena pod úroveň byla zrušena cca 0,3m mocnou vrstvou zhrublého štěrku sítě. Pod sítí byl objeven povrch zhrublého písečného štěrku S3/K6. Aby bylo dosaženo požadované únosnosti 200kPa bude nutné štěr. spáru prohloubit na povrch zhrublého štěrku k6, tj. cca o 0,3-0,4m pod stávající úroveň. Štěr. spára je v dané úrovni odčerpána. Štěr. spáru bude třeba odvodnit, docílit od úrovně a nalympertu, odčerpání přes provedení a provedení. Pro docílení je možno provést betonáž podzemní podlaží doporučit odčerpání.

TDPAsi: Skoro jasnou  $\pm 0 - +10^{\circ}\text{C}$ 

25.2.2021

POČET PRACOVNÍKŮ: CLE 2+4+4 (UK) A-Z-FLOOR 2, OČIŠŤEK

EWA 2, KKK-EKA 2 + plošina STRAND 3

PRACOVNÍ DOBA: 4<sup>h</sup> - 16<sup>h</sup> hod.MECHANIZACE: plošina (CLE), plošina (KKK-EKA)  
1x náhl. auto (beton)

PROVÁZENÉ PRÁCE:

CLE - vykop (normální) základové spáry, P3, šířka o 30-40cm (na zvlášť písečné) dle požadavků geologa

- betonáž podél. beton P3 - 3m C20/25

- zednické opravy

- oprava výhledové folie, oprava fasády

v ose 4, AB

A-Z-FLOOR - nutí samonivelacní stěry (schody) + hraničení

EWA - nutí generalního šlicí

(bezpečnostní karta + šlicí předání p. VOLFOVI z Zuhovny)



POČASÍ: Teplotasno - 2°C - +4°C  
 PRÁČET PRACOVNÍKŮ: CME 3+4, MINETS,  
 KOREFO 3, EES 4, DAZEP 2  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> hod.  
 MECHANIZACE: Kolový bagr, Malý bagr,  
 Auto 2x  
 PROVAZENÉ PRÁCE:  
 CME - zednické práce (opravy) + úklid  
 MINET - komplekce elektro  
 KOREFO - opravy podlah  
 EES - mříž obřích (2m<sup>3</sup> beton od CME)  
 - terasní upravy pod ED  
 DAZEP - přípravné práce pro OZ  
 - kování zdi + výkop u zadní čá-  
 sti stavby OZ (školka)

Zápis TDS  
 Provedení kerubů poslepu pum

Zápis TDS  
 Provedení kerubů poslepu pum o sloužle

Zápis geologa:  
 Inženýrka dne byla provedena  
 Mohlička zahl. spára opěrné zdi část P 5,  
 Záhledová spára je typická slabě přitisklé  
 jílem až písčitému jílu h. FG1-F4.  
 V současně době je zahl. spára zatopena  
 vodou a jíl je kožmědlý. Záhledová  
 spára je utluo dočistit od vody a  
 kožmědlého jílu, tj. pokložit lo cca  
 0,1 - 0,3 m vrstvou jílu s vysokou  
 vlhkostí s příslušným rozdělením kř = 200/10.  
 Do záhledové spáry nedoporučuji sypat  
 vápni vstříčku, ale vodu kožmědlý  
 podhledu k tomu by nedošlo z důvodu  
 klesání k akumulaci vlitrovane saz  
 vody v podzákladí. Po provedení  
 dotisku je možno položit kerub.





**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19**

**Termín plnění: září 2019 – březen 2021**

**Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.**

**IČO: 26768607**

**Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí**

**Telefonní spojení:** 

**Popis předmětu informace: ZL č. 41 – Opěrná stěna – změna předmětu díla**

**Popis problému: dle zápisu geologa ve SD změna rozsahu založení a změna rozsahu díla dle skutečného provedení**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu**

**Datum, podpis oprávněné osoby 26.04.2021**



**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892  
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 42

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19  
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: IO 03 + IO 05 + IO 06 Inženýrské sítě - chodník

DATUM: 04/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Požadavek Magistrátu města Kladno na změnu finálního povrchu ulice Divadelní s ohledem na budoucí generální rekonstrukci předmětné ulice vč. přílehlého chodníku

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o : 6.649,80 Kč

Cena díla se zvýší o : 0 Kč

Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o 6.649,80 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dnů

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 31.03. 2021

Termín dokončení díla do: 04/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.  
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
tel.: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
www.cl-evans.cz



Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.4.2021

**Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.42 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“**

Na základě požadavku Magistrátu města Kladno byla provedena změna řešení povrchu ulice Divadelní, a to s ohledem na plánovanou investiční akci MMK, kdy dojde ke generální rekonstrukci předmětné ulice vč. přilehlého chodníku. Dochází tedy ke snížení ceny. Za AD souhlasíme.

Úprava je součástí dokumentace skutečného provedení stavby.



S pozdravem

**KANIA**

KANIA a.s., Špálova 80/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....  
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY  
V Kladně, p.o.  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

**IO 03 + IO 05 + IO 06 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - CHODNÍK**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ**

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
<b>IO 03 PŘÍPOJKA VODY</b>						
<b>D1 - Vodovod vč. montáže</b>						
6	R101-R6	Chodník z litého asfaltu	m2	-3,000	917,00	-2 751,00
<b>D1 - Vodovod vč. montáže - celkem</b>						<b>-2 751,00</b>
<b>IO 05 PŘÍPOJKA PLYNU</b>						
<b>D3 - Komunikace</b>						
36	578100010RA0	Chodník z litého asfaltu	m2	-1,100	918,00	-1 009,80
<b>D3 - Komunikace - celkem</b>						<b>-1 009,80</b>
<b>IO 06 PŘÍPOJKA KANALIZACE</b>						
<b>D1 - Vodovod vč. montáže</b>						
7	R101-R7	Chodník ze zámkové dlažby	m2	-3,000	963,00	-2 889,00
<b>D1 - Vodovod vč. montáže - celkem</b>						<b>-2 889,00</b>

**IO 03 + IO 05 + IO 06 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - ZMĚNA PŘEDMĚTU DILA - CELKEM (bez DPH) - 6 649,80 Kč**

Poznámka : požadavek Magistrátu Kladno na změnu finálního povrchu ulice Divadelní s ohledem na budoucí generální rekonstrukci předmětné ulice vč. přilehlého chodníku

Zpracoval : Miloš Pávek  
V České Lípě dne 07. dubna 2021



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19**

**Termín plnění: září 2019 – duben 2021**

**Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.**

**IČO: 26768607**

**Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí**

**Telefonní spojení:** 

**Popis předmětu informace: ZL č. 42 – IO 03 + IO 05 + IO 06 Inženýrské sítě - chodník**

**Popis problému: rozhodnutí o změně rozsahu předmětu díla dle požadavku Magistrátu města Kladno na změnu finálního povrchu ulice Divadelní s ohledem na budoucí generální rekonstrukci předmětné ulice vč. přilehlého chodníku**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu**

**Datum, podpis oprávněné osoby 26.04.2021**



**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892  
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 43

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19  
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: IO 07-1 + IO 07-2 Přípojka metropolitní sítě + přílože , SP-01 + IO-02 Čerpání vody

DATUM: 04/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Nevyčerpaná položka rezervy dle rozpočtu prací, nerealizované práce týkající se čerpání vody

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o : 35.014,50 Kč

Cena díla se zvýší o : 0 Kč

Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o 35.014,50 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dnů


Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 31.03. 2021

Termín dokončení díla do: 04/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.

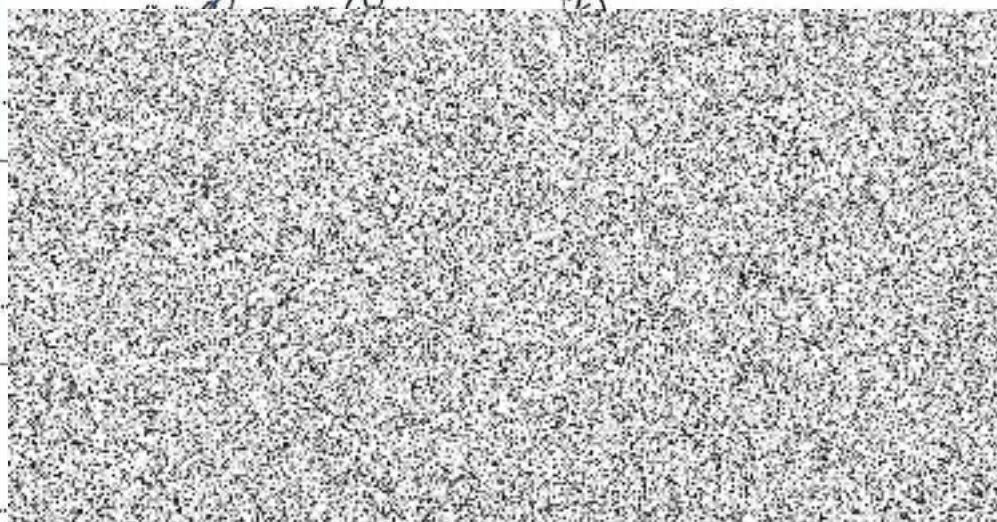

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.  
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
tel.: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: C226768607  
www.cl-evans.cz



Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.4.2021

**Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.43 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“**

V rámci realizace stavby nebylo prováděno odčerpávání vody a nebyla čerpána rozpočtová rezerva v rámci IO 07 Přípojka metropolitní sítě. Dochází tedy ke snížení ceny. Za AD souhlasíme.

S pozdravem



**KANIA**

KANIA a.s., Špálova 80/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....  
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19**

**Termín plnění: září 2019 – duben 2021**

**Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.**

**IČO: 26768607**

**Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí**

**Telefonní spojení:** 

**Popis předmětu informace: ZL č. 43 – IO 07-1 + IO 07-2 Přípojka metropolitní sítě + přílože , SO-01 + IO-02 Čerpání vody**

**Popis problému: nevyčerpaná položka rezervy dle rozpočtu prací, nerealizované práce týkající se čerpání vody**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu**

**Datum, podpis oprávněné osoby 26.04.2021**



**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**



**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY  
V Kladně, p.o.  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

**IO 07-1+07-2 PŘÍPOJKA METROPOLITNÍ SÍTĚ + PŘÍLOŽE - REZERVA  
SO-01 + IO-02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY- ČERPÁNÍ VODY**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ**

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	<b>IO 07-1 PŘÍPOJKA METROPOLITNÍ SÍTĚ</b>					
	<b>D5 Ostatní</b>					
105	Pol507	rozpočtová rezerva	ks	-1,000	7 279,00	-7 279,00
	<b>D5 Ostatní - celkem</b>					<b>-7 279,00</b>
	<b>IO 07-1 PŘÍPOJKA METROPOLITNÍ SÍTĚ - PŘÍLOŽE</b>					
	<b>D5 Ostatní</b>					
39	Pol522	rozpočtová rezerva	ks	-1,000	5 968,00	-5 968,00
	<b>D5 Ostatní - celkem</b>					<b>-5 968,00</b>
	<b>SO-01 Depozitář Kladno</b>					
	<b>1 - Zemní práce</b>					
1	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	-121,500	145,00	-17 617,50
	<b>1 - Zemní práce - celkem</b>					<b>-17 617,50</b>
	<b>IO- 02 Zpevněné plochy, oplocení</b>					
	<b>1 - Zemní práce</b>					
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-50,000	83,00	-4 150,00
	<b>1 - Zemní práce - celkem</b>					<b>-4 150,00</b>

**IO 07-1+07-2 + SO-01 + IO-02 - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA - CELKEM (bez DPH) - 35 014,50 Kč**

Poznámka : nerealizované práce dle rozpočtu

Zpracoval : Miloš Pávek  
V České Lípě dne 07. května 2021
