

Protokol o změně díla

změnový list číslo 072

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno





Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod  
zakázkovým číslem 1195

Změna: Bourací práce na římsě - jižní fasáda

P O P I S	Změnu vyvolal: GD, Zjištění skutečného stavu		
	Popis změny: Změna řeší ubourání římsy v 1-5.NP v části jižní fasády tak, aby bylo možno provést ztužení konzolové konstrukce římsy dle projektu statiky (viz Příloha 02).		
Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ v 05/2020 <span style="float: right;">ve formě</span>			
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		vícepráce	méněpráce
Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		74 434,87 Kč	0,- Kč
projekční náklady		0,-	0,-
úprava smluvní ceny: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2			
C E N A	zvýšení:		74 434,87 Kč
	snížení:		0,-
	nová cena:		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: má vliv na dokončení termínu 2. etapy a je obsaženo v avizovaném posunu termínu 90 dnů, který zahrnuje další změny realizace		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na konečný termín, který je ovlivněn posunutím termínu dokončení 2. etapy o 90 dnů		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: <span style="margin-left: 100px;">stavební práce</span> <span style="margin-left: 100px;">projekční práce</span>		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 zakres změny		
	Datum		

**Příloha č. 1 pro ZL 072- Bourací práce na římsě - jižní fasáda**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**  
 FN Brno - Psychiatrická klinika  
 SO 01 - PAVILON G PK  
 D.1.01.1 - REV 06  
 D.1.01.1 - REV 06  
 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	VCP Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						
nová	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	98,21000	111,00	10 901,31	RTS 20/I
				<b>98,21000</b>		<b>50 030,98</b>	

jižní fasáda : (66,92-0,45-1,35-5,25-0,15-24\*0,15)\*0,35\*5

339	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	56,12000	76,00	4 265,12	SoD
				<b>56,12000</b>			

jižní fasáda : (66,92-0,45-1,35-5,25-0,15-24\*0,15)\*0,2\*5

nová	967032974	Odesekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm	m2	140,30000	248,50	34 864,55	RTS 20/I
				<b>140,30000</b>			

přísekání římsy v tloušťce do 6 cm :

jižní fasáda : (66,92-0,45-1,35-5,25-0,15-24\*0,15)\*0,5\*5

Díl: D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
1393	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	22,64442	199,00	4 506,24	SoD
1394	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	45,28884	131,00	5 932,84	SoD
1395	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,64442	125,70	2 846,40	SoD
1396	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	226,44420	9,40	2 128,58	SoD
1397	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,64442	167,60	3 795,20	SoD
1398	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,64442	19,90	450,62	SoD
1400	979990105	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm	t	22,64442	209,50	4 744,01	SoD
				<b>24 403,89</b>			

**Celkem 74 434,87**



# ZL 72 PŘÍLOHA 02 POKYN STATIKA

TB 147  
(168)



Re: RE: FN BRNO PK\_odstranění břizolitu z jižní strany fasády

FN Brno - Psych. Komu: Skřivánek Tomáš Ing.

17.06.2020 15:18

Odeslal: Hana Marková

"martin.foral@ltprojekt.cz", "Nevoral Jan",

Kopie: "kubickova@k4ext.cz", "knot@k4ext.cz",

"halickova@k4.cz", "pigl@k4.cz", "navratil@k4.cz",

Dobrý den,

nenosná betonová mazanina bude ubourána v celé ploše římsy, z horní hrany stropní desky jsou přiložené zesilující profily U140 a provádí se nová skladba podlahy, břizolit bude v místech zesílení ocelovými prvky osekán.

S pozdravem Koudela

**From:** markova@k4.cz [mailto:markova@k4.cz] **On Behalf Of** FN Brno - Psych.

**Sent:** Wednesday, June 17, 2020 12:20 PM

**To:** Zdeněk Koudela <koudela@hch.cz>

**Cc:** Pavel Hladík <hladik@hch.cz>

**Subject:** Fw: FN BRNO PK\_odstranění břizolitu z jižní strany fasády

Dobrý den,

prosím o níže uvedené

Děkuji

S pozdravem

Ing. Hana Marková  
vedoucí projekční skupiny

K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno

tel.: +420 541 126 652

mobil: +420 604 419 628

[www.k4.cz](http://www.k4.cz), e-mail: [projekt\\_1195@k4.cz](mailto:projekt_1195@k4.cz)

--- E-mail Date : 17.06.2020 12:14:21

From : "Skřivánek Tomáš Ing." <[Tomas.Skrivanek@metrostav.cz](mailto:Tomas.Skrivanek@metrostav.cz)>

Send To : "[projekt\\_1195@k4.cz](mailto:projekt_1195@k4.cz)" <[projekt\\_1195@k4.cz](mailto:projekt_1195@k4.cz)>; "[martin.foral@ltprojekt.cz](mailto:martin.foral@ltprojekt.cz)" <

[martin.foral@ltprojekt.cz](mailto:martin.foral@ltprojekt.cz)>; "Nevoral Jan" <[Nevoral.Jan@fnbrno.cz](mailto:Nevoral.Jan@fnbrno.cz)>; "[kubickova@k4ext.cz](mailto:kubickova@k4ext.cz)" <

[kubickova@k4ext.cz](mailto:kubickova@k4ext.cz)>; "[knot@k4ext.cz](mailto:knot@k4ext.cz)" <[knot@k4ext.cz](mailto:knot@k4ext.cz)>; "[halickova@k4.cz](mailto:halickova@k4.cz)" <


SO AMOJ 199 SF 15

halickova@k4.cz; "bigl@k4.cz" <bigl@k4.cz>; "navratil@k4.cz" <navratil@k4.cz>  
Copy To : "Kolečkář Vítězslav" <vitezslav.koleckar@unistav.cz>; "Jašek Radovan Ing." <  
Radovan.Jasek@metrostav.cz>; "psima@ohlzs.cz" <psima@ohlzs.cz>; "Drozd Michal Ing." <  
Michal.Drozd@metrostav.cz>; "Skryja Petr" <petr.skryja@metrostav.cz>; "Trnečka  
Michal" <michal.trnecka@unistav.cz>; "Různar Daniel Bc." <Daniel.Ruznar@metrostav.cz  
>; "Vojtěch Bobek" <vojta.bobek@gmail.com>  
Subject : FN BRNO PK\_ odstranění břizolitu z jižní strany fasády

-----  
-----

Dobrý den,

upozorňuji na skutečnost a žádám o možnost provedení odstranění části břizolitu na jižní straně fasády objektu A. Je zde provedena konstrukce na ztužení římsy, kdy na vnější líc se osazuje U180, která potřebuje cca 155 mm tloušťku konzoly objektu. Samotná konzola má tloušťku cca 150 mm se spodním břizolitem cca 170 mm. Dle přiložených obrázku tedy musí dojít k ubourání betonové mazaniny na horním okraji a břizolitu na spodní hraně, aby bylo možné provést ztužení konzoly dle PD viz detail ("Ztužení římsy") níže. Odstranění bude provedeno v šíři cca 300 mm pro osazení U profilu (N132) a ocelové plotny (Z54).

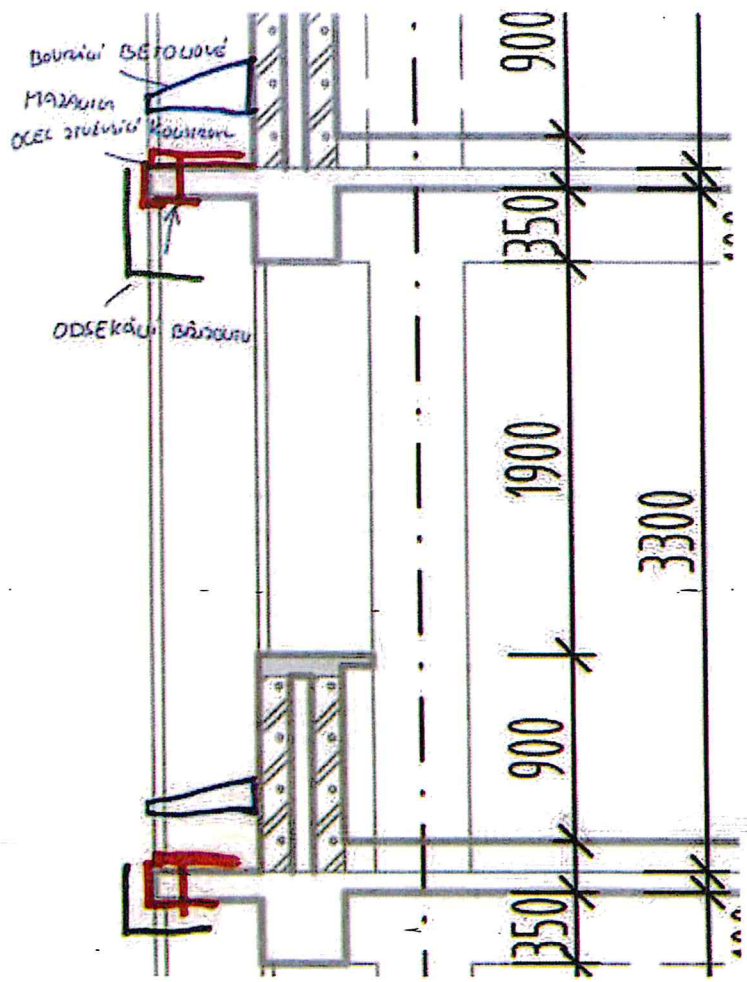


# ZESÍLENÍ ŘÍMSY 1 - 56x

VZOROVÝ DETAIL ZESÍLENÍ ŘÍMSY V JIŽNÍ FASÁDĚ (OSA C)

ŘEZ:

M 1:25

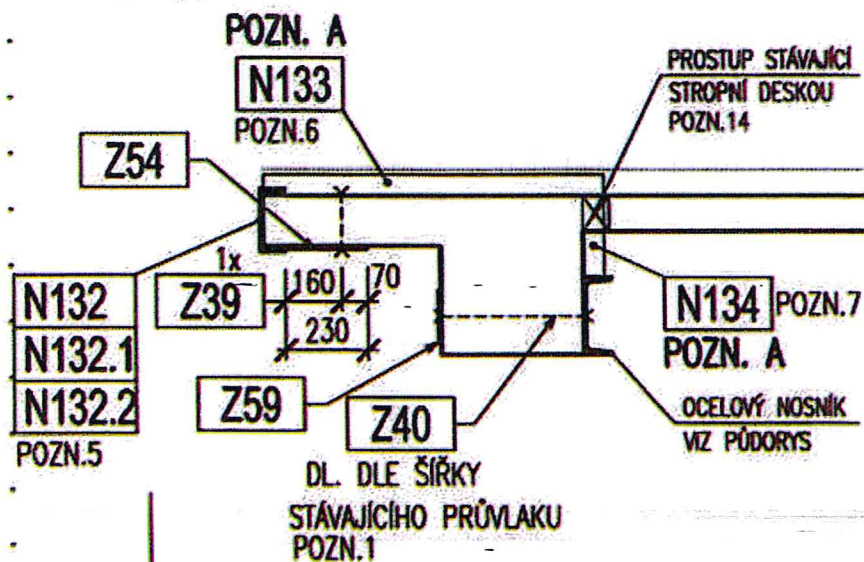

S pozdravem

Ing. Tomáš Skřivánek

Metrostav a.s., Divize 1, Vídeňská 121, 619 00 Brno

M +420 702 240 915

[tomas.skrivanek@metrostav.cz](mailto:tomas.skrivanek@metrostav.cz), [www.metrostav.cz](http://www.metrostav.cz)

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Informace o zpracování osobních údajů: [Zásady ochrany soukromí](#)

[IMAGE]

[IMAGE]



$$\begin{aligned}
 & \left[ \begin{array}{l} 66,920 \\ 24,015 \end{array} \right] - 0,45 - 1,35 - 5,25 = 0,15 \\
 & - (24,015) \cdot 0,05 = 0,05 \cdot 5
 \end{aligned}$$

