

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00, Praha 5 – Smíchov
IČ: 60838744,
DIČ: CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
p. Ing. Milan Fiala, p. Ing. Milan Peška
TDS: p. Ing. Miloš Klekner

Vyřizuje:
Ing. Karel Frankota



Naše značka:
SO 101+111 a SO 251 Ocelová Svodidla

09.04.2019

Předmět: Oznámení o upřesnění ocelového svodidla

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-0656/DOP/2019, články 8.11 až 8.14 Vás informujeme o následující upřesnění ocelového svodidla.

Dle projednání předložených konceptů RDS na Výrobních výborech pro objekty SO 251 a 101 upřesňujeme použití ocelového silničního svodidla

„KB2-RH1C“ na objektu SO 101+111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa a
„KB2-RH2K“ na objektu SO 251 Opěrné zdi Praha – Měchenice, vlevo včetně dlouhých a krátkých náběhů pro ukončení svodidel.

S ohledem na navrhovanou RDS stavby, Vás tímto žádáme v souladu se smlouvou o dílo o souhlas s použitím výše navrhovaného typu svodidla voestalpine. Tento požadavek bude mít vliv na změnu soupisu prací.

S přátelským pozdravem



Ing. Karel Frankota

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Jednání se konalo dne: **22. 5. 2019** v budově Policie ČR ve Zborovské ulici
Předmětem jednání byly akce: **II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce (1. etapa)**
Účastníci jednání: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu

Předmětem jednání bylo řešení provizorních svodidel oddělující výkop pro opěrnou zeď a provizorní jízdní pruh převádějící obousměrný provoz.

V rámci jednání bylo dohodnuto, že oddělení provozu od výkopu staveniště je třeba oddělit min. provizorními svodidly ve smyslu čl. 2.5 TP 114 a TP 159. Alternativně lze přistoupit k ochraně provozu s požadavky uvedenými v ČSN 736201 v čl. 15.15.3 tzn. odrazný obrubník společně s ochranou proti pádu osob do výkopu.

V rámci jednání bylo dále řešeno zabezpečení definitivního stavu silnice po rekonstrukci proti pádu vozidel do nádrže v úseku km 1,750 – 1,830 vlevo. DI Policie ČR požaduje provedení svodidla nebo jiného odpovídajícího zádržného systému ve výše uvedené staničení tak, aby nemohlo dojít při vyjetí vozidla v tomto úseku k jeho pádu do nádrže.

Zapsal: Ing. Pavel Hrdina

Pontex spol.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Přílohy: Prezenční listina




PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce (1. etapa)

Místo konání: DI Policie ČR, Zborovská Praha

Datum konání: 22.5.2019

jméno	organizace	telefon/mobil	e-mail	podpis
PAVEL ŘEŠKA	PONTEX spol. s r.o.			
JAN PLEŠÁK	PCR DI TV-ZAM			

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00, Praha 5 – Smíchov
IČ: 60838744,
DIČ: CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
p. Ing. Milan Fiala, p. Ing. Milan Peška
TDS: p. Ing. Miloš Klekner

Vyřizuje:
Ing. Karel Frankota



Naše značka:
SO 251 ZEĎ číslo 21

09.08.2019

Předmět: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-0656/DOP/2019, články 8.11 až 8.14 Vás informujeme o následující nové zjištěné skutečnosti.

Dle požadavku DI Policie ČR z jednání ze dne 22.5.2019 je nutné doplnit svodidlo tam, kde hrozí vyjetí vozidel do nádrže VD Vrané a protože ve staničení stavby 1,770-1,813 Km nejsou naplněny podmínky pro osazení svodidla dle čl. 13.1.2.2.9 písm c) ČSN 736101, z prostorových důvodů je možné osadit svodidlo pouze na opěrnou ŽB zeď, proto je doplněna do projektu zeď číslo 21.

S ohledem na zjištěnou skutečnost a navrhovanou RDS stavby, Vás tímto žádáme v souladu se smlouvou o dílo o písemný pokyn, jak v realizaci díla pokračovat. Tento požadavek bude mít vliv na změnu soupisu prací.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Frankota



strana 1 z 1

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Pontex s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

V Klínci

26. 8. 2019

Věc: Vyjádření OLH a nájemce ke zbudování propustku pod silnicí II/102.

Na základě předložené projektové dokumentace a místního šetření souhlasím jako nájemce a odborný lesní hospodář se stavbou propustku pod silnicí II/102. V případě, že stavba bude zasahovat na pozemky určené k plnění funkcí lesa tyto budou dočasně (trvale) odňaty případně omezeny plnění funkcí lesa. V průběhu stavby nedojde k poškození lesního porostu, stávající oborní oplocení bude po dokončení stavební akce plně funkční ve stávajícím provedení.

Před zahájením stavební akce mne informujte na tel. č. 724066430. Po ukončení akce bude převzato pracoviště předávacím protokolem.

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy ani vyjádření vlastníků lesních pozemků.

Ing. Filip Tobolka
nájemce a odborný lesní hospodář



Vyjádření správkyňe pozůstalosti ke změně návrhu technického řešení stavby

JUDr. Monika Rutlandová, advokátka, rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o., ev. č. ČAK 3468, se sídlem Panská 6, 110 00 Praha 1, Česká republika,

správkyně pozůstalosti po zemřelé paní **Elizabeth Barton-Dobenir**

jmenovaná usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j. 32 D 780/2018-347 ze dne 17. 01. 2019,

tímto na základě předložené projektové dokumentace a vyjádření jejího zpracovatele **souhlasí se změnou návrhu technického řešení stavby** spočívajícího v změně umístění trubního propustku pod stavbou – silnicí II/102, jenž se bude nacházet na pozemku, parcele katastru nemovitostí p. č. 362/1, lesní pozemek, v k. ú. Jíloviště, zapsaném na LV 617, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ.

V Praze dne 21. 10. 2019.

JUDr. Monika Rutlandová, advokátka
správkyně pozůstalosti

DOŠLO DNE:
18. 01. 2019

32 D 780/2018-347

USNESENÍ

Obvodní soud pro Prahu 5, Praha 2, Legerova 1877/7, rozhodl JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem kanceláře Praha 1, Na Florenci 35, pověřenou provedením úkonů soudu prvního stupně jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti po zůstaviteli, kterým je:

Elizabeth Barton-Dobenin

kterého se účastní:

1) Joan Mary Stepan, r

2) Richard Thomas York

oba zároveň též jako správci svěřenského fondu s názvem EBD IRREVOCABLE TRUST založeného zůstavitelkou dle práva státu Texas dne 7.10.2016, zastoupení advokátkou JUDr. Monikou Rutlandovou, advokátkou společností rutland&partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 21, Nové Město, Panská 6,

takto:

jmenuje JUDr. Moniku Rutlandovou, advokátku rutland&partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 21, Nové Město, Panská 6, **správcem celé pozůstalosti**, a to zejména nemovitých věcí nacházejících se na území České republiky evidovaných na jméno zůstavitelky.

Správce je povinen spravovat pozůstalost až do potvrzení nabytí dědictví a vykonává její prostou správu. Dle ust. § 1679 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lze při správě z pozůstalosti něco zcizit nebo použít jako jistotu, vyžaduje-li to zájem na zachování hodnoty nebo podstaty spravovaného majetku, jinak za protiplnění. Správce dědictví může do doby, než bude znám okruh dědiců, učinit úkon přesahující rozsah prosté správy, jen se souhlasem soudu, neboť dědicem by mohla být osoba pod zvláštní ochranou (dědic neznámý nebo neznámého pobytu).

Správce je oprávněn vykonávat práva a povinen plnit povinnosti, které ke svěřenému majetku příslušely zůstavitelce, ve prospěch pozůstalosti. Správce pozůstalosti je povinen ujmout se výkonu své funkce dnem následujícím po dni doručení usnesení.

Správce je povinen po skončení řízení o pozůstalosti předložit prostřednictvím soudu dědicům konečnou zprávu o své činnosti a v ní vyúčtovat nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů.

Odůvodnění:

1. Obvodní soud pro Prahu 5 bez návrhu zahájil řízení o pozůstalosti po zůstavitelce a pověřil JUDr. Lenku Leszay, notářku v Praze, se sídlem Praha 1, Na Florenci 35, soudním komisařem k provedení úkonů v tomto řízení ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.).

2. Šetřením provedeným ve věci bylo zjištěno, že zůstavitelka měla státní příslušnost Spojených států Amerických a měla rovněž ve státu své příslušnosti svůj obvyklý pobyt, byla vdova, bezdětná, žila sama, její sourozenci předemřeli, a dle dosavadních výsledků šetření jejími nejbližšími příbuznými jsou děti předemřelých sourozenců, a to paní Joan Mary Stepan a pan Richard Thomas York a další potomci předemřelých sourozenců, jejichž totožnost ani místo jejich pobytu není dosud známo, kteří by mohli přicházet jako dědici ze zákona. Jedná se tedy o osoby pod zvláštní ochranou, které mají právo seznámit se ze závěti zůstavitelky a vyjadřovat se k její platnosti a pravosti. Z tohoto důvodu jim byl jmenován opatrovník, a to usnesením zdejšího soudu čj. 32 D 780/2018-331 ze dne 29.11.2018, které nabylo právní moci dne 28.12.2018. Zůstavitelka zanechala holografní závěť, podle níž veškerý majetek a závazky v České republice vkládá okamžikem své smrti do svěřenského fondu pojmenovaného „EBD IRREVOCABLE TRUST“ založeného a existujícího podle práva státu USA.
3. Při předběžném šetření bylo zjištěno, že do pozůstalosti náleží nemovitě věci nacházející se na území České republiky, ohledně nichž je třeba provádět správu, zejména s ohledem na jejich pronajímání a vedení sporů ohledně některých z nich.
4. Soud podle ust. § 157 z.ř.s. rozhodl o ustanovení správce pozůstalosti, protože to vyžaduje zájem účastníků řízení na zachování hodnoty spravovaného majetku. Na návrh právního zástupce svěřenských správců svěřenského fondu s názvem EBD IRREVOCABLE TRUST, který má dle shora uvedené závěti nabýt pozůstalost, byl jmenován správce pozůstalosti, a to paní JUDr. Monika Rutlandová, která se svým jmenováním souhlasila.
5. Správce dědictví je povinen ujmout se výkonu své funkce dnem následujícím po dni doručení usnesení. Po skončení řízení je správce povinen předložit dědicům prostřednictvím soudu konečnou zprávu o své činnosti. Správce má nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů. O této odměně a náhradě hotových výdajů rozhodne soud po skočení řízení o dědictví. Na žádost správce dědictví může soud až do skončení projednání dědictví uložit dědicům, aby zaplatili správci dědictví zálohu na odměnu a jeho hotové výdaje.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Městskému soudu v Praze. Místem pro podání odvolání je notářská kancelář JUDr. Lenky Leszay, Ph.D., LL.M., notářky se sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Na Florenci 35, PSČ 110 00, nebo sídlo Obvodního soudu pro Prahu 5, na adrese Praha 2, Legerova 1877/7.

Usnesení se stane vykonatelným uplynutím stanovené lhůty k plnění.

V Praze dne 17. ledna 2019

Mgr. Kateřina Žezulíková
zástupkyně
JUDr. Lenky Leszay, Ph.D.
notáře jako soudního komisaře



Podpis Mgr. Kateřiny Žezulíkové
DN: cn=Kateřina Žezulíková, o=CZ,
ou=JUDr. Lenka Leszay, Ph.D.,
c=cz, ou=Notářská kancelář v Praze,
ou=Notářská kancelář, ou=Notářky.cz,
Date: 2019.01.17 17:44:42 +0100

Pontex s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
k rukám Ing. Pavla Hrdiny

**Věc: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice – vyjádření vlastníka ke
zbudování propustku pod silnicí.**

Vážený pane inženýre,

v zastoupení paní Evy Curryové 2/3 spoluvlastníka pozemku parcelní číslo 362/1 v k. ú. Jíloviště, v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ Vám tímto odpovídáme na Váš dopis ze dne 8. 10. 2019.

Jedná se o připravovaný záměr „**Stavby propustku pod silnicí II/102**“, který bude zasahovat do našeho shora uvedeného pozemku (příloha č. 2). **Souhlasíme** se shora uvedeným záměrem za dodržení následujících podmínek:

- a) požadujeme, aby veškeré práce byly provedeny pouze na Vaše vlastní náklady
- b) požadujeme, aby bylo vše inženýrsky zajištěno Vámi se všemi potřebnými a nutnými povoleními a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v plné součinnosti s dotčenými orgány státní správy
- c) požadujeme, aby kopie budoucích rozhodnutí a povolení byly předány na technické oddělení správy domu “U Nováků“
- d) požadujeme, aby v případě výskytu stavebních či jiných problému na výše uvedeném pozemku, jsme byli o všem neprodleně informováni
- e) stavba bude zasahovat do našeho pozemku 362/1, který je určený k plnění funkce lesa, požadujeme oddělení zabrané plochy stavbou dočasným či trvalým vynětím na Vaše vlastní náklady
- f) v průběhu stavby nedojde k poškození lesního porostu, stávající oborní oplocení bude po dokončení stavby plně funkční a ve stávajícím provedení
- g) před zahájením a po dokončení stavby informujte nájemce pozemku, našeho odborného lesního hospodáře Ing. Tobolku, tel.:  který pozemek písemně předá a převezme na základě předávacího protokolu
- h) jakékoliv škody, které vzniknou při realizaci díla majitelům nemovitosti, je Vaše společnost povinná uhradit a uvést do původního stavu

ch) po dokončení stavby a zaměření skutečného stavu budou řešeny samostatným smluvním vztahem věcná břemena a trvalé zábory, včetně kdo bude plně zodpovědný za provoz a údržbu

S pozdravem

V Praze dne 6. 11. 2019


Zdeňka Martínková

Tel.: 

Fax: 

Email: 



.....
Tomáš Švarc

Tel.: 

Fax: 

Email: 

Přílohy:

- 1.) Kopie plné moci
- 2.) Fotodokumentace
- 3.) Výpis z katastru nemovitostí

PLNÁ MOC

Ja, níže podepsaná
paní Eva Čistýová
soudně v postavení
tříbýlce

zmocňuji

- 1) pana Zdeňku Martinku
- 2) pana Tomáše Švance

aby mne zastupovali ve všech věcech týkajících se stávajícího řízení, dodávek energií, dodávek proudu a služeb v nemovitostech, ježchž jsem vlastníkem, resp. většinovým spoluvlastníkem (podíl 2/3), dále aby mne zastupovali ve všech záležitostech pojistných smluv ohledně se zejména nemovitostí, ježchž jsem vlastníkem, resp. většinovým spoluvlastníkem (podíl 2/3), nového nájmu a dalších pojistných smluv; zmocněnci jsou oprávněni sjednávat podmínky pojistných smluv, uzavírat, měnit a vypovídat pojistné smlouvy, vyřizovat veškeré záležitosti týkající se pojistného pořízení a činit další úkony spojené s těmito pojistnými smlouvami.

Zmocněnci jsou povinni o svém postupu vždy předem informovat zmocnětele. K plnění pojistného úkolu v písemné formě je třeba, aby jej učinili oba výše uvedení zmocněnci společně. Zmocněnci nejsou oprávněni zastupovat předníme nemovitosti bhemeny nebo jinými obdobnými právními postupy ani předníme nemovitosti zastupovat. Tato plnou moc uděluji současně jako jednatel většinový spoluvlastník (podíl 2/3) shora uvedených nemovitostí.

V Praze dne 28-01-2013

Zmocněnec přímý:

V Praze dne 28-01-2013

Zdeňka Martinková





PROPUSTEK
KM 1.0504

PT 1.0504

1.1

KP 1.065657

VB6		1000	101
A 0	452.5	15	
R			
A 150.36	25		

SEZD
KM 1.020

1.0

TK 0.982891

KP 0.962737

PT 0.982737

8.10

VB5		1000	101
A 366.61	280		
R	480		
A 97.88	20		

0.9

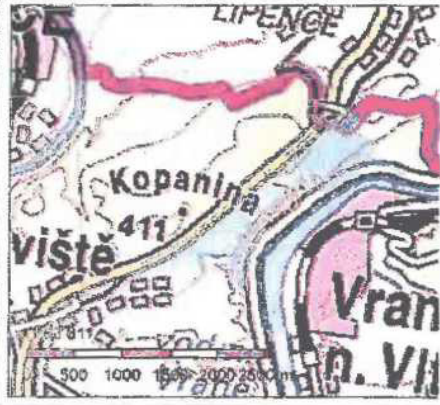
PK 0.861803

UPRAVA SVAHU TYP B1

1:4000
1:4000
1:4000

0.8

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	362/1	
Obec:	Lilovířtě [539341]	
Katastrální území:	Lilovířtě [660175]	
Číslo LV:	517	
Výměra [m²]:	1280979	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	KMD	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Druh pozemku:	lesní pozemek	

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Barton-Dobenin Elizabeth	1/3
Curryová Eva	2/3

Způsob ochrany nemovitosti

Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Podaná žaloba
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.11.2019 06:00:02.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřičský a katastrální](#), Poa sídliště: 1800/2, Kopecký 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [elektronickou adresu](#)

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

22 14312522 102

PONTEX s.r.o.

Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

Došlo: 08. 11. 2019

Č.j.: 6648/2019

Přílohy:

K vyřízení: PHr

Rozdělit:



**II/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE,
REKONSTRUKCE, ETAPA I.
Technický dozor stavby**

Naše značka: 133/19-120/VM/21
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel.

e-mail

Datum

KSÚS Středočeského kraje

**Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU**

**Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa I.

**Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č.1 SO 101 + 111/1 Rekonstrukce vozovky a
úprava zemního tělesa.**

Zhotovitel stavby dne 25.6. 2021 předložil TDS doplněný návrh ZBV č.1 SO 101 + 111/1 ver.4. Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti PDPS a požadavky Policie ČR.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č.1 SO 101 + 111/1 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa.

Položky oceněného soupisu prací SO 101 + 111/1 budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
J. Nejedlík



M. Valenta
Technický dozor investora

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Ing. Aleš Čermák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2021

V Praze : 24. června 2021

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel-

e-

Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce (1. etapa)

Věc: Vyjádření AD č. 46

Vážený pane inženýre,

dne 18. 6. 2021 obdržel finální verzi ZBV č. 1 k SO 101, která obsahuje 8 dílčích změn výše uvedené stavby. AD si dovoluje se k jednotlivým změnám vyjádřit postupně v souladu s číslování ve zdůvodnění ve změnovém listu.

K bodu 1)

Změna v bodě 1) řeší změnu trubního propustku, která zahrnuje změnu umístění propustku a změnu jeho délky.

V rámci PDPS byl trubní propustek navržen v km 1,050400 uprostřed mezi dvěma svahovými roklemi, při čemž měl převádět vodu z obou těchto roklí. Vtokové čelo bylo umístěno na pozemku parc. č. 362/1 v k. ú. Jíloviště na stávající skladovací ploše.

Po zahájení realizace došlo se na nás obrátit vlastník výše uvedeného pozemku, který požádal o změnu umístění propustku tak, aby čelo propustku bylo mimo skladovací plochu a zároveň byl propustek umístěn proti pouze jedné z roklí, jelikož druhá rokle je trvale suchá. Tím došlo ke změně umístění propustku a jeho prodloužení.

K bodu 2)

Změna v bodě 2) zahrnuje doplnění změny v souvislosti s doplnění opěrné zdi v úseku km 1,770 – 1,813.

V rámci PDPS byl úsek navržen ponechán bez zádržného systému a takto byl schválen Policií ČR jako dotčeným orgánem ve věci bezpečnosti dopravy.

Policie ČR na jednání 22.5.2019 požádala o doplnění zádržného systému ve výše uvedeném úseku, při čemž pro instalaci svodidla v uvedeném úseku není dostatečně široká krajnice a není možné z důvodu obslužné komunikace pod patou násypového svahu zemní těleso dále rozšiřovat rozšířit. Na základě výše uvedených skutečností je nutné doplnit opěrnou zeď, kterou bude zajištěno těleso komunikace a zároveň zachována obslužná komunikace podél objektu hráze VD Vrané.

K bodu 3)

Změna číslo 3) se týká upřesnění odvodnění zemní pláně, které je na straně zářezu (vlevo řešeno trativody). V rámci podrobného řešení v rámci RDS byla délka trativodů zmenšena, avšak odvodnění zemní pláně dostatečně zajištěno.

K bodu 4)

Změna v bodě 4) řeší změnu konstrukce vozovky na sjezdech vlevo z komunikace. V rámci PDPS byla navržena vozovka ve stejné skladbě jako na hlavní trase, dle vzorových příčných řezů typ 1, z důvodu sjednocení návrhu a nezávázání dalších technologií.

V průběhu realizace se ukázalo, že mechanizací zhotovitele z důvodu nedostatečných prostorových podmínek není možné provést technologii recyklaci za studena na místě, proto byl návrh konstrukce vozovky změněn a podkladní vrstva byla provedena ze štěrkodrti.

K bodu 5)

Změna v bodě 5) řeší úpravu odvodňovacích zařízení v km 0,570, kde došlo k záměně uliční vpusti za čistící kus šterbinového žlabu. Záměna byla požadována správcem komunikace. Systém povrchového odvodnění tím není dotčen a je dostatečně kapacitní.

K bodu 6)

Změna v bodě 6) řeší změny délky svodidel.

V rámci PDPS byla svodidla definována obecně. Zhotovitel následně předložil návrh výrobku svodidla, který je v souladu s požadavky PDPS a byl schválen objednatelem. Na mostě (tj. i na zdech) budou osazována svodidla typu KB2RH2K a jako svodidla na silnicích budou osazována svodidla typu KB2RH2C. Pro tato svodidla jsou používány náběhy takto: krátký náběh silničního svodidla délky 4,35 m, dlouhý náběh délky 11,40 m a náběh mostního svodidla délky 6,07 m. V rámci PDPS byly uvažovány délky náběhů takto: 8 m dlouhý náběh a 4 m krátký náběh. Tím došlo podstatné změně délek svodidel.

K bodu 7)

Změna v bodě 7) řeší záměnu nástavců na svodidla za odrazky v prolisech svodnice svodidla mostního typu.

V rámci PDPS byly navrženy dle TP 58 v místě svodidel na zdech a mostech nástavce na svodidla.

V návaznosti na výběr svodidla schváleného objednatelem k osazení na mostě a zdech, která má výšku horní hranu svodnice 1,1m bylo nutné dle čl. 2.3.1 TP 58 zaměnit nástavce na svodidla za odrazky v prolisech svodidla.

K bodu 8)

Změna v bodě 8) řeší změnu dopravního řešení.

Návrh definitivního dopravní značení byl projednán a schválen v rámci projektové přípravy s DI Policie ČR.

Na základě změny současné dopravní situace bylo dopravní řešení znovu projednáno s DI Policie ČR, při čemž byly konstatovány změny ve výchozí dopravní situaci, které jsou předmětem změny v bodě 8).

AD s návrhem ZBV č.1 souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Přílohy:

- Záznam z jednání ze dne 22. 5. 2019



V Říčanech dne 24. 6. 2021

Společnost „STRAKELL-BAGER Štěchovice“
adresa sídla Správce společnosti STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV č. 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání na kontrolních dnech stavby v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I“ **souhlasí** s navrženou a projednanou. Jmenovitě souhlasí:

- 1) s posunutím propustek v km 1,0504 do km 1,065 a zároveň s prodloužením z důvodu umístění vtokového čela mimo odstavnou plochu podél silnice.
- 2) s doplněním zajištění svahu k nádrži VD Vrané v úseku km 1,750 – 1,830 na základě požadavku PČR.
- 3) s upřesněním návrh trativodů.
- 4) s úpravou konstrukce na sjezdech s asfaltovým krytem.
- 5) s vypuštěním uliční vpusti UV 9 včetně přípojky, a jejím nahrazením čistícím kusem štěrbínového žlabu z důvodu požadavku správce komunikace.
- 6) s výběrem svodidel, která byla v PDPS definována pouze úrovní zadržení a odkazem na příslušný TP.
- 7) se záměnou odrazek nástavců na svodidla za odrazky v prolisech svodnic na zábradelních svodidlech
- 8) se změnou v trvalém dopravním značení na základě požadavku dotčeného orgánu ve věcech bezpečnosti dopravy.

S pozdravem



Ing. Milan Peška
Vedoucí investic EU



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I; ADA 4388 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 + 111 / 2	Číslo ZBV: 2
---	---	------------------------

Objednatel: **Středočeský kraj**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: **Společnost "STRAKELL-BAGER Štěchovice"**
Správce společnosti:
STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 60838744

Druhý společník:
KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 49702190

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I; ADA 4388

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101 + 111 / 2

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo č. S-0656/DOP/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem : Zborovská 11,150 21 Praha 5

Zhotovitel: Společnost "STRAKELL-BAGER Štěchovice", Správce společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	50	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Zhotovitel
5	Autorský dozor
6	Technický dozor
7	RDK

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci předkládané ZBV jsou zpracovány tyto změny:

a) Obnovení trubního propustku v km 4,151.

Při provádění stavebních prací byl dohledán v době přípravy stavby nenalezený propustek v km 4,151. S ohledem na zjištěný stav propustku (viz příložená fotodokumentace) bylo rozhodnuto o jeho obnově. Pro realizaci změny je třeba demontovat a následně obnovit zábranu proti pádu kamenů, která byla součástí jiného díla a je stále v záruce. Aby nedošlo k omezení záruky budou práce na zábraně realizovány původním dodavatelem (Swietelsky stavební s. r. o.) Změna má vliv na položky č.: 1, 3, 6, 19, 20, 23, 31, 33, 34, 105, 112, 60, 102, 78, 106, 110

b) Výměna trouby na vyústění stávajícího propustku v km 3,93.

Při provádění stavby bylo zjištěno poslední trouba délky 2,0m je prolomená a není možné na ni navázat odláždění svahu. Troubu bylo nutné vyměnit za novou. Změna má vliv na položky č.: 1, 6, 19, 20, 23, 31, 33, 34, 112, 60, 78.

c) Doplnění propustku v km 3,92.

Na základě požadavků správce toku Trnová, Lesy ČR (viz zápis z jednání ze dne 30. 4. 2019), byl doplněn nový trubní propustek pod silnicí II/102 jako posílení stávajícího propustku. Pro realizaci změny je třeba demontovat a následně obnovit plot, který byl součástí jiného díla a je stále v záruce. Aby nedošlo k omezení záruky budou práce na plotu realizovány původním dodavatelem (Swietelsky stavební s. r. o.) Změna má vliv na položky č.: 1, 2, 6, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 36, 38, 55, 112, 60, 102, 78, 88

d) Zásyp šachty v km 4,250.

Při provádění stavebních prací na pravé straně vozovky v km 4,250, tj. v době po dokončení opěrné zdi na levé straně komunikace, byla zjištěna šachta po původním propustku (viz příložené fotografie), kterou bylo nezbytné zasypat tak, aby v případě přejezdu vozidla nedošlo k propadu do šachty. Změna má vliv na položky č.: 107

e) Změna dopravního značení

Změna spočívá ve vyznačení přechodu pro chodce v km 0,130. Změna je vyvolána požadavkem Silničního správního úřadu vykonávajícího v místě stavby státní správu v podobě Stanovení místní úpravy prvozu na pozemní komunikaci sil. II/102 - k. ú. Jílovíště.

Změna má vliv na položky č.: 68, 72, 73, 74

☐

f) Změna konstrukce vozovky v úseku km 4,080 – 4,360.

V uvedeném úseku bylo zjištěno, že podkladní vrstvy jsou tvořeny kameny a balvany v takové úrovni, kdy znemožňují provedení podkladní vrstvy technologií recyklace za studena na místě. Z tohoto důvodu bylo nutné provést změnu konstrukce na typ plné konstrukce.

Změna má vliv na položky č.: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 35, 38, 39

g) Okamžitá sanace podkladů levé poloviny vozovky.

V průběhu provádění rekonstrukce pravé poloviny vozovky byla zjištěna pod vozovkou levé poloviny kaverna a to od úrovně spodního povrchu stávajícího asfaltového souvrství níže. Zjištění neprodleně ohlásil zhotovitel stavby a s ohledem na ohrožení bezpečnosti provozu provedl nezbytná opatření.

Souhlas s provedením následně vyjádřili TDS i AD.

Změna má vliv na položky č.: 107

h) Obnova ochranného betonu stropu prostupu vodovodu v km 0,075.

Na základě vyjádření AD č. 9 byla stávající poškozená ochrana stropu prostupu odstraněna a nahrazena novou.

Změna má vliv na položky č.: 1, 2, 19, 20, 24, 108, 38, 44, 111

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	2 485 657,34

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Josef Nejedlík	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG, a.s.	jméno	Ing. Tomáš Hajič Ing. Renata Hamrská	datum	podpis
Zhotovitel: KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o.	jméno	Ing. Petr Svoboda, Ph.D.	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 + 111 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101+111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
172 441 210,71

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 230 712,50	445 208,60	171 655 706,81	-785 503,90

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-225 219,46	2 260 437,88	2 705 646,48	1,57%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 455 931,96	173 690 925,23	1 249 714,52	0,72%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

souhlasím x nesouhlasím

datum

podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s.

souhlasím

Josef Nejedly

Projektant (autorský dozor):
Pontex spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:
Pragoprojekt a.s.

souhlasím

Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK

souhlasím

Ing. Jan Lichtneger

Supervize (RDK):

souhlasím

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Milan Peška

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2														
Název stavby:	ADA 4388, II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo SO/PS:	101+111								101 + 111 / 2					
Název SO/PS:	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	014102A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	55 057,27	57 094,55	2 037,28	104,23	5 738 619,25	0,00	212 345,69	5 950 964,94	212 345,69	3,70%	
2	014102B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	15 582,94	16 059,50	476,56	1,53	23 841,90	0,00	729,14	24 571,04	729,14	3,06%	
3	014102C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	290,50	300,39	9,89	377,83	109 759,62	0,00	3 736,74	113 496,36	3 736,74	3,40%	
6	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	3 064,49	3 118,50	54,01	77,35	237 038,30	0,00	4 177,67	241 215,97	4 177,67	1,76%	
10	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	5 503,51	5 842,83	339,32	467,38	2 572 230,50	0,00	158 591,38	2 730 821,88	158 591,38	6,17%	
11	113358	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	4 020,66	4 217,60	196,94	689,72	2 773 129,62	0,00	135 833,46	2 908 963,08	135 833,46	4,90%	
19	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	17 929,71	18 615,19	685,48	652,67	11 702 183,83	0,00	447 392,23	12 149 576,06	447 392,23	3,82%	
20	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17 929,71	18 615,19	685,48	13,03	233 624,12	0,00	8 931,80	242 555,92	8 931,80	3,82%	
21	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 916,25	3 410,63	494,38	156,30	455 809,88	0,00	77 271,59	533 081,47	77 271,59	16,95%	
22	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	266,30	267,91	1,61	972,88	259 077,94	0,00	1 566,34	260 644,28	1 566,34	0,60%	
23	17481	ZÁSYPAŘ JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 155,27	2 255,50	100,23	773,10	1 666 239,24	0,00	77 487,81	1 743 727,05	77 487,81	4,65%	
24	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	54 127,94	55 832,57	1 704,63	15,63	846 019,70	0,00	26 643,37	872 663,07	26 643,37	3,15%	
31	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	935,54	938,52	2,98	2 215,04	2 072 258,52	0,00	6 600,82	2 078 859,34	6 600,82	0,32%	
33	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	952,92	966,94	14,02	839,18	799 671,41	0,00	11 765,30	811 436,71	11 765,30	1,47%	
34	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1 871,08	1 873,64	2,56	8 780,61	16 429 223,76	0,00	22 478,36	16 451 702,12	22 478,36	0,14%	
35	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	25 828,02	27 051,83	1 223,81	269,57	6 962 459,35	0,00	329 902,46	7 292 361,81	329 902,46	4,74%	
36	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	761,02	774,50	13,48	120,79	91 923,61	0,00	1 628,25	93 551,86	1 628,25	1,77%	
38	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	25 830,19	27 441,68	1 611,49	187,71	4 848 584,96	0,00	302 492,79	5 151 077,75	302 492,79	6,24%	
39	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	27 291,69	26 067,88	-1 223,81	183,35	5 003 931,36	-224 385,56	0,00	4 779 545,80	-224 385,56	-4,48%	
44	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	12 690,00	12 769,80	79,80	147,27	1 868 856,30	0,00	11 752,15	1 880 608,45	11 752,15	0,63%	
55	767911	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	118,00	126,00	8,00	573,25	67 643,50	0,00	4 586,00	72 229,50	4 586,00	6,78%	
60	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	35,53	61,16	25,63	3 537,82	125 698,74	0,00	90 674,33	216 373,07	90 674,33	72,14%	
68	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	80,00	84,00	4,00	1 498,28	119 862,40	0,00	5 993,12	125 855,52	5 993,12	5,00%	
72	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3 986,26	3 999,75	13,49	91,20	363 546,91	0,00	1 230,29	364 777,20	1 230,29	0,34%	
73	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	99,33	115,33	16,00	332,23	33 000,41	0,00	5 315,68	38 316,09	5 315,68	16,11%	
74	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	3 886,93	3 884,42	-2,51	332,23	1 291 354,75	-833,90	0,00	1 290 520,85	-833,90	-0,06%	
78	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	13,28	40,01	26,73	4 406,53	58 518,72	0,00	117 786,55	176 305,27	117 786,55	201,28%	
88	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	62,86	70,86	8,00	140,81	8 851,32	0,00	1 126,48	9 977,80	1 126,48	12,73%	

		Nové položky											
102	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	0,00	2,00	2,00	21 700,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
105	767912R	OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO	KPT	0,00	1,00	1,00	10 851,40	0,00	0,00	10 851,40	10 851,40	10 851,40	100,00%
106	966842R	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	KPT	0,00	1,00	1,00	6 785,00	0,00	0,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	100,00%
107	451311	PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	0,00	6,80	6,80	2 822,70	0,00	0,00	19 194,36	19 194,36	19 194,36	100,00%
108	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,00	10,26	10,26	4 007,15	0,00	0,00	41 113,36	41 113,36	41 113,36	100,00%
110	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	0,00	10,50	10,50	2 120,00	0,00	0,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00	100,00%
111	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI BETON	M3	0,00	10,26	10,26	3 760,00	0,00	0,00	38 577,60	38 577,60	38 577,60	100,00%
112	711111	IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	0,00	95,48	95,48	107,00	0,00	0,00	10 216,36	10 216,36	10 216,36	100,00%
		Celkem						66 762 959,92	-225 219,46	2 260 437,88	68 798 178,34	2 035 218,42	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele: Josef Nejedlík, (stavbyvedoucí)

Za TDS: Miroslav Valenta

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I; ADA 4388

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	637 600 766,45
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	638 850 480,97
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	773 009 081,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,20%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,23%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 249 714,52
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,20%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	191 280 229,94

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,65%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 161 578,44
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	318 800 383,23

12=(1)*0,15	Limit	95 640 114,97
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I; ADA 4388	- 1 455 931,96	2 705 646,48	1 249 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 455 931,96	2 705 646,48	1 249 714,52	4 161 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101+111	1	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / RDS (úprava typu svodidla, odvodnění, trativodů, vozovek na sjezdech, propustku v km 1,05)	- 1 230 712,50	445 208,60	- 785 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 230 712,50	445 208,60	-785 503,90	1 675 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101+111 /2	2	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / Propustky v km 4,15; 3,93 a 3,92, zásyp šachty v km 4,25, přechod pro chodce v km 0,13, štět, kaverna pod vozovkou a betonová svodidla zajištění skal	- 225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	2 485 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I; ADA 4388
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101+111 / 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Změnový soupis prací SO 101+111 po změně 2 pro ZBV 2	14	
A Propustek km 4,151		
A1 Oznámení KSÚS - propustek 4,151	1	
A2 Fotografie poškozeného propustu	1	
A3 RDS Propust 4,151	1	
A4 Nabídka Swietelsky	4	
B Propustek km 3,930		
B1 Oznámení KSÚS - propustek km 3,930	1	
B2 Fotografie propustu	1	
B3 RDS Úprava propustku	1	
C Propustek km 3,920		
C1 Vyjádření Lesy ČR	2	
C2 Zápis z KD 7	4	
C3 Fotografie propustku v km 3,920	2	
C4 Vyjádření AD č. 8	2	
C5 Oznámení KSÚS - propustek km 3,920	1	
C6 RDS Výkres propustku	1	
D Zásyp šachty		
D1 Fotografie nalezené šachty (2ks)	2	
D2 Oznámení KSÚS - šachta	1	
D3 Vyjádření AD č. 16	1	
E Přejíždění pro chodce		
E1 Stanovení místní úpravy provozu MěÚ Černošice	4	
E2 Oznámení KSÚS - přechod	1	
F Štět		
F1 Oznámení KSÚS - štět	1	
F2 Vyjádření AD č. 15 vč. dodatku a grafické přílohy	4	
F3 Geodetické zaměření	2	
G Kaverna u VÚHLM		
G1 Zápis z SD	1	
G2 Dodací list - mat. na zásyp kaverny	1	
G3 Oznámení KSÚS - kaverna u VÚHLM	1	
H Kolektor		
H1 Oznámení KSÚS - kolektor	1	
H2 Vyjádření AD č. 9	2	
H3 Fotodokumentace - kolektor	2	
08 Stanovisko TDS k ZBV č. 2	1	
09 Stanovisko AD k ZBV č. 2	2	
10 Souhlasné stanovisko se ZBV č. 2 zástupce objednatele	1	
Počet listů celkem	50	

Změnový soupis prací SO101+111 po změně 2 pro ZBV 2

Evidenční číslo a název stavby: ADA 4388, II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 + 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa Číslo a název rozpočtu: SO 101 + 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa								101 + 111 / 2					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	55 057,27	57 190,44	2 133,17	104,23	5 738 619,25	0,00	222 340,28	5 960 959,53	222 340,28	3,87%
		zemina, kámen, kamenivo											
		SOD pol.11130 3064,49*0,2*2,0=1 225,80 [A] pol.113328 5503,51*2,0=11 007,02 [B] pol.131738 17929,71*2,0=35 859,42 [C] pol.12924 11049,26*0,15*2,0=3 314,78 [D] pol.12996 324,0*0,2=64,80 [E] pol.114158 1379,02*2,6=3 585,45 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=55 057,27 [G] ZBV 1 pol. č. 131738 (25.29-18.27)*6.83*2,0=95,89 [A] ZBV 2 a - propustek v km 4.151 (hloubení - pol. č. 131738) 2,0*70,56=141,12 [A] a - propustek v km 4.151 (sejmutí drnu - pol. č. 11130) 2,0*48,23*0,2=19,29 [B] b - propustek v km 3.930 (hloubení - pol. č. 131738) 2,0*15,0=30,00 [C] b - propustek v km 3.930 (sejmutí drnu - pol. č. 11130) 2,0*2,89*0,2=1,16 [D] c - propustek v km 3.920 (hloubení - pol. č. 131738) 2,0*105,55=211,10 [E] c - propustek v km 3.920 (sejmutí drnu - pol. č. 11130) 2,0*2,89*0,2=1,16 [F] f - vozovka E (odstranění zp ploch z kameniva - pol. č. 113328) 1,9*339,32=644,71 [G] f - vozovka E - akt. zóna (hloubení - pol. č. 131738) 2,0* 472,14=944,28 [H] h - plomba (hloubení - pol. č. 131738) 2,0*22,23=44,46 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 037,28 [J] ΣΣ 95,89+2 037,28=2 133,17 t											
2	014102B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	15 582,94	16 059,50	476,56	1,53	23 841,90	0,00	729,14	24 571,04	729,14	3,06%
		prostý beton											
		SOD pol.113738 2688,17*2,3=6 182,79 [A] pol.113358 4020,66*2,3=9 247,52 [B] pol.11328 331,8*0,2*2,3=152,63 [C] Celkem: A+B+C=15 582,94 [D] ZBV Dodatek 2 c - propustek v km 3.920 (pol. č. 113358) 2,3*9,17=21,09 [A] f - vozovka E - KSC (pol. č. 113358) 2,3*187,77=431,87 [B] h - plomba (pol. č. 96715) 2,3*10,26=23,60 [D] Celkem: A+B+D=476,56 [E]											
3	014102C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	290,50	300,39	9,89	377,83	109 759,62	0,00	3 736,74	113 496,36	3 736,74	3,40%
		železobeton											
		SOD pol.113168 116,2*2,5=290,50 [A] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4.151 (odstranění propustku pol. č. 966358) 2,5*0,6*3,14*0,2*10,5=9,89 [B] Celkem: A=9,89 [C]											
4	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	403,73	403,73	0,00	846,86	341 902,79	0,00	0,00	341 902,79	0,00	0,00%
		vč.dovozu na místo položení											
		2691,55*0,15=403,73 [A]											

1 Zemní práce													
5	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	3 426,00	3 426,00	0,00	129,00	441 954,00	0,00	0,00	441 954,00	0,00	0,00%
		vč.odvozu k dalšímu zpracování											
		viz žádost o povolení ke kácení 106+1474+36+25+173+22+133+0+133+23+28+13+107+74+222+174+11+360+176+100+36=3 426,00 [A]											
6	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	3 064,49	3 118,50	54,01	77,35	237 038,30	0,00	4 177,67	241 215,97	4 177,67	1,76%
		vč.odvozu a uložení na skládku tl.200 mm											
		SOD odhad 40% plochy (359*4+6225.22)*0,4=3 064,49 [A] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4.151 31,8*1,3+5,74*1,2=48,23 [A] b - propustek v km 3.930 3*0,6*1,34*1,2=2,89 [B] c - propustek v km 3.920 3,0*0,6*1,2*1,34=2,89 [C] Celkem: A+B+C=54,01 [D]											
7	11201	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PŘEŽŮ	KUS	5 728,00	5 728,00	0,00	1 146,52	6 567 266,56	0,00	0,00	6 567 266,56	0,00	0,00%
		vč.odvozu na místo určené investorem											
		viz žádost o povolení ke kácení 132+1842+72+25+517+6+798+7+798+69+168+37+178+123+416+44+0+270+66+80+60=5 708,00 [A] za plotem 20=20,00 [B] Celkem: A+B=5 728,00 [C]											
8	113168	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	116,20	116,20	0,00	1 303,97	151 521,31	0,00	0,00	151 521,31	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		účelová komunikace 581,0*0,2=116,20 [A]											
9	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	331,80	331,80	0,00	137,43	45 599,27	0,00	0,00	45 599,27	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		553,0*0,6=331,80 [A]											
10	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	5 503,51	5 842,83	339,32	467,38	2 572 230,50	0,00	158 591,38	2 730 821,88	158 591,38	6,17%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		SOD 25304.43*(0.54-0,15-0,05-0.13)=5 313,93 [A] provizorní vozovka 1.5*30*2*0,3*2=54,00 [B] předláždění vjezdů 38,8*0,2=7,76 [C] účelová komunikace 581,0*0,22=127,82 [D] Celkem: A+B+C+D=5 503,51 [E] ZBV Dodatek 2 f - vozovka E (1120,21+280*(0,9+0,17+0,1+0,5+0,1))*(0,54-0,15-0,05-0.13)=339,32 [A]											
11	113358	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	4 020,66	4 217,60	196,94	689,72	2 773 129,62	0,00	135 833,46	2 908 963,08	135 833,46	4,90%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		SOD podkl. betonu pod svodidly tl.0,2m 0.2*750*1.5=225,00 [A] KSC tl. 150 mm 25304,43*0,15=3 795,66 [B] Celkem: A+B=4 020,66 [C] ZBV Dodatek 2 c - propustek v km 3.920 10.43*5.86*0,15=9,17 [A] f - vozovka E - KSC (1120,21+280*(0,17+0,15+0,15))*0,15=187,77 [B] Celkem: A+B=196,94 [D]											
12	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	7 024,64	7 024,64	0,00	1 270,89	8 927 544,73	0,00	0,00	8 927 544,73	0,00	0,00%
		vč.odvozu na místo určené investorem											
		53763,38*0.13=6 989,24 [A] provizorní vozovka 1.5*30*2*0,11=9,90 [B] klíny 6*4,25*10*0,1=25,50 [C] Celkem: A+B+C=7 024,64 [D]											
13	113738	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	2 688,17	2 688,17	0,00	2 865,14	7 701 983,39	0,00	0,00	7 701 983,39	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku tl.prům.50 mm											
		53763,38*0.05=2 688,17 [A]											
14	113764	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	11 967,67	11 967,67	0,00	35,53	425 211,32	0,00	0,00	425 211,32	0,00	0,00%
		10x40											
		6345+438+1610+2667+2*225+167,67+233+3*2*9,5=11 967,67 [A]											

15	113775	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M	445,50	445,50	0,00	59,21	26 378,06	0,00	0,00	26 378,06	0,00	0,00%
		deska pod betonová svodidla - 60x10											
		SOD (1252-2*32)*1,5/4=445,50 [A]											
16	114158	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL., ODVOZ DO 20KM	M3	1 379,02	1 379,02	0,00	650,98	897 714,44	0,00	0,00	897 714,44	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		stáv.odláždění svahů - odhad 60% plochy (359*4+6225.22)*0,3*0,6=1 379,02 [A]											
17	12924	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	11 049,26	11 049,26	0,00	82,45	911 011,49	0,00	0,00	911 011,49	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		tl.150 mm											
		11049,26=11 049,26 [A]											
18	12996	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	324,00	324,00	0,00	260,57	84 424,68	0,00	0,00	84 424,68	0,00	0,00%
		stávají propustky											
		27*12,0=324,00 [A]											
19	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	17 929,71	18 663,14	733,43	652,67	11 702 183,83	0,00	478 687,76	12 180 871,59	478 687,76	4,09%
		SOD Výkop pro propustky, UV, přípojky, strmé svahy, dlažbu z LK, akt. zonu 18,27*6,83+13,28*5,69+15*1,2*1,2*2+148,53*1,2*2+359*6,08+6236,92*(0,6-0,2)+0,5*25304,4=17 929,71 [A] ZBV Dodatek 1 Výkop pro propustek -18,27*6,83=- 124,78 [A] 25,29*6,83=172,73 [B] Celkem: A+B=47,95 [C] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4.151 10,5*5,80+2,12*(4,42*1,3+2,5*1,3)/2+0,5*0,6*0,4=70,56 [A] b - propustek v km 3.930 2,5*6,0=15,00 [B] c - propustek v km 3.920 13,73*6,06+1,85*(4,35*3,5+2,5*1,9)/2+0,89*4,35=105,55 [C] f - vozovka E - akt. zóna (1120,21+280*(0,9+0,17+0,1+0,15+0,1+0,2))*0,3=472,14 [D] h - plomba 2,34*9,5=22,23 [E] Celkem: A+B+C+D+E=685,48 [F] ΣΣ 47,95+685,48=733,43											
20	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17 929,71	18 663,14	733,43	13,03	233 624,12	0,00	9 556,59	243 180,71	9 556,59	4,09%
		SOD 17929,71=17 929,71 [A] ZBV Dodatek 1 Výkop pro propustky, UV, přípojky, strmé svahy, dlažbu z LK, akt. zonu (25,29-18,27)*6,83 -18,27*6,83=- 124,78 [A] 25,29*6,83=172,73 [B] Celkem: A+B=47,95 [C] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4.151 (hloubení - pol. č. 131738) 70,56=70,56 [A] b - propustek v km 3.930 (hloubení - pol. č. 131738) 15,0=15,00 [B] c - propustek v km 3.920 (hloubení - pol. č. 131738) 105,55=105,55 [C] f - vozovka E - akt. zóna (hloubení - pol. č. 131738) 472,14=472,14 [D] h - plomba (hloubení - pol. č. 131738) 22,23=22,23 [E] Celkem: A+B+C+D+E=685,48 [F] ΣΣ 47,95+685,48=733,43											
21	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 916,25	3 410,63	494,38	156,30	455 809,88	0,00	77 271,59	533 081,47	77 271,59	16,95%
		SOD Násyp pro rozšíření v místě svodidel 0,5*2667=1 333,50 [A] aktivní zóna 359,0*2,5*0,5+(60+90+70+40+60)*5,4*0,5=1 312,75 [B] úprava nivelety v podjezdu 120*4,5*0,5=270,00 [C] Celkem: A+B+C=2 916,25 [D] ZBV Dodatek 2 c - propustek v km 3.920 13,73*5,4*0,3=22,24 [A] f - vozovka E - akt. zóna 0,3*(1120,21+280*(0,9+0,17+0,1+0,15+0,1+0,2))=472,14 [B] Celkem: A+B=494,38 [C]											
