

BA SILNIE
HO KRAJE,
Na Vlečce 177, 655 00 Ji
IC: 6442063

Změnový list č. 1

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Datum vydání požadavku:

14.09.2021

Adresa objednatele:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Komenského 449/2
Mariánské Lázně

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

DEŠŤOVÉ SVODY

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Výměna dešťové kanalizace nebyla součástí

Popis stávajícího stavu:

Kamerové zkoušky prokázaly poškození dešťové kanalizace.

Popis nového řešení:

Bylo použito nové kanalizační potrubí DN 160.


Nové řešení bylo navrženo zhotovitelem a schváleno autorským dozorem (AD). Spočívá v nahrazení stávajícího poškozeného potrubí novým. Trasa ponechána původní.

Návrh projektového řešení:


Změnový list č. 1

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Fotodokumentace :

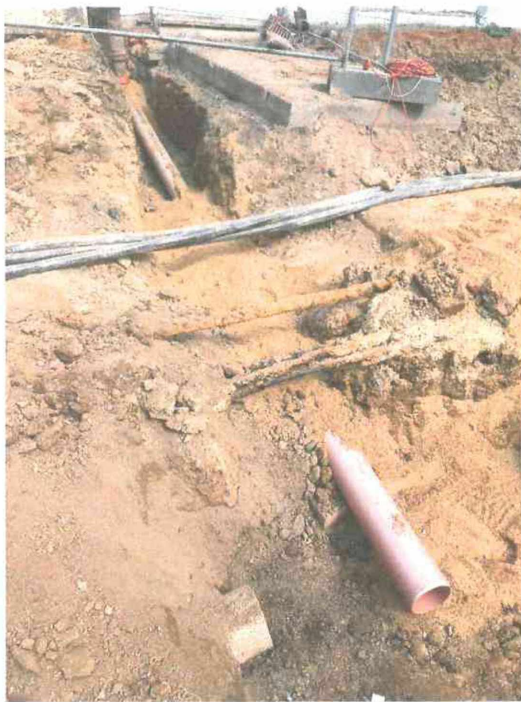

Výšeč lokality:

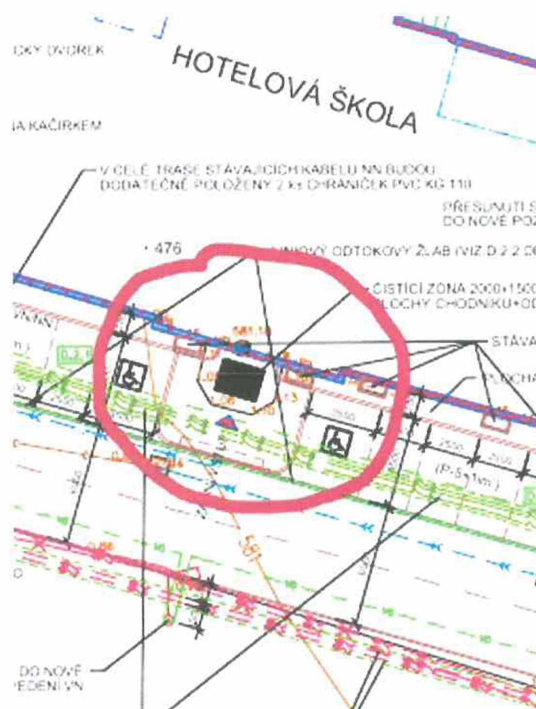

Zdůvodnění změny:

Kamerové zkoušky stávajících přípojek dešťové kanalizace zjistily jejich havarijní stav. Bylo rozhodnuto je vyměnit ve stejné trase a stejném profilu. Obnovila se tak bezporuchová funkčnost systému.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost může mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o

38 668,68 Kč bez DPH.

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	38 668,68 Kč	0,00 Kč	
3 398 280,20Kč	38 668,68 Kč		1,14

Změnový list č. 1

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

<u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u>		
Bez připomínek, souhlasím		
Datum: 14.09.2021		
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. zastoupený: Bc. Zdeněk Sopr	zhotovitel	

<u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u>		
Bez připomínek.		
Datum: 14.09.2021		
Ing Arch Dalibor Urbanec	projektant	

<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u>		
Bez připomínek.		
Datum: 14.09.2021		
Ing Ivan Hložek	technický dozor stavebníka	

<u>Vyjádření objednatele:</u>		
Bez připomínek		
Datum: 14.09.2021		
Ing. Jiří Chum	Ředitel školy	
Ing. Tomáš Walik	Ekonom školy	

Změnový list č. 1

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Na výšce 177, 950, 360
 IČ: 6442068
 UDRŽ
 KARLOVAR

Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikaci a parkoviště v areálu Hotelové školy

Objekt:

ZL č. 1 - dešťové svody

Místo:

p.p.č. 966/11, k.ú. Mariánské Lázně, Karlovarský k

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 668,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 668,68	
D	1		Zemní práce				14 820,28	
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,780	743,00	8 009,54	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu		16*0,7*0,7+6*0,7*0,7			
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m2	5,390	447,00	2 409,33	CS ÚRS 2021 01
9	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,780	40,50	436,59	CS ÚRS 2021 01
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,780	109,48	1 180,19	CS ÚRS 2021 01
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,160	133,00	819,28	CS ÚRS 2021 01
12	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	4,620	246,00	1 136,52	CS ÚRS 2021 01
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	4,620	179,40	828,83	CS ÚRS 2021 01
D	4		Vodorovné konstrukce				1 647,80	
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,540	1 070,00	1 647,80	CS ÚRS 2021 01
D	8		Trubní vedení				22 200,60	
20	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	kus	2,000	7 170,00	14 340,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	22,000	141,00	3 102,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN	m	22,660	210,00	4 758,60	CS ÚRS
