

Změnový list č. 4

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Datum vydání požadavku: 14.09.2021

Adresa objednatele:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Komenského 449/2
Mariánské Lázně
IČO 00077119

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ANGLICKÉ DVORKY U VCHODU

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nebylo obsahem projektové dokumentace.

Popis stávajícího stavu:

Anglické dvorky byly odstraněny, jejich technický stav byl nevyhovující.

Popis nového řešení:

Nové řešení bylo navrženo projektantem a schváleno autorským dozorem (AD). Spočívá v nahrazení funkce odvětrání pomocí anglického dvorku. Bude provedeno svíslé odvětrání plastovou troubou a v kotelně osazena mřížka. Prostor dvorku bude zasypan.

Návrh projektového řešení:

Řešení bylo předáno projektantem a schváleno autorským dozorem.


Změnový list č. 4

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Fotodokumentace



Výšeč lokality:

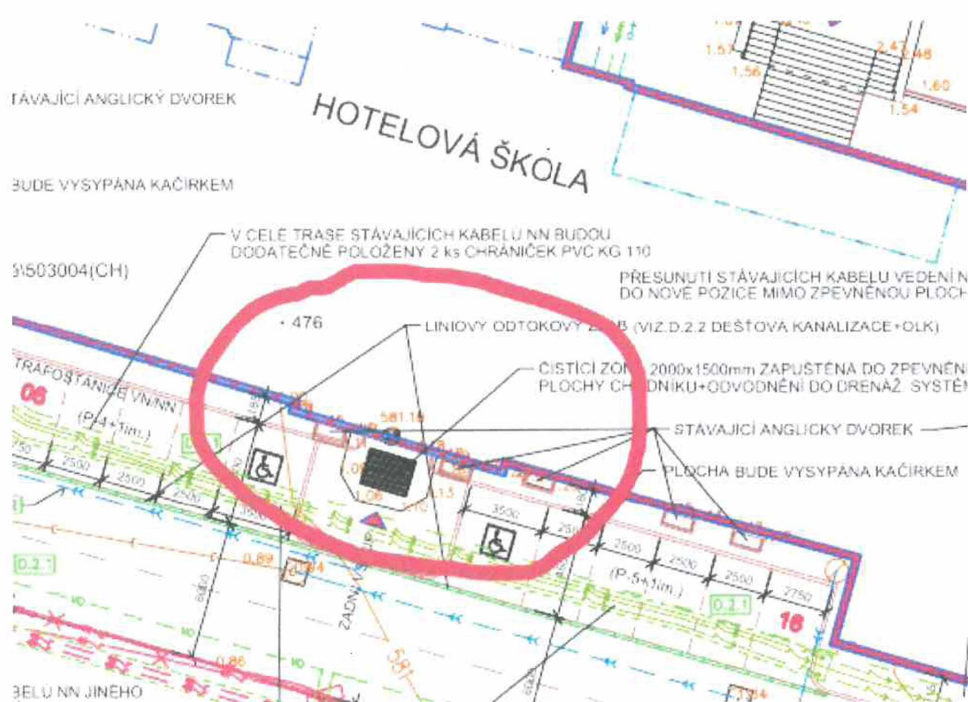

Změnový list č. 4

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Zdůvodnění změny:

Anglické dvorky u vchodu byly odstraněny, byly zdrojem zatékání do suterénních prostor. Funkce odvětrání byla nahrazena jiným řešením.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost může mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o

17 502,83 Kč bez DPH.

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	17 502,83 Kč	0,00 Kč	
3 398 280,20 Kč	17 502,83 Kč		0,52

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím

Datum: 14.09.2021

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. zastoupený: Bc. Zdeněk Sopr	zhotovitel	
--	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing Arch Dalibor Urbanec	projektant	
--------------------------	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing Ivan Hložek	technický dozor stavebníka	
-----------------	----------------------------	--

Vyjádření objednatele:

Bez připomínek

Datum: 14.09.2021

Ing. Jiří Chum	ředitel školy	
Ing. Tomáš Walik	ekonom školy	

Změnový list č. 4

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

ÚDR
 KARLOVÁ
 Na Vítězské 177 PSC 360 01
 IČ: 644 2063

Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ZL č. 4 - demontáž anglických dvorků u vchodu

Místo

Datum: 14.09.2021

Zadavatel: Hotelová škola Mariánské Lázně p.o.

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 502,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 643,63	
D	1		Zemní práce				3 531,15	
1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,325	236,00	784,70	
	VV		1,25*0,7*1,9*2		3,325			
2	M	58344197	šterkodr frakce 0/63	t	6,650	413,00	2 746,45	
	VV		3,325*2		6,650			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 900,00	
3	K	311/R	Provedení prostupů ve svislých stěnách vč. zazdění	ks	2,000	950,00	1 900,00	
	VV		2		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 773,60	
4	K	953731114	Odvětrání svislé trubami plastovými DN přes 110 do 140 mm vč. kolen	m	3,400	577,00	1 961,80	
	VV		1,7*2		3,400			
5	K	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací mřížky	kus	2,000	40,50	81,00	
	VV		2		2,000			
6	M	42972100	mřížka odvětrací kruhová DN 125	kus	2,000	157,00	314,00	
	VV		2		2,000			
7	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,014	1 200,00	2 416,80	
	VV		(1,25+0,7+0,7)*0,2*1,9*2		2,014			
D	997		Přesun sutě				4 316,87	
8	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,625	318,00	1 152,75	
	VV		3,625		3,625			
9	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,625	59,78	216,70	
	VV		3,625		3,625			
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	76,125	13,48	1 026,17	
	VV		3,625*21		76,125			
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,625	530,00	1 921,25	
	VV		3,625		3,625			
D	998		Přesun hmot				2 122,01	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,673	318,00	2 122,01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				859,20	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				859,20	
13	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	4,800	120,00	576,00	
	VV		2*1,2*2		4,800			
14	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	2,400	118,00	283,20	
	VV		1,2*2		2,400			
