

Změnový list č. 6

Stavba: Oprava komunikace a parkoviště

Datum vydání požadavku:

14.09.2021

Adresa objednatele:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Komenského 449/2
Mariánské Lázně
IČO: 00077119

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZŘÍZENÍ CHODNÍKU K ELEKTROROZVODNĚ

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řeší pouze provedení okapového chodníku bez pochozí vrstvy.

Popis nového řešení:

Nové řešení je navrženo na základě požadavku objednatele a zástupce společnosti ČEZ a je schváleno autorským dozorem (AD). Změna spočívá ve zřízení nášlapné, pochozí vrstvy ke stávajícím trafostanicím.

Návrh projektového řešení:

Změna vyžaduje nové projektové řešení, a to pouze formou zápisu do stavebního deníku


Změnový list č. 6

Stavba: Oprava komunikace a parkoviště

Fotodokumentace:



Výšeč lokality:

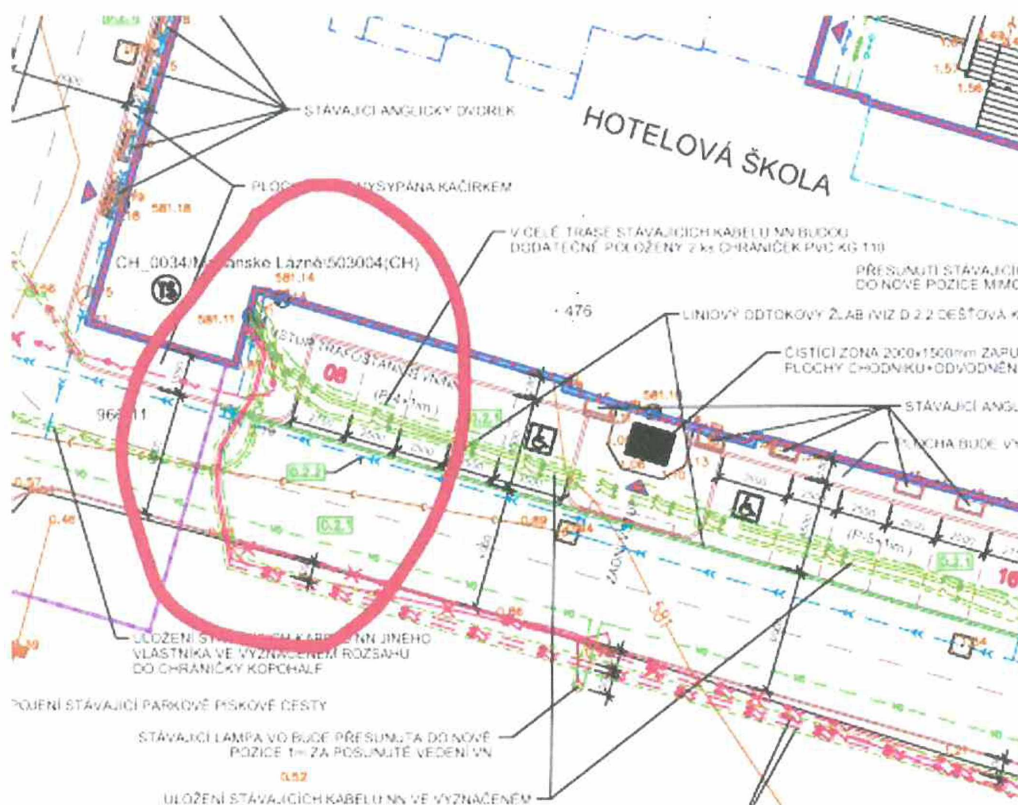

Změnový list č. 6

Stavba: Oprava komunikace a parkoviště

Zdůvodnění změny:

Stávající projektové řešení se jeví jako nevhodné, a to zejména z provozního hlediska. Zpevněná pochozí vrstva zaručí bezpečný přístup k trafostanicím a usnadní manipulaci se zařízeními pro obsluhu trafostanic.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Částečný formou zápisu do stavebního deníku.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost může mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o **5 962,90 Kč bez DPH.**

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	7 947,13 Kč	1 984,23 Kč	
3 398 280,20 Kč	9 931,36 Kč		0,29

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím.

Datum: 14.09.2021

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. zastoupený: Bc. Zdeněk Sopr	zhotovitel	
--	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing. arch. Dalibor Urbanec	projektant	
----------------------------	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing. Ivan Hložek	technický dozor stavebníka	
------------------	----------------------------	--

Vyjádření objednatele:

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing. Jiří Chum	ředitel školy	
Ing. Tomáš Walik	ekonom školy	

Změnový list č. 6

Stavba: Oprava komunikace a parkoviště



Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 6 - chodník k elektrorozvodně

Místo:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	ZL č. 6 - chodník k elektrorozvodně	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 962,90
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 962,90
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-1 984,23
6	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-11,220	72,59	-814,46
7	M	583439200	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	-1,602	398,36	-638,17
8	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	-11,220	32,38	-363,30
9	M	IP 855	Mulčovací textilie		-11,220	15,00	-168,30
	D	5	Komunikace pozemní				5 750,71
1	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	11,220	256,68	2 879,95
	VV		2*5,61		11,220		
2	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	11,557	248,40	2 870,76
	VV		11,22*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		11,557		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 048,09
3	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,445	168,00	1 250,76
	VV		1,835+5,61		7,445		
4	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	7,817	102,00	797,33
	VV		7,445		7,445		
	VV		7,445*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		7,817		
	D	998	Přesun hmot				148,33
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	2,473	59,98	148,33
