

Změnový list č. 9

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Datum vydání požadavku:

19.10.2021

Adresa objednatele:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Komenského 449/2
Mariánské Lázně
IČO: 00077119

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZÁMĚNA MATERIÁLU ZÁPADNÍ STRANA

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řeší podél budovy chodníček s kačírkem.

Popis nového řešení:

Nové řešení je navrženo na základě požadavku objednatele a asfalt bude položen až k objektu a je schváleno autorským dozorem (AD). Změna řeší bezpečný odtok dešťové vody od objektu.

Návrh projektového řešení:

Změna vyžaduje pouze formou zápisu do stavebního deníku


Změnový list č. 9

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Fotodokumentace:



Výšeč lokality:

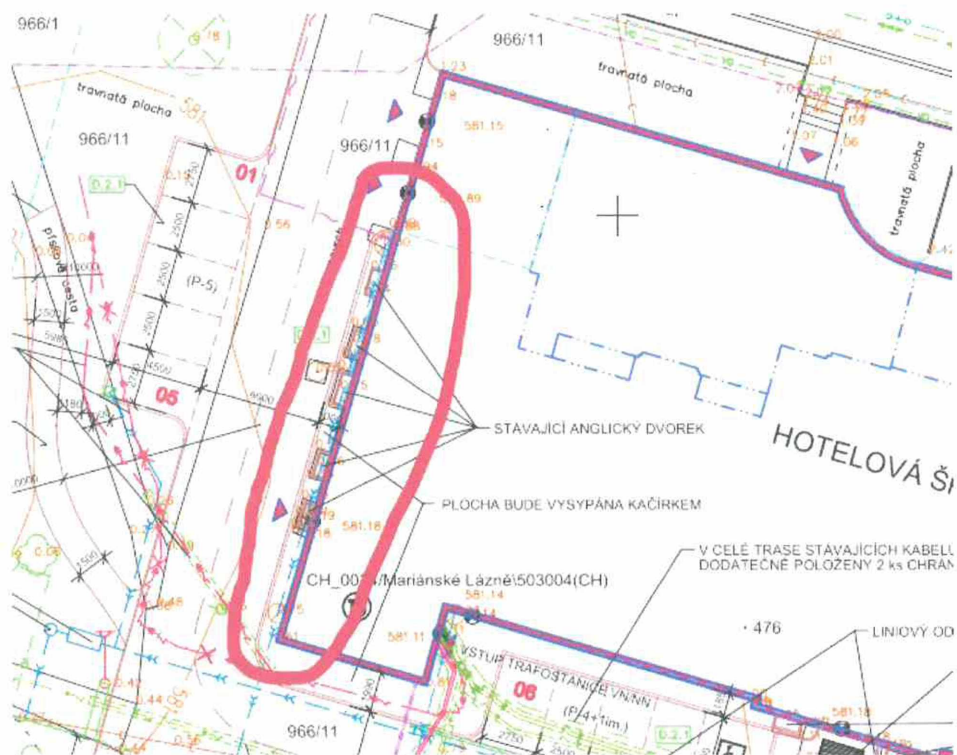

Změnový list č. 9

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Zdůvodnění změny:

Stávající projektové řešení bylo upraveno z provozního hlediska. Asfaltová plocha zaručí bezpečný odtok vody od západní strany objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Částečný formou zápisu do stavebního deníku.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost nebude mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o **6 424,54 Kč bez DPH.**

| Hodnota díla | Změna závazku | | % |
|-----------------|-------------------|--------------|------|
| | Změna dle ZL v x | | |
| | Rozšíření (+) | Zúžení (-) | |
| | 28 680,14 Kč | 22 255,60 Kč | |
| 3 398 280,20 Kč | 50 935,74 Kč | | 1,50 |

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím.

Datum: 19.10.2021

| | | |
|---|------------|--|
| Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. zastoupený: Bc. Zdeněk Sopr | zhotovitel | |
|---|------------|--|

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

| | | |
|----------------------------|------------|--|
| Ing. arch. Dalibor Urbanec | projektant | |
|----------------------------|------------|--|

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Ing. Ivan Hložek | technický dozor stavebníka | |
|------------------|----------------------------|--|

Vyjádření objednatele:

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Ing. Jiří Chum | ředitel školy | |
| Ing. Tomáš Walik | ekonom školy | |

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č. 9

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“



Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 9 - Záměna materiálu západní strana

Objekt:

Místo: p.p.č. 966/11, k.ú. Mariánské Lázně, Karlovarský k

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 6 424,54 |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 6 424,54 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 5 304,14 |
| 1 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 7,200 | 70,00 | 504,00 |
| | VV | F25 | 24*1*0,3 | | 7,200 | | |
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 7,200 | 150,00 | 1 080,00 |
| 3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 86,400 | 8,00 | 691,20 |
| 4 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 7,200 | 17,02 | 122,54 |
| 5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 | t | 12,960 | 125,00 | 1 620,00 |
| 6 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním | m2 | 24,000 | 53,60 | 1 286,40 |
| | VV | | 24*1 | | 24,000 | | |
| | D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | | | | -4 304,44 |
| 12 | K | 184911161 | Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | -24,000 | 72,59 | -1 742,16 |
| 13 | M | 583439200 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 | t | -3,442 | 398,36 | -1 371,16 |
| | VV | | 24*0,1*1,434 | | 3,442 | | |
| 14 | K | 184911311 | Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 | m2 | -24,000 | 32,38 | -777,12 |
| 15 | M | IP 855 | Mulčovací textilie | | -27,600 | 15,00 | -414,00 |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 5 424,84 |
| 19 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 48,000 | 162,00 | 7 776,00 |
| | VV | | 24 m2 "ŠDa fr. 0/63" | | 24,000 | | |
| | VV | | 24 m2 "ŠDa fr. 0/63" | | 24,000 | | |
| 21 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | 24,000 | 310,00 | 7 440,00 |
| 22 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 24,000 | 22,00 | 528,00 |
| 23 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 24,000 | 14,00 | 336,00 |
| 24 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 24,000 | 304,00 | 7 296,00 |
| 53 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -24,000 | 384,00 | -9 216,00 |
| 55 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | -23,000 | 160,08 | -3 681,84 |
| 57 | M | 59217035 | obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm | m | -1,000 | 433,32 | -433,32 |
| 66 | K | IP 10 | Izolace proti zemní vlhkosti u fasády + krycí lišta, položka je vč. materiálu, doprava a práce | m | -21,000 | 220,00 | -4 620,00 |
