

<b>Změnový list</b> pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
<b>Změnový list číslo</b>	<b>8</b>
<b>Identifikace akce</b>	
Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.
<b>Předmět změnového listu</b>	
Zdravotechnické rozvody (ZTI)	
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>	
celý objekt	
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>	
1) V umývárně č. m. 205 měly být osazeny sprchové kouty.	
2) V místnosti č. 114 mělo do prostoru před celu krátkodobého zadržení instalováno keramické, závěsné WC a umyvadlo.	
3) Na schodišti měly být na stávající rozvody požární vody osazeny 2 ks požárních hydrantů 2 ks.	
4) Stavební práce měly být provedeny v rozsahu stanoveném v soupisu prací. Soupis prací nezahrnoval stavební připomoci potřebné pro realizaci nových rozvodů ZTI.	
<b>Nové řešení :</b>	
1) Sprchy byly provedeny stavebními konstrukcemi obloženými keramickou dlažbou a obkladem s odtokem do odtokových žlabů.	
2) Do místnosti č. 114 byl před celu osazen nerezový antivandal komplet WC+umyvadlo. Doplněny rozvody požární vody a 1 ks hydrantu + oddělovač požární vody od pitné vody.	
3) Byly provedeny nové rozvody požární vody a instalovány 3 ks požárních hydrantů.	
4) Trasy rozvodů ZTI byly upraveny dle možnosti provedení prostupů stavebními konstrukcemi (minimalizace zásahů do kleneb, kamenného zdiva v podzemním podlaží apod.). V některých případech musela být se změnou trasy upravena také dimenze potrubí. Soupis prací byl upraven dle skutečných výměr, včetně doplnění chybějících stavebních připomocí (vybourání stávajících zazděných rozvodů kanalizace a vody).	
<b>Zdůvodnění změny :</b>	
1) změna provedení sprch byla rozhodnuta objednatelem po odstranění stávajících konstrukcí a vyhodnocení stavu prostor. Zvolený typ sprch je z hlediska životnosti a údržby výhodnější.	
2) záměna WC je provedena na dodatečný požadavek uživatele.	
3) Stávající rozvody požární vody nebyly v objektu nalezeny. Rozvody požární vody byly proto provedeny nově. Na uákladě obhlídky prostor požárním technikem KŘP-L bylo rozhodnuto o osazení požárního hydrantu i na schodišti mezi 2. a 3. nadzemním podlaží.	
4) K úpravě tras a dimenzí rozvodů ZTI došlo z důvodu nutnosti respektovat stávající konstrukce stropů a stěn v podzemním podlaží. Prostupy byly přesunuty do jiných míst než navrhovala PD, aby stávající klenby, kamenné stěny apod. byly co nejméně narušeny.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>	
Ke změně byl zpracován doplněk PD - rozvod požární vody.	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>	
SD č.2 str. 093367	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>	
Vliv na termín: Ano, 90 dní (spolu s ZL č. 5, 6 a 7)	
Vliv na kvalitu: Ne	
Vliv na cenu: Ano	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	292 905,05 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	- 132 475,26 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	160 429,79 Kč
<b>DPH:</b>	33 690,26 Kč





# ZMĚNOVÝ LIST č. 8

## PŘÍPOČTY

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.  
 Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Cenová soustava	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		D14E	ZTI				292 905,05
SoD	1	SoD pol. 02	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,300	157,50	1 149,75
IK	2	IK-ZL04-01	HT odbočka D 110/110	ks	4,000	245,00	980,00
IK	3	IK-ZL04-02	HT odbočka D 110/50	ks	6,000	245,00	1 470,00
IK	4	IK-ZL04-03	HT odbočka D 50/50	ks	2,000	150,00	300,00
IK	5	IK-ZL04-04	HT redukce D 110/50	ks	3,000	245,00	735,00
IK	6	IK-ZL04-05	HT redukce D 50/40	ks	4,000	150,00	600,00
IK	7	IK-ZL04-06	HT koleno D 110 45°	ks	28,000	245,00	6 860,00
IK	8	IK-ZL04-07	HT koleno D 110 30°	ks	4,000	245,00	980,00
IK	9	IK-ZL04-08	HT koleno D 110 15°	ks	18,000	245,00	4 410,00
IK	10	IK-ZL04-09	HT koleno D 50 90°	ks	10,000	150,00	1 500,00
IK	11	IK-ZL04-10	HT koleno D 50 45°	ks	22,000	150,00	3 300,00
IK	12	IK-ZL04-11	HT koleno D 50 15°	ks	14,000	150,00	2 100,00
IK	13	IK-ZL04-12	HT koleno D 40 45°	ks	2,000	150,00	300,00
IK	14	IK-ZL04-13	HT čistící kus D 110	ks	4,000	245,00	980,00
IK	15	IK-ZL04-14	HT přísávací hlavice D 110	ks	1,000	1 580,00	1 580,00
IK	16	IK-ZL04-15	HT přísávací hlavice D 50	ks	1,00	950,00	950,00
IK	17	IK-ZL04-16	HT zátka D 110	ks	1,00	140,00	140,00
IK	18	IK-ZL04-17	HT zátka D 50	ks	5,00	140,00	700,00
IK	19	IK-ZL04-18	Objímka s gumou D 110	ks	9,00	180,00	1 620,00
IK	20	IK-ZL04-19	Kombišroub pr. 8x100	ks	9,00	110,00	990,00
IK	21	IK-ZL04-20	Hmoždinky pr. 10	ks	9,00	110,00	990,00
IK	22	IK-ZL04-21	Podlahová gula D 50	ks	1,00	250,00	250,00
IK	23	IK-ZL04-22	Pračkový sifon podomítkový	ks	1,00	160,00	160,00
IK	24	IK-ZL04-23	Sprchová vpust 800	ks	2,00	180,00	360,00
SoD	25	SoD pol. 06	KG trubka pr. 110	m	12,60	273,00	3 439,80
IK	26	IK-ZL04-24	KG koleno pr. 160 45°	ks	2,00	160,00	320,00
IK	27	IK-ZL04-25	KG koleno pr. 125 45°	ks	6,00	150,00	900,00
IK	28	IK-ZL04-26	KG koleno pr. 125 30°	ks	3,00	150,00	450,00
IK	29	IK-ZL04-27	KG koleno pr. 125 15°	ks	1,00	150,00	150,00
IK	30	IK-ZL04-28	KG koleno pr. 110 45°	ks	6,00	150,00	900,00
IK	31	IK-ZL04-29	KG koleno pr. 110 30°	ks	4,00	150,00	600,00
IK	32	IK-ZL04-30	KG koleno pr. 110 15°	ks	4,00	150,00	600,00
IK	33	IK-ZL04-31	KG odbočka pr. 160/125	ks	1,00	220,00	220,00
IK	34	IK-ZL04-32	KG odbočka pr. 125/110	ks	3,00	210,00	630,00
IK	35	IK-ZL04-33	KG odbočka pr. 110/110	ks	1,00	210,00	210,00
IK	36	IK-ZL04-34	KG redukce pr. 160/110	ks	1,00	210,00	210,00
IK	37	IK-ZL04-35	KG kluzný prostředek	ks	4,00	130,00	520,00
IK	38	IK-ZL04-36	PPR trubka pr. 26 PN 20	m	46,00	260,00	11 960,00
IK	39	IK-ZL04-37	PPR trubka pr. 20 PN 20	m	52,00	260,00	13 520,00
IK	40	IK-ZL04-38	PPR nástěnka průchozí pr.20	ks	14,00	150,00	2 100,00
IK	41	IK-ZL04-39	PPR nástěnka koncová pr.20	ks	5,00	150,00	750,00
IK	42	IK-ZL04-40	PPR Koleno pr.26	ks	27,00	150,00	4 050,00
IK	43	IK-ZL04-41	PPR koleno pr.20	ks	60,00	150,00	9 000,00
IK	44	IK-ZL04-42	PPR koleno pr.20 45°	ks	9,00	150,00	1 350,00
IK	45	IK-ZL04-43	PPR T kus re. 25/20	ks	7,00	150,00	1 050,00
IK	46	IK-ZL04-44	PPR T kus re. 32/20/32	ks	1,00	150,00	150,00
IK	47	IK-ZL04-45	PPR T kus pr. 20	ks	4,00	150,00	600,00
IK	48	IK-ZL04-46	PPR zátka pr. 20	ks	12,00	150,00	1 800,00
IK	49	IK-ZL04-47	PPR redukce pr. 25/20	ks	6,00	150,00	900,00
IK	50	IK-ZL04-48	PPR redukce pr. 32/20	ks	1,00	150,00	150,00
IK	51	IK-ZL04-49	PPR nátrubek varný pr.26	ks	40,00	150,00	6 000,00





## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

### Změnový list číslo 9

#### Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.

#### Předmět změnového listu

Kontaktní zateplovací systém

#### Část díla dotčená změnovým listem

Fasáda objektu

#### Popis změny, popis technického řešení

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Zateplení soklu fasády ve dvoře nebylo v PD řešeno.

#### Nové řešení :

Bude provedeno vybourání starého kamenného obkladu, podklad bude vyrovnán zednický + izolantem tl. 50 mm a omítnut.

#### Zdůvodnění změny :

Z důvodu špatného stavu obložení kamenného soklu fasády ze dvora bude provedeno odstranění obkladu a nahrazení novou omítkou.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

#### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

SD č.1 str.713702, SD č.1 str.713710

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>36 574,28 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>36 574,28 Kč</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č. 9****PŘÍPOČTY**

**Stavba:** KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka  
**Objednatel:** ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zhotovitel:** STAV-AGENCY s.r.o.  
**Projektant:** Digitronic CZ s.r.o.

**REKAPITULACE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 574,28				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>36 574,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			36 574,28	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY**


**Stavba:** KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka  
**Objednatel:** ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zhotovitel:** STAV-AGENCY s.r.o.  
**Projektant:** Digitronic CZ s.r.o.

**REKAPITULACE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

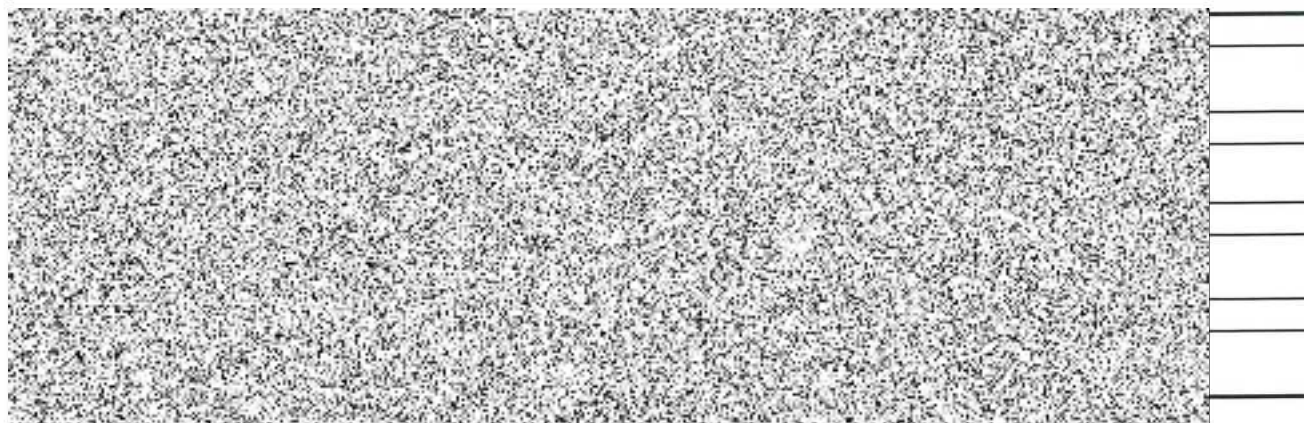


## ZMĚNOVÝ LIST č. 9

### PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.  
 Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

### POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV	Práce a dodávky HSV				36 574,28
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				36 574,28
URS	1	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	23,100	331,00	7 646,10
URS	2	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	22,000	230,00	5 060,00
URS	3	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,000	549,00	5 490,00
SOD	4	SOD pol. č. 20	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	12,000	325,00	3 900,00
URS	5	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	22,000	255,00	5 610,00
URS	6	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,718	102,00	379,24
URS	7	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	92,950	11,60	1 078,22
URS	8	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	3,718	104,00	386,67
URS	9	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,718	1 200,00	4 461,60
URS	10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,318	275,00	2 562,45
<b>Celkem změnový list</b>							<b>36 574,28</b>

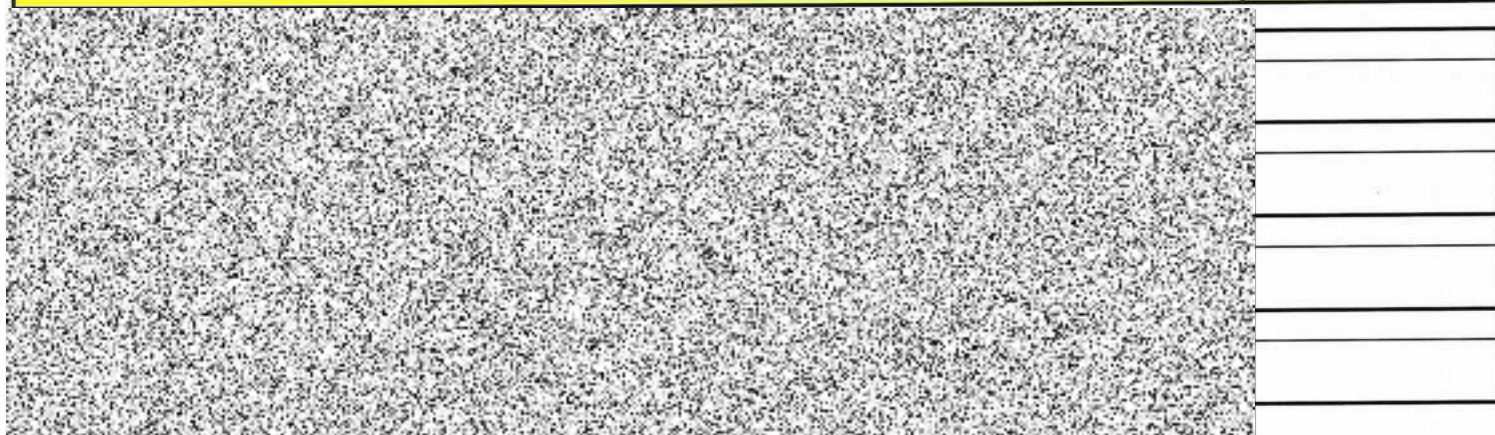



**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 10**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.

**Předmět změnového listu**

Obklady a dlažby - přípočty

**Část díla dotčená změnovým listem**

Sociální zařízení (WC) mimo 1. NP, koupelna a cela v objektu.

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V místnostech sociálního zařízení (mimo 1. nadzemního podlaží), v koupelně a v cele měla být provedena pouze demontáž obkladů a dlažeb bez vyrovnávky a hydroizolace.

**Nové řešení :**

V místnostech sociálního zařízení (mimo 1. nadzemního podlaží), v koupelně a v cele byla provedena vyrovnávka stěn a podlah. Ve sprchových koutech byla provedena hydroizolace stěn a podlahy.

**Zdůvodnění změny :**

Z důvodu velkých nerovností stěn a podlah je nutné provést celkovou vyrovnávku podkladu. Hydroizolace stěn a podlahy v koupelně nutno provést z důvodu technologických předpisů na provádění sprchových koutů - nebylo v SoD.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Stavební deník č.2, strana 093371

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšeny ochrany konstrukcí objektu

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>42 968,28 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>42 968,28 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>9 023,34 Kč</b>



**ZMĚNOVÝ LIST č. 10****PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje  
- OOP Smržovka  
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.  
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A01 Podlahy a podlahové konstrukce		42 968,28			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>42 968,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			42 968,28	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY****REKAPITULACE**


Stavba: KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje  
- OOP Smržovka  
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.  
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

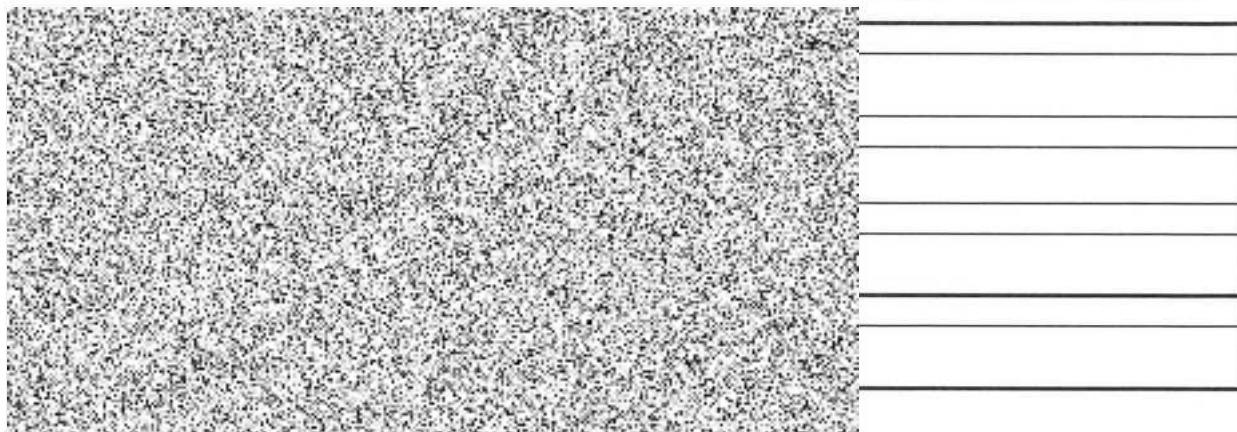



**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 11**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.

**Předmět změnového listu**

Obklady a dlažby - odpočty

**Část díla dotčená změnovým listem**

Kuchyň + WC v 1.NP místnosti č.117,107,108,109.

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V uvedených místnostech č.117,107,108,109 se měl provádět nový obklad a dlažba.

**Nové řešení :**

V uvedených místnostech č.117,107,108,109 se nový obklad a dlažba neprovádí.

**Zdůvodnění změny :**

Z důvodu již nově provedených obkladů a dlažeb v m.č.117,107,108,109 se nový obklad a dlažba nebude provádět.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Stavební deník č.2, strana 093371


**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne, kvalita zůstává zachována

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		- Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	57 501,48 Kč
<b>Cellkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	57 501,48 Kč
<b>DPH:</b>		12 075,31 Kč

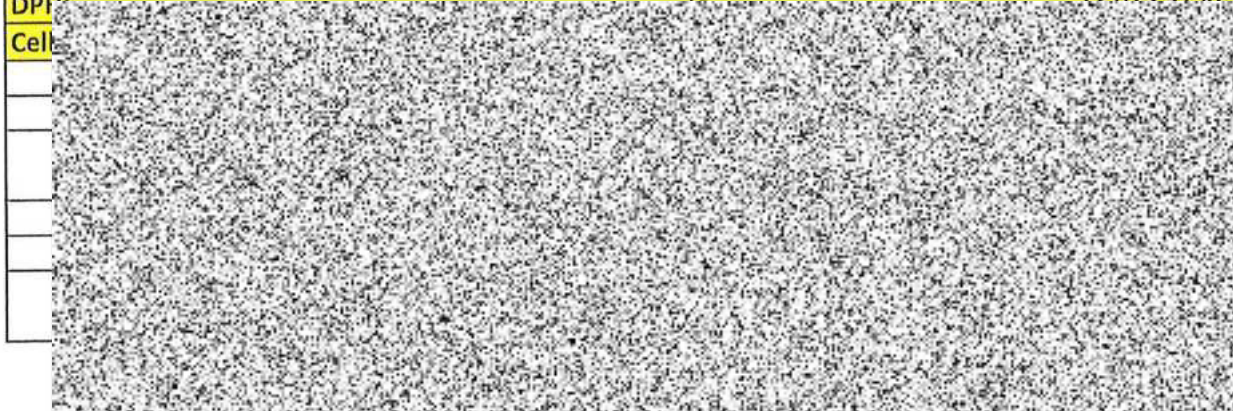





**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 12**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.

**Předmět změnového listu**

Fasáda

**Část díla dotčená změnovým listem**

Jihozápadní fasáda směrem na Lidické náměstí

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Fasáda měla být provedena formou tenkovrstvé silikonsilikátové omítky bez dalších ochranných nátěrů.

**Nové řešení :**

Fasáda byla po poškození provedena nově formou tenkovrstvé silikonsilikátové omítky opatření hydrofobizačním transparentním silikonovým nátěrem.

**Zdůvodnění změny :**

Po dokončení fasády došlo v průběhu zimního období k jejímu znečištění pravděpodobně vozidlem zimní údržby silnic (pachatel neznámý). Proto byla provedena nová vrstva omítky, která byla opatřena hydrofobizačním nátěrem. Takto ošetřenou fasádu je možné v případě znečištění omýt tlakovou vodou.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

SD č.1 str.713710


**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, kvalita byla zvýšena - fasáda bude odolnější proti zašpinění a půjde snáze vyčistit.

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>73 805,80 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Cellkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>73 805,80 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>15 499,22 Kč</b>

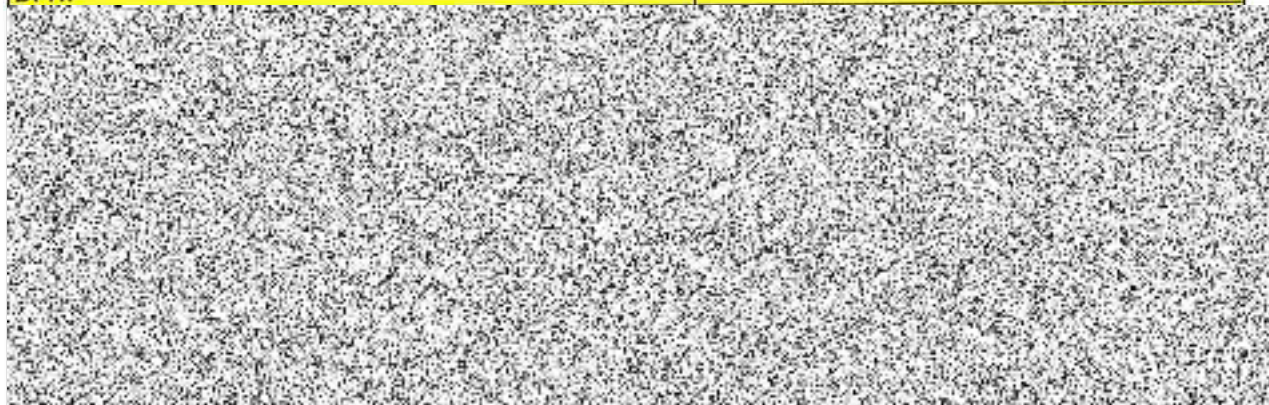







## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

### Změnový list číslo 13

#### Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.

#### Předmět změnového listu

Strukturovaná kabeláž

Část díla dotčená změnovým listem

Strukturovaná kabeláž (datové rozvody)

Popis změny, popis technického řešení

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozvody a prvky strukturované kabeláže (datové sítě) měly být provedeny dle návrhu projektové dokumentace.

#### Nové řešení :

Rozvody strukturované kabeláže byly doplněny o další přípojovací místa dle požadavku objednatele.

#### Zdůvodnění změny :

V období od zpracování projektové dokumentace do zahájení stavebních úprav došlo ke změně požadavků na vybavení kancelářských pracovišť a jejich rozmístění.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

#### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

SD č.1 str.713710

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	37 944,10 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	37 944,10 Kč
DPH:	7 968,26 Kč





**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 15**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.

**Předmět změnového listu**

EZS, STA

**Část díla dotčená změnovým listem**

Slaboproudé rozvody EZS, STA a domácí telefon.

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Systém televizní antény (STA) a domácí telefon (zvonkové komunikátory) měly být provedeny nově. Rozvody EZS vč. koncových prvků (zařízení) měly být provedeny nově.

**Nové řešení :**

U STA a domácího telefonu byla provedena jen kontrola stávajících rozvodů. U EZS byly provedeny jen rozvody. Koncové prvky si pořídil a osadil objednatel.

**Zdůvodnění změny :**

Po kontrole rozvodů STA a domácího telefonu bylo objednatelem rozhodnuto, že jejich stav umožňuje ponechání stávajících. U EZS byly provedeny jen rozvody, zařízení si z důvodu kompatibility dodal a osadil objednatel.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

SD č.1 str.713710

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	-	Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	27 450,13 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	27 450,13 Kč
<b>DPH:</b>	-	5 764,53 Kč



**ZMĚNOVÝ LIST č. 15**

**ODPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.  
 Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		D4	Sítě STA				-27 450,13
SoD	1	SoD SLA pol. 4	Nástěnný 19" rozvaděč 13U-18U hl.do 450 mm	kus	-1,00	203,06	-203,06
SoD	2	SoD SLA pol. 13	Bleskojistka nn do 500 V	kus	-1,00	60,92	-60,92
SoD	3	SoD SLA pol. 14	Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků	kus	-4,00	1 015,31	-4 061,24
SoD	4	SoD SLA pol. 15	Anténa Engel AC-42, k21-69	ks	-2,00	284,29	-568,58
SoD	5	SoD SLA pol. 16	FM anténa FM-200	ks	-1,00	121,84	-121,84
SoD	6	SoD SLA pol. 17	DAB anténa BT-151	ks	-1,00	101,53	-101,53
SoD	7	SoD SLA pol. 18	Svodič FX-090 F75 T	ks	-8,00	12,18	-97,44
SoD	8	SoD SLA pol. 19	Filtr LTE/NMT montáž	ks	-2,00	20,31	-40,62
SoD	9	SoD SLA pol. 20	Zasilovač IKUSY ONE 118 montáž	ks	-1,00	28,43	-28,43
SoD	10	SoD SLA pol. 21	Multiřepínač POLYTRON PSG 512 C montáž	ks	-1,00	40,61	-40,61
SoD	11	SoD SLA pol. 22	Trubka ochranná průchozí D do 29 mm, stěna do 30 cm	kus	-12,00	14,62	-175,44
SoD	12	SoD SLA pol. 23	Koaxiální kabel v trubkách	m	-110,00	12,18	-1 339,80
SoD	13	SoD SLA pol. 24	Kabel koaxiální Belden H121 Cu PVC 5 mm	m	-70,00	9,75	-682,50
SoD	14	SoD SLA pol. 25	Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm	m	-60,00	12,18	-730,80
SoD	15	SoD SLA pol. 26	Videotelefon WELCOME montáž	ks	-1,00	1 015,31	-1 015,31
SoD	16	SoD SLA pol. 27	Samozamykací elektromechanický zámek montáž	ks	-1,00	934,09	-934,09
SoD	17	SoD SLA pol. 28	Modul displeje se snímačem ID karet montáž	ks	-1,00	771,64	-771,64
SoD	18	SoD SLA pol. 29	Řídicí jednotka DT montáž	ks	-1,00	527,96	-527,96
SoD	19	SoD SLA pol. 30	Vstupní audio/video panel systému domovního telefonu ABB WELCOM montáž	ks	-1,00	1 258,99	-1 258,99
SoD	20	SoD SLA pol. 31	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	-15,00	9,75	-146,25
SoD	21	SoD SLA pol. 32	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 B x 1,5 mm2	m	-15,00	9,75	-146,25
SoD	22	SoD SLA pol. 33	Trubka ochranná průchozí D do 29 mm, stěna do 30 cm	kus	-3,00	14,62	-43,86
SoD	23	SoD SLA pol. 34	JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky	m	-10,00	13,00	-130,00
SoD	24	SoD SLA pol. 35	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 baleno po 100 m délky	m	-10,00	8,12	-81,20
SoD	25	SoD SLA pol. 36	Detektor PIR na předem připravené úchytné body	kus	-17,00	121,84	-2 071,28
SoD	26	SoD SLA pol. 37	Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní	kus	-24,00	10,56	-253,44
SoD	27	SoD SLA pol. 38	Koncentrátor EZS na připravené úchytné body	kus	-1,00	14,62	-14,62
SoD	28	SoD SLA pol. 39	Sířena s majákem na budovu na úchyt.body	kus	-1,00	27,62	-27,62
SoD	29	SoD SLA pol. 40	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	-1,00	227,43	-227,43
SoD	30	SoD SLA pol. 41	Komunikátor do skříně ústředny EZS na úchyt.body	kus	-1,00	23,56	-23,56
SoD	31	SoD SLA pol. 42	MU3-N ústředna EZS DM	kus	-1,00	20,31	-20,31
SoD	32	SoD SLA pol. 43	MG kontakt EN3-QSC-GN	kus	-24,00	11,37	-272,88
SoD	33	SoD SLA pol. 44	Sířena vnitřní SA-913FM/FT	kus	-1,00	60,92	-60,92
SoD	34	SoD SLA pol. 45	Detektor pohybový KX15DTAM	kus	-17,00	27,62	-469,54
SoD	35	SoD SLA pol. 46	Akumulátor AKU 24-12	kus	-1,00	77,16	-77,16
SoD	36	SoD SLA pol. 48	JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky	m	-492,00	13,00	-6 396,00
SoD	37	SoD SLA pol. 11	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	kus	-0,13	4 264,31	-554,36
SoD	37	SoD SLA pol. 12	Přirážka za prořez kabelů	kus	-0,13	1 599,12	-207,89
SoD	38	SoD SLA pol. 13	Doprava, režie	kus	-0,13	23 986,76	-3 118,28
SoD	39	SoD SLA pol. 14	Revize elektroinstalace (proměření slaboproudé elektroinstalace)	kus	-0,13	2 665,20	-346,48

**-27 450,13**

