



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice	
Změnový list vystavil:	Pavel Pohořalý	
Datum:	03. 01. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Odstranění nášlapných vrstev nad rámec VV</b></p> <p>Projekt počítal s odstraněním stávajících nášlapných vrstev z PVC. Při průzkumu stavby bylo zjištěno, že některé místnosti obsahují více vrstev PVC, které bude nutné odstranit.</p> <p>Počty vrstev nad rámec VV:</p> <p>Místnost 1.01 – 2 vrstvy Místnost 1.04 – 2 vrstvy Místnost 1.08 – 2 vrstvy Místnost 1.11 – 2 vrstvy Místnost 1.13b – 1 vrstva Místnost 2.09 – 1 vrstva</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	27 706,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 706,90 Kč	12. 02. 2022	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: MARTIN PODHORSKÝ	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 3.2.2022	Datum: 3.2.2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet OZ\_05 - Odstranění nášlapných vrstev nad rámec VV


Číslo místnosti	Plocha místnosti [m <sup>2</sup> ]	Počet vrstev nad rámec projektu	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Hmotnost [t]
1.01	11,50	2	23,00	0,06
1.04	12,30	2	24,60	0,06
1.08	48,50	2	97,00	0,25
1.11	59,10	2	118,20	0,31
1.13b	5,60	1	5,60	0,01
2.09	59,50	1	59,50	0,15

Kód	Popis	MJ	Množství	Cena za m.j.	Cena celkem	SoD/URS
12.	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m <sup>2</sup>	327,90	70,00 Kč	22 953,00 Kč	SoD
33.	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,85	1 800,00 Kč	1 534,57 Kč	SoD
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	0,85	286,00 Kč	243,83 Kč	ÚRS
997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot	t	0,85	2 420,00 Kč	2 063,15 Kč	ÚRS
486.	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, že zařízení staveniště není možné vybudovat), zábory	%	26 794,55 Kč	1 %	267,95 Kč	SoD
487.	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními	%	26 794,55 Kč	0,2 %	53,59 Kč	SoD
488.	Kompletační činnost	%	26 794,55 Kč	2,1 %	562,69 Kč	SoD
489.	Koordinační činnost generálního dodavatele	%	562,69 Kč	5 %	28,13 Kč	SoD
<b>Cena celkem</b>						<b>27 706,90 Kč</b>

## Fotodokumentace nášlapných vrstev

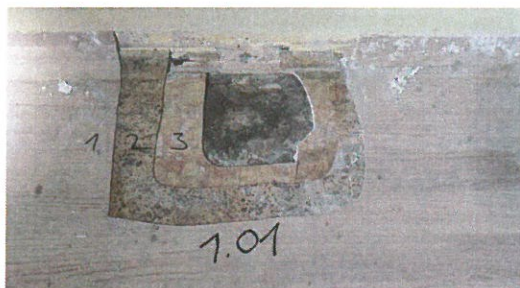

Místnost 1.01 – 3 vrstvy

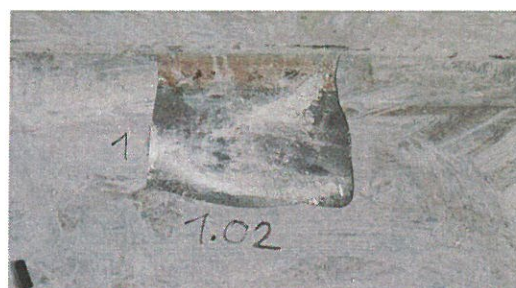

Místnost 1.02 – 1 vrstva



Místnost 1.03 – 1 vrstva



Místnost 1.04 – 3 vrstvy



Místnost 1.08 – 3 vrstvy



Místnost 1.09 – 1 vrstva



Místnost 1.10 – 1 vrstva



Místnost 1.11 – 3 vrstvy




Místnost 1.12 – 1 vrstva



Místnost 1.13 – 2 vrstvy



Místnost 2.02 – 1 vrstva

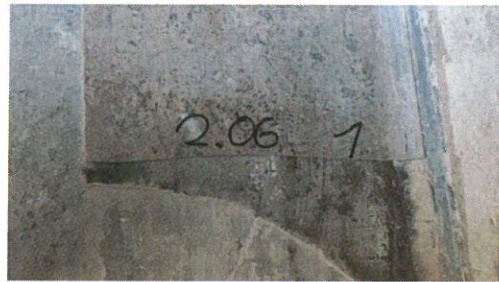

Místnost 2.06 – 1 vrstva



Místnost 2.07a – 1 vrstva




Místnost 2.07b – 1 vrstva



Místnost 2.07c – 1 vrstva




Místnost 2.07d – 1 vrstva

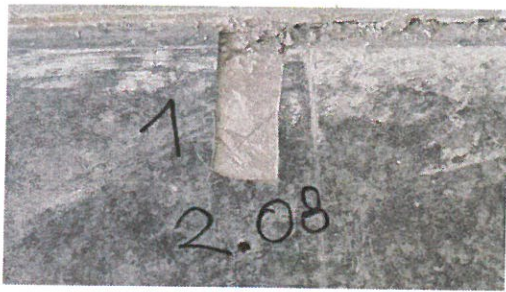


Místnost 2.08 – 1 vrstva




Místnost 2.09 – 2 vrstvy

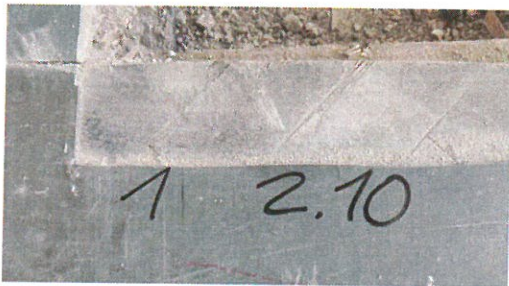


Místnost 2.10 – 1 vrstva

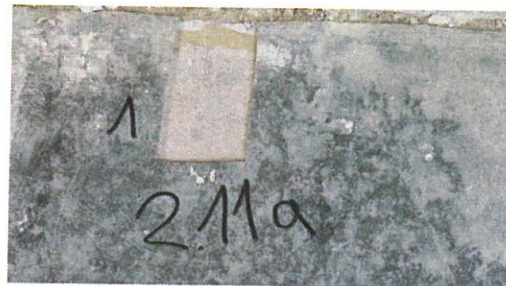


Místnost 2.11a – 1 vrstva

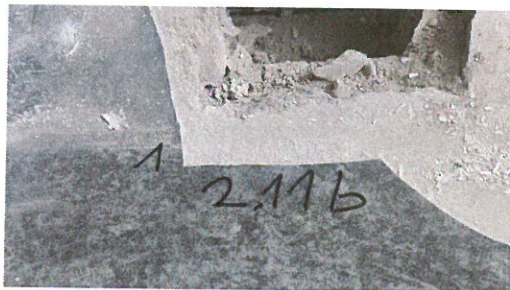

Místnost 2.11b – 1 vrstva

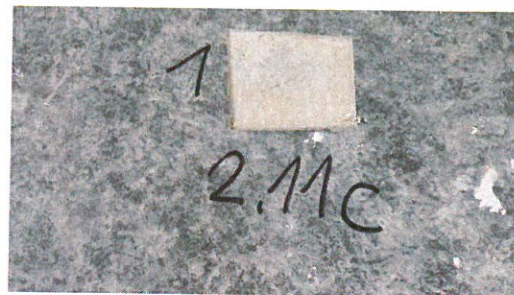

Místnost 2.11c – 1 vrstva

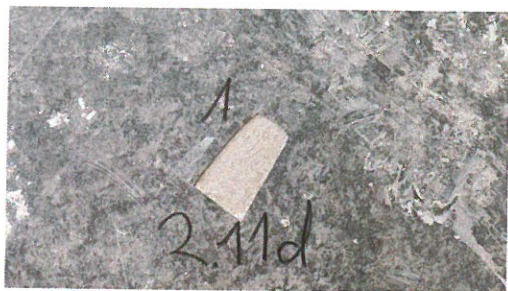

Místnost 2.11d – 1 vrstva
