





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice	
Změnový list vystavil:	Pavel Pohořalý	
Datum:	03. 01. 2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Výměna stávajících SDK konstrukcí		
Při realizování rekonstrukce bylo dohodnuto vybourání následující SDK konstrukcí, které nebyly součástí VV ani PD.		
1. V místnosti 1.08 byly demontované dvě příčky tvořící zádveří		
2. Demontáž příčky mezi místnostmi 2.11b a 2.11c z důvodu založení na nevyhovující skladě. V rámci rekonstrukce bude příčka po změně skladby podlahy namontovaná nová. Bude zvolena konstrukční varianta s dvojitým záklopem s tím, že spodní deska bude do vlhkých prostor RBI. Svrchní deska bude typ Habito, která je vhodná do vlhkých prostor, je vysokopevnostní a díky tomu bude vhodná do tohoto typu provozu.		
3. Záklop v místnostech 2.07a, 2.07c., 2.07d do výšky 200 cm a v místnosti 2.07b do výšky 170 cm. Neschopnost odstranění malby z SDK z důvodu vysoké soudržnosti. V rámci rekonstrukce bude záklop vyměněn za nový.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	71 695,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71 695,65 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MARTIN POŠTORSKÝ 	POHOŘALÝ 	
Datum: 3.2.2022	Datum: 3.2.2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

OZ 08 ZMĚNA SDK KONSTRUKCÍ

1. Demontáž příček v místnosti 1.08, které tvořily zádveři						
kód	název položky	výpočet	měrná jednotka	množství	cena za m.j.	cena celkem
BOURANÉ KONSTRUKCE:	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí, opláštění jednoduché	2 x (2,5 x 4,29 x 0,15 dveře 0,7 x 2)	m ²	18,65	83,20 Kč	1 551,68 Kč
10.	Vybourání dveří jednoduchých (dřevěných) do ocelové zárubně		ks	2	550,00 Kč	1 100,00 Kč
2. Demontáž příčky mezi místnostmi 2.11b a 2.11c z důvodu založení na nevyhovující skladě a zasahování do okna						
kód	název položky	výpočet	měrná jednotka	množství	cena za m.j.	cena celkem
BOURANÉ KONSTRUKCE:	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí, opláštění jednoduché	4,48 x 4,04 x 0,15	m ²	18,1	83,20 Kč	1 505,92 Kč
713130813	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl. Přes 100 mm.	4,48 x 4,04 x 0,15	m ²	18,1	31,60 Kč	571,96 Kč
NOVÉ KONSTRUKCE:	SDK příčka s vloženou minerální izolací (2xHabitot+2xRBIx12,5mm+tepeině izolace 80mm)	4,48 x 4,04 x 0,15	m ²	18,1	1 960,00 Kč	35 476,00 Kč
3. Záklap v místnostech 2.07a, 2.07c, 2.07d do výšky 200 cm a v místnosti 2.07b do výšky 170 cm z důvodu nemožnosti odstranění malby z SDK kvůli vysoké soudržnosti						
kód	název položky	výpočet	měrná jednotka	množství	cena za m.j.	cena celkem
BOURANÉ KONSTRUKCE:	Demontáž SDK předřazené stěny s jednoduchou nosnou konstrukcí, opláštění jednoduché	(4,09 + 0,9 + 4,24 + 2,09) x 2 + 5,3 x 1,7	m ²	31,65	67,20 Kč	2 126,88 Kč
NOVÉ KONSTRUKCE:	Jednostranný záklap 12,5 mm + teplená izolace tl. 50 mm	(4,09 + 0,9 + 4,24 + 2,09) x 2 + 5,3 x 1,7	m ²	31,65	552,00 Kč	17 470,80 Kč
4. Likvidace a přesuny hmot						
kód	název položky	množství	měrná jednotka	cena za m.j.	cena celkem	SoD/URS
33.	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	1,99	t	1 800,00 Kč	3 580,20 Kč	SoD
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	1,99	t	286,00 Kč	569,14 Kč	URS
997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku z materiálu na bázi sádry	1,713	t	2 470,00 Kč	4 230,55 Kč	URS
997013814	Poplatek za uložení na skládku stavebního odpadu izolačních	0,03	t	3 110,00 Kč	98,51 Kč	URS
128.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m.	1,76	t	600,00 Kč	1 053,16 Kč	SoD
486.	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, že zařízení staveniště není možné vybudovat), zábory	69 334,80	%	1 %	693,35 Kč	SoD
487.	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními	69 334,80	%	0,2 %	138,67 Kč	SoD
488.	Kompletační činnost	69 334,80 Kč	%	2,1 %	1 456,03 Kč	SoD
489.	Koordinační činnost generálního dodavatele	1 456,03 Kč	%	5 %	72,80 Kč	SoD
Celkem					71 695,65 Kč	

Fotodokumentace likvidace SDK konstrukcí

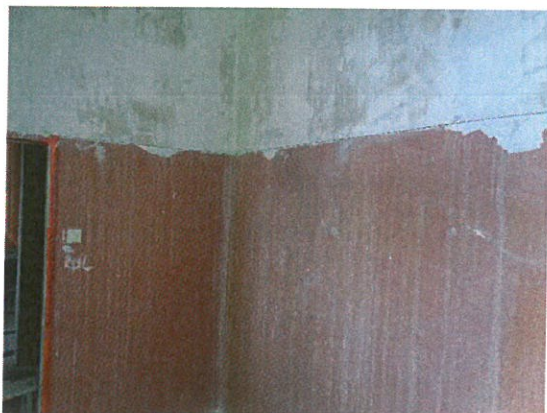

Stávající SDK



Místnost 2.11 – demontáž SDK příčky



Místnost 2.11 – demontáž SDK příčky



Místnost 2.11 – demontáž SDK příčky



Místnost 2.11 – demontáž SDK příčky



Místnost 1.08 - demontovaná příčka



Místnost 2.07 – demontáž SDK záklopů



Místnost 2.07 – demontáž SDK záklopů



Demontáž SDK konstrukcí



Demontáž SDK konstrukcí



Místnost 1.08 - demontovaná příčka



Místnost 2.07 – demontáž SDK záklopů
