

Protokol o změně díla

změnový list číslo: **8**

Stavba:	FN Brno: Rekonstrukce rozvodny pavilon D2
Objekt:	suterén pavilonu D2, areál Bohunice
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	Uchytíl s.r.o, K terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Projektant:	Ing. Jakub Tichý, Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice
Změna:	Příloha č. 3, pol. č. 75: Dodávka a motnáž ucpávky protipožární. VÍCEPRÁCE NAD RÁMEC VÝKAZU - VÝMĚR- Protipožární ucpávky - kabelový kanál Úprava stávajícího kabelového kanálu výměňkové stanice včetně doplnění slzičkového plechu.

POPIS

Změnu vyvolal:	Změnu vyvolal projektant, protože v projektové dokumentaci nejsou uvedeny všechny protipožární ucpávky nutné pro realizaci. Dále dojde k prodloužení stávajícího kabelového kanálu v prostoru výměňkové stanice ke stěně rozvodny kvůli možnosti instalace kabelových vývodů z pojistkových skříní SR301 a SR302		
Popis změny:	Vytvoření protipožární ucpávky v prostoru kabelového kanálu pod úrovní podlahy rozvodny směrem do instalační kabelové stupačky. Vytvoření protipožární ucpávky v prostoru kabelového kanálu pod úrovní podlahy rozvodny směrem do podlahového kabelového kanálu v prostoru výměňkové stanice. Vybourání železobetonové podlahy za účelem vstupu a výstupu přívodní kabeláže rozvodny k pojistkovým skříním SR301 a SR302 a kabelovým kanálem ve výměňkové stanici. Doplnění slzičkového plechu včetně uchycení a celková renovace kabelového kanálu v prostoru výměňkové stanice		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD	15.3.2022	
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné	bez projekčního zpracování	

CENA

Vliv změny na náklady stavby:	ANO, položkový rozpočet zvýší náklady stavby.			
Ocenění změny předložil:			Ve formě:	
Náklady na změnu:	vícepráce: 36 430,8 Kč	méněpráce:		
Stavební náklady:	vícepráce:	méněpráce:		
Projekční náklady:	vícepráce:	méněpráce:		
Úprava smluvní ceny:				
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:	zvýšení:			
	snížení:			
	nová cena:			
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Zhotovitel:	Datum: 15.03.2022	Jméno: Jakub Grombíf	Podpis: 
	Objednatel (investor, uživatel):			
	TDI:	15.03.2022	Ing. Josef Chudáček	
	GP:			

TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	1 k SOD: DP/2984/2021/Mc	

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	Rozpočet je přílohou ZL č. 8
	Příloha č. 2:	Púdorys_ZL8_Protipožárníucpávky

DATUM

V Brně dne:	15.03.2022
-------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-004C FN Brno - Bohunice**

Objekt: **620-3 Rekonstrukce rozvodny pavilonu D2**

Rozpočet: **D.1.1 VCP -- ZL -- Protipožární ucpávky -- Kabelový kanál**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 819,89
PSV			16 959,04
MON			16 651,88
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 430,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 430,81 CZK
Základní DPH	21 %	7 650,47 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **44 081,28 CZK**

v _____ dne _____


Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2022-004C	FN Brno - Bohunice
O:	620-3	Rekonstrukce rozvodny pavilonu D2
R:	D.1.1	VCP -- ZL -- Protipožární ucpávky -- Kabelový kanál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 423,00
1	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	2,00000	1 000,00	2 000,00
2	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 0,6*1,0*0,15	m3	0,09000	4 700,00	423,00
				0,09000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 118,34
3	767510111R00	Montáž kanálových krytů - osazení	kg	65,00000	43,47	2 825,55
4	767510191R00	Montáž kanálových krytů - příplatek za otvor	kus	6,00000	387,30	2 323,80
5	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	25,00000	48,39	1 209,75
6	650111761R00	Montáž ochran. úhelníku / trubky s držáky do zdiva	bm	2,00000	629,62	1 259,24
7	767-001	Příprava drážky pro osazení úhelníku do betonu, podbetonování a zapravení, včetně materiálu	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				396,89
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24192	194,17	46,97
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,24192	13,25	3,21
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,24192	274,07	66,30
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,24192	30,56	7,39
12	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,24192	1 128,56	273,02
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 116,20
13	133301510000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm 11375	kg	10,00000	51,19	511,90
14	13640310R	Plech žebrovaný/slzičkový	t	0,04000	90 107,55	3 604,30
Díl: 783		Nátěry				724,50
15	783293002R00	Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní disperzní, základ antikorozní + 2x email	m2	2,50000	289,80	724,50
Díl: M21		Elektromontáže				16 651,88
16	210020921R00	Dodávka a montáž ucpávky protipožární, průchod stěnou, tl. 10 cm	ks	2,00000	8 325,94	16 651,88

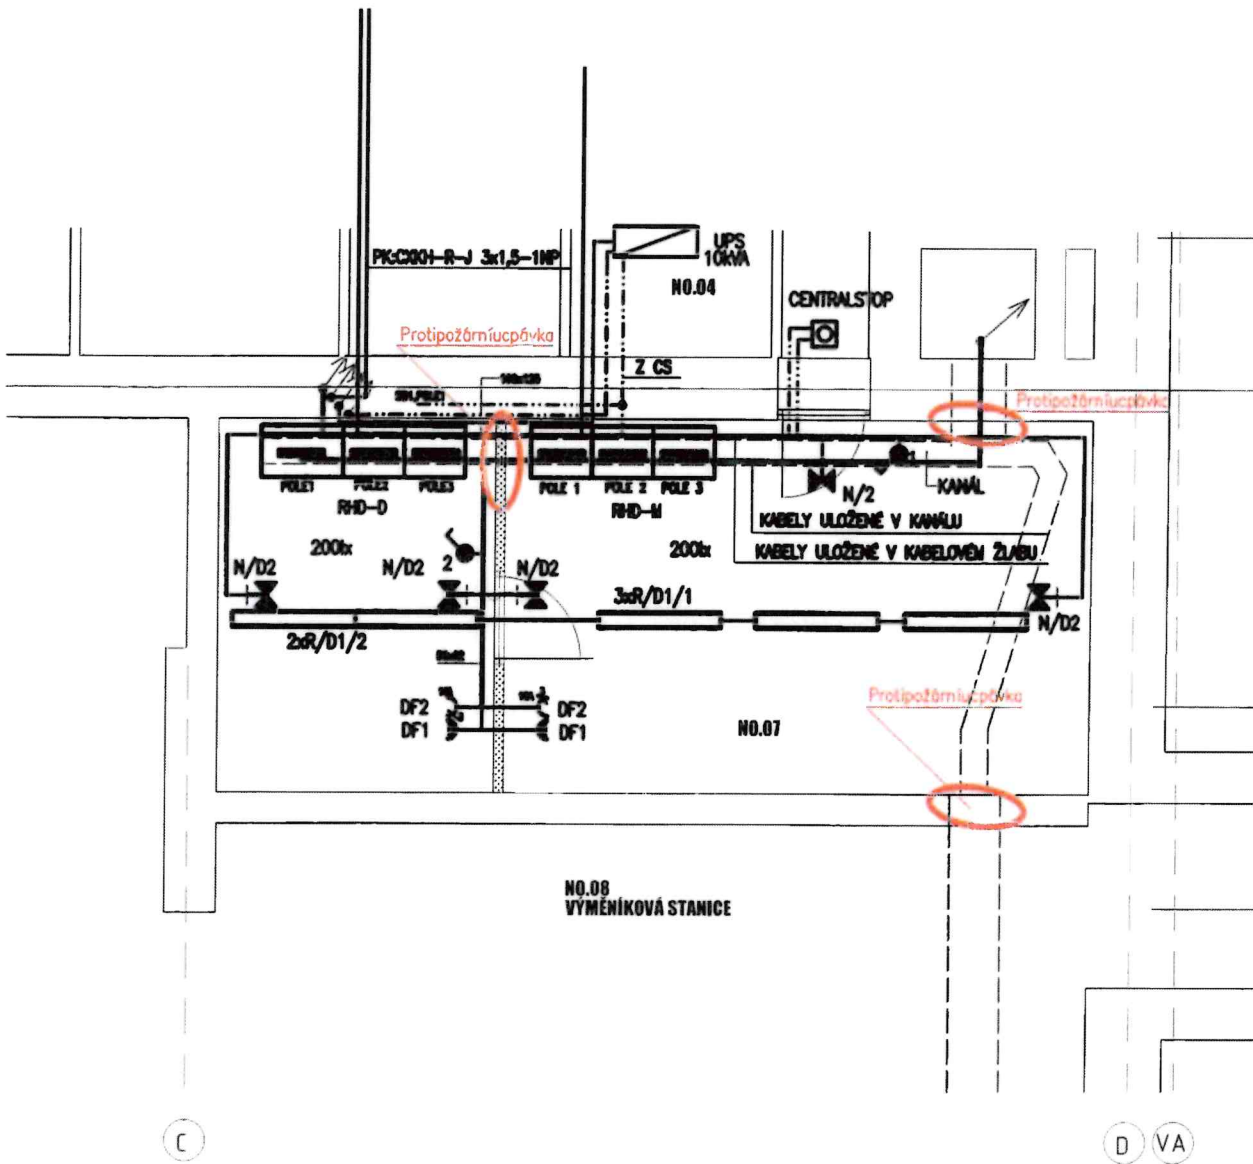

POZNÁMKA:

- PŘESUNUTÉ KABELY Z PŮVODNÍHO ROZVADĚČE RH BUDOU ULOŽENY V KABELOVÉM KANÁLU DO POLÍ 2(MDO DO RHD-M, DO DO RHD-D), DLE DÉLKY SE PŘEPOJÍ BUĎ PŘÍMO NEBO SE POMOCÍ SPOJKY PRODLOUŽÍ
 - KABELY PRO AKCI JIP A ELEKTROINSTALACI V ROZVODNĚ BUDOU ULOŽENY V KABELOVÉM ŽLABU NAD ROZVADĚČI
 - U KABELŮ, PROSTUPUJÍCÍ MEZI ROZVODNAMI MDO A DO BUDOU PROVEDENY POŽÁRNÍ UCPÁVKY, PŘED ROZVADĚČI BUDOU POLOŽENY DIELEKTRICKÉ KOBERCE
 - POSTUP PROVEDENÍ NAPOJENÍ KABELÁŽE Z POLÍ 3 PRO AKCI JIP KIGOPL VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- R -LED SVĚTLIDLO 35W, IP66, PŘISAZENÉ, TYP VIPED LED-136-5000-4K, VYRTYCH
 N -NOUZOVÉ LED SVĚTLIDLO IP40, PŘISAZENÉ, TYP NEXILITE 250lm-1H, VYRTYCH

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN AC 400V/ TN-C-S
 OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
 OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
 OCHRANA PŘI PORUŠE :

NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 VNĚJŠÍ VLIVY: PROSTORY NEZVYŠUJÍCÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU
 EL. PROUDEM



SEVER

Příloha Změnového Listu číslo 8

+ 0,000 = 1.NP

DOBAVATEL PROJEKTU	NAZEV AKCE		ČÍSLO AKCE		AUTORIZACE		
	REKONSTRUKCE ROZVODNY PAV. D2		21018				
	STAVĚBNÍK	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno					
	MÍSTO STAVBY	FN Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno, pavilon "D2"					
	DATUM:	9/2021					
	STUPĚŇ PD:	PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE					
	PROFESNÍ ČÁST:	SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE					
STAV. OBJEKT:	01						
ČÁST PD:	D						
PROJEKTANT ČÁST:	STUPĚŇ PD:	STAV. OBJEKT:	ČÁST PD:	PROFESNÍ ČÁST:	Č. VYKRESU	MĚŘÍTKO:	NAZEV VÝK.
ING. JAROMÍR GLOVINA Tel: +420 604 328 790 E-mail: glovinaj@gmail.com	DVZ	01	D	D.1.4-003	1:50	1:50	ELEKTROINSTALACE - 1.PP

Uchytíl UCHYTIL s.r.o.
 U Elektrárny 1
 695 01 HODONÍN
 spojovatelka: 518 321 039, fax: 518 321 038
 IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078

Uchytíl Platná dokumentace	
Zakázka č.:	321 039
Data:	08. 03. 2022
Podpis:	
