

Protokol o změně díla

změnový list číslo 157

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Otvory ve stropní žb desce pro vstup VZT na objektu C

POPIS	Změnu vyvolal: Projekt	
	Popis změny: Realizace vstupů železobetonovou deskou na objektu C pro vstup VZT potrubí, včetně statického zajištění ocelovou konstrukcí a ošetření ocelové konstrukce protipožární vatou. V zadávací projektové dokumentaci nebyly vstupy řešeny.	
Způsob projekčního zpracování: dílčí schéma zaslané emailem od AD vč. výkazu výměr k nacenění, viz přílohy vliv změny na náklady stavby: ANO		
ocenění změny předložil: GZ		
ve formě		
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK.		vícepráce
Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		18 698,51 Kč
projekční náklady		0,-
úprava smluvní ceny: Připočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		0,00 Kč
C E N A	zvýšení:	18 698,51 Kč
	snížení:	0,00 Kč
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	Podpis
objednatel (investor, uživatel)		
TDI:		
GP:		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: 14.6.2021 email od AD	
	Termín realizace změny: v rámci 3. etapy	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby	
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce	
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb	
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:	
	Příloha 01 položkový rozpočet	
	Příloha 02.1 -2.3_PD dílčí schéma zaslané emailem 14.6.2021	
Datum 23.06.2021		


Příloha č. 1 pro ZL 157 - Otvory ve stropní žb desce pro prostup VZT objekt C
Akce FN Brno - psychiatrická klinika

O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				800,00		
276	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	16,00000	50,00	800,00	RTS 18/ II	SoD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				449,50		
nová	972011311	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,25 m2, tl.12 cm otvory v žb desce : 550x200 mm : 1 355x400 mm : 1	kus	2,00000	144,50	289,00	RTS 21/ I	nová
nová	972011411	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, tl.12 cm otvory v žb desce : 500x710 mm : 1	kus	1,00000	160,50	160,50	RTS 21/ I	nová
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,50		
nová	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,00399	375,00	1,50	RTS 21/ I	nová
Díl: 713		Izolace tepelné				1 297,74		
380	713131131	Izolace tepelná stěn lepením PO opláštění : 4,864	m2	4,86400	133,20	647,88	RTS 18/ II	SoD
nová	63151421	Deska z minerální plsti ISOVER AKU tl. 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,86400 Koeficient prořez : 0,1	m2	5,35040	116,50	623,32	RTS 21/ I	nová
nová	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 6 m	t	0,02904	914,00	26,54	RTS 21/ I	nová
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 083,87		
nová	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg l 140 : 0,3*2*14,4 1,7*2*14,4 0,5*2*14,4 1,5*2*14,4 0,6*1*14,4 2,1*2*14,4	kg	184,32000	55,90	10 303,49	RTS 21/ I	nová
nová	13380525	Tyč průřezu l 140, střední, jakost oceli S235 11375 0,3*2*14,4/1000 1,7*2*14,4/1000 0,5*2*14,4/1000 1,5*2*14,4/1000 0,6*1*14,4/1000 2,1*2*14,4/1000 Koeficient prořez a řezání: 0,1	t	0,20275	27 160,00	5 506,69	RTS 21/ I	nová
nová	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,20829	1 314,00	273,69	RTS 21/ I	nová
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				65,90		
1393	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,07200	199,00	14,33	RTS 18/ II	SoD
1394	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,07200	131,00	9,43	RTS 18/ II	SoD
1395	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,07200	125,70	9,05	RTS 18/ II	SoD
1396	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,72000	9,40	6,77	RTS 18/ II	SoD
1397	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,07200	167,60	12,07	RTS 18/ II	SoD
1398	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,07200	19,90	1,43	RTS 18/ II	SoD
1399	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	0,07200	178,10	12,82	RTS 18/ II	SoD
Celkem						18 698,51		

AKCE: FN BRNO - PSYCHIATRICKÁ KLINIKA
 LÉČ: VYPLNĚNÍ NOVÝCH PROSTORŮ PRO VZT DO STAVBY KAP. 2. NP
 OBJEKTU C A PODATEČNÉ ZEPŘEHY STAVBY

PŮDOPLOŠŤ:

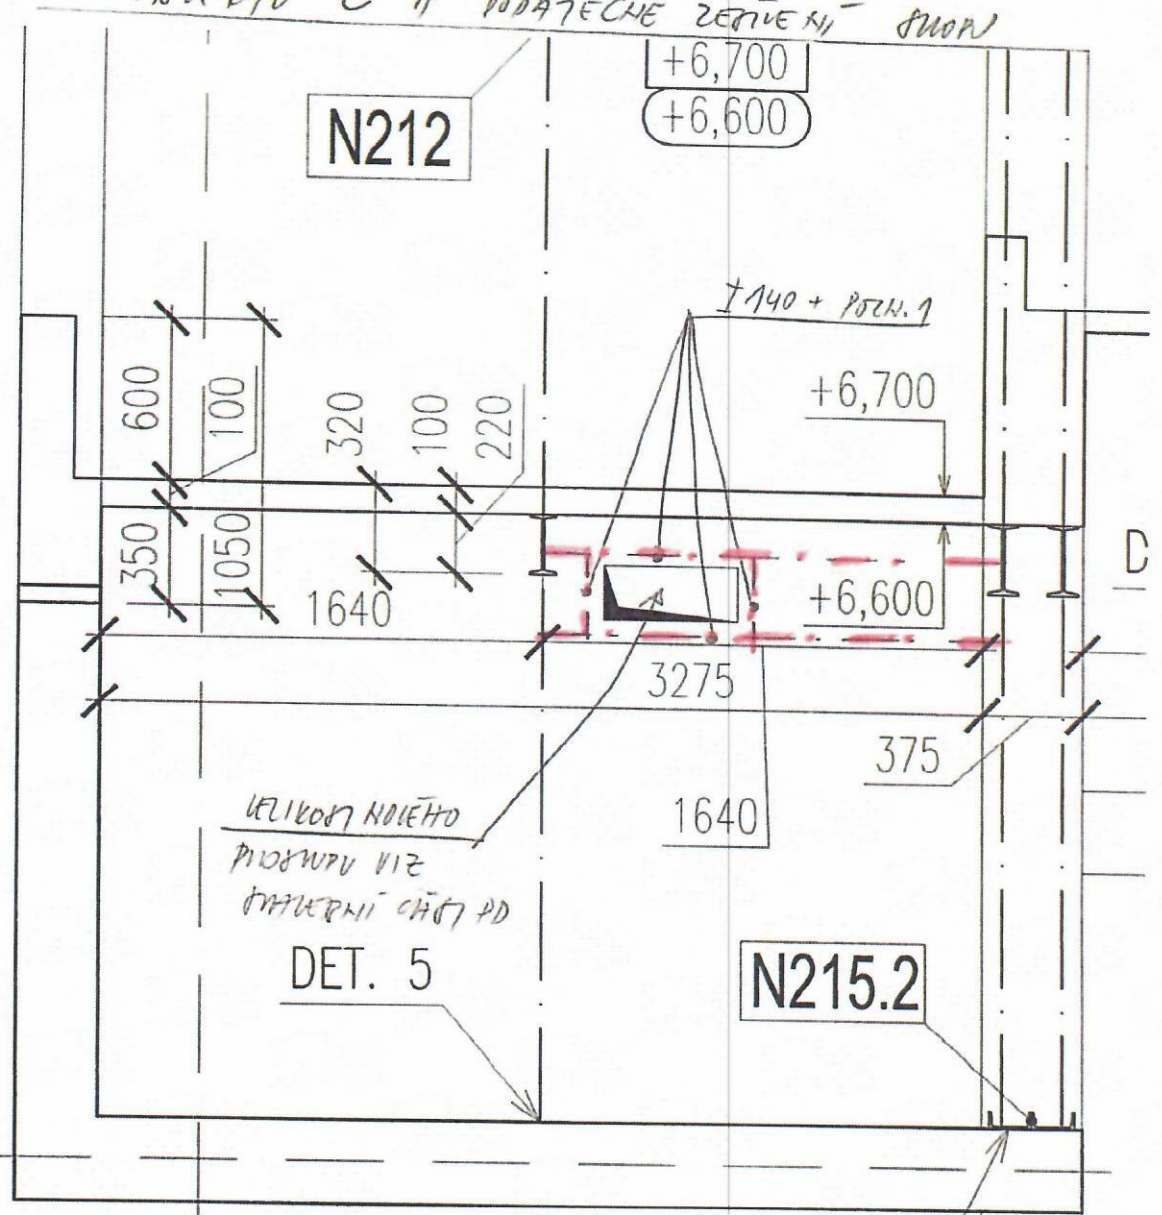

(H)

PŮVODNĚ:

PRŮZK. 1 - NOVĚ SE KONTAKTUJÍ STAVBY STAVBY PŘI VYPLNĚNÍ KAP. PŮVODNĚ
 ZEPŘEHY SE NOVĚM POD STÁVAJÍCÍM PROSTŘEDÍM
 KAP. 2. NP A NOVĚ KONTAKTUJÍ STAVBY DOKLADUJÍ VÝŠI
 STAV. STAVBY POKRYTÍ OCELOVÝCH KŮŽÍ A STAVBA BUDE
 VYPLNĚNÁ PSYCHIE TECHNICKÝ VYKONÁVÁNÍM PŮVODNĚ KAP. 2. NP

DET. A.2

062 2235 JZ
 SV4117 T.6111

1

PAPET LAMPOU SET - PO ZEPŘEHY STAVBY VYPLNĚNÍ
 NOVĚ PŮVODNĚ POKRYTÍ DIAGNOSTICKÉ TECHNOLOGIE

ZL 157
PŘÍL 02.2

ПЪРВОНАЧ. ПРОЕКТОРЪ 2-4P - ДЕТУНЪС

N212.1

I 1940 + ПОЗН. 1

1290

1450

1825

3275

375

DET. A.2

N215.2

DET. 5

H

1290

ЛЕЖАКЪТ МОЛЕТО ПЛОЩИНУ
ВИЗ ПЪРВЕТО СЪЩО ПО

У БРАНЕ ДНЕ 9.6.2021

УПРАВНОУЛ: ИИГ. КОУДЕЦА

ЗОДП. МО ВЕУТАНЪ: ИИГ. ХУАДИК

4

2L 157

ПЭТЛО 2.3

4

ПЪРВОРЪД: ПЛОТ КМД 2-ЛП - ОБЪЕКТ

47120

5

