

Protokol o změně díla

změnový list číslo 190

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G část A, B,C Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195		
<b>Změna: ASŘ – úprava tvaru velkého átria</b>		
P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt, FN Brno	
	Popis změny: Úprava velkého átria za účelem lepšího využití a odvodnění dané plochy na pokyn investora.	
Způsob projekčního zpracování: schéma vliv změny na náklady stavby: ANO		
ocenění změny předložil: GZ		
ve formě		
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		vícepráce
Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK		381.767,71 Kč
úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILOKĚN G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
C	Zvýšení celkem: <b>381.767,71 Kč</b>	
E	Snížení celkem :	
Bilance celkem:		
N	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6	
A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	1. 12. 21
	objednatel (investor, uživatel)	1. 12. 21
	TDI:	-
	GP:	10. 12. 2021
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: 11/2021	
	Termín realizace změny: v rámci 3. etapy	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby	
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb	
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 schéma nového tvaru átria	

# Příloha č.1 pro ZL 190 Úprava velkého atria

## Položkový soupis prací a dodávek


S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 001 Odstranění stávajícího MZK a vytvoření nového</b>						<b>180 412,11</b>		
1	113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm	m2	68,00000	324,00	22 032,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
2	113111130R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.30 cm	m2	68,00000	513,00	34 884,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
3	965043321RT2	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	0,60000	5 025,00	3 015,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
4	976074141R00	Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen	kus	5,00000	304,50	1 522,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
5	564972121R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 30 cm	m2	68,00000	423,00	28 764,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
6	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	68,00000	225,00	15 300,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,60000	16,00	185,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		2,9*4		11,60000				
8	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	2,90000	336,50	975,85	RTS 21/ II	RTS 21/ II
9	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu,cihel,dřeva	t	2,90000	1 612,00	4 674,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
10	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	79,52624	298,00	23 698,82	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek						
11	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	318,10496	142,50	45 329,96	RTS 21/ II	RTS 21/ II
12	979083111R00	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí	t	2,90000	10,20	29,58	RTS 21/ II	RTS 21/ II
<b>Díl: 002 Palisády</b>						<b>122 871,26</b>		
13	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	2,50000	501,00	1 252,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
14	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	22,00000	1 427,00	31 394,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
15	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	10,00000	1 477,00	14 770,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
16	711823111R00	Položení popové fólie vodorovně včetně dodávky těsnicí pásky	m2	10,00000	67,00	670,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
17	28323136R	Fólie popová, nopy 8 mm profilovaná	m2	10,00000	45,70	457,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
18	58330002.AR	Štěrkopisek k zásypu	t	4,50000	241,00	1 084,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		2,5*1,8		4,50000				
19	592284420R	Palisáda kruhová betonová 400 mm	kus	116,00000	263,00	30 508,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		22/0,2*1,05		115,50000				
		Konec provozního součtu						
		116		116,00000				
20	592284430R	Palisáda kruhová betonová 800 mm	kus	52,00000	397,50	20 670,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		10/0,2*1,05		52,50000				
		Konec provozního součtu						
		52		52,00000				
21	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	24,93250	885,00	22 065,26	RTS 21/ II	RTS 21/ II
<b>Díl: 003 Schodiště</b>						<b>78 484,34</b>		
22	327111211R00	Zасыпání svahových tvárníc se ztuhnutím	m3	9,87000	813,00	8 024,31	RTS 21/ II	RTS 21/ II
23	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,20000	1 321,00	1 585,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		20*0,2*0,3		1,20000				
24	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	20,00000	1 427,00	28 540,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
25	58337304R	Štěrkopisek frakce 0-16 B	t	15,01500	268,00	4 024,02	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		9,1*1,65		15,01500				
26	59228510R	Palisáda betonová 200x100x400 přírodní	kus	118,00000	144,50	17 051,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
27	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	21,76250	885,00	19 259,81	RTS 21/ II	RTS 21/ II

**Bilance celkem**

**381 767,71**

ZL 190 příloha 02 nový návrh tvaru  
FN Brno – Psychiatrická klinika  
ÚPRAVA ÁTRIA - VÝSADBA

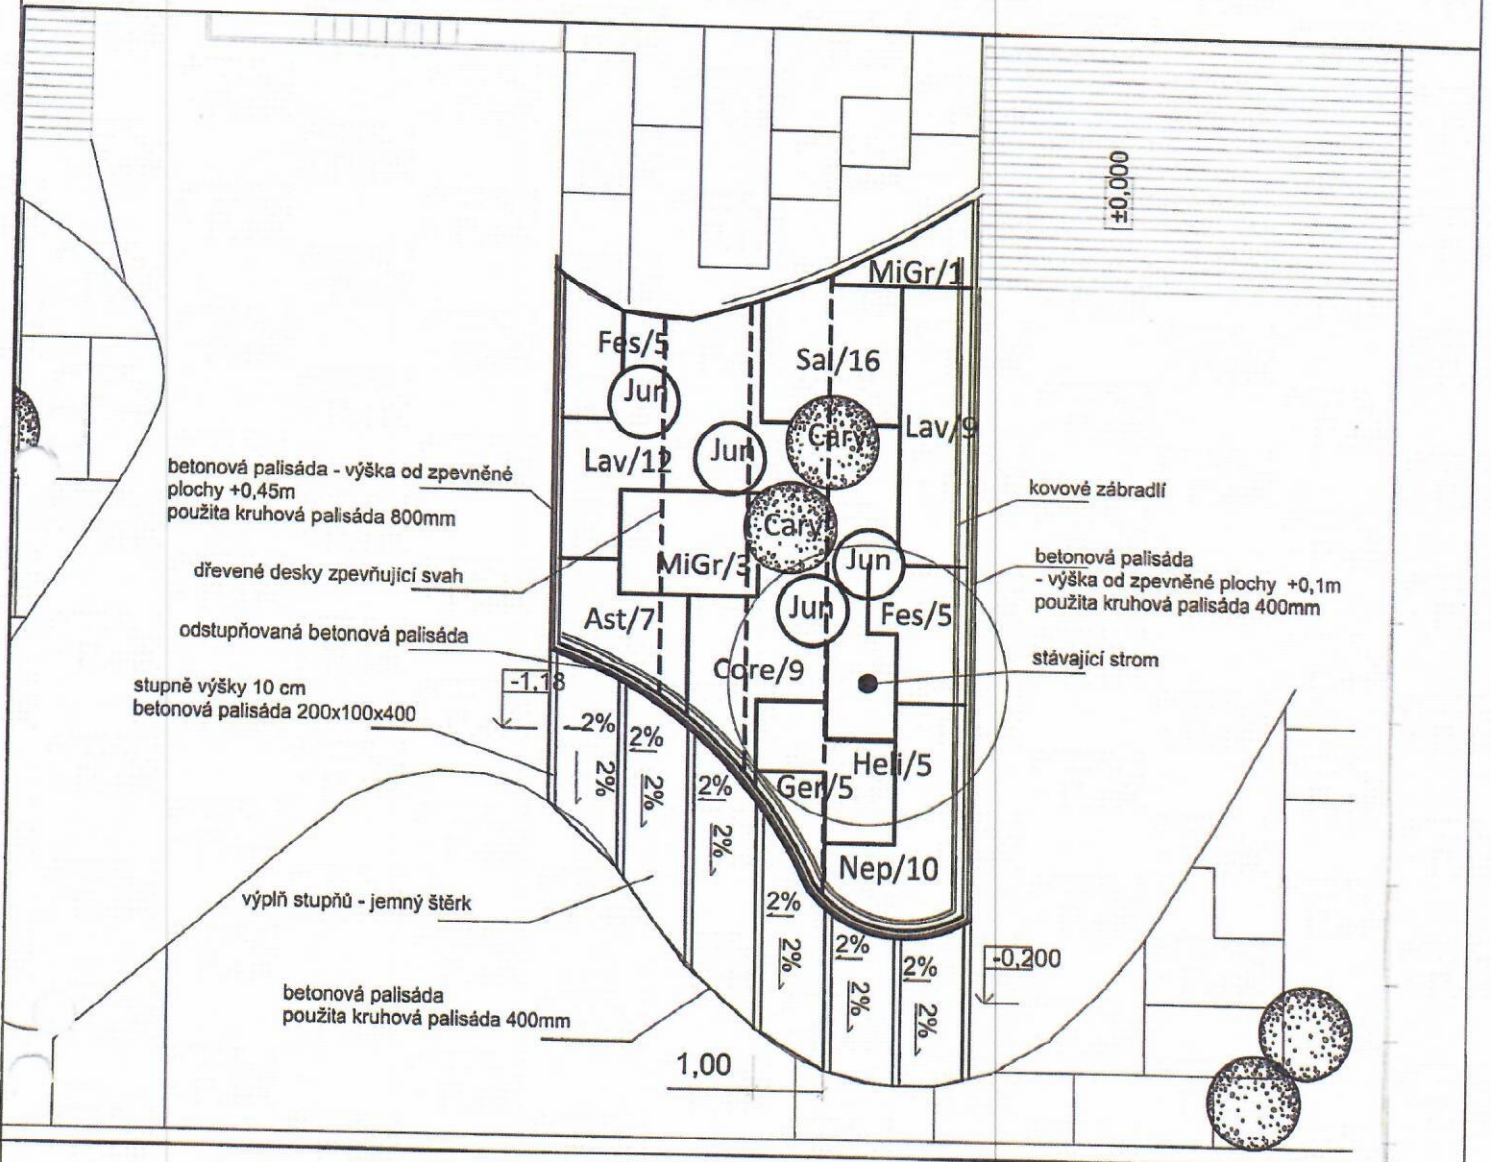

#### PALISÁDY

Palisády se kladou těsně vedle sebe do betonového lože ze zavlhle betonové směsi třídy C 20/25 XF3. Při zabudování je nutné kontrolovat svislost každé palisády a respektovat jejich kónicitu, která je dána technologií výroby. Z tohoto důvodu je nutno před zatvrdnutím betonového lože fixovat jejich svislost např. pomocí dřevěného nebo plastového distančníku (např. obkladačským klínkem). Doporučujeme rovněž nepodceňovat funkci nopové fólie za předpokladu, že palisády budou z jedné strany zasypány zeminou, byť i jen částečně, nebo budou zabudovány v místě se zvýšenou vlhkostí. Podél nopové fólie vysypat těžký nebo drcený štěrk, šířka zásypu 50cm.

Rozměr betonového lože

palisáda 800 - šířka 400mm, výška 300mm

palisáda 400 - šířka 300, výška 170mm

#### SOUPIS ROSTLIN:

Jun - Juniperus horizontalis 'Glauca' 4 ks

Cary - Caryopteris clandonensis 2 ks

Lav - Lavandula angustifolia 21 ks

Fes - Festuca glauca 10 ks

Ast - Aster dumosus 7 ks

MiGr - Miscanthus sinensis 'Gracilimus' 4 ks

Core - Coreopsis verticillata 9 ks

Heli - Helictrotrichon semervirens 5 ks

Ger - Geranium x cantabrigiense 5 ks

Nep - Nepeta x faassenii 10 ks

Sal - Salvia officinalis 16 ks
