



# ROMAN KUČERA - STAVITELSTVÍ

Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice, IČ: 60823020, DIČ: CZ6908271249



## FAKTURA - daňový doklad

<b>DODAVATEL:</b> Roman Kučera - stavitelství Strádova 1725/37 370 07 České Budějovice  IČ: 60823020 DIČ: CZ6908271249 Tel.: 602 438 174 e-mail: stavkucera@volny.cz Výpis z ŽR č.j.: Ž/501/2020/HŘ/56068/3 Magistrát města České Budějovice  Banka: FIO BANKA a.s. Číslo účtu: 2500196205/2010	<b>FAKTURA číslo:</b> 2022-033 <b>Variabilní symbol:</b> 20200033 <b>ODBĚRATEL:</b> Obec Čičenice Čičenice 79 387 71 Čičenice  IČ: 00.251097 DIČ: není plátce DPH
<b>PRÍJEMCE:</b> Obec Čičenice Čičenice 79,387 71 Čičenice zastoupení: Renata Regálová-starostka obce	<b>Konstantní symbol:</b> 0308 <b>Forma úhrady:</b> převodem <b>HS - č. objednávky:</b> 13/2022 ze dne 20.04.2022 <b>Akce/zakázka:</b> Novostavba garáží pro kom.techniku,k.ú.Čičenice
<b>Způsob dopravy:</b> vlastní  <b>Odebral:</b> TDI Miloš Štědrý <b>Středisko:</b> Kučera -VÝROBA <b>Zpracoval:</b> Roman Kučera-VEDENÍ	<b>Datum vystavení:</b> 08.12.2022 <b>Datum splatnosti:</b> do 30 dnů od převzetí faktury <b>Dať. uskut. zd. pl.:</b> 30.11.2022

Na podkladě uzavřené SOD č.13/2022 ze dne 20.04.2022, Vám fakturujeme za řádně provedené stavební práce za období 05-11/2022, v souladu s Zápisem o předání a převzetí díla ze dne 30.11.2022 a v rozsahu Zjišťovacího protokolu č.1 ze dne 08.12.2022

**akce: Novostavba garáží pro komunální techniku,k.ú.Čičenice**

Stavební práce bez DPH				1 070 521,94 Kč
	základ	21%	1 070 521,94	1 070 521,94 Kč
	DPH	21%	224 809,61	224 809,61 Kč
	základ	15%	0,00	0,00 Kč
	DPH	15%	0,00	0,00 Kč
<b>Stavební práce včetně 21% DPH</b>				<b>1 295 331,55 Kč</b>

**CELKEM K FAKTURACI 11/2022 K PROPLACENÍ 1 295 331,55 Kč**


Obec Čičenice  
Čičenice čp. 79, 387 71  
tel.: 383 381 111  
IČ: 00261

.....  
Převzal, dne:

Fakturaci zpracoval:  
p. Roman Kučera  
mobil: 602 438 174

Digitálně  
podepsal  
Roman Kučera  
Datum:  
2022.12.12  
08:04:26 +01'00'


Příloha: Zjišťovací protokol č.1 včetně Položkového soupisu prací a dodávek ze dne 07.12.2022  
Zápis o předání a převzetí díla ze dne 30.11.2022

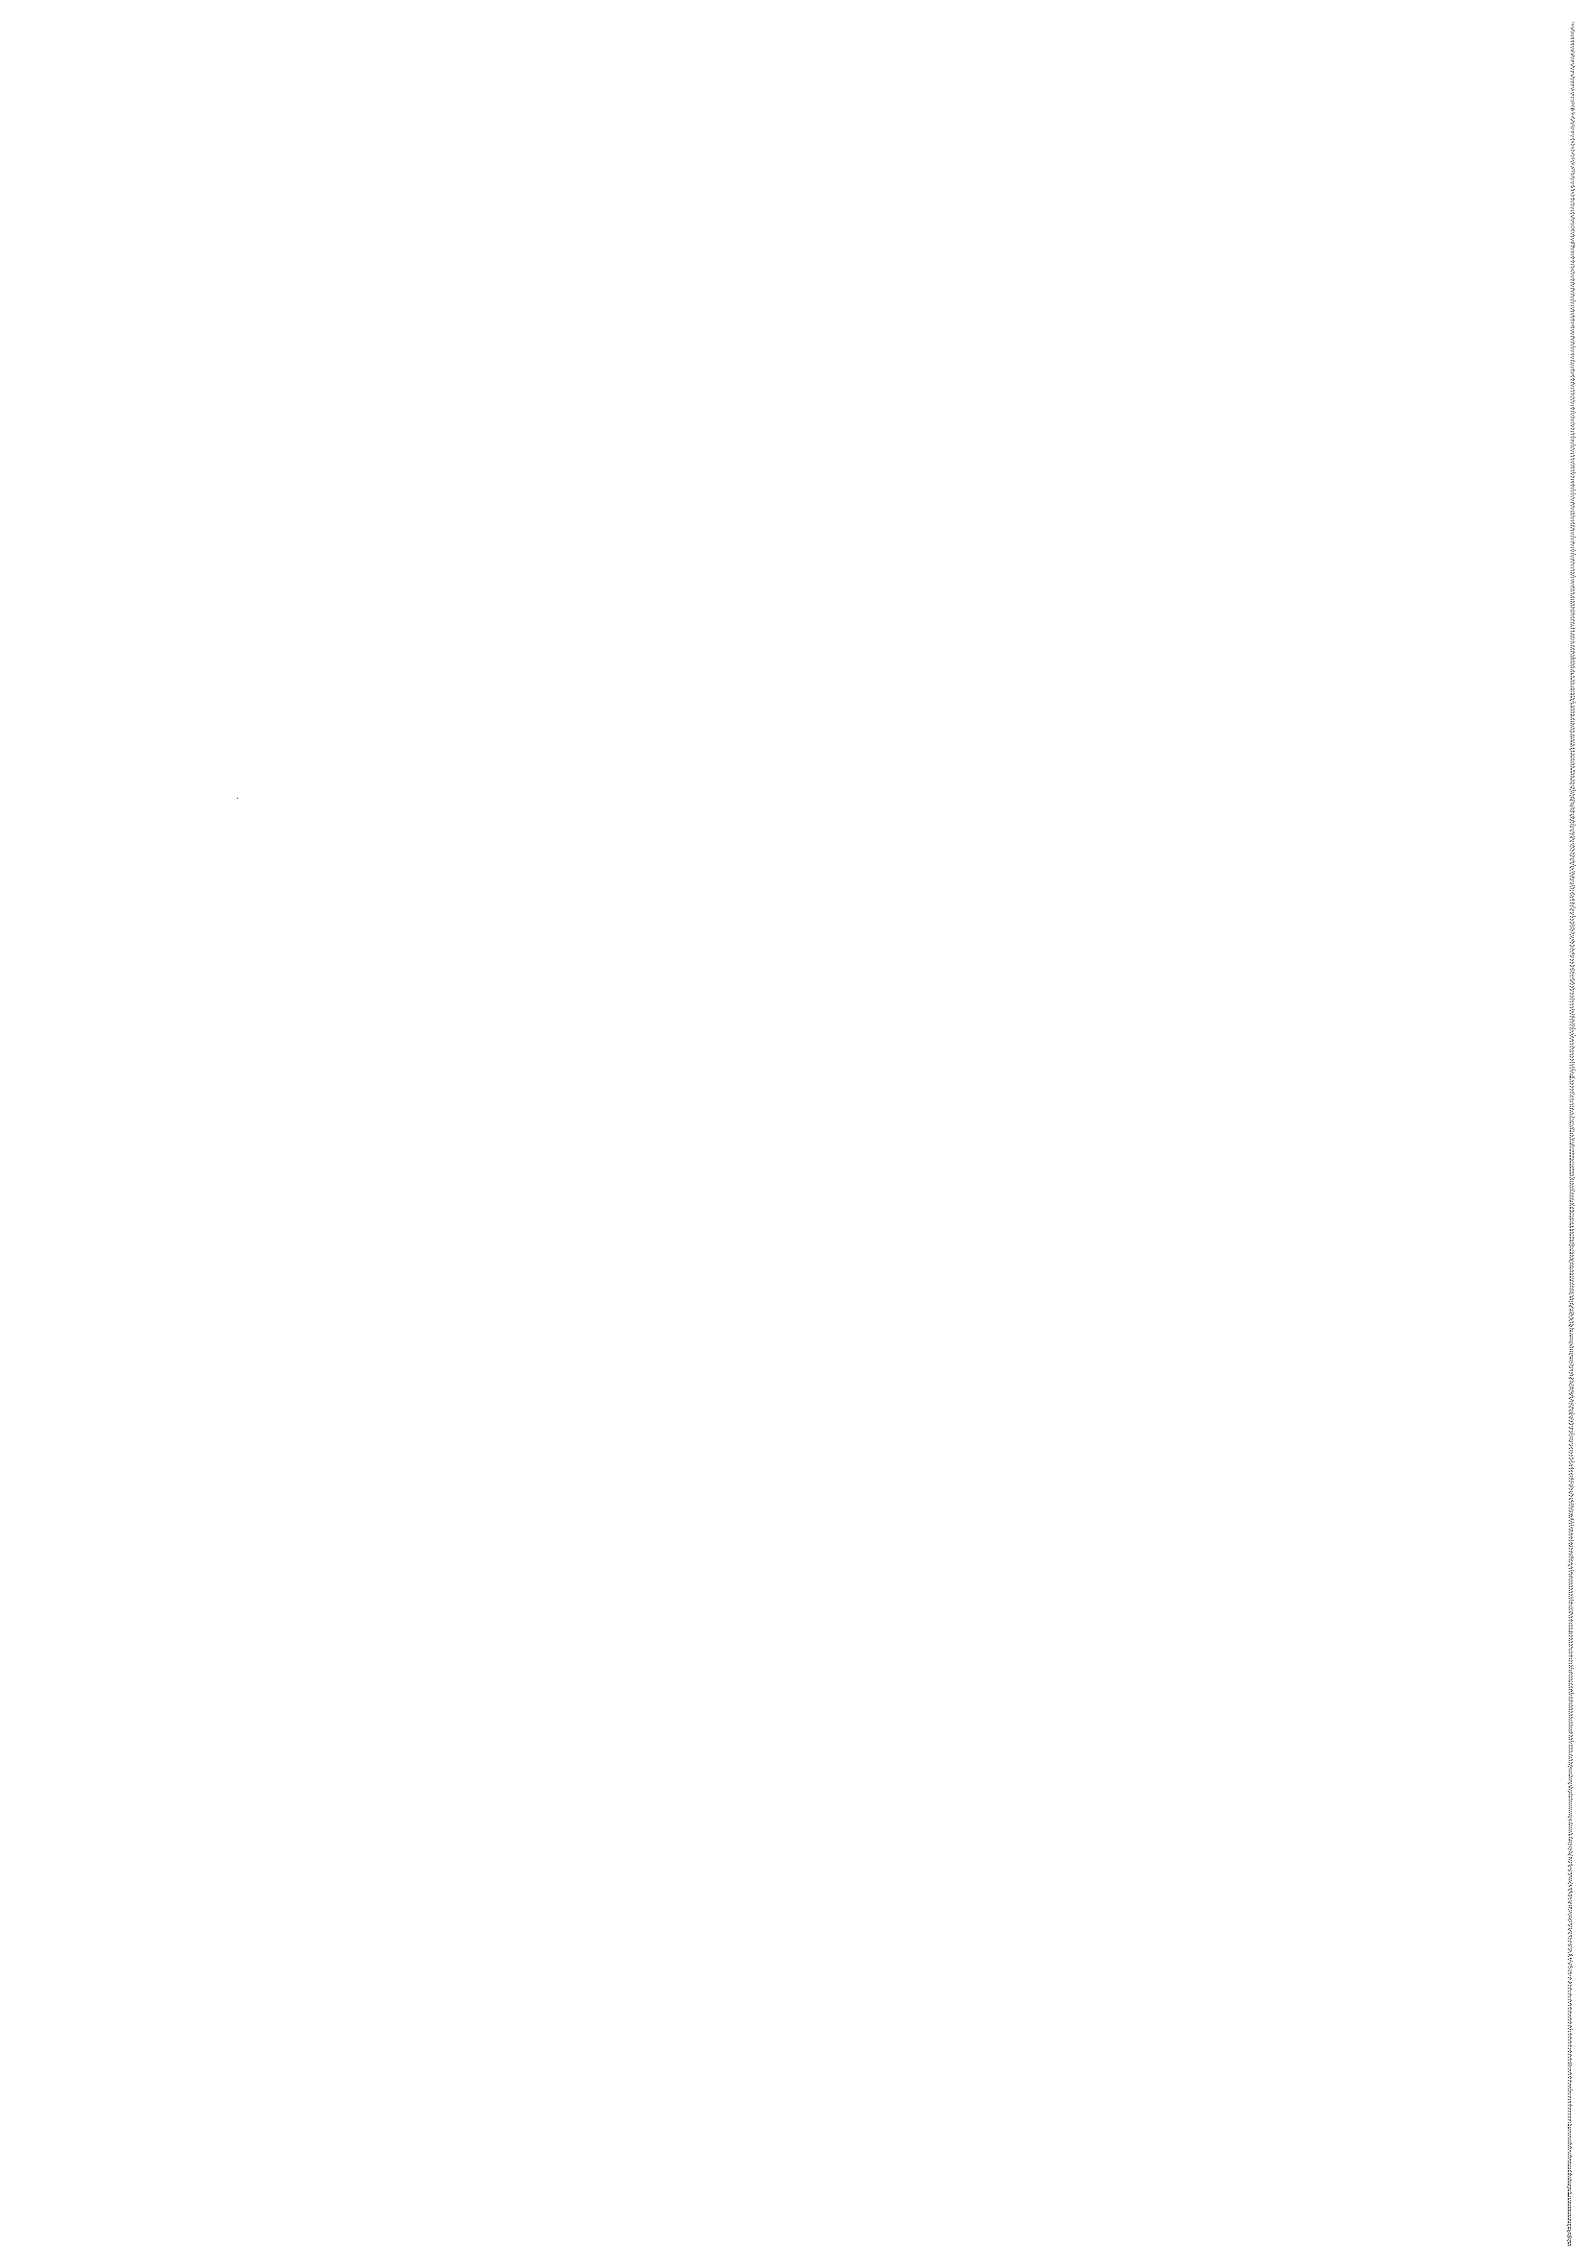

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00-Ostatní a vedlejší náklady
O:	Novostavba garáží pro komunální techniku, k.ú. Čičenice
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mn.	cena / MJ	celkem	Zjišť. protokol č. 1		Zjišť. protokol č. 2	
							mn.	celkem	mn.	celkem
1	005121010R	Vybudování a likvidace zařízení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo	KČ	1,000	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00		0,00
2	005121010T	Oplocení staveniště (montáž, pronájem, demontáž, dooprava)	m	80,000	204,80	16 384,00	80,00	16 384,00		0,00
3	005211010R	Revize, zkoušky, atesty	KČ	1,000	2 600,00	2 600,00	1,00	2 600,00		0,00
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	KČ	1,000	800,00	800,00	1,00	800,00		0,00
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení, "geometrický plán"	KČ	1,000	5 034,65	5 034,65	1,00	5 034,65		0,00
6	005241022R	Geodetické vytýčení před zahájením stavby, vč. protokolu o vytýčení	KČ	1,000	3 600,00	3 600,00	1,00	3 600,00		0,00
7	005281012R	Náklady na geologa - bude přizván k převzetí a ověření únosnosti základové spáry	KČ	1,000	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00		0,00
Celkem za objekt:						32 018,65		32 018,65	0,00	0,00

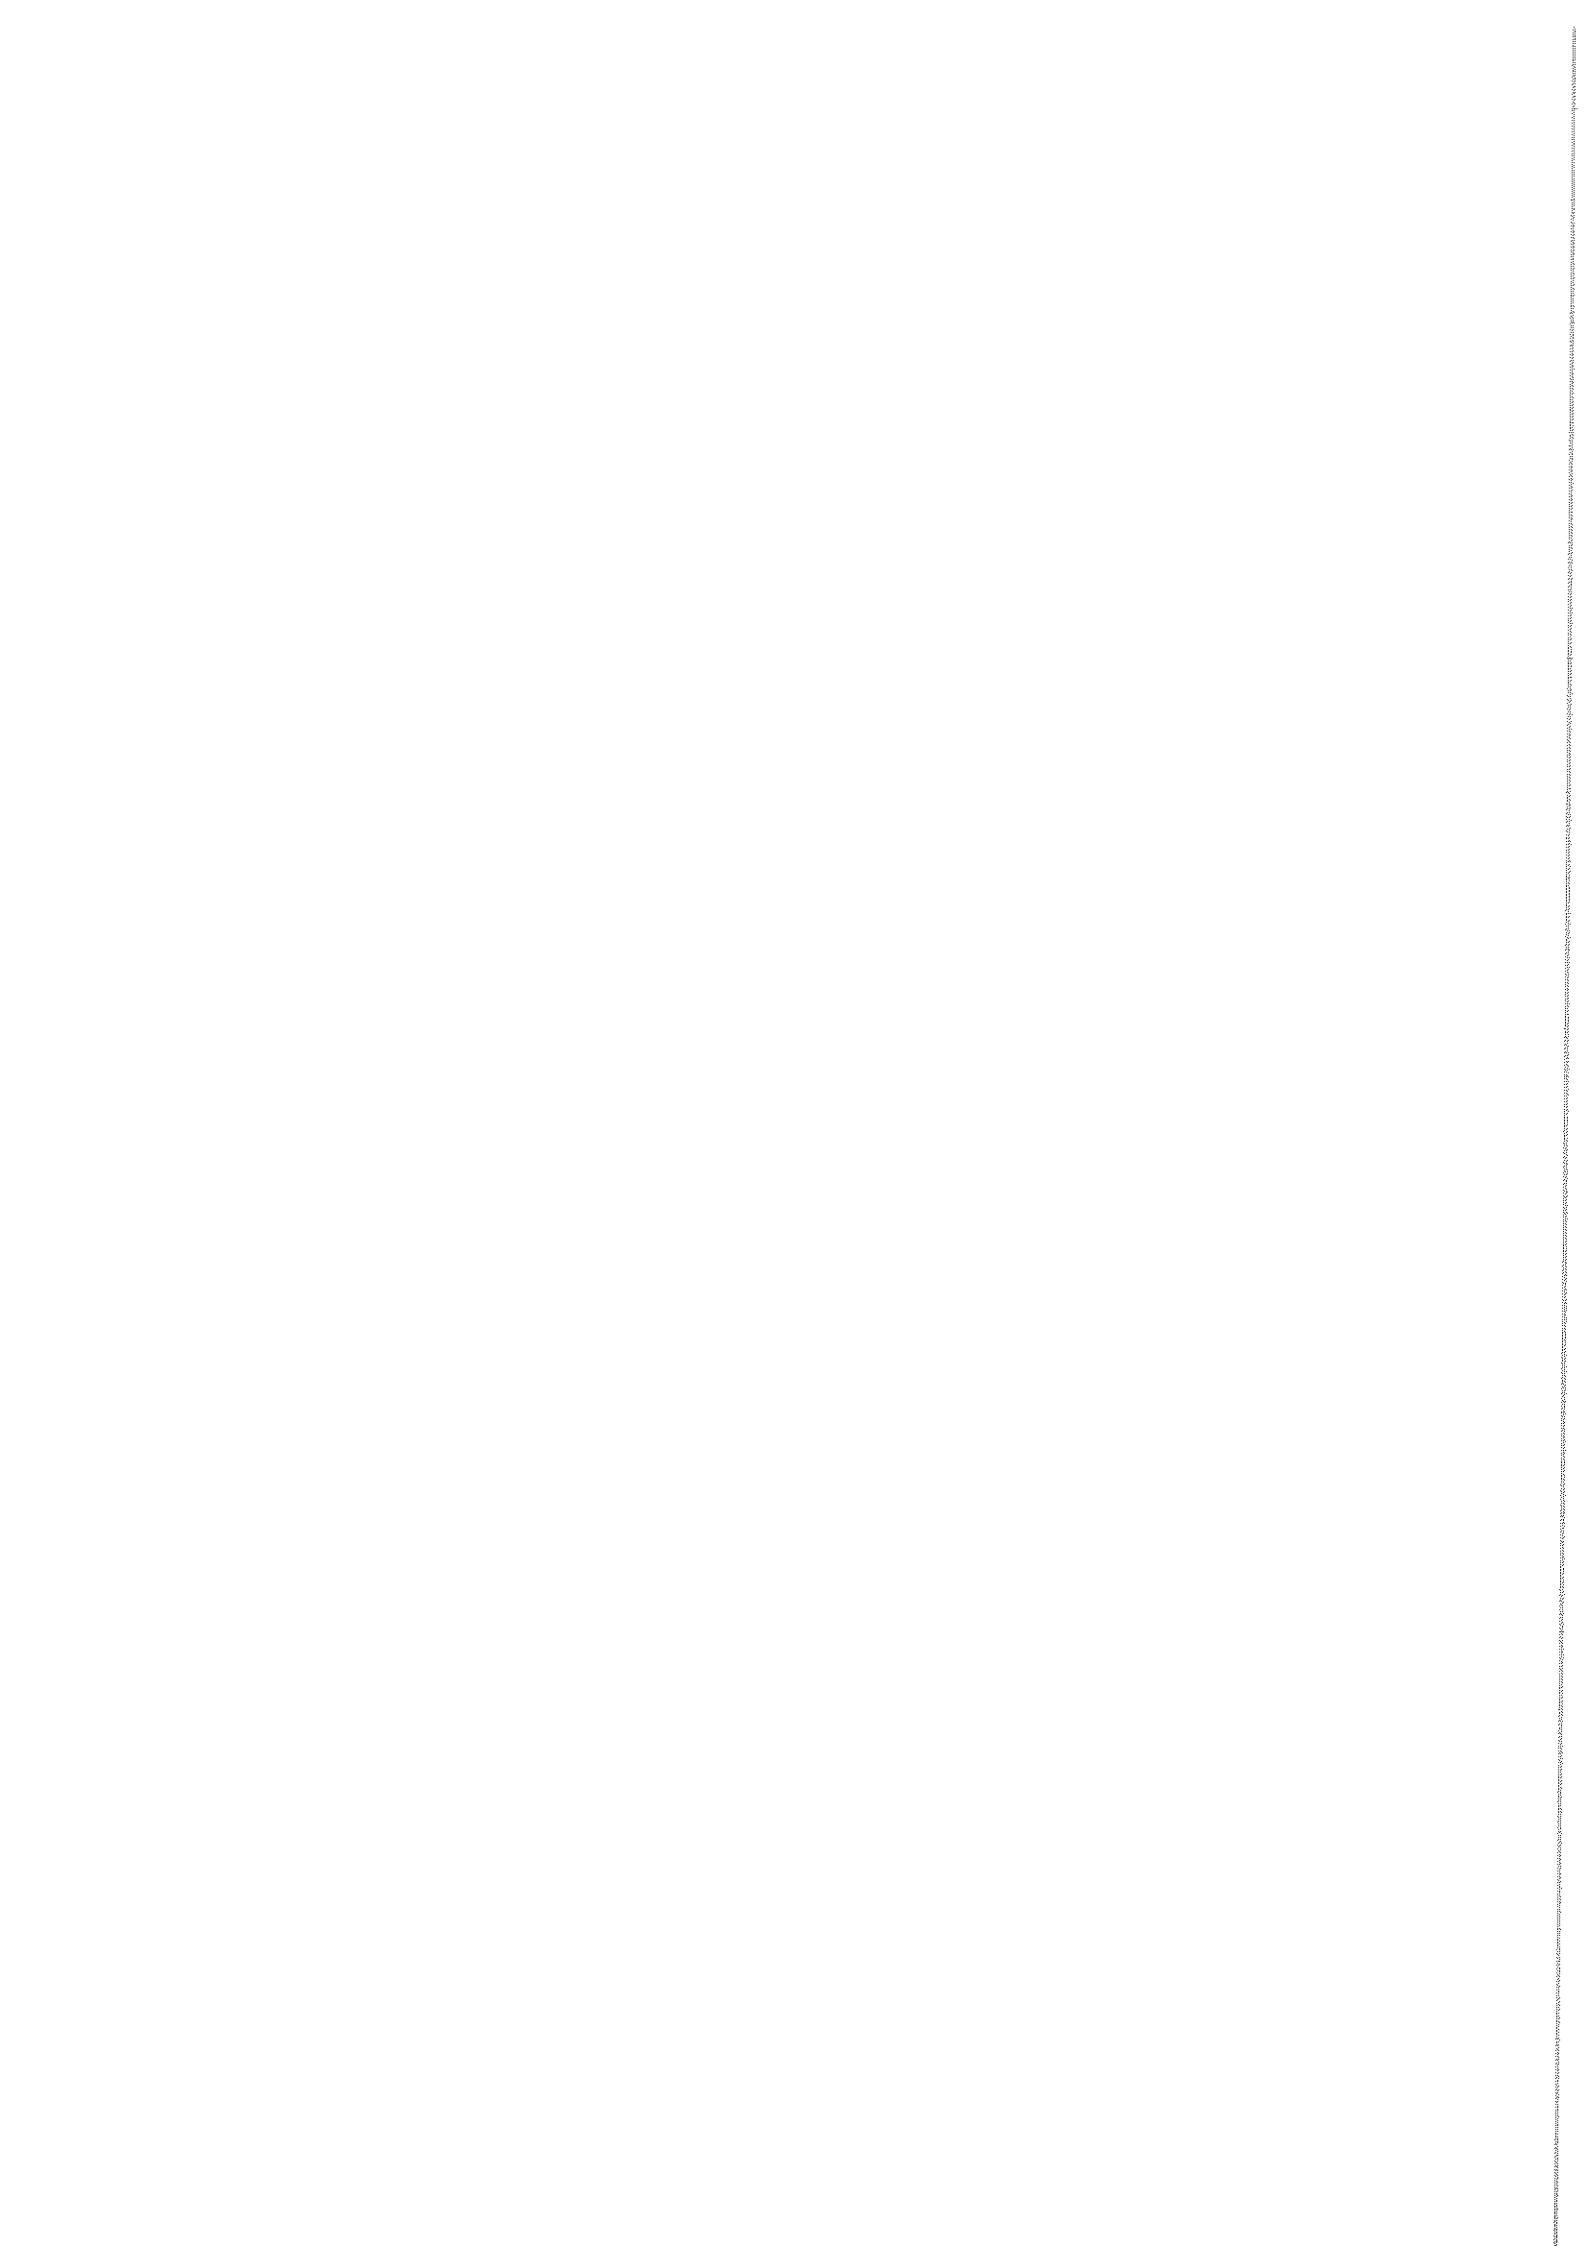

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01 - Vlastní stavba
O:	Novostavba garáží pro komunální techniku ,k.ú.Čičenice
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mn.	cena / MJ	Zjišť. protokol č. 1		Zjišť. protokol č. 2		
						celkem	mn.	celkem	mn.	
1	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	92,130	48,16	4 436,98	92,13	4 436,98	0,00	0,00
2	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, objem do 100 m3, strojně	m3	14,746	263,99	3 892,83	14,75	3 892,83	0,00	0,00
3	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,583	1 047,21	1 657,73	1,58	1 657,73	0,00	0,00
4	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,825	380,40	6 019,83	15,83	6 019,83	0,00	0,00
5	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,154	210,01	6 752,60	32,15	6 752,60	0,00	0,00
6	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	482,310	16,57	7 990,91	482,31	7 990,91	0,00	0,00
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,154	10,20	327,97	32,15	327,97	0,00	0,00
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	61,093	220,00	13 440,46		0,00	0,00	13 440,46
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,000	123,00	1 845,00	15,00	1 845,00	0,00	0,00
10	58331202R	šitékordr netříděná (skryvka z lomů)	t	30,000	310,70	9 321,00	30,00	9 321,00	0,00	0,00
11	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,000	13,21	1 056,80	80,00	1 056,80	0,00	0,00
12	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	7,050	957,60	6 751,08	7,05	6 751,08	0,00	0,00
13	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,718	2 812,00	24 515,02	8,72	24 515,02	0,00	0,00
14	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,060	791,00	4 793,46	6,06	4 793,46	0,00	0,00
15	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	6,060	127,00	769,62	6,06	769,62	0,00	0,00

16	273353101	Bednění otvorů v základových deskách průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m	kus	1,000	382,00	382,00	1,00	382,00		0,00	0,00
17	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,295	41 050,00	12 109,75	0,30	12 109,75		0,00	0,00
18	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,860	2 593,50	17 791,41	6,86	17 791,41		0,00	0,00
19	274353112	Bednění otvorů v základových pásech průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	kus	1,000	426,99	426,99	1,00	426,99		0,00	0,00
20	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	22,900	1 409,80	32 284,42	22,90	32 284,42		0,00	0,00
21	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,824	50 720,00	41 793,28	0,82	41 793,28		0,00	0,00
22	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,225	1 126,70	5 887,01	5,23	5 887,01		0,00	0,00
23	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	71,800	1 199,85	86 149,23	71,80	86 149,23		0,00	0,00
24	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,125	48 709,99	6 088,75	0,13	6 088,75		0,00	0,00
25	317168058	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	3,000	1 084,90	3 254,70	3,00	3 254,70		0,00	0,00
26	317168059	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	6,000	1 156,15	6 936,90	6,00	6 936,90		0,00	0,00
27	317998110	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 mm	m	8,750	87,81	768,34	8,75	768,34		0,00	0,00
28	411168365	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm	m2	55,300	1 784,10	98 660,73	55,30	98 660,73		0,00	0,00
29	417238233	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	30,500	268,86	8 200,21	30,50	8 200,21		0,00	0,00
30	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,525	2 997,00	4 570,43	1,53	4 570,43		0,00	0,00
31	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	6,100	412,50	2 516,25	6,10	2 516,25		0,00	0,00
32	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	6,100	98,29	599,57	6,10	599,57		0,00	0,00
33	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,229	51 189,99	11 722,51	0,23	11 722,51		0,00	0,00
34	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	8,500	187,50	1 593,75	8,50	1 593,75		0,00	0,00
35	564951413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm	m2	25,000	212,00	5 300,00	25,00	5 300,00		0,00	0,00
36	611131300	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený strojně	m2	47,530	71,36	3 391,74	47,53	3 391,74		0,00	0,00

37	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	47,530	362,70	17 239,13	47,53	17 239,13	0,00	0,00
38	612131300	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený strojně	m2	86,600	61,20	5 299,92	86,60	5 299,92	0,00	0,00
39	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	86,600	313,38	27 138,71	86,60	27 138,71	0,00	0,00
40	622131300	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	60,450	62,48	3 776,92	60,45	3 776,92	0,00	0,00
41	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,090	140,80	1 279,87	9,09	1 279,87	0,00	0,00
42	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	60,450	322,29	19 482,43	60,45	19 482,43	0,00	0,00
43	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,500	568,00	4 260,00	7,50	4 260,00	0,00	0,00
44	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,950	37,21	593,47	15,95	593,47	0,00	0,00
45	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,808	3 329,99	12 680,61	3,81	12 680,61	0,00	0,00
46	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,808	1 142,09	4 349,08	3,81	4 349,08	0,00	0,00
47	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,808	346,95	1 321,19	3,81	1 321,19	0,00	0,00
48	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,173	40 850,00	7 067,05	0,17	7 067,05	0,00	0,00
49	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	6,400	733,80	4 696,32	6,40	4 696,32	0,00	0,00
50	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	16,800	213,50	3 586,80	16,80	3 586,80	0,00	0,00
51	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	75,000	48,30	3 622,50	75,00	3 622,50	0,00	0,00
52	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 250,000	1,59	3 577,50	2 250,00	3 577,50	0,00	0,00
53	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	75,000	33,00	2 475,00	75,00	2 475,00	0,00	0,00
54	95101101	D+M VĚTRACÍ OTVORY PRO PŘÍVOD VENKOVNÍHO VZDUCHU VČ. MRÍŽEK	kus	4,000	780,00	3 120,00	4,00	3 120,00	0,00	0,00
55	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,000	81,20	3 897,60	48,00	3 897,60	0,00	0,00
56	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	169,158	261,44	44 224,84	169,16	44 224,84	0,00	0,00

57	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	110,700	12,39	1 371,57	110,70	1 371,57	0,00	0,00
58	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,044	28 544,00	1 255,94	0,04	1 255,94	0,00	0,00
59	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	30,300	25,49	772,35	30,30	772,35	0,00	0,00
60	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,012	28 544,00	342,53	0,01	342,53	0,00	0,00
61	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	55,350	112,01	6 199,75	55,35	6 199,75	0,00	0,00
62	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	63,653	142,80	9 089,65	63,65	9 089,65	0,00	0,00
63	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,150	131,50	1 992,23	15,15	1 992,23	0,00	0,00
64	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	17,423	142,80	2 488,00	17,42	2 488,00	0,00	0,00
65	998711102	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,522	1 007,00	525,65	0,52	525,65	0,00	0,00
66	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	111,000	12,39	1 375,29	111,00	1 375,29	0,00	0,00
67	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,036	28 544,00	1 027,58	0,04	1 027,58	0,00	0,00
68	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	57,560	9,40	541,06	57,56	541,06	0,00	0,00
69	62853001	<i>pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	67,086	148,00	9 928,73	67,09	9 928,73	0,00	0,00
70	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	61,680	111,50	6 877,32	61,68	6 877,32	0,00	0,00
71	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	70,932	148,00	10 497,94	70,93	10 497,94	0,00	0,00
72	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	57,560	111,50	6 417,94	57,56	6 417,94	0,00	0,00
73	62853005	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu</i>	m2	67,086	164,88	11 061,14	67,09	11 061,14	0,00	0,00



74	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytí povlakové v objektech v do 6 m	t	1,168	1 179,00	1 377,07	1,17	1 377,07	0,00	0,00	0,00
75	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	39,240	24,60	965,30	39,24	965,30	0,00	0,00	0,00
76	63140274	<b>pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm</b>	<b>m</b>	<b>41,202</b>	<b>21,60</b>	889,96	41,20	889,96	0,00	0,00	0,00
77	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	18,450	204,00	3 763,80	18,45	3 763,80	0,00	0,00	0,00
78	28375931	<b>deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm</b>	<b>m2</b>	<b>19,373</b>	<b>58,10</b>	1 125,57	19,37	1 125,57	0,00	0,00	0,00
79	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	55,500	124,51	6 910,31	55,50	6 910,31	0,00	0,00	0,00
80	28376142	<b>křín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový</b>	<b>m3</b>	<b>6,702</b>	<b>2 842,00</b>	19 047,08	6,70	19 047,08	0,00	0,00	0,00
81	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,186	996,00	185,26	0,19	185,26	0,00	0,00	0,00
82	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	41,000	57,40	2 353,40	41,00	2 353,40	0,00	0,00	0,00
83	35442062	<b>pás zemnicí 30x4mm FeZn</b>	<b>kg</b>	<b>45,100</b>	<b>44,20</b>	1 993,42	45,10	1 993,42	0,00	0,00	0,00
84	741501101	Elektro - viz samostatný rozpočet	kpl	0,000	74 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu řš 250 mm	m	18,000	471,00	8 478,00	18,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00
86	764215405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené řš 400 mm	m	21,400	530,00	11 342,00	21,40	11 342,00	0,00	0,00	0,00
87	764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu řš do 400 mm	kus	2,000	150,00	300,00	2,00	300,00	0,00	0,00	0,00
88	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu řš 330 mm	m	9,000	822,00	7 398,00	9,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00
89	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000	871,50	871,50	1,00	871,50	0,00	0,00	0,00
90	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	3,000	1 002,63	3 007,89	3,00	3 007,89	0,00	0,00	0,00
91	764501101	STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ SVOD PRO STÁVAJÍCÍ GARÁŽ NA P.Č.175/9 BUDE DEMONTOVAN, NOVĚ BUDE STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ ŽLAB NAPOJEN NA NOVÝ ŽLAB ŘEŠENÉ NOVOSTAVBY GARÁŽI	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
92	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,125	1 939,99	242,50	0,13	242,50	0,00	0,00	0,00

93	767501101	D+M GARÁŽOVÁ VRATA 2500/2200 - KOVOVÝ POZINKOVANÝ RÁM A KŘÍDLA, BARVA POVRCHOVÉ ÚPRAVY RÁMU A KŘÍDLA BAREVNÁ	kus	2,000	33 608,00	67 216,00	2,00	67 216,00	0,00	0,00
94	767501102	D+M GARÁŽOVÁ VRATA 2250/2200 - KOVOVÝ POZINKOVANÝ RÁM A KŘÍDLA, BARVA POVRCHOVÉ ÚPRAVY RÁMU A KŘÍDLA BAREVNÁ	kus	1,000	32 104,00	32 104,00	1,00	32 104,00	0,00	0,00
95	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	60,450	38,60	2 333,37	60,45	2 333,37	0,00	0,00
96	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně čílnosti 1 a 2	m2	60,450	148,20	8 958,69	60,45	8 958,69	0,00	0,00
97	783801101	D+M soklu z epoxidové stěrky tl. 100 mm vč. výplně spáry silikonem	m	39,240	182,00	7 141,68	39,24	7 141,68	0,00	0,00
98	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	47,600	20,00	952,00	47,60	952,00	0,00	0,00
99	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	47,600	126,00	5 997,60	47,60	5 997,60	0,00	0,00
100	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	47,600	492,80	23 457,28	47,60	23 457,28	0,00	0,00
101	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	47,600	320,00	15 232,00	47,60	15 232,00	0,00	0,00
102	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	138,000	12,80	1 766,40	138,00	1 766,40	0,00	0,00
103	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	138,000	48,60	6 706,80	138,00	6 706,80	0,00	0,00

Celkem za objekt:

933 369,75

919 929,29

0,00


13 440,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02-Přeložky vodovod, dešťová kanalizace
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mn.	cena / MJ	celkem	Zjišť. protokol č. 1		Zjišť. protokol č. 2	
							mn.	celkem	mn.	celkem
1	8501	Přeložka vodovodní přípojky pro dům čp. 121, PE-HD 32x3,0	m	19,000	1 244,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	23 636,00
2	8502	Přeložka vodovodního řávu, PE160	m	35,200	3 108,00	109 401,60	0,00	0,00	0,00	109 401,60
3	8503	Dešťová kanalizace KG DN150	m	12,000	1 667,00	20 004,00	12,00	20 004,00	0,00	0,00
4	8504	Dešťový zasakovací objekt	kus	1,000	24 200,00	24 200,00	1,00	24 200,00	0,00	0,00
						177 241,60	44 204,00	0,00	0,00	133 037,60

Celkem za objekt:

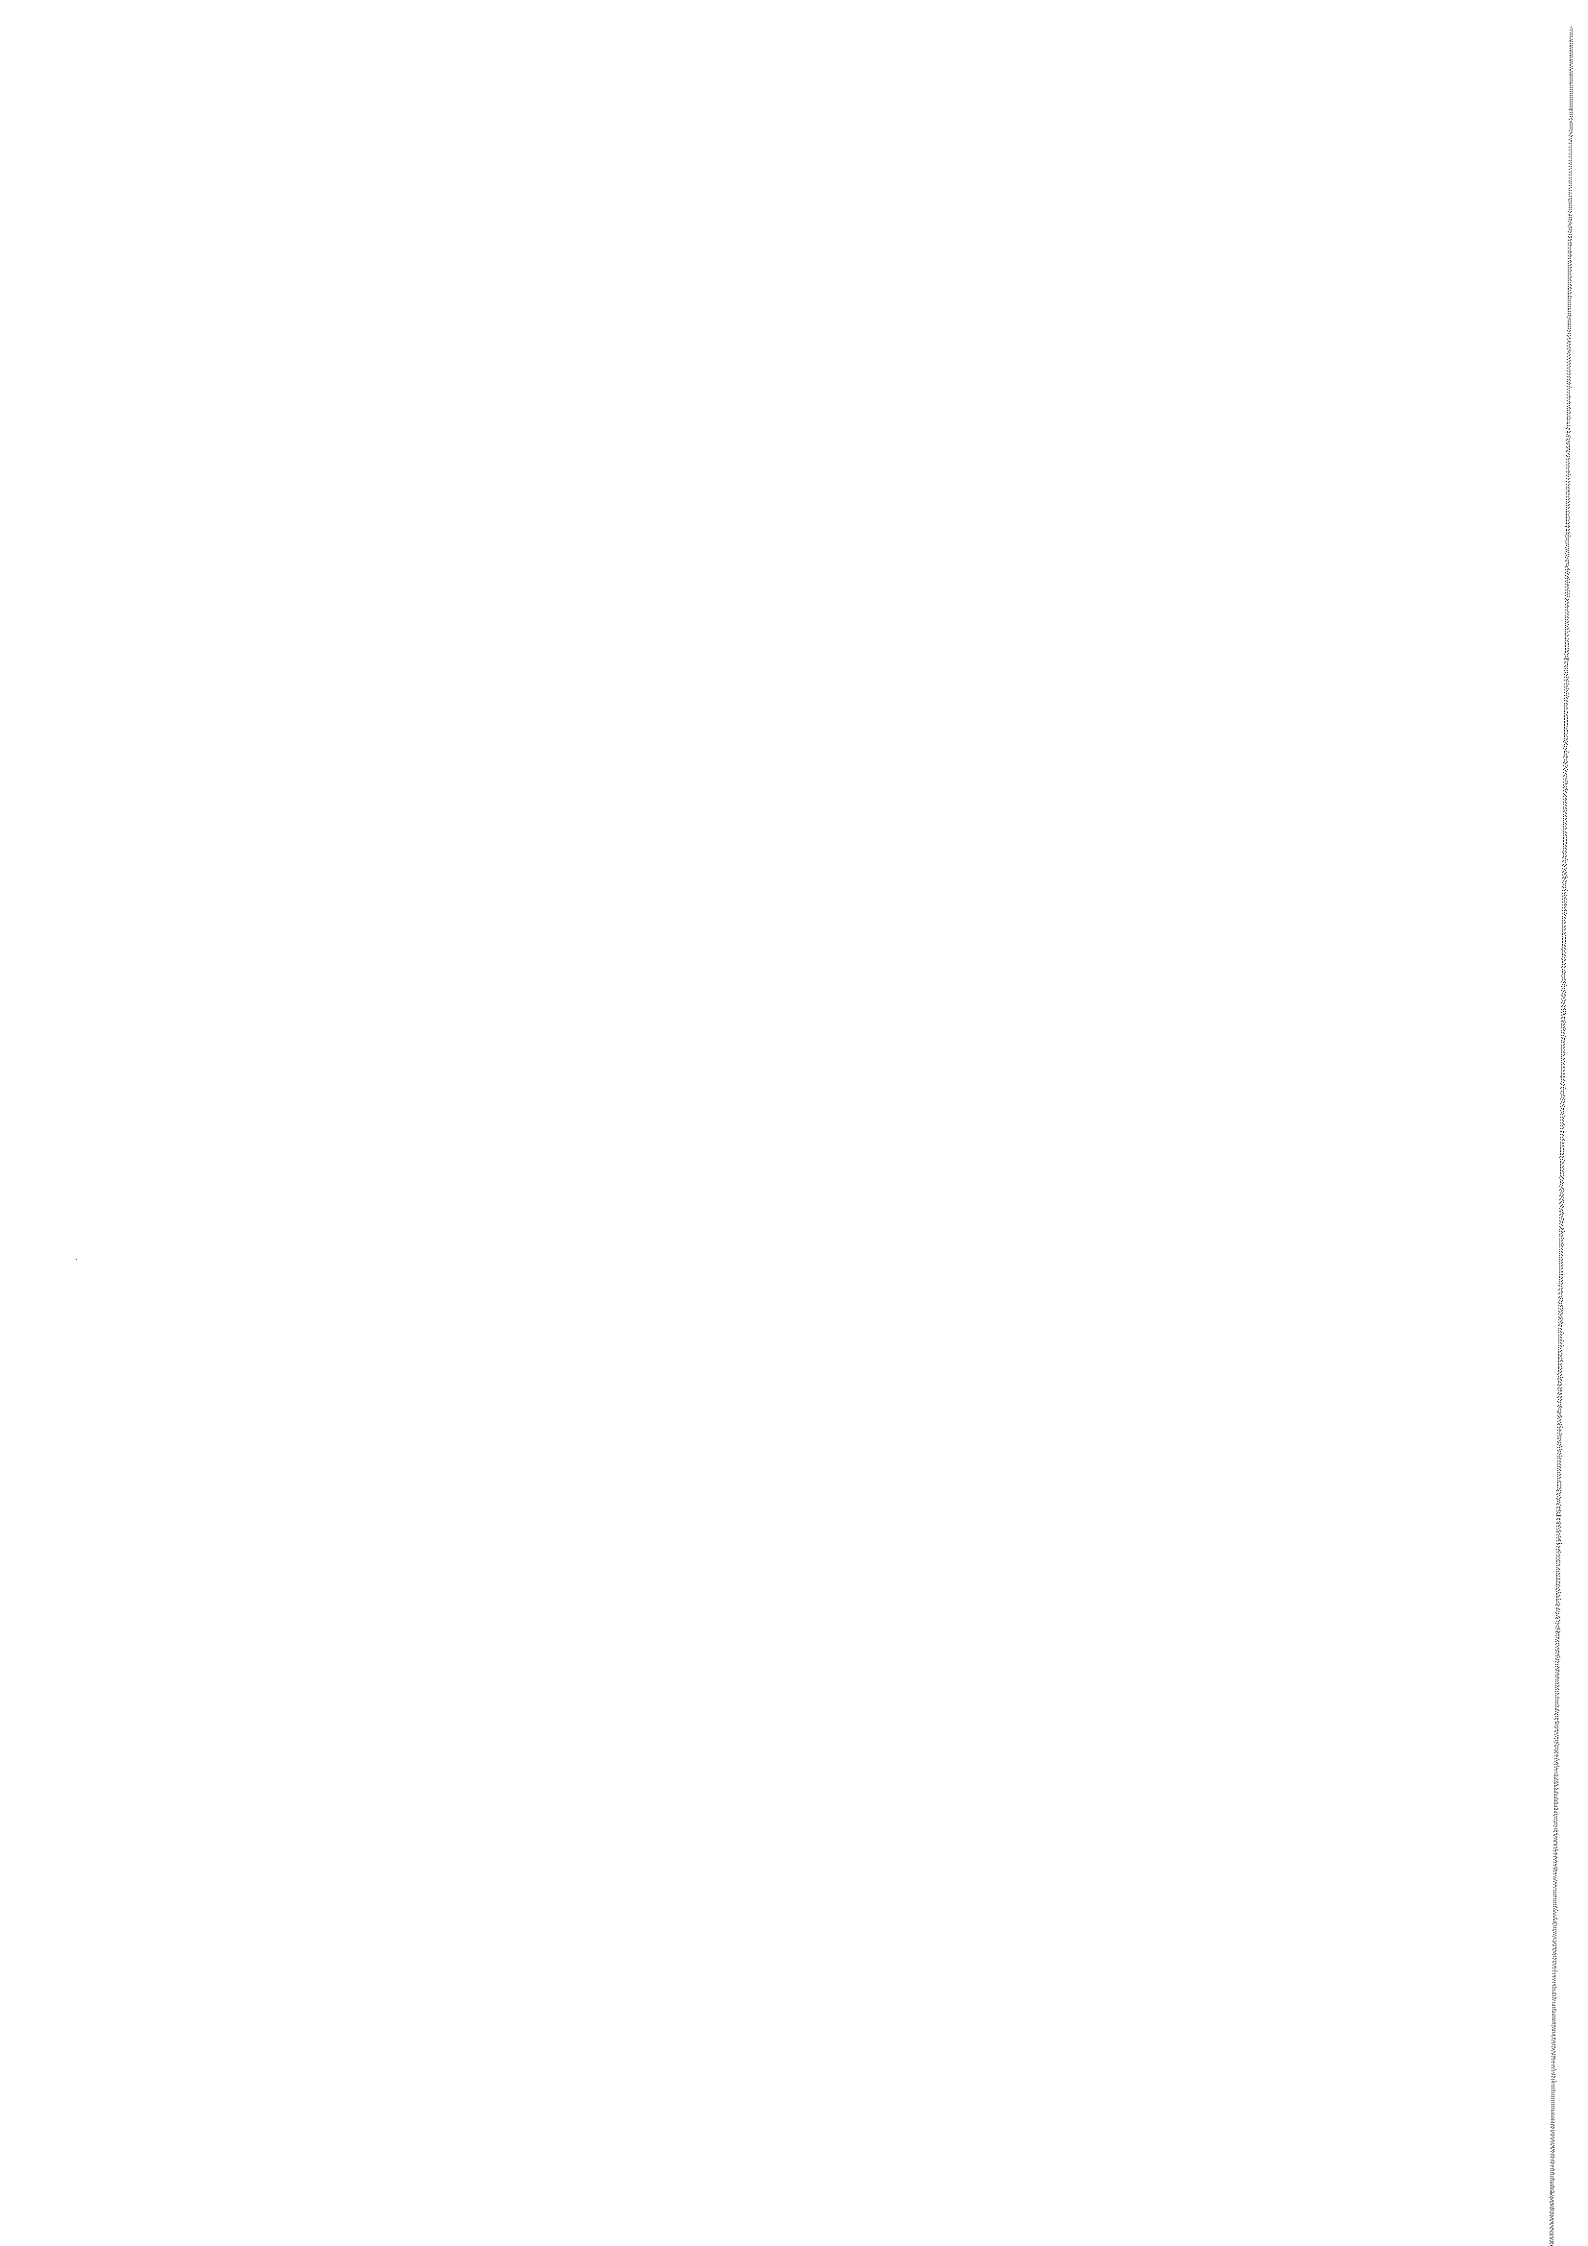

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Elektromontáž
O:	Novostavba garáží pro komunální techniku, k.ú. Čičenice
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mn.	cena / MJ	celkem	Zjišť. protokol č. 1			Zjišť. protokol č. 2		
							mn.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
1	1.1	Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T	ks	2	287,5	575,00	2,00	575,00		0,00	0,00	0,00
2	1.2	Zásuvka IP44, 230V/50Hz - 16A, 2P+T	ks	10	339,3	3 392,50	10,00	3 392,50		0,00	0,00	0,00
3	1.3	Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44	ks	1	285,2	285,20	1,00	285,20		0,00	0,00	0,00
4	1.4	Spínač střídací ř.6, 230V/50Hz, 10A, IP44	ks	2	293,-	586,50	2,00	586,50		0,00	0,00	0,00
5	2.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 50 (KOPOFLEX)	m	15	55,-	828,00	15,00	828,00		0,00	0,00	0,00
6	2.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení	m	25	63,-	1 581,25	25,00	1 581,25		0,00	0,00	0,00
7	2.3	Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly)	kpl	1	403,-	402,50	1,00	402,50		0,00	0,00	0,00
8	3.2	Instalační přístrojová krabice KP67/3	ks	13	36,-	463,45	13,00	463,45		0,00	0,00	0,00
9	3.3	Instalační přístrojová krabice KU68	ks	3	36,-	106,95	3,00	106,95		0,00	0,00	0,00
10	4.1	Instalační krabice 105x105x55, IP55	ks	2	155,-	310,50	2,00	310,50		0,00	0,00	0,00
11	4.2	Instalační rámečky	kpl	1	230,-	230,00	1,00	230,00		0,00	0,00	0,00
12	4.3	Montážní a instalační materiál (hmožděnky, šroubky)	kpl	1	345,-	345,00	1,00	345,00		0,00	0,00	0,00
13	5.1	Pásek FeZn 30x4	m	35	102,-	3 582,25	35,00	3 582,25		0,00	0,00	0,00
14	5.2	Svorka Sr3b	ks	1	76,-	75,90	1,00	75,90		0,00	0,00	0,00
15	5.3	Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen - MET	ks	1	437,-	437,00	1,00	437,00		0,00	0,00	0,00
16	6.1	A1 - PRACHOTĚSNÉ PRISAZENÉ SVÍTIDLO LED 40W, IP65, přisazené, 5500lm, d=1275mm, opalový polykarbonátový kryt	ks	5	1 438,-	7 190,00	5,00	7 187,50		0,00	0,00	0,00
17	7.1	Kabel CYKY-J 4x10	m	15	182,-	2 725,50	15,00	2 725,50		0,00	0,00	0,00
18	7.2	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	35	76,-	2 656,50	35,00	2 656,50		0,00	0,00	0,00
19	7.3	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	40	55,-	2 200,00	40,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00
20	7.4	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	30	44,-	1 311,00	30,00	1 311,00		0,00	0,00	0,00
21	7.5	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	20	44,-	874,00	20,00	874,00		0,00	0,00	0,00
22	7.6	Vodič CY10	m	5	75,-	373,75	5,00	373,75		0,00	0,00	0,00

23	8.1	Elektroměrový rozváděč pro 1xET, vč. mont.materiálu - provedení dle místního PDS Třipólový jistič 400V/50Hz, 25A Instalační a montážní materiál	kpl	1	6 325,-	6 325,00	1,00	6 325,00	0,00	0,00
24	9.1	Instalační rozváděč pod omítku 359 x 589 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka), 36mod. vč. příslušenství, krytí: IP31/20, Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, přívody a vývody horem, boční kryt, držák mont. panelů, zákryt, kapsa na výkresy, vč. výzbroje - viz. RG1	kpl	1	11 328,-	11 327,50	1,00	11 327,50	0,00	0,00
25	1.1	vysek rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	25	35,-	862,50	25,00	862,50	0,00	0,00
26	1.2	vysek rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	m	5	46,-	230,00	5,00	230,00	0,00	0,00
27	1.3	vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 15cm	ks	2	115,-	230,00	2,00	230,00	0,00	0,00
28	1.5	Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládku do 1km	t	1	568,-	284,00	0,50	284,00	0,00	0,00
29	1.6	Odvoz sutí z vybouraných hmot za každý další 1km	t	1	32,-	16,00	0,50	16,00	0,00	0,00
30		Montážní a instalační práce	kpl	1	14 457,0	14 457,00	1,00	14 457,00	0,00	0,00
31	1.24	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1	4 600,-	4 600,00	1,00	4 600,00	0,00	0,00
32	1.25	Likvidace odpadů	kpl	1	3 200,-	3 200,00	1,00	3 200,00	0,00	0,00
33	1.26	Revize	kpl	1	2 300,-	2 300,00	1,00	2 300,00	0,00	0,00
								74 370	0	0
Celkem za objekt:								74 370	0	0
