

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

## Změnový list č. 07

### Dešťové potrubí

**Stavba**

(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

**Objekt**

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

**Zpracoval**



**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Po odkopání obvodu objektu bylo zjištěno, že jedna ze stávajících dešťových kanalizací vede pod objektem, druhá podél objektu, avšak nebylo jisté, kam je zaústěna. Tento stav byl projednán s GP na KD, kde bylo rozhodnuto o provedení kamerové zkoušky stávající ležaté dešťové kanalizace. Následně bude provedeno nové ležaté dešťové potrubí po obvodu objektu se zaústěním do společné kanalizace na hranici pozemku viz příloha.

*Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.*

**Vliv na dopracování PD**

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

**Dopad do smluvní ceny**

Vícepráce

81.018,75 Kč bez DPH

Méněpráce

0 Kč bez DPH

Celkem

81.018,75 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních**

**termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 5 dní.

**Přílohy** (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet (vícepráce, méněpráce)

2 strany


2. Půdorys prováděných prací

1 strana

3. Herčík a Kříž – cenová nabídka

1 strana

**Schválil za zhotovitele**



Dne 14.1.2023 Podpis

**Schválil za TDS**


Dne 14.1.2023 Podpis

**Schválil za GP**

Dne 17.1.23 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 17.1.2023 Podpis



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ T.G.MASARYKA NAVÝŠENÍ KAPACITY O 2 TŘÍDY (vila Pamela)

Objekt: **ZL07 - Dešťové potrubí**

Místo: Ruzyňská 26/253, Praha 6 - Ruzyně

Datum: 13.05.2022

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

Projektant: QUADRA PROJECT  
s.r.o.

Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Zpracovatel: KONSIT, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


## Náklady soupisu celkem

81 018,75

D								
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
		721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	37,000			ÚRS
	VV		<i>1+12+24 = 37m viz příložený výkres</i>					
		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,990			ÚRS
	VV		<i>37 x 0,45 x 0,6</i>					
		721111111	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	kus	2,000			ÚRS
	VV		<i>napojení dešťových rozvodu na 2 stávající vývody - kamenina DN 125</i>					
		721111112	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150	kus	1,000			ÚRS
		721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	1,000			ÚRS
	VV		<i>napojení dešťových rozvodu na nově vytvořený vývod - kamenina DN 150</i>					
7	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000			SoD
		721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000			ÚRS
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	37,000			SoD
		388995213	Chráníčka kabelů z trub HDPE v římse DN 110 - DN 140	m	40,000			ÚRS
	VV		<i>provizorní dešťové svody 4x10 m</i>					
		359901212R	Kamerová zkouška kanalizace f. Herčík a Kříž	kus	1,000			R
	VV		<i>dle příložené CN +12,5%</i>					
17	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000			CS ÚRS 2022 01
D	VRN3		Zařízení staveniště					
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,00			SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Náklady na stavební buňky</li> <li>- Sklárky na staveništi</li> <li>- Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště</li> <li>- Připojení staveniště na inženýrské sítě</li> <li>- Zabezpečení staveniště</li> <li>- Staveništní mechanizace</li> <li>- Energie pro zařízení staveniště</li> <li>- Informační tabule na staveništi</li> <li>- Zrušení zařízení staveniště</li> <li>- Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště</li> </ul>					
	P							

# PŮDORYS VNĚJŠÍ KANALIZACE

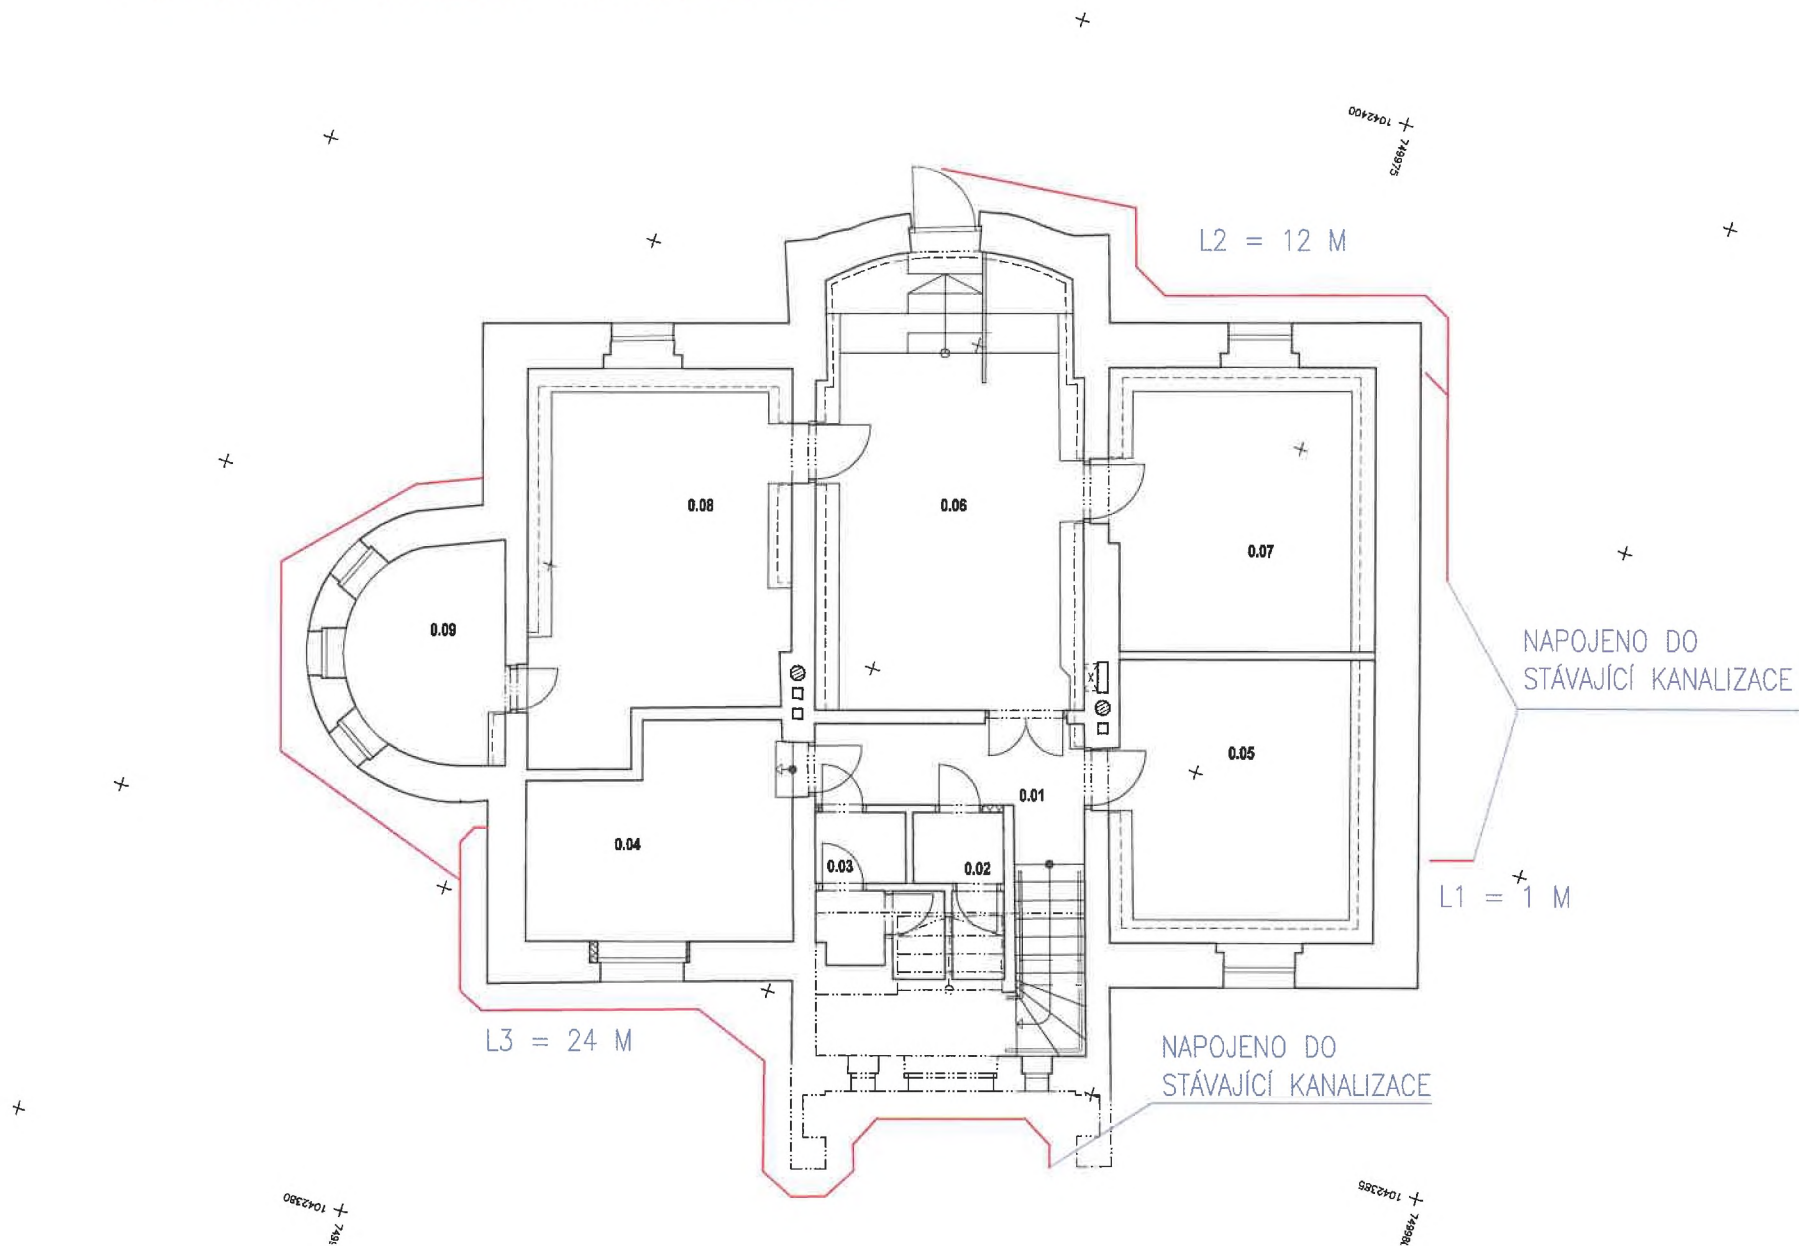

D2204470

09-09-2022

**HERČÍK a KŘÍŽ**

Faktura daňový doklad 2022003477

**03 2022 1565**

Dodavatel: HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.

K Háji 2639/7, Praha 5, 155 00, CZ, IČO: 49356607, DIČ: CZ49356607, Web: <https://www.hercikakriz.cz> Registrováno 27.04.1993 u MS v Praze, oddíl C, vložka 18855

Variabilní symbol 2022003477  
 Konstantní symbol 308  
 Specifický symbol 18630197

Způsob úhrady Převodem  
 Bankovní účet 1387411879/2700  
 Banka UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
 IBAN CZ25 2700 0000 0013 8741 1879  
 BIC BACXCZPP

Vystavení 02.09.2022  
 DUZP 02.09.2022  
 Splatnost 02.10.2022

ODBĚRATEL

**KONSIT a.s.**  
 Půlkruhová 786/20  
 160 00 Praha  
 Czech Republic  
 IČO: 18630197 DIČ: CZ18630197

Kód : 71.20.19. Fakturujeme Vám za revizi potrubí kanalizace (vč. čištění). Dle Objednávky : OMS/2360301/536/22 Akce : Ruzyňská 26

Podíl	Název	Množství	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Celkem za položku
rp4	Čištění kanalizace s revizí do DN 250 do 10 m	1,000 ks				
	Revize kanalizace s čištěním do DN 250 do 10 m	1,000 ks				
	Revize kanalizace s čištěním do DN 250 11-50 m	39,000 m				
rp4	Čištění kanalizace s revizí do DN 250 11 - 50 m	39,000 m				
	Zpráva a záznam z kam. prohlídky - USB flash disk	1,000 ks				
	Trasování kanalizace	0,500 h				
	Doprava paušál 2A1 1712	1,000 j				
rp4	Doprava paušál 7AX 5131	1,000 j				

ba DPH	Základ daně	DPH
21 %		

CELKEM K ÚHRADĚ

Vyhotořil: Zuzana Konecká

V případě dotazů nás kontaktujte na mail [ucetni@hercikakriz.cz](mailto:ucetni@hercikakriz.cz), nebo tel. 733 126 610.

29-09-0
