



Projekt:	Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	2

Komu: ABC Chomutov spol. s r.o. Od Statutárnímu městu Chomutov

Stavební Objekt: stavební část, VZT

Předmět změny:

Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.

1. Rekonstrukce vnějších schodišť. - Při provádění zemních prací zjistil, že zídky, které ohraničují schodiště – vstupní schodiště do kuchyně a kanceláře vedoucí školní jídelny mají nedostatečné základy a nejsou odizolovány proti vodě a jsou v nevyhovujícím stavu (rozpadlé cihly). V DPS je řešena pouze oprava konstrukce schodišť, která by byla, podle názoru Zhotovitele nedostatečným řešením z hlediska dlouhodobé životnosti schodů a zídek.
2. Zabezpečení místnosti č. 1-20. PD řeší pouze mříž na jednom okně. Na základě objednatele a provozovatele bude doplněna mříž také na druhé okno.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy : Oznámení zhotovitele o včasném varování ze dne 23.2.2023 (schodiště) a 9.3.2023 (mříže)
Oznámení o claimu na dodatečnou platbu ze dne 29.3.2023

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Zástupcem zhotovitele byl předložen nový návrh - doloženo zákresem (viz. "výkresy").

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	78 175,11 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	78 175,11 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: ABC Chomutov spol. s r.o.

Stavební Objekt: stavební část, VZT

Předmět změny:

Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.

1. Rekonstrukce vnějších schodišť. - Při provádění zemních prací zjistil, že zídky, které ohraničují schodiště – vstupní schodiště do kuchyně a kanceláře vedoucí školní jídelny mají nedostatečné základy a nejsou odizolovány proti vodě a jsou v nevyhovujícím stavu (rozpadlé cihly). V DPS je řešena pouze oprava konstrukce schodišť, která by byla, podle názoru Zhotovitele nedostatečným řešením z hlediska dlouhodobé životnosti schodů a zídek.

2. Zabezpečení místnosti č. 1-20. PD řeší pouze mříž na jednom okně. Na základě objednatele a provozovatele bude doplněna mříž také na druhé okno.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy : Oznámení zhotovitele o včasné varování ze dne 23.2.2023 (schodiště) a 9.3.2023 (mříže)
Oznámení o claimu na dodatečnou platbu ze dne 29.3.2023

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Vyčíslení změny bude doloženo po zaměření skutečných ploch na místě stavby. Finanční objem bude následně doplněn.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	78 175,11 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
78 175,11 Kč

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-21

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radoš

KSO: 801 31
Místo: Chomutov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

IC: 00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

IC:
DIČ:
IC: 62757296
DIČ:

Podatel:

IC: 88529908
DIČ:

Zpracovatel:

Podatel:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.urs.cz](#).

Cena bez DPH			78 175,11
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	78 175,11	16 416,77
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			94 591,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-21

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radost

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		78 175,11	94 591,88	
ZL.2.1	schodiště JZ strana	39 507,38	47 803,93	STA
ZL.2.2	schodiště SZ strana	28 407,73	34 373,35	STA
ZL.2.3	Okenní mříž - místnost 1.20	10 260,00	12 414,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radost

Objekt:

ZL.2.1 - schodiště JZ strana

KSO:

8013112

Místo:

Chomutov

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

00261891

DIČ:

CZ00261891

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

62757296

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		39 507,38		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	39 507,38		21,00%	8 296,55
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	47 803,93	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti budovy MŠ Radost

Objekt: ZL.2.1 - schodiště JZ strana

Místo: Chomutov

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	39 507,38
HSV - Práce a dodávky HSV	3 133,99
1 - Zemní práce	3 133,99
S - Přesuny sutí	36 373,39
2 - Zakládání	5 247,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 086,00
4 - Vodorovné konstrukce	6 819,94
5 - Komunikace pozemní	4 715,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 023,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 854,38
998 - Přesun hmot	4 141,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radost

Objekt:

ZL.2.1 - schodiště JZ strana

Místo:

Chomutov

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 507,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 133,99

D	1		Zemní práce					
1	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	1,248			
	PP		Ruční výkop v hornině 4					
	VV		založení - pásy					
	VV		1,3*0,6*0,8*2		1,248			
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,248			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
3	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6,240			
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km					
	VV		1,248*5 'Přepočtené koeficientem množství		6,240			
26	K	1671111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,248			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutečného výkopku nebo sypaliny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.wcs.cz/item/CS_UIS_2023_01/2671111101					
5	K	171201201R00	Uložení sypaliny na skládku	m3	1,248			
	PP		Uložení sypaliny na skládku					
28	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,248			
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4					
D	S		Presuny sutí					
17	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,788			
	PP		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km					
18	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,880			
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV		1,788*10 'Přepočtené koeficientem množství		17,880			
19	K	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	1,788			
	PP		Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m					
20	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,788			
	PP		Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky					
21	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	1,788			
	PP		Poplatek za skládku					
D	2		Zakládání					
7	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,652			
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.wcs.cz/item/CS_UIS_2023_01/271532213					
	VV		1,5*0,5*0,2*2		0,300			
	VV		1,5*1,172*0,2		0,352			
	VV		Součet		0,652			
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,040			
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.wcs.cz/item/CS_UIS_2023_01/274313711					
	VV		založení - pásy					
	VV		1,3*0,5*0,8*2		1,040			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
9	K	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	1,950			
	PP		Nadrzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu tř. 20/25, tloušťky zděve přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.wcs.cz/item/CS_UIS_2023_01/311113142					
	VV		2*1,3*0,75		1,950			
10	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,008			
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odskloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.wcs.cz/item/CS_UIS_2023_01/311361821					
	VV		1,3*2*2*0,89/1000*1,15		0,005			
	VV		1,3*0,5*2*1,15*0,22/1000*1,15*2		0,003			
	VV		Součet		0,008			
D	4		Vodorovné konstrukce					
11	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,977			
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.wcs.cz/item/CS_UIS_2023_01/430321414					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		deska					
	W		1,5*0,4*0,3		0,180			
	W		1,5*1,172*0,3		0,527			
	W		schod.st.					
	W		1,5*0,3*0,3		0,135			
	W		1,5*0,3*0,15*2		0,135			
	W		Součet		0,977			
12	K	430382021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi KARI	t	0,027			
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp sklapřů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://bezdělniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430382021					
	W		1,5*0,4*4,44*2/1000*1,25		0,007			
	W		1,5*1,172*4,44*2/1000*1,25		0,020			
	W		Součet		0,027			
13	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,875			
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://bezdělniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433351131					
	W		1,5*0,15*3		0,875			
14	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,876			
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://bezdělniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433351132					
	D	5	Komunikace pozemní					
15	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2,025			
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetáním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikost dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://bezdělniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596841120					
	W		dlažba na podestu je v SOD					
	W		1,5*0,3*3		1,350			
	W		1,5*0,15*3		0,875			
	W		Součet		2,025			
16	M	BET.CANCO1	BEST-CANTO17CM PŘÍRODNÍ	kus	15,000			
	PP		BEST-CANTO17CM PŘÍRODNÍ					
	W		1,5*0,3*3		15,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
22	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	4,253			
	PP		Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tloušťky síti					
	Online PSC		https://bezdělniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001					
	W		schod.stlky					
	W		(1,175+0,4)*(0,75+0,2+0,4)*2		4,253			
27	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	4,253			
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probavená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://bezdělniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním	m3	0,742			
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://bezdělniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511114					
	W		výbupnutí schodiště					
	W		deska					
	W		1,5*0,4*0,2		0,120			
	W		1,5*1,172*0,2		0,352			
	W		schod.st.					
	W		1,5*0,3*0,3		0,135			
	W		1,5*0,3*0,15*2		0,135			
	W		Součet		0,742			
	D	998	Přesun hmot					
25	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	8,120			
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radost

Objekt:

ZL.2.2 - schodiště SZ strana

KSO:

8013112

Místo:

Chomutov

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

00261891

DIČ:

CZ00261891

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

62757296

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		28 407,73	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	28 407,73	21,00%	5 965,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 373,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radost

Objekt:

ZL.2.2 - schodiště SZ strana

Místo:

Chomutov

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 407,73

17 - Konstrukce ze zemin	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 459,92
1 - Zemní práce	4 459,92
S - Přesuny sutí	22 487,66
2 - Zakládání	6 475,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 431,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 725,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 471,04
998 - Přesun hmot	3 113,04
PSV - Práce a dodávky PSV	1 460,15
713 - Izolace tepelné	1 460,15

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radost

Objekt:

ZL.2.2 - schodiště SZ strana

Místo:

Chomutov

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 407,73

D	17	Konstrukce ze zemin	0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 459,92
D	1	Zemní práce	4 459,92

1	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	1,776	
PP			Ruční výkop v hornině 4			
VV			založení - pásy			
VV			1,85*0,6*0,8*2		1,776	
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,776	
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m			
3	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	8,880	
PP			Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km			
VV			1,776*5 'Přepočtené koeficientem množství		8,880	
4	K	1671111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,776	
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhrazeného výkopku nebo sypání ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3			
Online PSC			https://podniky.uzs.cz/item/CS_UHS_2023_01/267111101			
5	K	171201201R00	Uložení sypání na skládku	m3	1,776	
PP			Uložení sypání na skládku			
25	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,776	
PP			Poplatek za skládku horniny 1- 4			

D S Přesuny sutí

7	K	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,915	
PP			Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km			
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,150	
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km			
VV			0,915*10 'Přepočtené koeficientem množství		9,150	
9	K	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,915	
PP			Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m			
10	K	979087113R00	Nakládání výbour.hmot na doprav.prostředky	t	0,915	
PP			Nakládání výbour.hmot na doprav.prostředky			
11	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,915	
PP			Poplatek za skládku			

D 2 Zakládání

12	K	271532213	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,444	2
PP			Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním a urovňováním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm			
Online PSC			https://podniky.uzs.cz/item/CS_UHS_2023_01/271532213			
VV			1,85*0,6*0,2*2		0,444	
VV			Součet		0,444	
13	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,480	3
PP			Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25			
Online PSC			https://podniky.uzs.cz/item/CS_UHS_2023_01/274313711			
VV			založení - pásy			
VV			1,85*0,6*0,8*2		1,480	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14	K	311113142	Nosná zed' tl.přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	2,775	1
PP			Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, součty zdiva přes 150 do 200 mm			
Online PSC			https://podniky.uzs.cz/item/CS_UHS_2023_01/311113142			
VV			2*1,85*0,75		2,775	
15	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,012	64
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500			
Online PSC			https://podniky.uzs.cz/item/CS_UHS_2023_01/311361821			
VV			1,85*2*2*0,89/1000*1,15		0,008	
VV			1,85*0,5*2*1,15*0,22/1000*1,15*2		0,004	
VV			Součet		0,012	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,995	
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklovitým vtačením do trnů stěn			

Strana 3 z 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podniky.uzs.cz/item/CS_UHS_2023_01/622142001					
	VV		schod.zidky					
	VV		1,85*(0,75+0,2+0,4)*2		4,995			
24	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	4,995			
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
Online PSC			https://podniky.uzs.cz/item/CS_UHS_2023_01/622511112					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,416			
PP			Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
Online PSC			https://podniky.uzs.cz/item/CS_UHS_2023_01/962042320					
VV			obourání zábradloví zidky					
VV			1,85*0,75*2*0,15		0,416			
D	998		Přesun hmot					
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 8 do 12 m	t	6,104			
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovné dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	713		Izolace tepelné					
20	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,775			
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
Online PSC			https://podniky.uzs.cz/item/CS_UHS_2023_01/713131143					

WV		schod.zidky			2,775
WV		1,85*0,75*2			
21	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	2,914
PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm			
WV		2,775*1,05'Přepočtené koeficientem množství			2,914
22	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,022
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m			
Online PSC		https://pismokv.usc.cz/tem/CS_USF_2023_01/998713101			
23	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,022
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k očním za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu			
Online PSC		https://pismokv.usc.cz/tem/CS_USF_2023_01/998713181			

Strana 4 z 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snižení energetické náročnosti budovy MŠ Radost

Objekt:

ZL.2.3 - Okenní mříž - místnost 1.20

KSO: 8013112
Místo: Chomutov

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ: 62757296
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		10 260,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 260,00	21,00%	2 154,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 414,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radost

Objekt: **ZL.2.3 - Okenní mříž - místnost 1.20**

Místo: Chomutov

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem


10 260,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

10 260,00

DOKUMENTACE

SCHODISTE ^{u v} VĚ STRANIA

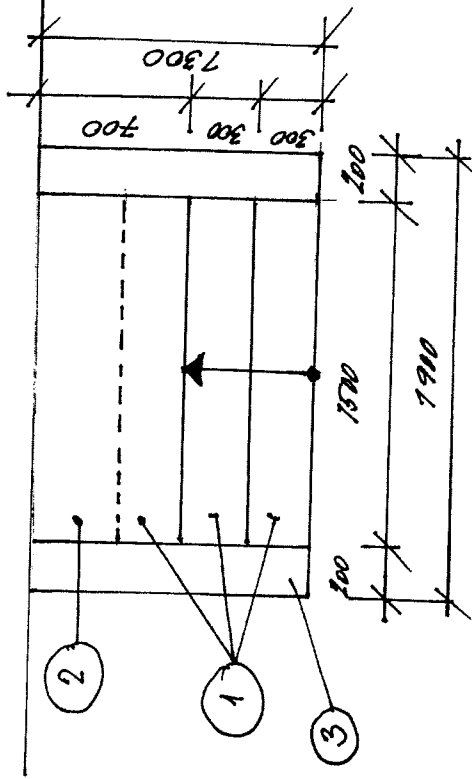

- ① SCODNICE BEST - CANTO TRIOJUNI
- ② KERATICKA TLAĐA
- ③ TH'RNICE XTRACINEHO ŽEDNENI

STRALS IS 345/100725
17

- ROZKHERY DLE 7D STAVANICI STAV
- SODDNICE DLE 7D
- SODDISTSODHA' KIDKA KOKA - KUDAGRENE BEDNENI
TUTAKENE' SKODLAKNITIH TLETIVET, PLACENIY DO
THELO. FINANLI NODAKOKA' KUKTA SODDUA SE
SODLET ODLETV.





Výtah ze zápisu kontrolního dne

Na KD č. 12 dne 22. 2. 2023 byly řešeny následující záležitosti, které nebyly dosud uzavřeny:

Zhotovitel při provádění zemních prací zjistil, že zídky, které ohraničují schodiště – vstupní schodiště do kuchyně a kanceláře vedoucí školní jídelny mají nedostatečné základy a nejsou odizolovány proti vodě a jsou v nevyhovujícím stavu (rozpadlé cihly). V DPS je řešena pouze oprava konstrukce schodišť, která by byla, podle názoru Zhotovitele nedostatečným řešením z hlediska dlouhodobé životnosti schodů a zídek. SpS vyzve AD k návrhu řešení. V případě schodiště do kuchyně by měl být návrh řešení koordinován s realizací nového přístavku. – SpS vyzval AD k návrhu řešení a účasti na dalším KD. AD sdělila, že se zúčastní KD dne 8. 3. 2023. – Zhotovitel vypracoval návrh na obnovení schodů a zídek. Bylo konzultováno s AD. Objednatel technicky odsouhlasil. Objednatel se následně vyjádří ke způsobu financování obnovení schodišť a zídek. – Objednatel sdělil, že obnovení schodišť a zídek bude financováno v rámci projektu na základě změnového listu. Zhotovitel připraví podklady pro změnové řízení.
