

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 31

SO, PS: D1.01.4.c Elektroinstalace

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na zvětšení UPS z důvodů doplnění vývodů pro požární větrání budoucího urgentního příjmu. Nový výkon UPS pro 1RPO.D3-DO – 5kW/doba zálohy 30 min.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: požadavkem ze strany zpracovatele dokumentace silnoproudu

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změn na konečný termín dokončení díla:

- Termín dodání 2 měsíce od objednání, původní varianta dodávky byla pozastavena
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změn na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **25 000,00 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 03.03.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1







Výtisk číslo: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci



BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

 vedoucí manažer stavby

 ředitel divize projektový

 člen představenstva


Jména odpovědných zástupců za objednatele:

 provozně technický náměstek

TDI
I - AD

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet stavby, ZL31

Stavba: **SIL**

Objekt: **01**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			25 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

25 000,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

21 981.



Položkový rozpočet, ZL31

S:	SIL
O:	Zvětšení UPS z důvodů doplnění vývodů pro požární větrání urgentního příjmu. Výkon UPS pro 1RPO.D3-DO – 5kW/doba zálohy 30min.
R:	D.1.01.4.c Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 259		1RPO.D3-DO				
238	281	UPS 3F/3F, náhradní zdroj pro napájení rozvaděče, výkon 4 kVA, doba zálohy 30 min, elektronický, bypass, ruční bypass - UPS umístěná pod rozvaděčem	ks			
		UPS 3F/3F, náhradní zdroj pro napájení rozvaděče, výkon 5 kVA, doba zálohy 30 min, elektronický, bypass, ruční bypass - UPS umístěná pod rozvaděčem	ks			
		Celkem				

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 32

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám na základě požadavku z kontrolního dne změnový list na odpočet světlovodu Z18. Zrušení světlovodu bylo rozhodnuto na základě zhodnocení na místě, kdy v prostoru místnosti D3 1.23 je umístěno dostatečně velké okno pro osvětlení této místnosti.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Požadavkem z kontrolního dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: -29 144,67 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 10.03.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1





Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci


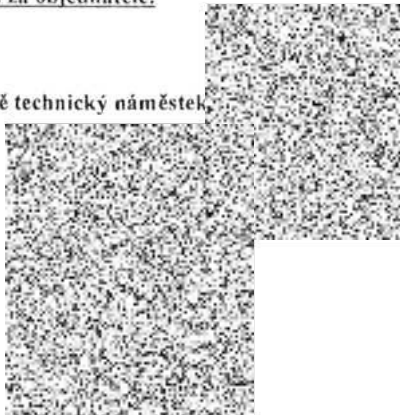
BLOCK
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

 vedoucí manažer stavby
 ředitel útvize projektový
 člen představenstva


 provozně technický náměstek
DI
AD


Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet stavby, ZL32

Stavba: ASŘ
Objekt: 01
Rozpočet: 01 **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
a.s.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-26 404,59
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-26 404,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 404,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -26 404,59 CZK

v



Za zhotovitele

dne




Za objednatele

Položkový rozpočet, ZL32

S:	ASŘ
O:	nerealizování světlovodu
R:	D.1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukci						
311	970051400R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm vč. kompletní skladby střešního pláště D.1.01 1-903: 0,7	m	-0,70000			/lastní	
				0,70000				
Díl: 712		Povlakové krytiny						
335	712_99_01	Úprava střešního pláště - lemování, prostupy, klempířské kce, neuvedené v samostatných položkách D 1.01 1-105: 0,6*0,6	m2	-0,36000			/lastní	
				0,36000				




Díl: 767		Konstrukce zámečnické							RTS 22/ II
458	Z_1B	D + M Světlovod, kompletně dle výpisu D1.01 1-501 Stěna vnitřní prosklená z hliníkových profilů Součástí stěny jsou dveře jednokřídlové otvíravé otočné, dva boční a jeden horní pevně zasklený světlík Zasklení dvojsklem bezpečnostním tvrzeným, čířým Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčiků 50x50 mm (o vzájemně rozleči max 150 mm) dobře viditelných proti pozadí Dveře a boční světlíky doplněny o meziskelní manuálně ovládané horizontální žaluzie - ovládání magnetem Kování: - klika / paniková klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče Povrchová úprava: - vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení Rozměr stěny: 2050 x 3000 mm Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm	ks	-1,00000			/lastní		

Celkem

Položkový rozpočet, ZL32

S:	ASŘ
O:	nerealizování světlovodu
R:	D.1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

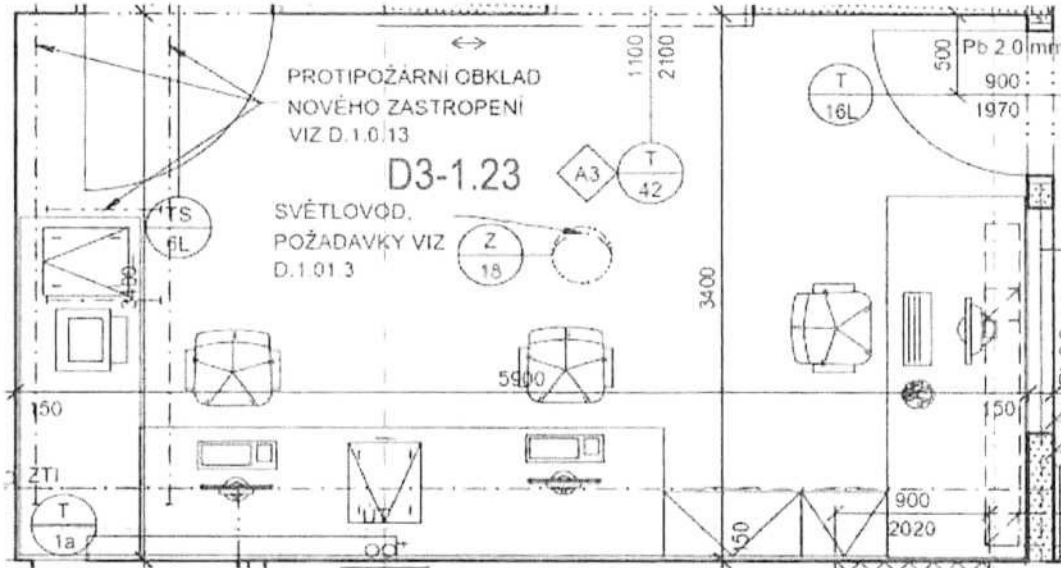

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33

SO, PS: D1.01. 4f Vzduchotechnika

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě změny projektové dokumentace ocelové konstrukce OK1, kde se nově jednotky chlazení osazují přímo na pororošty a tedy se nerealizují systémové konstrukce pro osazení na střešku, ale jednotky budou stát na gumových podkladních praxcích mimo jednotky 1C.02 a 7.01, které se osazují nad sebe. Změna byla vyvolána z důvodů změny chlazení MR, které je nově umístěno vč. výparníku na střeše objektu.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny v případě odsouhlasení do 30.4.2024
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: - 66 428,39 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovnik: 1x zhotovitel

Datum vydání: 14.03.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

vedoucí manažer stavby
ředitel divize projektový management
člen představenstva

provozně technický náměstek
TDI
á - AD

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2.02-02 / V10 / v 5 ka dní 12.02.2016

Datum vydání: 14.03.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL33

Stavba: **VZT**

Objekt: **01**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-66 428,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-66 428,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-66 428,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-66 428,39 CZK**

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Zařídil:



Položkový rozpočet, ZL33

S:	VZT
O:	Gumové podkladní bloky místo systémových kcí, nová systémová kce
R:	D.1.01.4f Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01a.		Zdroj chladu zař. 1						
56	1a 01 5	Systémová konstrukce pro osazení na střechech, nosnost 100 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace	ks	-1,00000			Vlastní	
	1a 01 5	Podkladní blok - gumový pražec 1000	ks	2,00000			individuální cena	
Díl: 01c.		Dochlazení vyšetřovny						
72	1c.02 5	Systémová konstrukce pro osazení na střechech, nosnost 100 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace	ks	-1,00000			Vlastní	
	1c.02.5	Podkladní blok - gumový pražec	ks	2,00000			individuální cena	
Díl: 02a.		Zdroj chladu zař. 2						
138	2a 01 5	Systémová konstrukce pro osazení na střechech, nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace	ks	-1,00000			Vlastní	
	2a.01.5	Podkladní blok - gumový pražec	ks	3,00000			individuální cena	
Díl: 04a.		Zdroj chladu zař. 4						
242	4a 01 5	Systémová konstrukce pro osazení na střechech, nosnost 100kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace	ks	-2,00000			Vlastní	
	4a.01.5	Podkladní blok - gumový pražec	ks	4,00000			individuální cena	
Díl: 06a		Chlazení VRV						
268	6a 01a	Systémová konstrukce pro osazení na střechech, nosnost 200kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace	ks	-1,00000			Vlastní	
	6a 01a	Podkladní blok - gumový pražec	ks	2,00000			individuální cena	
Díl: 06b		Chlazení VRV						
297	6b 01 1	Systémová konstrukce pro osazení na střechech, nosnost 200kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace	ks	-1,00000			Vlastní	
	6b 01 1	Podkladní blok - gumový pražec	ks	3,00000			individuální cena	
