

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko
 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.11.2021 + Dodatek č.1 ze dne 6.12.2021
Změny V.etapa-zámkový sál

Číslo změny stavby:

ZL 10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.11. 2021(dále jen Smlouva) a Dodatku č.1:
 Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
 Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah:

Položkový rozpočet	1
Výkresová část, podklady	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	1

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor

Dopad do termínu	ANO / NE *
-------------------------	-------------------

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

1) Dodatečně požadavky v rámci zprovoznění zámkového sálu očního oddělení vzniklé v průběhu realizace výstavby. Změnový list řeší doplnění nosné ocelové konstrukce do stropu z důvodu přenesení zatížení z operačních stativů, doplnění izolované soustavy a akustické podhledy z důvodu zamezení přenosu zvuku mezi ambulancemi.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-24 568,00 Kč	188 860,70 Kč	164 292,70 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Marek Kovář	datum	13.09.2023	podpis
-----------------	------------------	-------	------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	MUDr. Martin Svoboda	datum	13.09.2023	podpis
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	13.09.2023	podpis
Zhotovitel	Josef Kubanek	datum	13.09.2023	podpis

Vojenská nemocnice Olomouc
 Sušilovo nám. 5
 779 00 OLOMOUC
 IČ: 608 00 691, DIČ: CZ60800691

SPZ DESIGN
 SPZ DESIGN, s.r.o.
 Moravská 359/13
 779 00 Olomouc - Holice
 IČ: 278 31 132 (1)

Stavba: VN Olomouc - rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů


Objekt: Ocelová k-ce, 5.etapa doplnění pro stativy

List Rozpočtu	Místn os č.	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
04430001 - Stavební úpravy	2.240	37	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0.247	55 800.00	13 754.70	podle SoD
					dodatečné osazení nosníku pro stativ na zákrovovém sále					
					CELKEM				13 754,70 Kč	

vícepráce
méněpráce
celkem za rozpočet

13 754,70 Kč
0
13 754,70 Kč

ZL 10 – Ocelová k-ce, Zákrokový sál

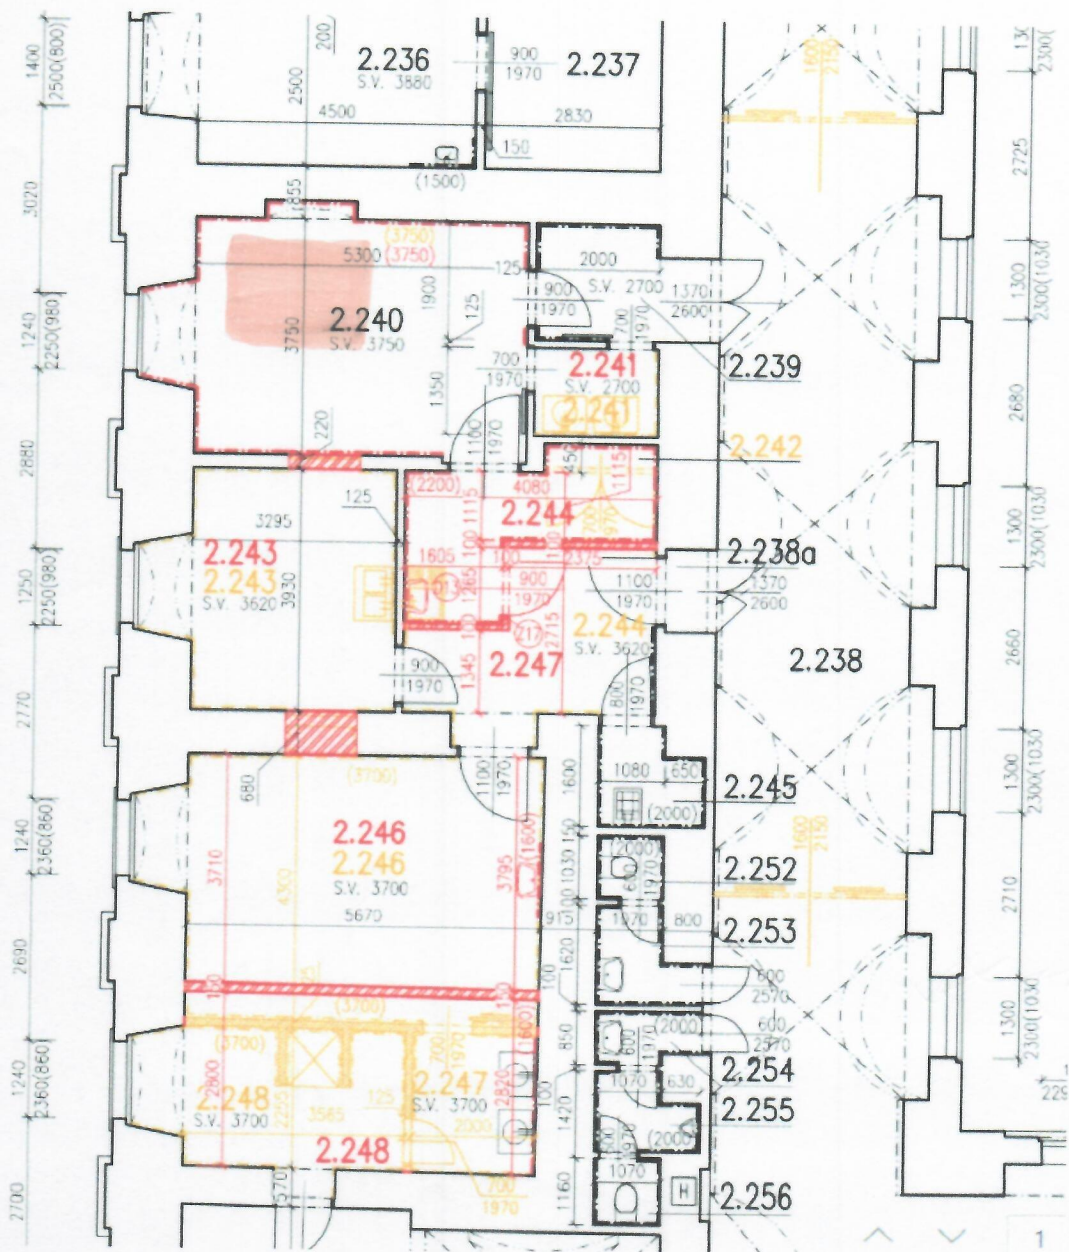

Stavba

VN Olomouc- rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů

Objekt

ZIS implementace pro stávající ROP 21


1	K	Náklady na dopravu					
		Dodávky ZIS (HAKEL) 1x ATyS g M - 2P 40A 230Vac - Automatický přepínač sítě pro UPS/ZIS zások, 1x Propojka ATyS M 4P 40-125A, 1x Pomocný kontakt ATyS M, 1x Kryt svorek do 160A (2ks v balení), 1x MDS-D signalizační panel	ks	1 000	950,00		950,00
2	M	Dodávky jističů, spínačů, ochranných komponentů, svorek dle aktuální PD ROP21-ZIS mimo jističí komponenty uvedené v původní PD rozváděč ROP 21 - ZIS/DO/VDO - v č. D 1 4 3 2 57	ks	1 000	54500,00		54500,00
3	M	Zapojení a prodrátování všech komponentů ZIS včetně prvků viz výše - položky z bodu č. 2 a č. 3 (jedna se o položky nad ramec původní PD ROP 21 - ZIS/DO/VDO - v č. D 1 4 3 2 57)	kpl	1 000	7 850,00		7 850,00
4		Oživení ZIS specialistou	ks	1 000	26500,00		26500,00
5		Náklady na vypracování PD - ROP21-ZIS	ks	1 000	15800,00		15800,00
6		Monitoring UPS kabeláž	ks	1 000	12500,00		12500,00
7	M	Kabel vícežilový 4x2x0,8	m	30 000	20,00		600,00
8	K	Zednické přípomocce-sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč. dodávky materiálu	hod	5	329,00		1 350,00
Celkem							120050,00

vícepráce
méněpráce
celkem za rozpočet

120 050,00 Kč
0
120 050,00 Kč




ZL 10 – ZIS

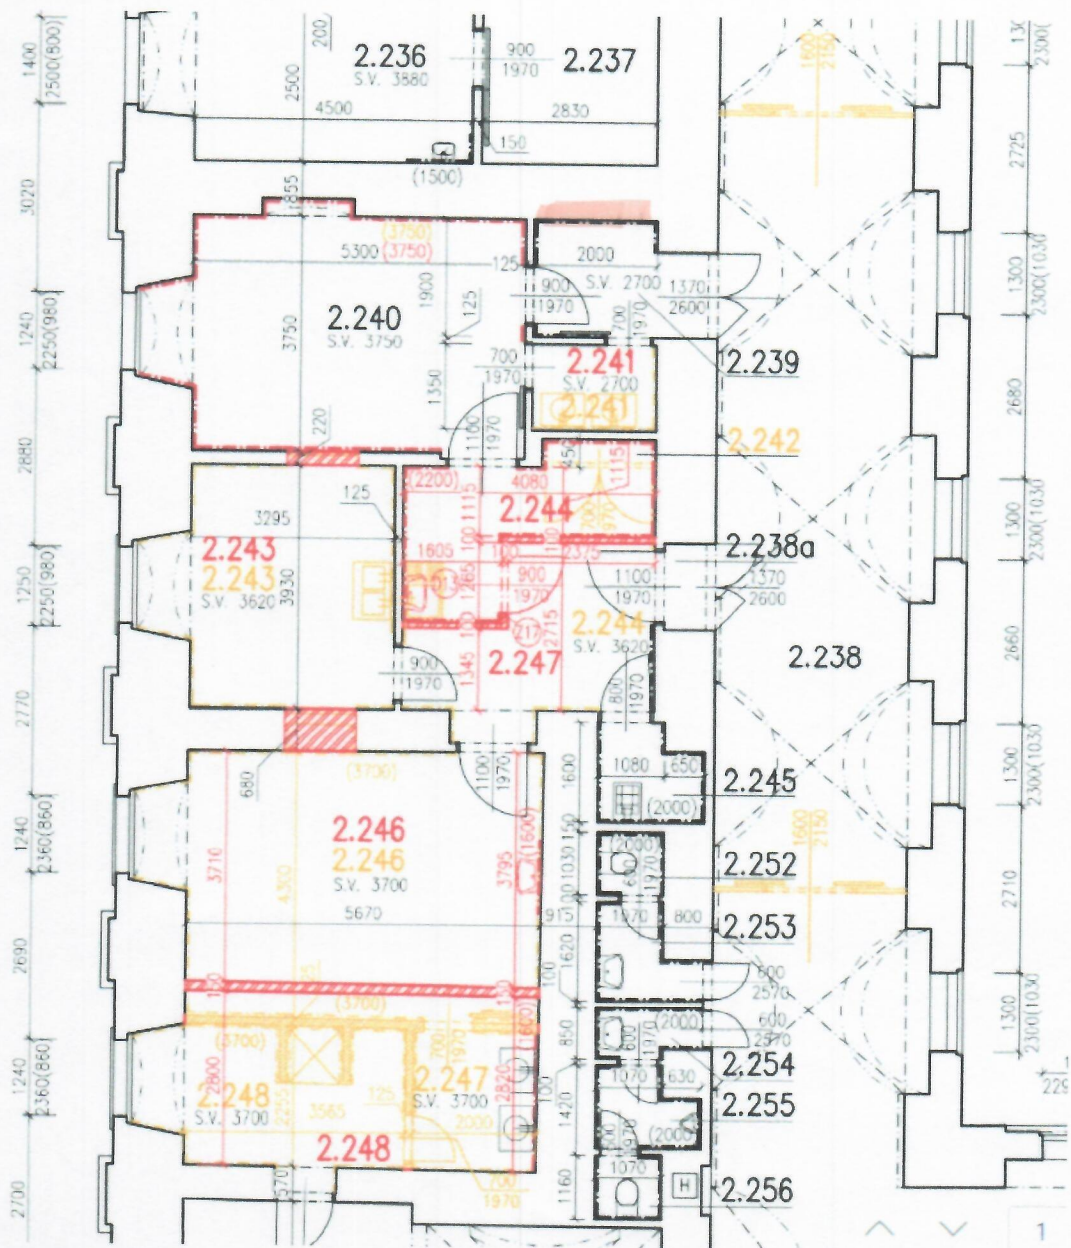

Stavba: VN Olomouc- rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů

Objekt: doplnění protihlukového podhledu do vyšetřovny

PČ	Typ	Kód	Popis	M J	Množství	J cena	Cena celkem (CZK)	soustava
283	K	763131442	SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m ³ dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-37,000	664,00	-24 568,00	SOD
	M		Podhled kazetový, Rockfon Sonar sdB41 600/600/35	m2	37	1488	55056,00	vlastní

vícepráce
méněpráce
celkem za rozpočet

55 056,00 Kč
-24 568,00
30 488,00 Kč



Varianta 2:

Rockfon Sonar dB41 600x600x35 informace na odkazu

<https://www.rockfon.cz/produkty/rockfon-sonar-db-41/#Dokumentaceanávody>

Cena za 1m² 1 488 Kč bez DPH Celkem 37m² x 1 488 = 55 056 Kč

Dostupnost 14 od objednání

Podélná neprůzvučnost 41dB

ZL 10 – SDK podhled

