

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucrekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

**Evakuační rozhlas, doplnění strukturované kabeláže, doplnění
bezdotykového otevírání dveří, napojení dveří JIP a ARO na
systém EPS, zásuvky STA, zásuvka PC, wifi přízemí, stativy v OS,
sterilizace**

Číslo změnového listu stavby:

ZL 9

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023(dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:

Řešené změny

4

Položkový rozpočet

4

Výkresová část, podklady

3

Další doklady nezbytné pro popis, řádné
zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

0

Paré č.

1

Příjemce

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

Dopad do termínu

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

V průběhu realizace díla došlo k poruše části stávajícího požárního rozhlasu, který již není kompatibilní s nově navrženým systémem požární ochrany a nelze jej dále využívat. Proto je ze strany objednatele požadována výměna a dopojení nového systému požární ochrany budovy, který lze plně spárovat se stávajícím systémem. Doplnění strukturované kabeláže z důvodu zajištění chodu slp rozvodů v budově. V průběhu realizace stavby byl vznesen požadavek ze strany uživatele na bezdotykové otevírání hlavních dveří na oddělení ARO, JIP a operačních sálů. Důvodem požadavku je hygienické bezdotykové otevírání do čistých prostor oddělení. Tento typ otevírání nebyl součástí projektové dokumentace. Na základě požadavku objednatele pro bezdotykové ovládání dveří do jednotlivých oddělení ARO, JIP, operační sály muselo být provedeno v rámci bezpečného provozu doplnění dveří k systému elektronické požární ochrany objektu. Při vyhlášení požáru dojde k aktivaci dveří a systém automaticky odemkne tyto dveře pro zajištění bezpečného úniku. Na základě provozu nemocnice byly rošířeny požadavky na datové krabice v dalších prostorách a místech, včetně kabelových tras z přípojných míst - sterilizace, přípravná, napojení WiFi v 1.NP a napojení na stativy v OS (nebylo součástí PD)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	525 596,33 Kč	525 596,33 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Albin Gottwald

datum

15.9.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele (TDI) Ing. Marek Kovář

datum

15.9.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum

15.9.2023

podpis

Zhotovitel

Aleš Musil

datum

15.9.2023

podpis

SPZ
DESIGN

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132 (1)



merit

NÁZEV STAVBY: VN Olomouc - Návrh opravy SLP rozvodů ARO		
OBJEKT: Elektronické komunikace		
	Název technologie	Celkem
SK	Strukturovaná kabeláž	96 792,80
NZS	Nouzový zvukový systém	271 991,26
MT	Monitorování teplot	
Celkové náklady bez DPH		368 784,06
Základní DPH (21%)		77 444,65
Celkové náklady s DPH		446 228,71
MERIT GROUP a.s. a / Březinova 136/7, 779 00 Olomouc t / +420 585 226 185, f / +420 585 230 206 e / merit@merit.cz, w / www.merit.cz IČO 64609995, DIČ CZ699000785 BU ČSOB 377897583/0300 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221		

Datum: 24. května 2023

Zpracoval : Ing Miroslav Kavka

15.9.2023

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

#####

#####

#####

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem

96 792,80

Díl M23.01 SK - Strukturovaná kabeláž

96 792,80

1	K		Montáž - Optický rozvaděč - kompletní pro 24 vláken SC/Pc	ks	2	2 573,70	5 147,40
2	M		Dodávka - Optický rozvaděč - kompletní pro 24 vláken SC/Pc	ks	2	2 350,60	4 701,20
	PP		Optický rozvaděč - Vana optická 19" 1U s vysuvným šuplíkem bez čela. Čelo k optické vaně pro 24 SC konektorů. 1xKazeta pro 24 svárů, včetně vika, hřebíků a ochrann svárů. 24xAdapter SC/Pc SM simplex. 24xOptický pigtail 9/125um SC 1m. Ochrana svárů. Označení vyvodu segmentů				

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 1+0+0+1

3	K		Montáž - Access Point (Přístupový bod)	ks	1	770,00	770,00
4	M		Dodávka - Access Point (Přístupový bod)	ks	1	15 600,00	15 600,00
	PP		Access Point - Maximální přenosová rychlost: 1774 Mbit/s. Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz): 574 Mbit/s. Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz): 1200 Mbit/s. Porty: 1 x 10/100/1000 BASE-T. Standard: 802.11a/n/ac/ax. Šifrování/zabezpečení: WPA3, WPA, WPA2. Konektor USB Typ-A. Maximální spotřeba energie: 16,5 W. Umístění: Strop, Zed, Barva: Bílá				

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 0

5	K		Montáž - Konektor RJ45 Cat 6A, STP, nestíněný na drát (CCTV, WiFi...)	ks	1	99,00	99,00
6	M		Dodávka - Konektor RJ45 Cat 6A, STP, nestíněný na drát (CCTV, WiFi...)	ks	1	17,71	17,71

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 0+3+0+0

7	K		Montáž - Kabel datový STP, Cat. 6A, B2ca s1d1a1	m	100	27,50	2 750,00
8	M		Dodávka - Kabel datový STP, Cat. 6A, B2ca s1d1a1	m	100	18,85	1 885,00

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 826+2115+0+0

9	K		Montáž - Kabel optický 24 vl., 9/125um, SM, FR-LSZH, B2ca-s1 d0 a1	m	124	28,80	3 571,20
10	M		Dodávka - Kabel optický 24 vl., 9/125um, SM, FR-LSZH, B2ca-s1 d0 a1	m	124	65,70	8 146,80

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 12+46+4+32

11	K		Montáž - Svazkový držák kabelů	ks	15	30,80	462,00
12	M		Dodávka - Svazkový držák kabelů	ks	15	21,51	322,65

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 0+154+0+0

13	K		Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	124	55,33	6 860,92
14	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	124	29,48	3 655,52

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 0+110+0+0

15	K		Rozebrání a znovuosazení SDK pohledu	m	12	220,00	2 640,00
----	---	--	--------------------------------------	---	----	--------	----------

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 0+106+0+22

16	K		Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	1	165,00	165,00
----	---	--	---	----	---	--------	--------

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 59

17	K		Svár optického vlákna	ks	48	417,50	20 040,00
----	---	--	-----------------------	----	----	--------	-----------

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 48

18	K		Měření optického vlákna, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	24	556,60	13 358,40
----	---	--	---	----	----	--------	-----------

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 24

19	K		Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1	6 600,00	6 600,00
----	---	--	---	-----	---	----------	----------

V V Vyměry dle výkresu: 02, 03, 04, 05

V V 1

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV STAVBY: VN Olomouc - Návrh opravy SLP rozvodů ARO

OBJEKT: Elektronické komunikace

Datum: 24. května 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem

Díl M23.02 NZS - Nouzový zvukový systém

271 991,26

271 991,26

1	K		Montáž - Optický nástěnný rozvaděč k uložení 6 optických konektorů ve vnitřním i venk. prostředí	ks	1	687,00	687,00	nová položka
2	M		Dodávka - Optický nástěnný rozvaděč k uložení 6 optických konektorů ve vnitřním i venk. prostředí	ks	1	1 577,00	1 577,00	nová položka
	PP		Optický nástěnný rozvaděč - určen k uložení 6 optických konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí. Kapacita 6 optických konektorů SC. Uložení rezervy optického vlákna 2 m. Ranžirovací oka. PG průchodky. Uzamykatelné víko. Instalace na zeď					
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		1+0+0					
3	K		Montáž - Optický rozvaděč do racku - kompletní pro 6 vláken SC/Pc	ks	1	710,00	710,00	nová položka
4	M		Dodávka - Optický rozvaděč do racku - kompletní pro 6 vláken SC/Pc	ks	1	1 944,00	1 944,00	nová položka
	PP		Optický rozvaděč - Vana optická 19" 1U s výsuvným šuplíkem bez čela. Čelo k optické vaně pro 12 SC konektorů. 1xKazeta včetně víka, hřebínku a ochrany sváru. 6xAdapter SC/Pc SM simplex. 6xOptický pigtail 9/125um SC 1m. 6x záslepky. Ochrana sváru. Označení vyvodu segmentu					
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		0+1+0					
5	K		Montáž - Optický převodník SM přes rozhraní DAL (úředna) vč. instalační krabice	ks	1	278,00	278,00	nová položka
6	M		Dodávka - Optický převodník SM přes rozhraní DAL (úředna) vč. instalační krabice	ks	1	26 411,00	26 411,00	nová položka
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		1+0+0					
7	K		Montáž - Optický převodník SM přes rozhraní DAL (mikrofonní stanice) vč. instalační krabice	ks	1	278,00	278,00	nová položka
8	M		Dodávka - Optický převodník SM přes rozhraní DAL (mikrofonní stanice) vč. instalační krabice	ks	1	26 894,00	26 894,00	nová položka
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		0+1+0					
9	K		Montáž - Externí síťový zdroj 3A/24VDC 17Ah EN 54-4	ks	1	1 044,00	1 044,00	nová položka
10	M		Dodávka - Externí síťový zdroj 3A/24VDC 17Ah EN 54-4	ks	1	11 449,00	11 449,00	nová položka
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		1+0+0					
11	K		Montáž - Akumulátor 12V DC/17 Ah	ks	2	63,00	126,00	nová položka
12	M		Dodávka - Akumulátor 12V DC/17 Ah	ks	2	1 543,00	3 086,00	nová položka
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		2+0+0					
13	K		Montáž - Kabel silový 2x2,5mm2 B2ca-s1d1a1 P60	m	838	26,40	22 123,20	SoD nouzový zvukový systém p.č. 19
14	M		Dodávka - Kabel silový 2x2,5mm2 B2ca-s1d1a1 P60	m	838	40,36	33 821,68	SoD nouzový zvukový systém p.č. 20
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		0+128+710					
15	K		Montáž - Kabel optický 6 vl. G 657 A1, LSZH, B2ca-s1a.d2 a1, funkční integrita 180min	m	190	28,80	5 472,00	nová položka
16	M		Dodávka - Kabel optický 6 vl. G 657 A1, LSZH, B2ca-s1a.d2 a1, funkční integrita 180min	m	190	53,10	10 089,00	nová položka
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		108+8+74					
17	K		Montáž - Krabice propojovací s požární odolností se svorkovnicí	ks	1	765,00	765,00	nová položka
18	M		Dodávka - Krabice propojovací s požární odolností se svorkovnicí	ks	1	1 877,00	1 877,00	nová položka
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		0+1+0					
19	K		Montáž - Skupinový držák kabelů, požárně odolný vč. šroubu do betonu	ks	331	46,00	15 226,00	nová položka
20	M		Dodávka - Skupinový držák kabelů, požárně odolný vč. šroubu do betonu	ks	331	36,80	12 180,80	nová položka
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		0+39+292					
21	K		Montáž - Přichytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	298	7,70	2 294,60	SoD nouzový zvukový systém p.č. 23
22	M		Dodávka - Přichytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	298	14,81	4 413,38	SoD nouzový zvukový systém p.č. 24
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		76+0+222					
23	K		Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení	ks	12	66,00	792,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 67
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		2+2+8					
24	K		Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení	ks	1	77,00	77,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 68
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		1+0+0					
25	K		Průraz stěnou do 80cm, vč. zapravení	ks	1	176,00	176,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 70
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		1+0+0					
26	K		Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	950,00	950,00	SoD nouzový zvukový systém p.č. 28
27	M		Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	1 200,00	1 200,00	SoD nouzový zvukový systém p.č. 29
	VV		Výměry dle výkresu: 06, 07, 08					
	VV		1					
28	M		Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (koby, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1	3 500,00	3 500,00	SoD nouzový zvukový systém p.č. 30

29	K	Demontaž komponentů NZS	hod	16	825,00	13 200,00	SoD slaboproud
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 16							
30	K	Rozebrání a znovuosazení SDK podhledu	m	102	220,00	22 440,00	SoD strukturovana kabeláž p.č.76
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 26+10+66							
31	K	Svar optického vlákna	ks	12	417,50	5 010,00	nová položka
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 12							
32	K	Měření optického vlákna vč. vypracování měřicího protokolu	ks	6	556,60	3 339,60	nová položka
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 6							
33	K	Programování a zprovoznění systému NZS	hod	8	825,00	6 600,00	SoD slaboproud
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 8							
34	K	Funkční zkouška systému NZS	hod	6	1 650,00	9 900,00	SoD slaboproud
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 6							
35	K	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1	3 850,00	3 850,00	SoD nouzový zvukový systém p.č.33
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 1							
36	K	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	3	880,00	2 640,00	SoD slaboproud
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 3							
37	K	Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu (povinná náležitost dle ČSN EN 50849)	kpl	1	8 970,00	8 970,00	SoD nouzový zvukový systém p.č.36
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 1							
38	K	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1	1 100,00	1 100,00	SoD nouzový zvukový systém p.č.35
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 1							
39	K	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	5 500,00	5 500,00	SoD nouzový zvukový systém p.č.37
V/V Vyměry dle výkresu: 06_07_08 1							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
Objekt: 01 Změnové listy
Rozpočet: 009.2 ZL č.9.2 - Doplnění bezdotykového otvírání dveří-vstup ARO, JIP, operační sály

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: 60800691
 Sušilovo nám. 1/5 DIČ: CZ60800691
 77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: 25527380
 Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
 79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Hana
 Dubravová

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			82 157,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 216,00
Celkem			90 373,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	90 373,00 CZK
Základní DPH	21 %	18 978,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 109 351,33 CZK

v

dne

7.9.2023



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	009.2	ZL č.9.2 - Doplnění bezdotykového otvírání dveří-vstup ARO, JIP, operační sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				82 157,00	
1	101.101	Doplnění bezdotykového otvírání dveří-vstup ARO, JIP, operační sály - viz příloha nabídka 2 Max + s.r.o. - Elektrosystémy	kpl	1.00000	82 157,00	82 157,00	nová položka
Díl: ON		Ostatní náklady				8 216,00	
2	00531 R	VRN - režijní náklady 8%	kompl	1.00000	6 573,00	6 573,00	nová položka
3	00532 R	VRN - správní režie 2%	kompl	1.00000	1 643,00	1 643,00	nová položka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: 009.3 ZL č.9.3 - napojení dveří JIP a ARO na systém EPS

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: 60800691
Sušilovo nám. 1/5 DIČ: CZ60800691
77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: 25527380
Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			40 538,64
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 538,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 538,64 CZK
Základní DPH	21 %	8 513,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 49 051,75 CZK

v

dne

11.9.2023


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	009.3	ZL č.9.3 - napojení dveří JIP a ARO na systém EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: M22.02		EPS - Elektrická požární signalizace				40 538,64	
1	Pol0 1	Dodávka a montáž záložního bateriového zdroje pro ovládání automatických	ks	3.00000	3 650,00	10 950,00	nová položka
2	Pol1 1	Drobný materiál	kpl	1.00000	600,00	600,00	nová položka
3	Pol223	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	1.00000	880,00	880,00	SoD EPS p č 52
4	Pol227	Montáž - Poplachový koppler (4 vstupy/2 výstupy)	ks	1.00000	797,50	797,50	SoD EPS p č 1
5	Pol229	Montáž - Deska izolátoru pro koppler vč. krytu	ks	1.00000	150,00	150,00	SoD EPS p č 3
6	Pol233	Montáž - Skříň pro bus - koppler na omítku	ks	1.00000	220,00	220,00	SoD EPS p č 7
7	Pol254	Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, P60	m	196.00000	24,74	4 849,04	SoD EPS p č 28
8	Pol258	Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	304.00000	18,70	5 684,80	SoD EPS p č 34
9	Pol228	Dodávka - Poplachový koppler (4 vstupy/2 výstupy)	ks	1.00000	4 250,40	4 250,40	SoD EPS p č 2
10	Pol230	Dodávka - Deska izolátoru pro koppler vč. krytu	ks	1.00000	317,50	317,50	SoD EPS p č 4
11	Pol234	Dodávka - Skříň pro bus - koppler na omítku	ks	1.00000	373,12	373,12	SoD EPS p č 8
12	Pol255	Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, P60	m	196.00000	32,77	6 422,92	SoD EPS p č 29
13	Pol259	Dodávka - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	304.00000	16,59	5 043,36	SoD EPS p č 35
Celkem						40 538,64	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: 009.4 ZL č.9.4 - zásuvky STA, zásuvka PC, wifi přízemí, Drager, sterilizace

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: 60800691
Sušilovo nám. 1/5 DIČ: CZ60800691
77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: 25527380
Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			25 900,63
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 900,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 900,63 CZK
Základní DPH	21 %	5 439,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 31 339,76 CZK

v

dne

15.9.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet


S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	009.4	ZL č.9.4 - zásuvky STA, zásuvka PC, wifi přízemí, Drager, sterilizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: M22.1		Zásuvka STA				3 520,18	
1	Pol197	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	2,00000	99,00	198,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 55
2	Pol1	Dodávka - zásuvka STA včetně krytu	ks	2,00000	263,00	526,00	nová položka
3	Pol198	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	2,00000	29,09	58,18	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 56
4	Pol2	Dodávka-Koaxiální kabel H 121	m	17,00000	20,00	340,00	nová položka
5	Pol3	Montážní práce-měření, napojení, zprovoznění	kpl	1,00000	2 398,00	2 398,00	nová položka
Díl: M22.2		Zásuvka PC - přípravná				8 095,06	
6	Pol171	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat 6A, STP - kompletní, pod omítku	ks	1,00000	275,00	275,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 29
7	Pol173	Montáž - Modulární konektor (keystone) Cat 6A, STP	ks	4,00000	99,00	396,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 31
8	Pol177	Montáž - Kabel datový STP, Cat. 6A, B2ca s1d1a1	m	142,00000	27,50	3 905,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 35
9	Pol197	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	1,00000	99,00	99,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 55
10	Pol219	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	1,00000	165,00	165,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 77
11	Pol172	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat 6A, STP - kompletní, pod omítku	ks	1,00000	178,87	178,87	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 30
12	Pol174	Dodávka - Modulární konektor (keystone) Cat 6A, STP	ks	4,00000	92,60	370,40	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 32
13	Pol178	Dodávka - Kabel datový STP, Cat. 6A, B2ca s1d1a1	m	142,00000	18,85	2 676,70	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 36
14	Pol198	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	1,00000	29,09	29,09	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 56
Díl: M22.3		WIFI přízemí (pro p.Lid'áka)				7 129,90	
15	Pol173	Montáž - Modulární konektor (keystone) Cat 6A, STP	ks	2,00000	99,00	198,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 31
16	Pol177	Montáž - Kabel datový STP, Cat. 6A, B2ca s1d1a1	m	142,00000	27,50	3 905,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 35
17	Pol219	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	1,00000	165,00	165,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 77
18	Pol174	Dodávka - Modulární konektor (keystone) Cat 6A, STP	ks	2,00000	92,60	185,20	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 32
19	Pol178	Dodávka - Kabel datový STP, Cat. 6A, B2ca s1d1a1	m	142,00000	18,85	2 676,70	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 36
Díl: M22.4		Práce pro společnost Drager				2 602,20	
20	Pol177	Montáž - Kabel datový STP, Cat. 6A, B2ca s1d1a1	m	12,00000	27,50	330,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 35
21	Pol178	Dodávka - Kabel datový STP, Cat. 6A, B2ca s1d1a1	m	12,00000	18,85	226,20	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 36
22	Pol4	Montážní práce	kpl	1,00000	2 046,00	2 046,00	nová položka
Díl: M22.5		Sterilizace				4 553,29	
23	Pol177	Montáž - Kabel datový STP, Cat. 6A, B2ca s1d1a1	m	12,00000	27,50	330,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 35
24	Pol197	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	1,00000	99,00	99,00	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 55
25	Pol5	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	690,00	690,00	nová položka
26	Pol178	Dodávka - Kabel datový STP, Cat. 6A, B2ca s1d1a1	m	12,00000	18,85	226,20	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 36
27	Pol198	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	1,00000	29,09	29,09	SoD strukturovaná kabeláž p.č. 56
28	Pol4	Montážní práce	kpl	1,00000	3 179,00	3 179,00	nová položka
Celkem						25 900,63	

Legend:


- ☐ empty element, page 1
- ☐ empty element, page 2
- ☐ empty element, page 3
- ☐ empty element, page 4
- ☐ empty element, page 5
- ☐ empty element, page 6
- ☐ empty element, page 7
- ☐ empty element, page 8
- ☐ empty element, page 9
- ☐ empty element, page 10
- ☐ empty element, page 11
- ☐ empty element, page 12
- ☐ empty element, page 13
- ☐ empty element, page 14
- ☐ empty element, page 15
- ☐ empty element, page 16
- ☐ empty element, page 17
- ☐ empty element, page 18
- ☐ empty element, page 19
- ☐ empty element, page 20
- ☐ empty element, page 21
- ☐ empty element, page 22
- ☐ empty element, page 23
- ☐ empty element, page 24
- ☐ empty element, page 25
- ☐ empty element, page 26
- ☐ empty element, page 27
- ☐ empty element, page 28
- ☐ empty element, page 29
- ☐ empty element, page 30
- ☐ empty element, page 31
- ☐ empty element, page 32
- ☐ empty element, page 33
- ☐ empty element, page 34
- ☐ empty element, page 35
- ☐ empty element, page 36
- ☐ empty element, page 37
- ☐ empty element, page 38
- ☐ empty element, page 39
- ☐ empty element, page 40
- ☐ empty element, page 41
- ☐ empty element, page 42
- ☐ empty element, page 43
- ☐ empty element, page 44
- ☐ empty element, page 45
- ☐ empty element, page 46
- ☐ empty element, page 47
- ☐ empty element, page 48
- ☐ empty element, page 49
- ☐ empty element, page 50
- ☐ empty element, page 51
- ☐ empty element, page 52
- ☐ empty element, page 53
- ☐ empty element, page 54
- ☐ empty element, page 55
- ☐ empty element, page 56
- ☐ empty element, page 57
- ☐ empty element, page 58
- ☐ empty element, page 59
- ☐ empty element, page 60
- ☐ empty element, page 61
- ☐ empty element, page 62
- ☐ empty element, page 63
- ☐ empty element, page 64
- ☐ empty element, page 65
- ☐ empty element, page 66
- ☐ empty element, page 67
- ☐ empty element, page 68
- ☐ empty element, page 69
- ☐ empty element, page 70
- ☐ empty element, page 71
- ☐ empty element, page 72
- ☐ empty element, page 73
- ☐ empty element, page 74
- ☐ empty element, page 75
- ☐ empty element, page 76
- ☐ empty element, page 77
- ☐ empty element, page 78
- ☐ empty element, page 79
- ☐ empty element, page 80
- ☐ empty element, page 81
- ☐ empty element, page 82
- ☐ empty element, page 83
- ☐ empty element, page 84
- ☐ empty element, page 85
- ☐ empty element, page 86
- ☐ empty element, page 87
- ☐ empty element, page 88
- ☐ empty element, page 89
- ☐ empty element, page 90
- ☐ empty element, page 91
- ☐ empty element, page 92
- ☐ empty element, page 93
- ☐ empty element, page 94
- ☐ empty element, page 95
- ☐ empty element, page 96
- ☐ empty element, page 97
- ☐ empty element, page 98
- ☐ empty element, page 99
- ☐ empty element, page 100

ZL 9.3 - DVEŘE NA ARO, DIP, OS - DOPLNĚNÍ
NAPOJENÍ DVEŘÍ NA EPS

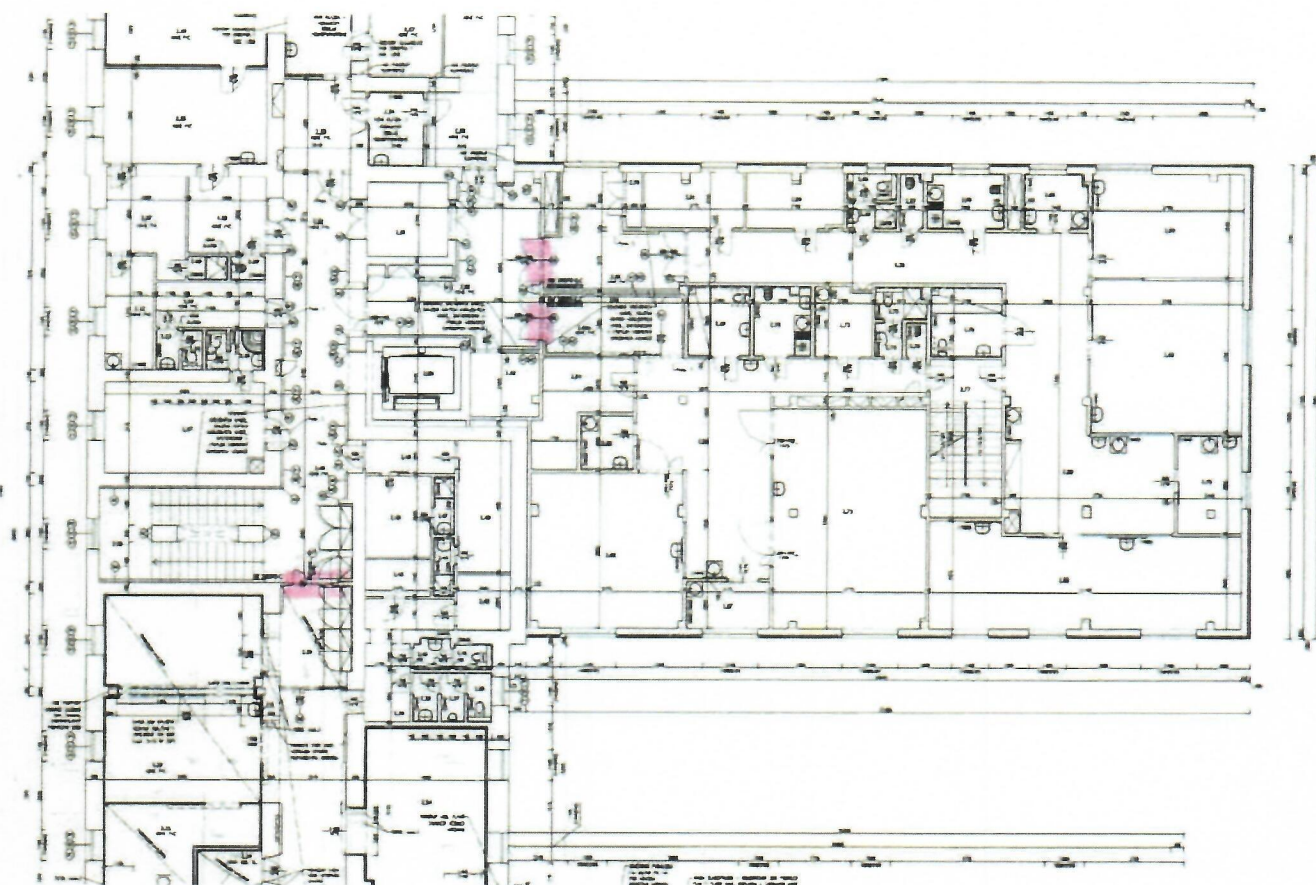


ZL 9.4

- POŽADAVEK PERSONÁLU MEMORIE NA UMÍSTĚNÍ (PŘÍDAK)
- DATOVÉ ZAŠROUKY PRO PC
- PŘÍKOD DATOVÝCH KABELŮ PRO STATIVY A OPERAČNÍ ROZETKA

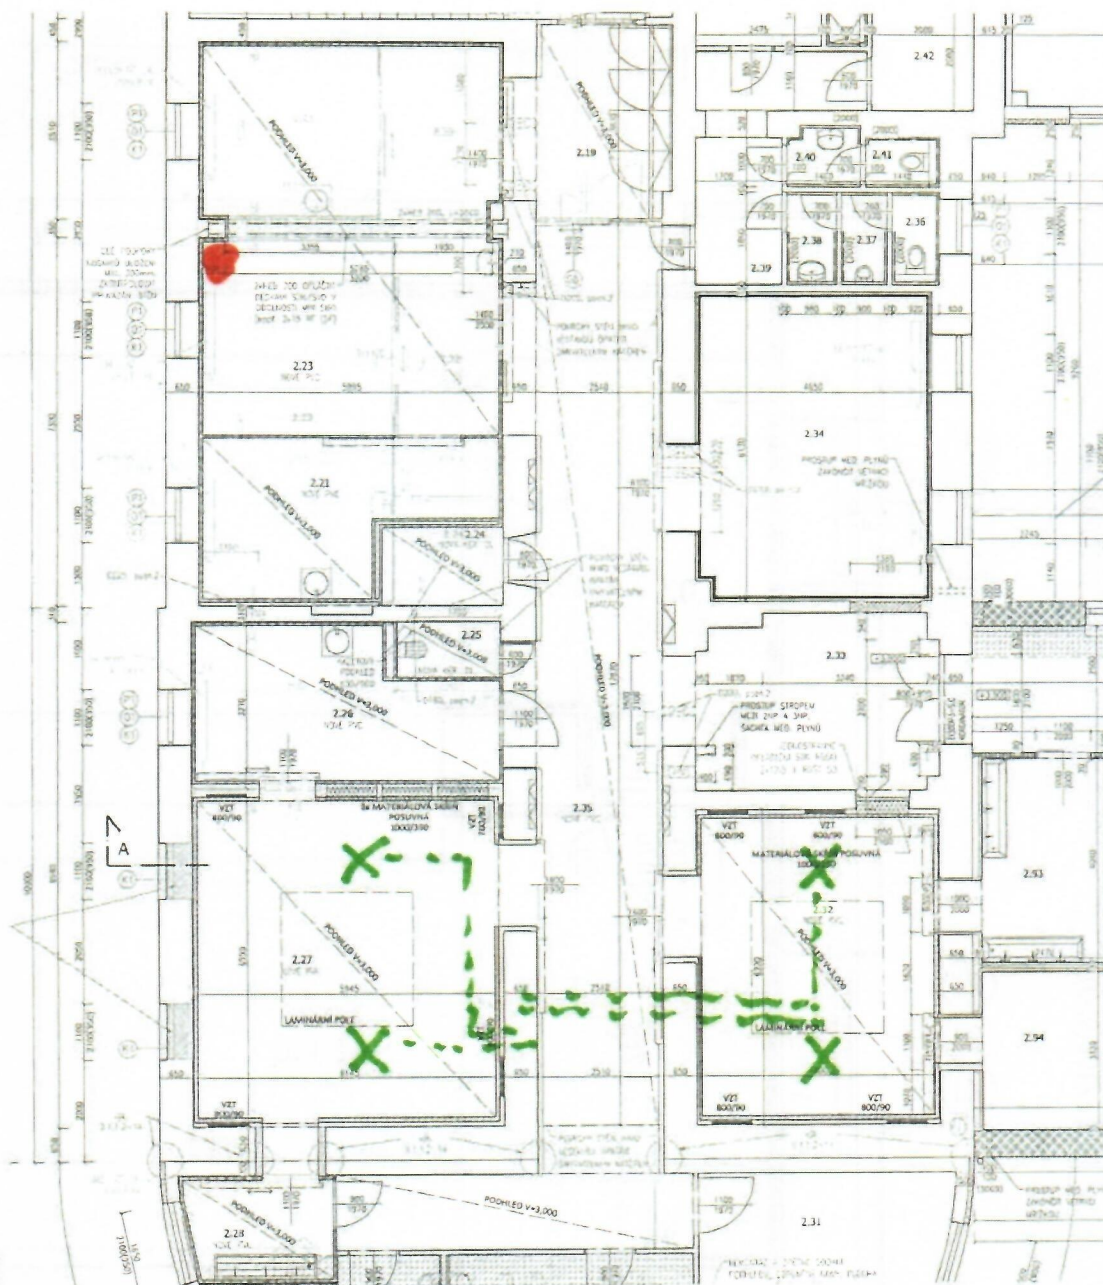


ZL 9.4

- POŽADAVEK PERSONÁLU MEMOCHICE NA OSAZENÍ DATOVÉ ZÁSOBY
PRO NOVOU TECHNOLOGII STERILIZACE

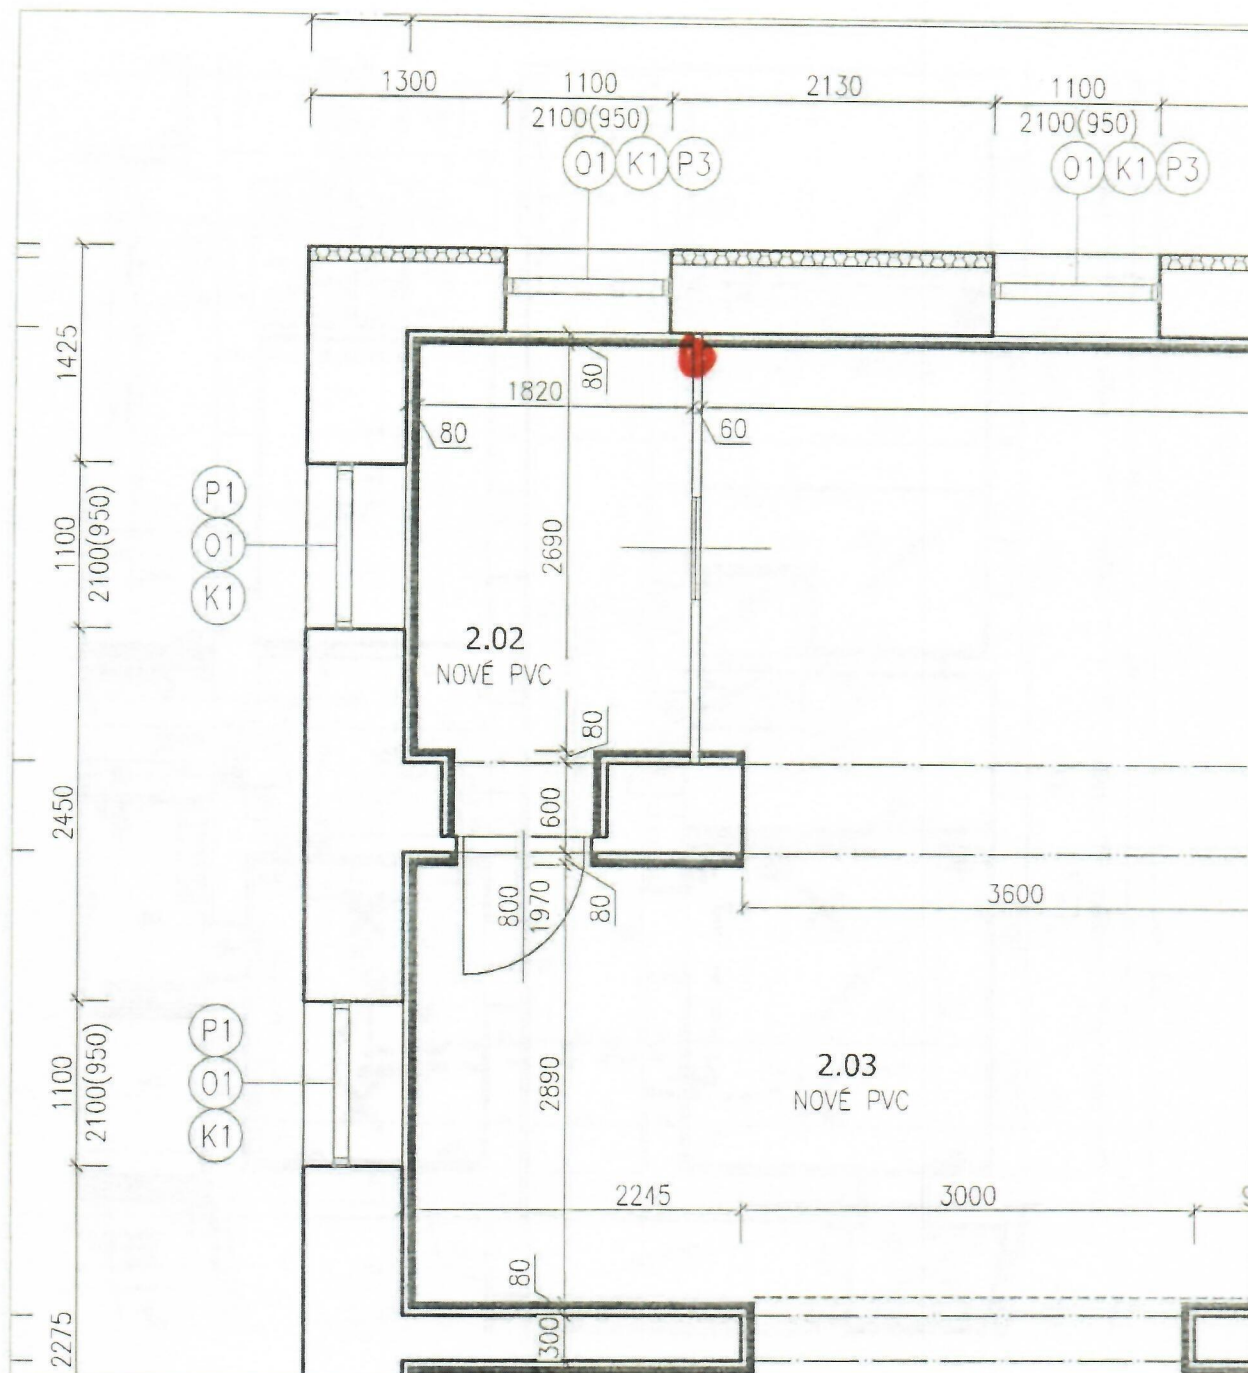

ZL 9.4

- NOVA DATOVA TRASA PRO KAPOVENÍ POSILUJÍCÍHO ACCESS POINTU (WIFI)

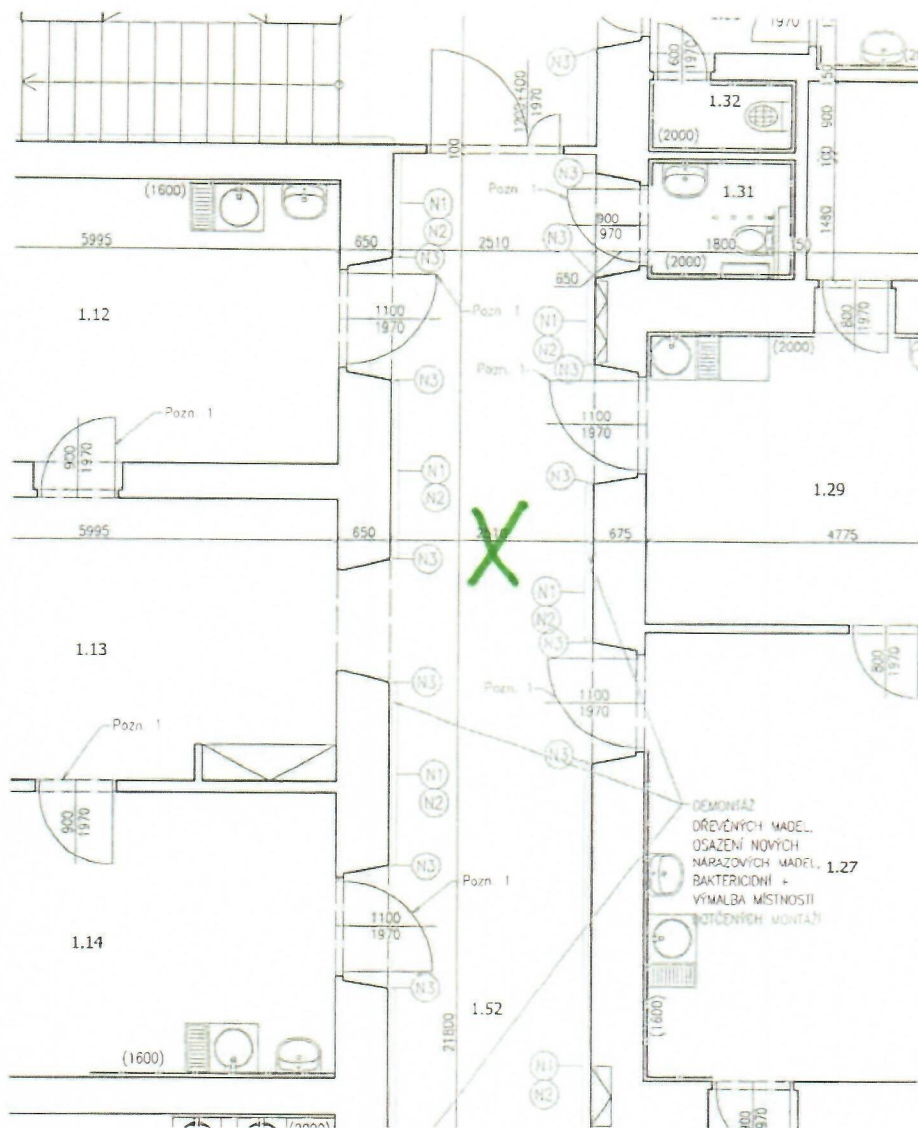

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucrekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č: 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

**Změny vzniklé z důvodu požadavku provozu na úpravu čistých
prostor operačních sálů**

Číslo změnového listu stavby:

ZL 10

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:

Řešené změny

1

Položkový rozpočet

2

Výkresová část, podklady

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné
zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

0

Paré č.

1

Příjemce

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

Dopad do termínu

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavků provozu vznikly úpravy na konstrukci vestavby čistých prostor OS. Vícepráce spočívají v úpravě pharma oken s osazením vnitřních žaluzií a úpravu v osazení automatických dveří do m.č.2.23. Méně práce spočívají v odpočtu svislých rohů, což vyplývá z konstrukce dodávané vestavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

-43 820,60 Kč

Cena navrhovaných víceprací

67 797,45 Kč

Cena navrhovaných Méněprací
a Víceprací celkem

23 976,85 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Albin Gottwald

datum

15.9.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele
(TDI)

Ing. Marek Kovář

datum

15.9.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum

15.9.2023

podpis

Zhotovitel

Aleš Musil

datum

15.9.2023

podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: **60800691**
Sušilovo nám. 1/5 DIČ: **CZ60800691**
77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			23 976,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 976,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 976,85 CZK
Základní DPH	21 %	5 035,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **29 011,99 CZK**

v

dne

15. 9. 2022



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	010	ZL č.10a- ČP změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 768.4		Výplně otvorů ČP				67 797,45	
1	7684.101	Osazení 2x Pharma prosklení vč. mechanicky ovládané žaluzie o rozměru 1600x930 -2ks - m č 2 28	kpl	1,00000	23 814,00	23 814,00	nová položka
2	7684.102	Osazení 2x Pharma prosklení vč. mechanicky ovládané žaluzie o rozměru 1120x930 -2ks - m č 2 26	kpl	1,00000	16 005,00	16 005,00	nová položka
3	7684.103	Osazení 2x Pharma prosklení vč. mechanicky ovládané žaluzie o rozměru 1120x930 -2ks - m č 2 21	kpl	1,00000	16 005,00	16 005,00	nová položka
4	7684.104	D04 Kovové dveře 1100 x 1970 m č 2 26, příplatek za použití tlačného systému pohonu automatického otevírání dveří	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00	nová položka
5	7684.105	Obložení dveřního otvoru . ostění z důvodu posunu dveří m č 2 23	kpl	1,00000	7 095,00	7 095,00	nová položka
6	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	645,69000	5,00	3 228,45	SoD rekonstrukce p č 126

Celkem	67 797,45
---------------	------------------

Položkový rozpočet


S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přílehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	010	ZL č.10b - ČP změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 768.3		Příčky, předstěny, obklady				-43 820,60	
1	76830001T00	Kovový fabion svislý v 2900 mm, členění a barevnost dle panelu, materiál: Nerez 78,3 -78,3	m	-78,30000	533,00	-41 733,90	SoD rekonstrukce p č 100
2	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-417,33900	5,00	-2 086,70	SoD rekonstrukce p č 110
Celkem						-43 820,60	

2L 10

POHODU NA PROVOZ NA ÚPRAVU
PROSTOR

- ODEČET SVISLOM RÔMU ĆP
- PŮPOČET 1 K₁ PROKLONÍ PHAETHA
- ÚPRAVA DVEČÍ + OTVORU

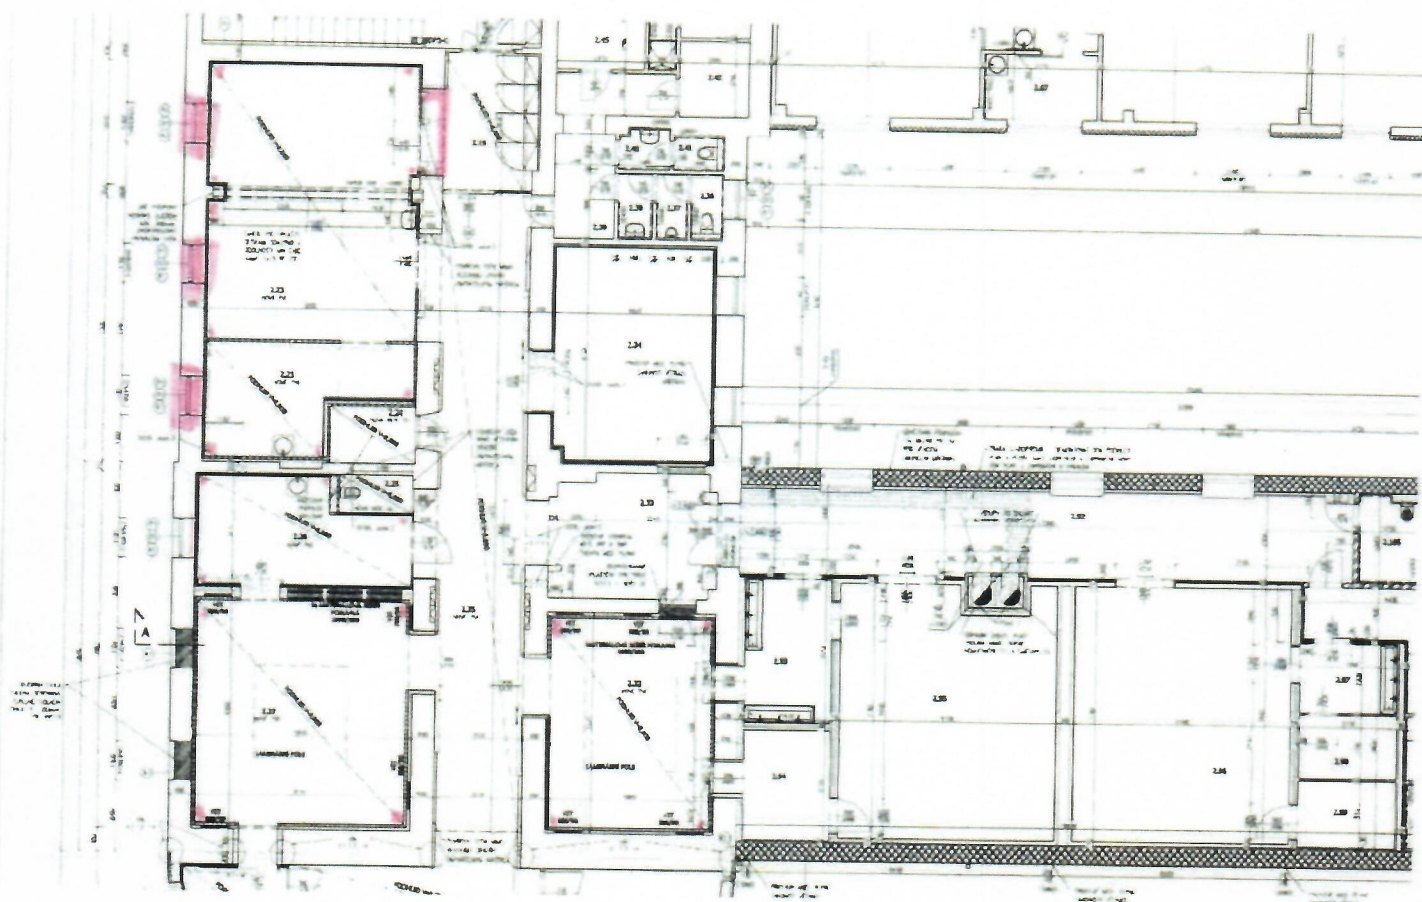

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucrekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

**Doplnění uzávěru stoupacího potrubí na rozvodech medi plynů
m.č. 2.26**

Číslo změnového listu stavby:

ZL 11

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023(dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:

Řešené změny

1

Položkový rozpočet

1

Výkresová část, podklady

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné
zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

0

Paré č.

1

Příjemce

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

Dopad do termínu

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění uzávěru stoupacího potrubí na rozvodech medi plynů m.č. 2.26 v prostoru operačních sálů. Projektové dokumentace neobsahovala a v rámci částečného provozu po dobu rekonstrukce bylo nutné instalovat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	58 937,00 Kč	58 937,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Albin Gottwald

datum

15.9.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele
(TDI)

Ing. Marek Kovář

datum

15.9.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum

15.9.2023

podpis

Zhotovitel

Aleš Musil

datum

15.9.2023

podpis

SPZ
DESIGN

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132 (1)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
Objekt: 01 Změnové listy
Rozpočet: 011 ZL č.11 - doplnění uzávěrů stoupacího potrubí pro 3.NP a rychlospojkového panelu SV800 do m.č. 2.26

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: 60800691
 Sušilovo nám. 1/5 DIČ: CZ60800691
 77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: 25527380
 Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
 79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 937,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 937,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 937,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 376,77 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 71 313,77 CZK


v

dne

3.8.2023



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	011	ZL č.11 - doplnění uzávěrů stoupacího potrubí pro 3.NP a rychlospojkového panelu SV800 do

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Druh plynu: kyslík				29 905,00	
1	Pol41	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	10,00000	479,00	4 790,00	SoD medi plyny p č 2
2	Pol42	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	35,00000	578,00	20 230,00	SoD medi plyny p č 3
3	Pol44	D+M Pájka Ag 45 + pasta	g	160,00000	13,00	2 080,00	SoD medi plyny p č 5
4	Pol48	D+M Lékařský panel pod omítku	ks	1,00000	2 805,00	2 805,00	SoD medi plyny p č 9
Díl: 11		Konzole a přichytný materiál:				7 543,00	
5	Pol65	D+M konzola (objímka) pro Cu 12x1, vzdálenost podpor max. 1,0m	ks	10,00000	223,00	2 230,00	SoD medi plyny p č 92
6	Pol66	D+M konzola (objímka) pro Cu 18x1, vzdálenost podpor max. 1,5m	ks	23,00000	231,00	5 313,00	SoD medi plyny p č 93
Díl: 9		Ventilové krabice				17 254,00	
7	Pol58	D+M Ventilová skříň pro 2 plyny bez signalizace - pod omítku	ks	1,00000	17 254,00	17 254,00	nová položka
Díl: 804		Rozvody medicinálních plynů				4 235,00	
8	Pol70	Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1	ks	1,00000	385,00	385,00	SoD medi plyny p č 97
9	Pol77	Dopravné	kpl	1,00000	3 850,00	3 850,00	SoD medi plyny p č 104
Celkem						58 937,00	

2.23
PREPARATION

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucká konstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č: 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

**Změna typu svítidel dle aktuálních podhledů včetně odpočtu,
VCP silnoproud**

Číslo změnového listu stavby:

ZL 12

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:

Řešené změny

1

Položkový rozpočet

3

Výkresová část, podklady

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné
zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

0

Paré č.

1

Příjemce

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

Dopad do termínu

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Po zaměření a kontrole projektovaného množství a typu svítidel byly zjištěny skutečnosti s rozporům v P.D. týkající se navrženého typu světel do plechových podhledů, které nebyly v P.D. zaznamenány. Odpočet části svítidel v provozu ARO oddělení, kde z důvodu nepřetržitého provozu není možná výměna stávajícího osvětlení.

Pro operační svítidla je nutné posílit silnoproudé rozvody – požadavek dodavatele operačních lamp.

V m.č. 1.15 a 1.120 byly doplněny ovladače pro DALI řízení osvětlení s nutnou instalací kabeláže.

V m.č. 2.02 je doplněn přívod 400V/16A IP44 dle požadavku na osazení nové technologie ve sterilizaci.

Pro automatické dveře v OS, JIP a ARO, kde bylo nutné přivést el. energii k oddálenému ovládání.

Z požadavku personálu nemocnice byly doplněny elektrické zásuvky v m.č. 2.29 a 2.30.

V prostoru JIP budou nově osazena stropní svítidla po obvodu dotěsněna silikonem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-262 665,50 Kč	369 151,89 Kč	106 486,39 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Albín Gottwald

datum

15.9.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele
(TDI)

Ing. Marek Kovář

datum

15.9.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum

15.9.2023

podpis

Zhotovitel

Aleš Musil

datum

15.9.2023

podpis



SPZ DESIGN, s.r.o.

Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132

(1)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: **60800691**
Sušilovo nám. 1/5 DIČ: **CZ60800691**
77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			33 810,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 980,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 790,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 790,33 CZK
Základní DPH	21 %	7 515,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 43 306,30 CZK

v

dne

15.9.2021


Za zhotovitele


Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	012.1	ZL č.12.1a - Změna typu svítidel dle aktuálních pohledů včetně odpočtů svítidel, doplnění DA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				270 717,83	
1	741.101	Odstranění stávajících vrstev těsnění	ks	50,00000	242,00	12 100,00	nová položka
		Utěsnění svítidel v čistém prostoru : 50		50,00000			
2	741.102	Utěsnění nových svítidel	ks	50,00000	328,00	16 400,00	nová položka
		Utěsnění svítidel v čistém prostoru : 50		50,00000			
3	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	125,00000	32,10	4 012,50	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálu pol č. 25
		Doplnění řízení svítidel DALI v m.č. 1,15 a 1,20 : 125		125,00000			
4	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	143,75000	37,90	5 448,13	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálu pol č. 26
		Doplnění řízení svítidel DALI v m.č. 1,15 a 1,20 : 125*1,15		143,75000			
5	přísl. A1.1	Rámeček pro montáž do SDK	kus	16,00000	702,60	11 241,60	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č. 23
		SOD : -6		-6,00000			
		skutečnost : 19		19,00000			
		2		2,00000			
		doplnění scházejících svítidel nad rozsah PD m.č. 2.06 : 1		1,00000			
6	přísl. A2	Rámeček pro montáž do SDK	kus	13,00000	1 127,30	14 654,90	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č. 24
		SOD : -5		-5,00000			
		skutečnost : 11		11,00000			
		7		7,00000			
7	sv. A1 nové	VML 140 VP MMO 4K atyp KP625 IP44/20 40W 4700Lm IP44/20 Ra80	ks	50,00000	3 566,00	178 300,00	nová položka
		skutečnost : 95		95,00000			
		odpočet svítidla ARO : -45		-45,00000			
8	sv. A2	ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830/35/40, 4400lm, 110lm/W, 3-4K, Ra min. 80, IK03	kus	1,00000	2 088,10	2 088,10	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č. 9
		SOD : -26		-26,00000			
		skutečnost : 29		29,00000			
		odpočet svítidla ARO : -2		-2,00000			
9	sv. C2	CETUS3 L 2000-840 HF RW, 2208lm, 142lm/W, 4K, Ra min. 80, IK06	kus	9,00000	648,70	5 838,30	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č. 12
		SOD : -26		-26,00000			
		skutečnost : 33		33,00000			
		doplnění scházejících svítidel nad rozsah PD m.č. 3.56, 3.59 : 2		2,00000			
10	sv. J1	JULIE 1200 LED IP65 4200 840, 4200lm, 111lm/W, 4K, Ra min. 80, IK08	kus	1,00000	1 179,90	1 179,90	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č. 17
		SOD : -91		-91,00000			
		skutečnost : 92		92,00000			
11	sv. P3 nové	VML 130 PT2 940 30W 3300Lm 4000K IP40 Ra90	ks	6,00000	3 242,40	19 454,40	nová položka
		skutečnost : nové : 6		6,00000			
Díl: 752		DALI				23 973,00	

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	012.1	ZL č.12.1a - Změna typu svítidel dle aktuálních pohledů včetně odpočtů svítidel, doplnění DA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
12	DALI 9	Vlastní montáž a zapojení komponentů DALI	kus	1,00000	900,00	900,00	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol č 119
13	DALI 1	AWHE258W DALI2 7-tlačítkový ovládací panel s LED indikací, 4 scény, UP/DOWN + OFF, bílá, IR RC	kus	2,00000	11 536,50	23 073,00	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol č 111

Doplnění řízení svítidel DALI v m č 1,15 a 1,20 : 2

2,00000

Díl: HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **1 785,00**

14	HZS2231 2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - stavební přípomoci	hod	5,00000	357,00	1 785,00	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol č 121
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	---

Doplnění řízení svítidel DALI v m č 1,15 a 1,20 : 5

5,00000

Díl: VRN1 **Průzkumné, geodetické a projektové práce** **1 980,00**

15	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol č 128
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	---

Doplnění řízení svítidel DALI v m č 1,15 a 1,20 : 1

1,00000

Celkem

298 455,83

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: 012.2 ZL č.12.2 - VCP silnoprod

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: 60800691
Sušilovo nám. 1/5 DIČ: CZ60800691
77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: 25527380
Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			59 806,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 890,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			70 696,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 696,06 CZK
Základní DPH	21 %	14 846,17 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **85 542,23 CZK**

v

dne

15.7.2023


Za zhotovitele


Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	012.1	ZL č.12.1b - Změna typu svítidel dle aktuálních pohledů včetně odpočtů svítidel, doplnění DA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				-262 665,50	
1	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	-53,00000	357,00	-18 921,00	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č 6
		SOD : -779		-779,00000			
		-15		-15,00000			
		skutečnost : 797		797,00000			
		odpočet svítidla ARO : -56		-56,00000			
2	přisl. A1	Box pro stropní montáž	kus	-3,00000	702,60	-2 107,80	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č 22
		16-13					
		-3		-3,00000			
3	sv. A1	ANNA VARIOFLEX Q596 4400 830/35/40, 4404lm, 110lm/W, 3-4K, Ra min. 80, IK03	kus	-99,00000	2 088,10	-206 721,90	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č 7
		SOD : -207		-207,00000			
		-14		-14,00000			
		-5		-5,00000			
		skutečnost : 129		129,00000			
		odpočet svítidla ARO : -4		-4,00000			
		doplnění scházejících svítidel nad rozsah PD m č 1 01, 2 06 : 2		2,00000			
4	sv. A2 nové	ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830/35/40, 4400lm, 110lm/W, 3-4K, Ra min. 80, IK03	kus	-1,00000	2 121,20	-2 121,20	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č 10
		SOD : -1		-1,00000			
5	sv. B2	LF3 E 5000-940 M600Q LDE KA WH, 5000lm, 129lm/W, 4K, Ra min. 90, IK03	kus	-2,00000	3 080,80	-6 161,60	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č 11
		SOD : -24		-24,00000			
		skutečnost : 22		22,00000			
6	sv. D1	DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS (LO - Low mode), 3050lm, 116lm/W, 4K, Ra min. 80, IK06	kus	-2,00000	2 651,20	-5 302,40	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č 13
		SOD : -101		-101,00000			
		skutečnost : 101		101,00000			
		odpočet svítidla ARO : -2		-2,00000			
7	sv. D2	DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS (ME - Medium mode), 4750lm, 116lm/W, 4K, Ra min. 80, IK06	kus	-2,00000	2 651,20	-5 302,40	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č 14
		SOD : -58		-58,00000			
		skutečnost : 56		56,00000			
8	sv. L2	NOVS M 2500-840 DI HF WH, 2500lm, 142lm/W, 4K, Ra min. 80, IK08	kus	-1,00000	2 225,20	-2 225,20	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č 18
		SOD : -92		-92,00000			
		skutečnost : 92		92,00000			
		odpočet svítidla ARO : -2		-2,00000			
		doplnění scházejících svítidel nad rozsah PD m č 1 10 : 1		1,00000			
9	sv. P1	PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HF, 4000lm, 138lm/W, 4K, Ra min. 90, IK03	kus	-4,00000	3 450,50	-13 802,00	SoD silnoproud výměna osvětlení pol č 20
		SOD : -35		-35,00000			
		skutečnost : 31		31,00000			

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	012.2	ZL č.12.2 - VCP silnoprod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				50 167,06	
1	741.101	Úprava rozváděče včetně doplnění svorek a přístroje	ks	5.00000	2 365.00	11 825.00	nová položka
		Doplnění přívodu pro operační světla : 4		4.00000			
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 1		1.00000			
2	741.102	Montáž zapuštěné zásuvky 400V	ks	1.00000	237.00	237.00	nová položka
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 1		1.00000			
3	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	43.00000	43.70	1 879.10	ÚRS 2/2023
		Doplnění přívodu pro operační světla : 35		35.00000			
		Příprava tras pro ovládání dveří OP : 8		8.00000			
4	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	4.00000	53.30	213.20	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol.č. 10
		Doplnění zásuvek a vývodů v m.č. 2.29 a 2.30 : 4		4.00000			
5	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	276.00000	32.10	8 859.60	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol.č. 25
		Doplnění zásuvek a vývodů v m.č. 2.29 a 2.30 : 22		22.00000			
		Doplnění přívodu pro operační světla : 170		170.00000			
		48		48.00000			
		26		26.00000			
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 10		10.00000			
6	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	10.00000	58.80	588.00	ÚRS 2/2023
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 10		10.00000			
7	741132148	Ukončení kabelu 5x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	ks	2.00000	257.00	514.00	ÚRS 2/2023
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 2		2.00000			
8	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	4.00000	97.80	391.20	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol.č. 65
		Doplnění zásuvek a vývodů v m.č. 2.29 a 2.30 : 4		4.00000			
9	34.101	Silový vodič H07V-K 6,00 žlutozelená (CYA)	m	29.90000	25.40	759.46	nová položka
		Doplnění přívodu pro operační světla : 26*1,15		29.90000			
10	34.102	kabel silový H07RN-F 5G16 (CGTG)	m	11.50000	474.00	5 451.00	nová položka
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 10*1,15		11.50000			
11	34.103	Zásuvka vestavná 16A/5P 400V IP44	ks	1.00000	875.00	875.00	nová položka
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 1		1.00000			
12	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	220.80000	37.90	8 368.32	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol.č. 26
		Doplnění zásuvek a vývodů v m.č. 2.29 a 2.30 : 22*1,15		25.30000			
		Doplnění přívodu pro operační světla : 170*1,15		195.50000			
13	34111125	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x4mm2	m	55.20000	68.90	3 803.28	ÚRS 2/2023
		Doplnění přívodu pro operační světla : 48*1,15		55.20000			
14	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	11.50000	67.40	775.10	ÚRS 2/2023
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 10*1,15		11.50000			
15	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	45.15000	43.30	1 955.00	ÚRS 2/2023
		Doplnění přívodu pro operační světla : 35*1,05		36.75000			
		Příprava tras pro ovládání dveří OP : 8*1,05		8.40000			

Položkový rozpočet


S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	012.2	ZL č. 12.2 - VCP silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
16	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	4,00000	58,00	232,00	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol č 11
		Doplnění zásuvek a vývodů v m.č. 2.29 a 2.30 : 4		4,00000			
17	74_OP-R.1	dodávka ochranného pospojování na zakázku	kus	1,00000	2 860,00	2 860,00	SoD silnoproud úpravy VZT ... pol č 18
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 1		1,00000			
18	M040	5519A-A02357 Z Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, řazení 2P+PE, d. Tango, b. zelená	ks	4,00000	145,20	580,80	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol č 66
		Doplnění zásuvek a vývodů v m.č. 2.29 a 2.30 : 4		4,00000			
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 639,00	
19	HZS2231.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - stavební připomoci	hod	22,00000	357,00	7 854,00	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol č 121
		Doplnění zásuvek a vývodů v m.č. 2.29 a 2.30 : 4		4,00000			
		Doplnění přívodů pro operační světla : 4		4,00000			
		Příprava tras pro ovládání dveří OP : 6		6,00000			
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 8		8,00000			
20	HZS2232.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - napojení na stávající elektroinstalaci	hod	5,00000	357,00	1 785,00	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol č 123
		Doplnění zásuvek a vývodů v m.č. 2.29 a 2.30 : 2		2,00000			
		Doplnění přívodů pro operační světla : 3		3,00000			
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 890,00	
21	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	3,00000	3 630,00	10 890,00	SoD silnoproud rekonstrukce oper sálů ... pol č 128
		Doplnění zásuvek a vývodů v m.č. 2.29 a 2.30 : 1		1,00000			
		Doplnění přívodů pro operační světla : 1		1,00000			
		Doplnění vývodu v m.č. 2.02 a 2.03 : 1		1,00000			
Celkem						70 696,06	

ZL 12.1


-PROSTOR ODDELENÍ ABO, KDE MENÍ POŽÁR Z
DŮVODU 24 HOD. PROVOZU BEZPŘÍČINĚ VÝNEM
SVĚTLA

-PROSTOR JIP, KDE BYLO VĚTŠÍ Z DŮVODU
TŘÍKOVÉHO PŘEHODU PODMĚN PLOŠT VÝNEM
TYPU SVĚTLA S KONTAKTNÍM KONTAKTEM.

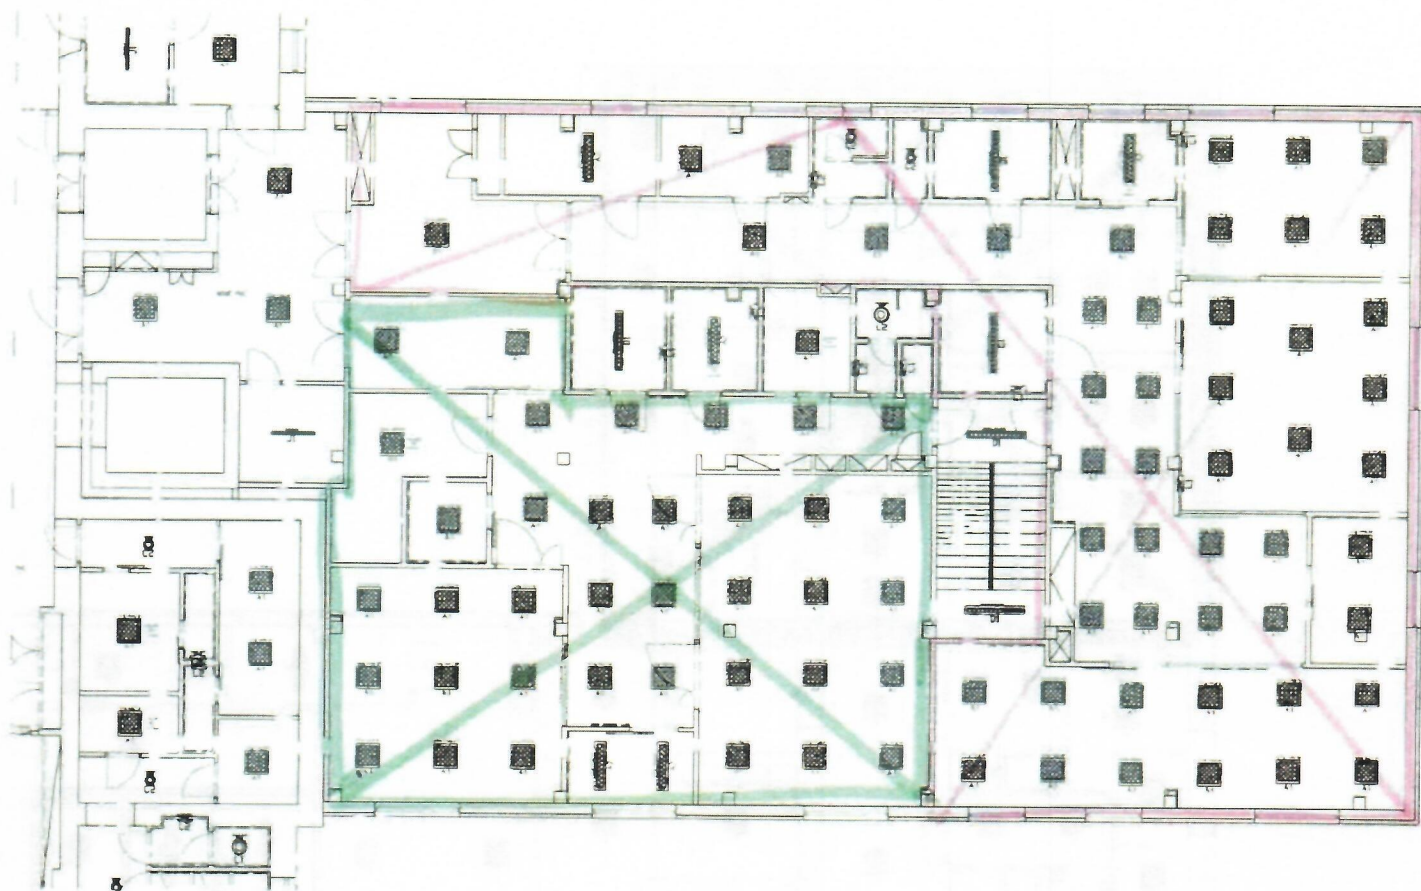


ZL 12 1

- PROSTOR STERILIZACE - VÝPĚNA TYPU SUTIDER
S UMÍSTĚNÍM DO MIZOVANÉHO PLENOVÉHO
PODMEDU

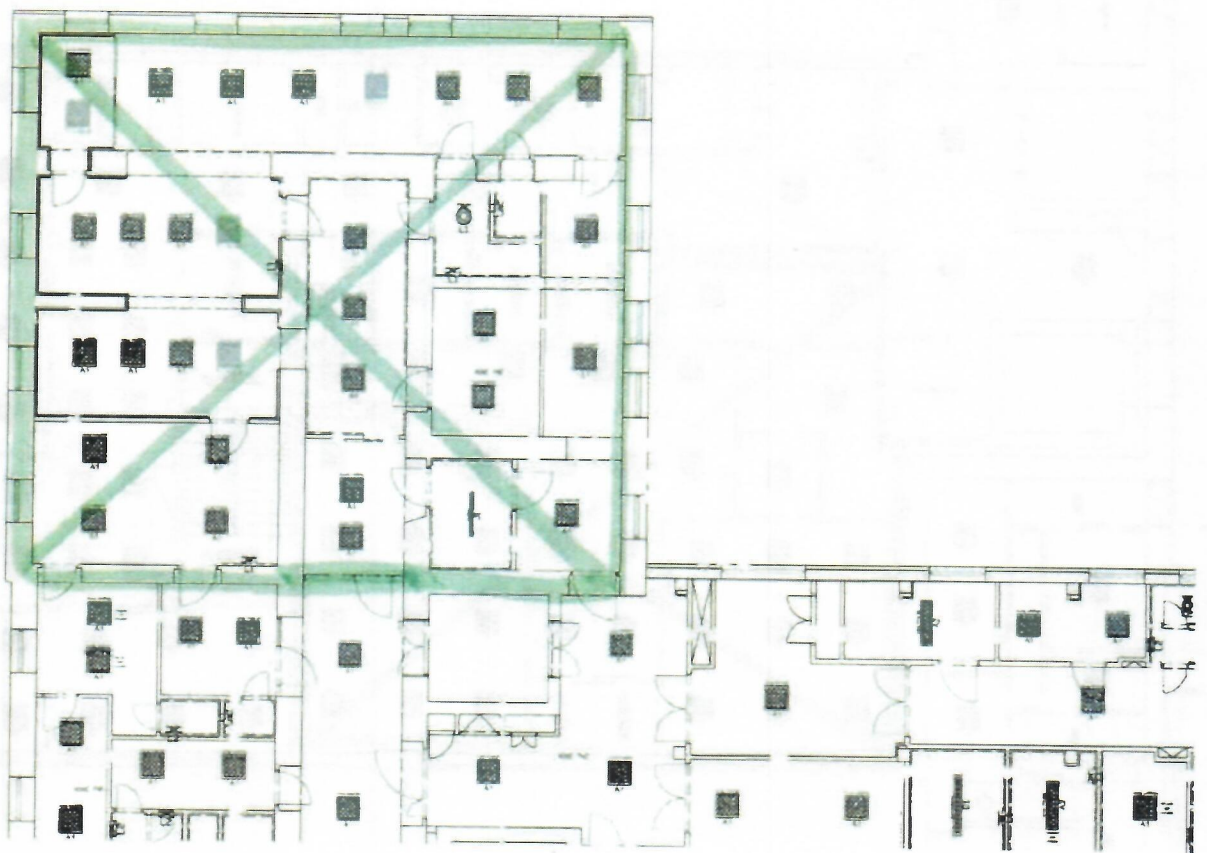

ZL 12.1

- DOPLNĚNÍ OVLADACÍ DALÍ OSVĚTLENÍ VČ. KABELOVÝCH TRAS

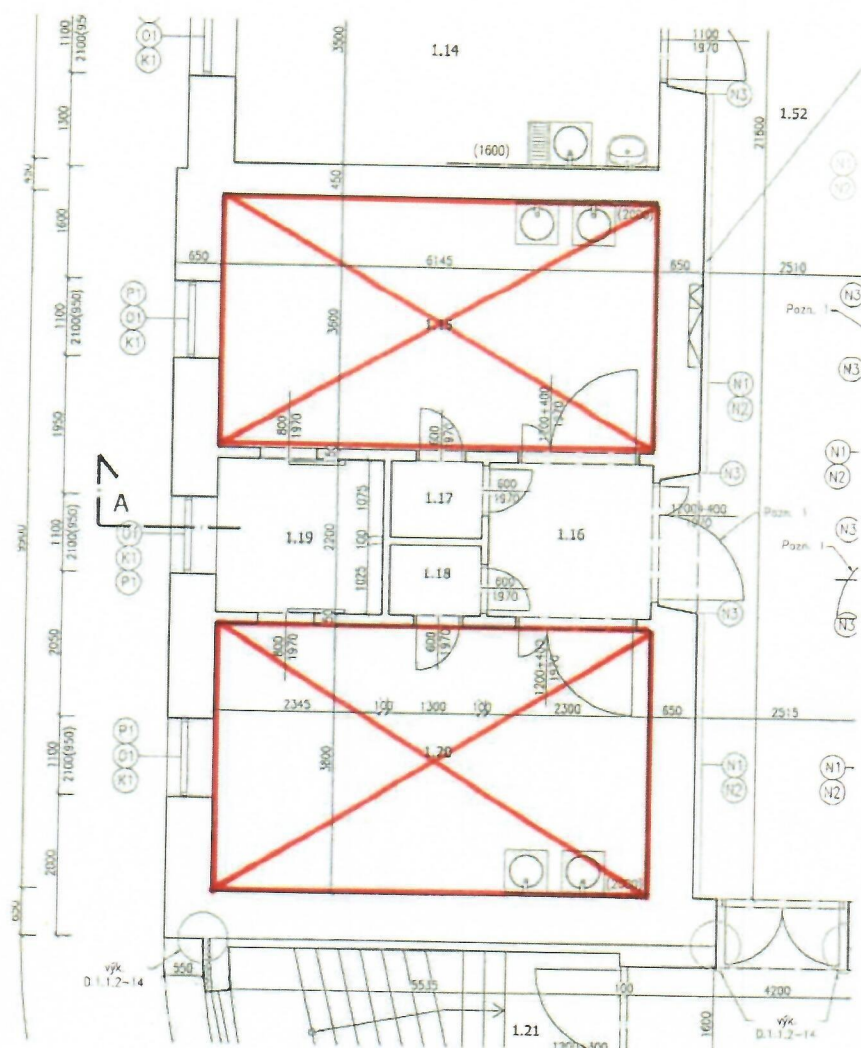

- LL 11C.L
 - DOPLNĚNÍ KABELOŽE PRO OP. SVĚTLA A RADIOTA
 - DOPLNĚNÍ EL. PŘÍVODU PRO NOVÉ ZARÍZENÍ VE STŘEDIZACI (MČ. 202)
 - DOPLNĚNÍ EL. PŘÍVODU PRO ODDÁLOVÉ TACÍ PRO OTEVÍRÁNÍ AUT. DVEŘÍ

