

## Změnový list č. 1 ze dne .....

Název stavby:	Oprava místních komunikací v Mostě – II. etapa
Číslo smluvního vztahu:	MIROS23200395
Název části stavby (PS, SO):	11 - ŠEVČÍKA
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lokální oprava obrubníku a výměna AB krytu.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Na základě místního šetření za účasti objednatele a zhotovitele bylo domluveno, že rozsah a technické řešení bude změněno. Objednatel vyhotovil revizi dokumentace změna č. 4 Tyto práce mají vliv na cenu díla a termín dokončení.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Práce je nutné realizovat k řádnému dokončení díla. Zhotovitel provede práce dle pokynů objednatele.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	491 760,04 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	185 340,10 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	<b>677 100,14 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Rozpočet

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - II. ETAPA  
 Objekt: 11 - ŠEVČIKA  
 Soupis: ZL č. 1 - Změna rozsahu po místním šetření

Místo: MOST  
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST  
 Zhotovitel:

Datum: 15. 5. 2023  
 Projektant: TECHNICKÉ  
 SLUŽBY MĚSTA  
 MOSTI A S  
 ING. VLADIMÍR  
 PLHÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>185 340,10</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				185 340,10
D	1		Zemní práce				49 608,30
32	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	18,000	86,25	1 552,50
23	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	143,200	256,50	36 730,80
	W		18+46,5+77,5+1,2		143,200		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	75,500	150,00	11 325,00
D	5		Komunikace pozemní				34 095,30
24	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	103,000	168,00	17 304,00
	W		85+18		103,000		
33	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	31,100	333,00	10 356,30
6	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,750	180,00	6 435,00
D	8		Trubní vedení				-3 000,00
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-2,000	1 500,00	-3 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 285,78
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	253,50	3 802,50
26	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	9,000	133,50	1 201,50
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	389,25	2 335,50
8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,500	250,00	18 875,00
9	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	-75,000	110,00	-8 250,00
28	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	150,500	75,75	11 400,38
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,505	4 800,00	7 224,00
35	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	159,000	217,50	34 582,50
29	K	935114111	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	4,000	1 530,00	6 120,00
30	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	492,500	6,08	2 994,40
D	997		Přesun sutě				23 086,76
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	106,742	50,00	5 337,10
	W		1,764		1,764		
	W		89,5		89,500		
	W		15,478		15,478		
	W		Součet		106,742		
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 601,130	2,00	3 202,26
	W		106,742*15 "Přepočtené koeficientem množství"		1 601,130		
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	105,992	137,25	14 547,40
D	998		Přesun hmot				1 263,96
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,066	60,00	1 263,96



# PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo zakázky : 23033LN	Název zakázky : MOST II ul. Ševčíka bl. 717	ZL: 1
Požadavek zadal :	Lukáš Spal	Datum zadání : 18.09.2023
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování : 20.09.2023


**NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :** Po místním šetření určil objednatel změnu rozsahu prací, který je oproti výkazu výměř odlišný. Byla navržena změna ohledně dodání materiálu betonových obrub a odvodnění.

**PŘÍČINA / DŮVOD :**  
 Dle pokynů objednatele bude zhotovitel realizovat práce, následně po zaměření geodetem, bude předložen soupis dle skutečnosti a ZL č.2.  
 Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodaatečné práce mají vliv na cenu díla a termín dokončení díla.

**POPIS / SCHEMA :**



Stránka 1

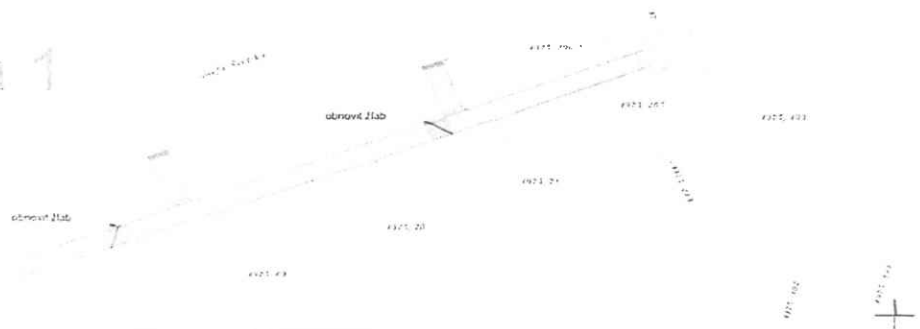

Číslo	Název	Množství	Jednotka
01	odhradní žlab	120,00	m
02	odvodnění	120,00	m
03	betonový oblitek	120,00	m

<b>ZMĚNA 4</b>			
Projednáno:	MIKEL	Zpracováno:	MIKEL
Ing. Zdeněk Pihák	Ing. Lukáš Spal	Ing. Zdeněk Pihák	Ing. Lukáš Spal
Datum:	18.09.2023	Podpis:	MIKEL
Objekt:	Oprava chodníku ul. J. Ševčíka bl. 717	Druh:	ZMĚNA
Typ:	ZMĚNA	Číslo:	02
Objekt:	Oprava chodníku ul. J. Ševčíka bl. 717	Druh:	ZMĚNA
Dodavatel:	MIKEL	Objekt:	02

<b>Vypracoval :</b>	<b>Lukáš Spal</b> Lukáš Spal	<b>Odsouhlasil :</b>	<b>Ing. Vladimír Pihák</b>
---------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------------

Detailně podřísl  
 Lukáš Spal  
 Datum: 2023.10.20  
 14:16:49 -02'00
