










PŪDORYS, M 1:50



POZNÁMKY:


- | | |
|--------------------------|------|
| 1) TŘÍDA PEVNOSTI OCELI | S235 |
| 2) TŘÍDA PEVNOSTI ŠROUBŮ | 5.8 |

24.04.2023	PRO KLIENTA	PP	JS
DATUM	POPIS REVIZE / ZMĚNY	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL

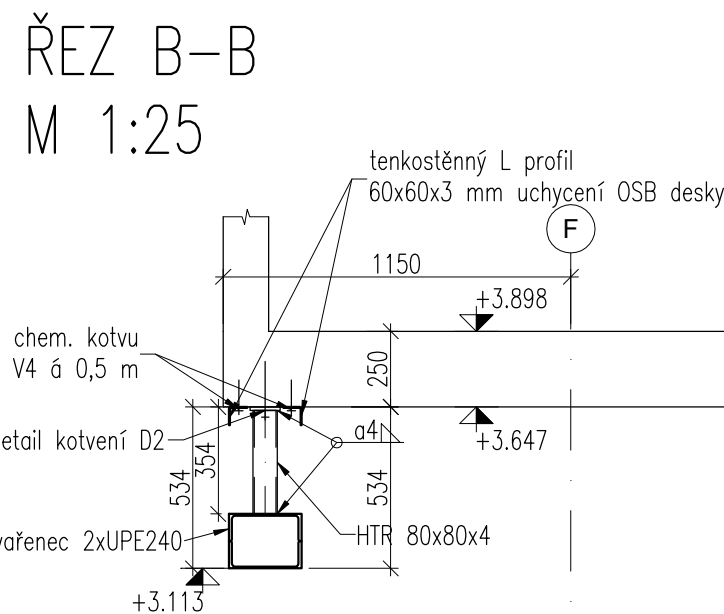

NAVRHL:		KRESLIL:	KONTOLOVAL:	 PROJEKCE STATIKA DOPRAVNÍ STAVBY PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9 ☎ 776 304 488, URL: www.psds.cz	
ODP. OSOBA:					
STAVEBNÍK:				AUTORIZ. RAZÍTKO:	
 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10					
STAVBA:					
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3				Č. PŘÍLOHY:	Č. VÝTISKU:
K.Ú.: Žižkov		STUPEŇ: Dílenská dokumentace	FORMÁT: 4 x A4		
KRAJ: Praha		DATUM: 03/2023	MĚŘÍTKO: 1:50, 1:25, 1:10		
Výkres pomocné konstrukce LOP 1.NP				4	

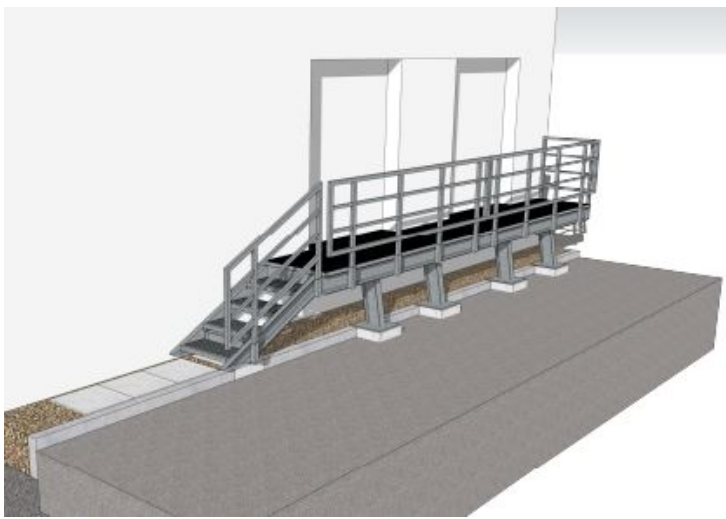

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 60	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 11.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace M218 - OLŠANSKÁ - RAMPA TRAFOSTANICE (Přiloženo samostatným dokumentem.)	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Rampa u trafostanice			
Popis a zdůvodnění změny: Během stavebních prací byla zjištěna značná degradace železobetonové rampy u trafostanic. Rampa je ve velmi špatném stavu a její sanování k obnovení původní pevnosti a konstrukční celistvosti by znamenalo vynaložení značné finanční částky. Z tohoto důvodu bude stávající železobetonová rampa nahrazena ocelovou montovanou konstrukcí.			
		Rampa bude založena na betonových blocích. Na betonové bloky pak bude osazen roznášecí plech kotvený do bloků osazený nášlapnými prvky, zábradlím a schodištěm. Podrobně je specifikováno ve zpracované projektové dokumentaci.	
		Vliv na termín: NE	
		Vliv na výkresovou dokumentaci: ANO, zpracována dokumentace změny stavby před dokončením: M218 - OLŠANSKÁ - RAMPA TRAFOSTANICE	
		Vícepráce263.090,10 Kč Méněpráce 9.780,17 Kč Změna celkem253.309,93 Kč	
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
			odstavec 7, § 222 ☐



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění v průkazu energetické náročnosti budovy

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 60
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	11.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rampa u trafostanice Popis a zdůvodnění změny: Během stavebních prací byla zjištěna značná degradace železobetonové rampy u trafostanic. Rampa je ve velmi špatném stavu a její sanování k obnovení původní pevnosti a konstrukční celistvosti by znamenalo vynaložení značné finanční částky. Z tohoto důvodu bude stávající železobetonová rampa nahrazena ocelovou montovanou konstrukcí. Rampa bude založena na betonových blocích. Na betonové bloky pak bude osazen roznášecí plech kotvený do bloků osazený nášlapnými prvky, zábradlím a schodištěm. Podrobně je specifikováno ve zpracované projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 12	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
9.780,17 Kč	263.090,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
253.309,93 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
 Číslo ZL: 60
 Předmět ZL: Rampa u trafostanice
 Objekt: SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

				Vícepráce/méněpráce		
Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemní práce				
1	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,664	748,00	1 244,67
		<i>výkop pro patky: 0,8*0,8*4*(0,9-0,25)</i>				
2	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,664	324,02	539,17
3	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16,640	24,52	408,01
		<i>1,664*10</i>				
4	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,664	116,90	194,52
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,664	23,74	39,50
6	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,078	191,08	588,22
		<i>1,664*1,85</i>				
	2	Zakládání				
7	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,432	4 470,00	1 931,04
		<i>"viz výkres - 101"</i>				
		<i>(0,6*0,6*0,3)*4</i>		0,432		
		<i>Součet</i>		0,432		
8	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,444	4 720,00	2 095,68
		<i>"viz výkres - 101"</i>				
		<i>(0,4*0,6*0,25)</i>		0,060		
		<i>(0,4*0,4*0,6)*4</i>		0,384		
		<i>Součet</i>		0,444		
9	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	4,340	459,00	1 992,06
		<i>"viz výkres - 101"</i>				
		<i>((0,4+0,6)*2*0,25)</i>		0,500		
		<i>((0,4*4)*0,6)*4</i>		3,840		

Stavba: **Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3**
Číslo ZL: **60**
Předmět ZL: **Rampa u trafostanice**
Objekt: **SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská**

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<i>Součet</i>		4,340		
10	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,340	83,90	364,13
	5	Komunikace pozemní				
11	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	0,750	338,00	253,50
		<i>"viz výkres - 101"</i>				
		<i>(0,5*1,5)</i>		0,750		
		<i>Součet</i>		0,750		
12	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	0,773	384,78	297,43
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dlažba formátu 500x500 mm</i>				
		<i>0,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství</i>		0,773		
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
13	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	0,480	16,44	7,89
		<i>"viz výkres - 101"</i>				
		<i>"pod plovoucí základ schodiště" (0,8*0,6)</i>		0,480		
		<i>Součet</i>		0,480		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12	kus	20,000	87,29	1 745,80
		<i>"viz výkres - 101"</i>				
		<i>(4*5)</i>		20,000		
		<i>Součet</i>		20,000		
15	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16	kus	24,000	121,12	2 906,88
		<i>"viz výkres - 101"</i>				
		<i>(12*2)</i>		24,000		
		<i>Součet</i>		24,000		
16	95396512R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12 A4 (nerezová)	kus	44,000	226,71	9 975,24
		<i>cena viz kalkulace</i>				
17	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	6,290	4 060,36	25 539,66
		<i>"původní rampa"</i>				
		<i>(1,5+5,9)*0,85</i>				
	997	Přesun sutě				

Stavba: **Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3**
Číslo ZL: **60**
Předmět ZL: **Rampa u trafostanice**
Objekt: **SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská**

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,264	1 010,00	2 287,04
19	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,264	119,42	270,41
20	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	43,024	17,91	770,55
		<i>2,264*19 'Přepočtené koeficientem množství</i>		<i>43,776</i>		
21	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,264	597,11	1 352,10
22	997321611	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot	t	2,264	59,71	135,21
	998	Přesun hmot				
23	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	4,743	146,00	692,48
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	764	Konstrukce klempířské				
24	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	3,300	706,10	2 330,13
		<i>(1,65*2)</i>		<i>3,300</i>		
		<i>Součet</i>		<i>3,300</i>		
25	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	2 579,70	12,90
	767	Konstrukce zámečnické				
26	767163111	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do ocelové konstrukce	m	6,818	1 540,00	10 499,72
		<i>"viz výkres - D.10"</i>				
		<i>(3,001+3,045+0,772)</i>		<i>6,818</i>		
		<i>Součet</i>		<i>6,818</i>		
27	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty	m	6,818	11 600,00	79 088,80
		<i>Poznámka k položce:</i>				
		<i>zábradlí viz výkres - D.10</i>				
28	767163211	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do ocelové konstrukce	m	1,444	1 780,00	2 570,32
		<i>"viz výkres - D.10"</i>				
		<i>(1,444)</i>		<i>1,444</i>		
		<i>Součet</i>		<i>1,444</i>		

Stavba: **Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3**
Číslo ZL: **60**
Předmět ZL: **Rampa u trafostanice**
Objekt: **SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská**

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
29	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty	m	1,444	11 600,00	16 750,40
		<i>Poznámka k položce: zábradlí viz výkres - D.10</i>				
30	767210151	Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	4,000	148,00	592,00
		<i>"viz výkres - 101"</i>				
		<i>(4)</i>		4,000		
		<i>Součet</i>		4,000		
31	55347082	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 600x305mm	kus	4,000	600,00	2 400,00
32	767250111	Montáž podest z oceli šroubováním	m2	5,387	218,00	1 174,37
		<i>"viz výkres - 101"</i>				
		<i>(6*0,8+1,63*0,18*2)</i>		5,387		
		<i>Součet</i>		5,387		
33	55347016	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm	m2	5,387	1 710,00	9 211,77
34	767995111	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	14,698	61,90	909,81
		<i>"jákl 50x50x4 mm (5,64 kg/m)"</i>				
		<i>(0,203*2+0,22*10)*5,64</i>		14,698		
		<i>Mezisoučet</i>		14,698		
35	767995112	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	17,255	37,89	653,79
		<i>"IPE 120 (10,4 kg/m)"</i>				
		<i>(0,093+0,6)*10,4</i>		7,207		
		<i>Mezisoučet</i>		7,207		
		<i>"plech tl. 5 mm (39,25 kg/m2)"</i>				
		<i>(1,6*0,08*2)*39,25</i>		10,048		
		<i>Mezisoučet</i>		10,048		
36	767995113	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	113,627	51,51	5 852,93
		<i>"IPE 180 (18,8 kg/m)"</i>				
		<i>(0,981*4+0,53*4)*18,8</i>		113,627		
		<i>Mezisoučet</i>		113,627		
37	767995114	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	167,157	56,34	9 417,63
		<i>"L60x40x5 mm (3,76 kg/m)"</i>				
		<i>(6,02*2+0,8*2)*3,76</i>		51,286		
		<i>Mezisoučet</i>		51,286		
		<i>"UPE 160 (17 kg/m)"</i>				
		<i>(1,29*2)*17</i>		43,860		
		<i>Mezisoučet</i>		43,860		

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 60
Předmět ZL: Rampa u trafostanice
Objekt: SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"plech tl. 12 mm (94,2 kg/m2)"				
		(0,36*0,2*3+0,3*0,3*4)*94,2		54,259		
		Mezisoučet		54,259		
		"plech tl. 8 mm (62,8 kg/m2)"				
		(0,05*0,05*12+0,13*0,159*4+0,73*0,2+0,12*0,1*2)*62,8		17,752		
		Mezisoučet		17,752		
38	767995116	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	353,182	40,14	14 176,73
		"UPE 180 (19,7 kg/m)"				
		(0,672*4+6,02*2+1,6*2)*19,7		353,182		
		Mezisoučet		353,182		
39	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	0,054	39 500,00	2 133,00
		51,286*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,054		
40	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,008	38 000,00	304,00
		7,27*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,008		
41	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,119	42 992,05	5 116,05
		113,627*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,119		
42	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	0,046	39 800,00	1 830,80
		43,86*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,046		
43	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	0,371	39 800,00	14 765,80
		353,182*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,371		
44	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,011	51 351,61	564,87
		10,048*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,011		
45	1361122R	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,019	51 351,61	975,68
		17,752*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,019		
46	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,057	50 157,39	2 858,97
		54,259*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,057		
47	14550248	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm	t	0,015	41 600,00	624,00
		14,698*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,015		
48	30909193	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x35mm	100 kus	0,520	3 410,00	1 773,20
		52*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,520		
49	31111013	matice nerezová šestihranná M12	100 kus	0,052	1 010,00	52,52
		52*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,052		
50	31121022	podložka nerezová 13 DIN 9021	100 kus	0,520	801,00	416,52
		52*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,520		
51	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,351	66,88	90,35
	777	Podlahy lité				

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 60
Předmět ZL: Rampa u trafostanice
Objekt: SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská


Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
52	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	-10,647	182,79	-1 946,17
		"vstupní rampa k trafostanici"				
		(-5,7*(0,69*2+0,25)+1,65*0,16*2+1,2*0,69)		-10,647		
53	777131121	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2	m2	-4,461	14,91	-66,51
		"vstupní rampa k trafostanici"				
		(-5,7*0,69+1,65*0,16*2)		-4,461		
54	777131213	Penetrační nátěr schodišťových stupňů polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	-1,421	273,95	-389,28
		((1,2+0,86)*0,69)		-1,421		
55	777131221	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů schodišťových stupňů pískem do 0,5 kg/m2	m2	-1,421	24,91	-35,40
56	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	-4,461	76,70	-342,16
57	777611261	Krycí nátěr schodišťových stupňů protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	-1,421	108,90	-154,75
58	777621121	Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový	m2	-9,819	581,62	-5 710,93
59	777621221	Krycí nátěr schodišťových stupňů průmyslový polyuretanový	m2	-1,421	773,19	-1 098,70
60	998777104	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	-0,042	863,57	-36,27
	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
61	789121220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí očištění oprášením	m2	22,830	17,91	408,89
62	789121240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2	22,830	29,86	681,70
63	789121270	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	22,830	65,68	1 499,47
64	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem	m2	22,830	776,25	17 721,79
		"L60x40x5 mm (0,19 m2/m)"				
		(6,02*2+0,8*2)*0,19		2,592		
		Mezisoučet		2,592		
		"IPE 120 (0,48 m2/m)"				
		(0,093+0,6)*0,48		0,333		
		Mezisoučet		0,333		
		"IPE 180 (0,7 m2/m)"				
		(0,981*4+0,53*4)*0,7		4,231		
		Mezisoučet		4,231		
		"UPE 160 (0,579 m2/m)"				
		(1,29*2)*0,579		1,494		
		Mezisoučet		1,494		
		"UPE 180 (0,639 m2/m)"				
		(0,672*4+6,02*2+1,6*2)*0,639		11,456		

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
 Číslo ZL: 60
 Předmět ZL: Rampa u trafostanice
 Objekt: SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<i>Mezisoučet</i>		11,456		
		<i>"plechy (2 m2/m2)"</i>				
		<i>(1,6*0,08*2)*2</i>		0,512		
		<i>(0,05*0,05*12+0,13*0,159*4+0,73*0,2+0,12*0,1*2)*2</i>		0,565		
		<i>(0,36*0,2*3+0,3*0,3*4)*2</i>		1,152		
		<i>Mezisoučet</i>		2,229		
		<i>"jáckl 50x50x4 mm (0,19 m2/m)"</i>				
		<i>(0,203*2+0,22*10)*0,19</i>		0,495		
		<i>Mezisoučet</i>		0,495		
		<i>Součet</i>		22,830		
CELKEM (BEZ DPH)				253 309,93		



méněpráce



vícepráce - nové položky



vícepráce - stávající položky

-9 780,17

263 090,10	165 998,74
	97 091,36

Rozbor ceny

Položka	95396512R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12 A4 (nerezová)
TOV	000	TOV 000 MJ kus

H	Přímý materiál		198,00
NC	z toho nákupní cena		198,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		14,84
P	z toho přímé mzdy		11,09
O	odvody	33,8 % z mezd	3,75
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00

PZN **Příme zpracovací náklady** [M] + [S] + [T] **14,84**

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] **212,84**

R1	Výrobní režie	38,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	5,64
R2	Správní režie	26,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	3,86
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] **9,49**

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] **222,33**

Z	Zisk	18,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	4,38
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] **226,71**

Jednotková cena **226,71**

Hmotnost 0,00013

Normohodiny 0,056

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	M	54879443	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x160mm	kus	1,00000	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Materiály						198,00					
3	P	712000-S2-T3	Dělník	Nh	0,05600	198,00	11,09				

Rozbor ceny				
Položka	95396512R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12 A4 (nerezová)		
TOV	000	TOV 000	MJ	kus
Mzdy		11,09		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 62	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 11.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace PD_ZSMV Olšanská 4 – JV terasa (Přiloženo samostatným dokumentem.)	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zábradlí z tahokovu Popis a zdůvodnění změny: V rámci projektu a VV nebylo řešeno oplocení u rekonstruované terasy na jihovýchodní terase. Z důvodu zabezpečení objektu bylo doplněno oplocení z tahokovu. Vliv na termín: NE Vliv na výkresovou dokumentaci: ANO, zpracována dokumentace ZSMV Olšanská 4 - JV TERASA. (Přiloženo samostatným dokumentem.) Vícepráce128.694,84 Kč Méněpráce 0,00 Kč Změna celkem 128.694,84 Kč			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			



Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 62
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	11.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zábradlí z tahokovu Popis a zdůvodnění změny: V rámci projektu a VV nebylo řešeno oplocení u rekonstruované terasy na jihovýchodní terase. Z důvodu zabezpečení objektu bylo doplněno oplocení z tahokovu.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 5	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	128.694,84 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
128.694,84 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			128 694,84
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	128 694,84	27 025,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	155 720,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	17. 7. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		128 694,84	155 720,76	
ZL62	Zábradlí z tahokovu	128 694,84	155 720,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL62 - Zábradlí z tahokovu

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			128 694,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	128 694,84	21,00%	27 025,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			155 720,76
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt:

ZL62 - Zábradlí z tahokovu

Místo: Olšanská

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		128 694,84
HSV - Práce a dodávky HSV		15 062,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 216,14
997 - Přesun sutě		2 846,30
PSV - Práce a dodávky PSV		111 108,40
767 - Konstrukce zámečnické		75 217,01
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		35 891,39
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		2 524,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: ZL62 - Zábradlí z tahokovu

Místo: Olšanská Datum: 17. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 128 694,84

D HSV Práce a dodávky HSV 15 062,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 216,14

415	K	953945142	Kotvy mechanické M 16 dl 170 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	226,00	5 424,00	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 16, délka 170 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953945142							
VV	4*6				24,000			

6	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,875	7 762,45	6 792,14	SoD
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

PP	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3							
VV	"atika terasy" 0,7*5,0*0,25				0,875			
VV	Součet				0,875			

D 997 Přesun sutě 2 846,30

38	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	2,100	298,56	626,98	SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,100	119,42	250,78	SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,900	17,91	714,61	SoD
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
VV	2,1*19 'Přepočtené koeficientem množství				39,900			

43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,100	597,11	1 253,93	SoD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 111 108,40

D 767 Konstrukce zámečnické 75 217,01

377	K	767995115	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	606,000	43,20	26 179,20	SoD
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

PP	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

1	M	15945235.R	plech děrovaný tahokov TR 62,5/22*9 mm, tl. 1,5 mm	t	0,289	111 700,00	32 281,30	Odvozená
---	---	------------	--	---	-------	------------	-----------	----------

PP	plech děrovaný tahokov oko 42/12,5/2,5 tl 1,5mm tabule							
VV	289/1000				0,289			

2	M	13010286	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm	t	0,180	37 200,00	6 696,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PP	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm							
VV	164/1000				0,164			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,180			
3	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,131	36 700,00	4 807,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm					
	VV		119/1000		0,119			
	VV		0,119*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,131			
4	M	13010618	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 40x40x5,0mm	t	0,020	38 700,00	774,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 40x40x5,0mm					
	VV		18/1000		0,018			
	VV		0,018*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
5	M	1000110744	Závítová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2	kus	6,000	277,96	1 667,76	Materiály online
	PP		Závítová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2					
	VV		0,25*4*6		6,000			
6	M	31197002	tyč závítová Pz 4.6 M8	m	2,640	48,80	128,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závítová Pz 4.6 M8					
	VV		0,1*4*6		2,400			
	VV		2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,640			
7	M	31111020	matice nerezová šestihranná M16	100 kus	0,264	3 030,00	799,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice nerezová šestihranná M16					
	VV		4*6/100		0,240			
	VV		0,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,264			
8	M	31111017	matice nerezová šestihranná M8	100 kus	1,056	426,00	449,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice nerezová šestihranná M8					
	VV		4*4*6/100		0,960			
	VV		0,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,056			
9	M	HWL.887201600 000	PODLOŽKA NEREZ M16	kus	26,400	10,00	264,00	Materiály online
	PP		PODLOŽKA NEREZ M16					
	VV		4*6		24,000			
	VV		24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,400			
393	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,698	1 673,98	1 168,44	SoD
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				35 891,39	
409	K	789121220	Oprášení ocelových konstrukcí třídy I	m2	40,341	17,91	722,51	SoD
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění oprášením					
410	K	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	m2	40,341	29,86	1 204,58	SoD
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním					
411	K	789121270	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy I	m2	40,341	65,68	2 649,60	SoD
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem					
412	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 µm	m2	40,341	776,25	31 314,70	SoD
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)					
	VV		"tahokov" (3,4*1,175)*2*5*0,70		27,965			
	VV		"T 40x40x4" 1,175*5*(0,04*4)		0,940			
	VV		"L 40x40x4" (1,175*2+3,4*2)*5*(0,04*4)		7,320			
	VV		"PL 100x8" (3,4*0,1*2,1+0,26*0,1*2,1*2)*5		4,116			
	VV		Součet		40,341			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 524,00	
10	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000	631,00	2 524,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 63	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 27.9.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Ubourání a odvětrání šachty kolektoru na SV Popis a zdůvodnění změny: U severovýchodní části objektu se nachází odvětrávací šachta do kolektoru. Tato šachta je neustále poškozována a slouží jako vstup pro osoby, které se dopouští v prostorách kolektoru trestné činnosti, kdy poškozuji a kradou zde kabely vedené do objektu Olšanská 4. Z tohoto je nutné upravit odvětrávání tak, aby nebyl odvětráváním umožněn vstup. Dojde k ubourání stávající betonové šachty, která je značně poškozena. Následně bude nahrazena nerezovými trubkami. Vliv na termín: NE. Vliv na výkresovou dokumentaci: ANO, bude doplněno do DSPS Vícepráce28.208,14 Kč Méněpráce 0,00 Kč Změna celkem28.208,14 Kč			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			




Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím. Viz přiložený návrh nové šachty od projektanta stavby.

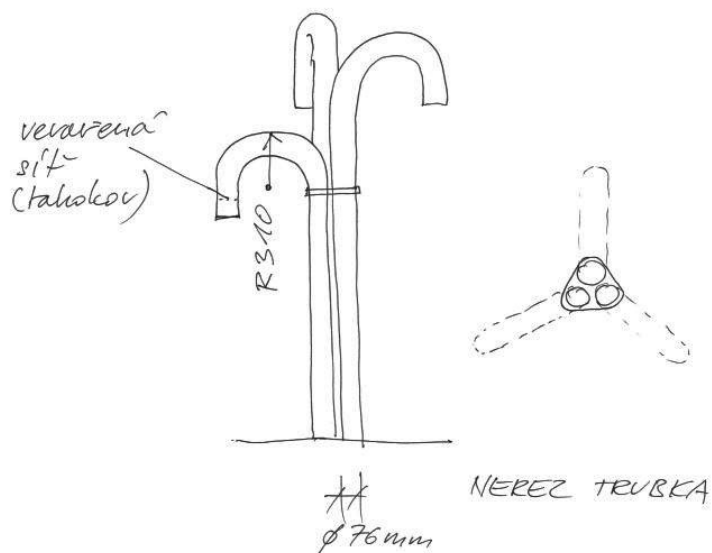

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní.

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 63
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	27.9.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ubourání a odvětrání šachty kolektoru na SV Popis a zdůvodnění změny: U severovýchodní části objektu se nachází odvětrávací šachta do kolektoru. Tato šachta je neustále poškozována a slouží jako vstup pro osoby, které se dopouští v prostorách kolektoru trestné činnosti, kdy poškozuji a kradou zde kabely vedené do objektu Olšanská 4. Z tohoto je nutné upravit odvětrávání tak, aby nebyl odvětráváním umožněn vstup. Dojde k ubourání stávající betonové šachty, která je značně poškozena. Následně bude nahrazena nerezovými trubkami.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	28.208,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28.208,14 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	28 208,14
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	28 208,14	5 923,71
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	34 131,85
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	26. 9. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		28 208,14	34 131,85	
ZL63	Ubourání a odvětrání šachty na SV	28 208,14	34 131,85	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL63 - Ubourání a odvětrání šachty na SV

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			28 208,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 208,14	21,00%	5 923,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			34 131,85
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olšanská 1951-4

Objekt:

ZL63 - Ubourání a odvětrání šachty na SV

Místo:

Olšanská

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 208,14

HSV - Práce a dodávky HSV

13 272,52

1 - Zemní práce

1 256,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 249,52

997 - Přesun sutě

6 683,38

998 - Přesun hmot

1 082,65

PSV - Práce a dodávky PSV

13 673,62

767 - Konstrukce zámečnické

11 138,98

772 - Podlahy z kamene

531,30

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

2 003,34

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 262,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: ZL63 - Ubourání a odvětrání šachty na SV

Místo: Olšanská Datum: 26. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							28 208,14	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 272,52	
D	1	Zemní práce					1 256,97	
16	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,114	211,18	235,25	SoD
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV	"zásyp šachty" (1,4-0,3)*(1,65-0,3)*0,75				1,114		
	VV	Součet				1,114		
13	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	2,228	458,58	1 021,72	SoD
	PP	štěrkopísek frakce 0/16						
	VV	1,114*2 'Přepočtené koeficientem množství				2,228		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 249,52	
1	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	1,693	1 240,00	2 099,32	CS ÚRS 2023 02
	PP	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961031411						
	VV	"obvod zdiva šachty x výška bouraného zdiva x tl. zdiva" (1,4*2+1,65*2)*1,85*0,15				1,693		
	VV	Součet				1,693		
8	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,277	7 762,45	2 150,20	SoD
	PP	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm						
	VV	"plocha šachty x tl. 120 mm" 1,4*1,65*0,12				0,277		
D	997	Přesun sutě					6 683,38	
38	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	4,931	298,56	1 472,20	SoD
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m						
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,931	119,42	588,86	SoD
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,689	17,91	1 677,97	SoD
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	VV	4,931*19 'Přepočtené koeficientem množství				93,689		
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,931	597,11	2 944,35	SoD
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
D	998	Přesun hmot					1 082,65	
141	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	2,571	421,10	1 082,65	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 673,62	
D	767		Konstrukce zámečnické				11 138,98	
48	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	18,920	87,50	1 655,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113					
	VV		"TR 76mm, tl. 2,0 mm, dl. 4 m" 3,71*4		14,840			
	VV		"koleno 90°, 6 ks" 0,58*6		3,480			
	VV		"nerez spona" 0,1		0,100			
	VV		"spojovací materiál" 0,5		0,500			
	VV		Součet		18,920			
46	M	140310R	Dodávka, výroba a doprava atypického odvětrávacího komínku z nerez	ks	1,000	9 450,00	9 450,00	CN
	PP		Dodávka, výroba a doprava atypického odvětrávacího komínku z nerez					
47	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,020	1 673,98	33,48	SoD
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D	772		Podlahy z kamene				531,30	
51	K	772522811	Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	2,310	230,00	531,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772522811					
	VV		"zastropení šachty" (1,4*1,65)		2,310			
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				2 003,34	
50	K	782131811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	6,710	298,56	2 003,34	SoD
	PP		Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty					
	VV		"obvod zdíva šachty x výška 1,1 m" (1,4*2+1,65*2)*1,1		6,710			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 262,00	
44	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	631,00	1 262,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 69	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 4.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Rampa před kantýnou			
Popis a zdůvodnění změny: Před provedením nového povrchu rampy je nutné rampu sanovat a vyrovnat do spádu. Reprofilací cementovou sanační maltou dojde k nahrazení poškozeného betonu a obnovení původní pevnosti a konstrukční celistvosti. Stávající povrchu bude očištěn od nesoudržných částí degradovaného betonu následně dojde k sanaci opravnou maltou a k vytvoření spádu. Zároveň dojde k doplnění 5 ks venkovního nástěnného osvětlení.			
Vliv na termín: NE			
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno v DSPS			
Vícepráce 100.557,07 Kč Méněpráce 20.351,54 Kč Změna celkem 80.205,53 Kč			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			



Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.


Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy

Příloha:

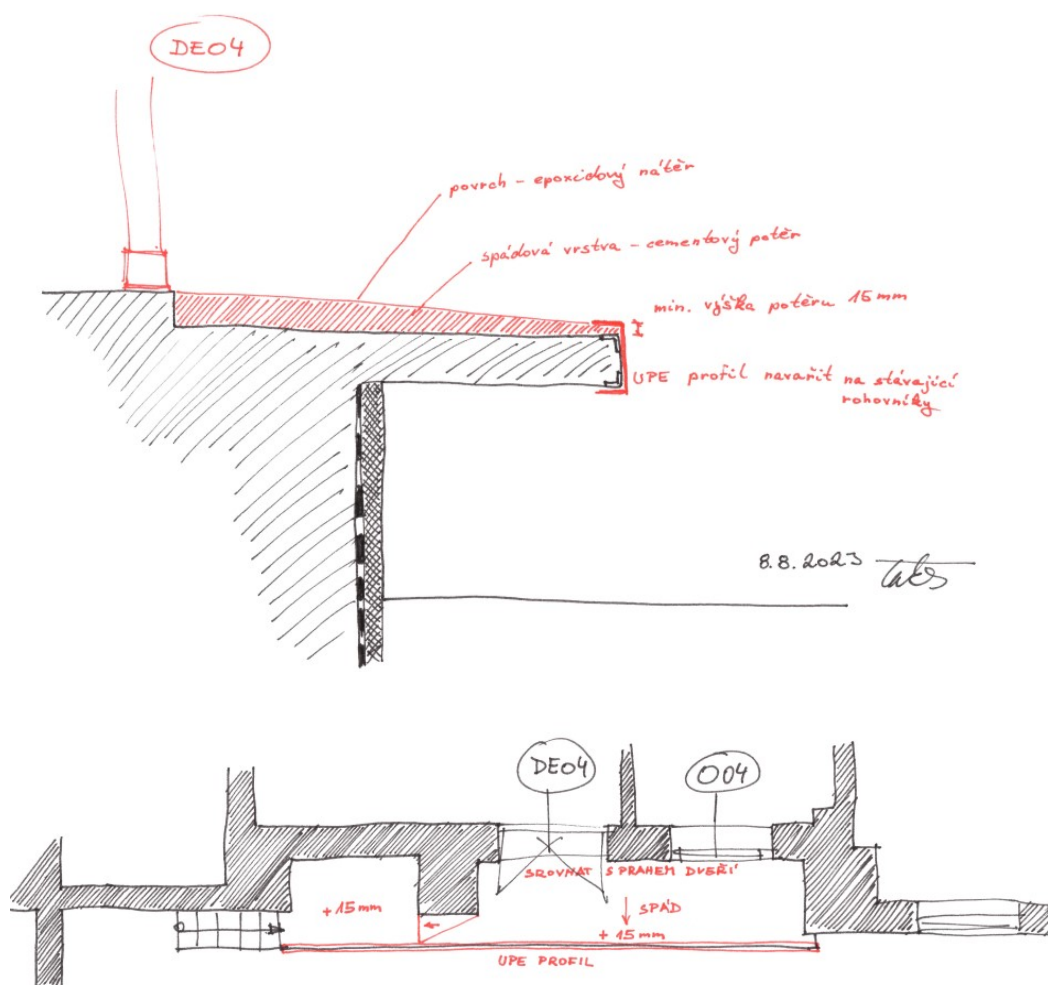

DLE ČSN 44 5305

- 5.1.2, a) zábradlí se nemusí zřizovat.... pokud by bránilo základnímu provozu (např. nakládací rampy)

8.8.2023

tks



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 69
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	4.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rampa před kantýnou Popis a zdůvodnění změny: Před provedením nového povrchu rampy je nutné rampu sanovat a vyrovnat do spádu. Reprofilací cementovou sanační maltou dojde k nahrazení poškozeného betonu a obnovení původní pevnosti a konstrukční celistvosti. Stávající povrchu bude očištěn od nesoudržných částí degradovaného betonu následně dojde k sanaci opravnou maltou a k vytvoření spádu. Zároveň dojde k doplnění 5 ks venkovního nástěnného osvětlení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
20.351,54 Kč	100.557,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
80.205,53 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	80 205,53
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	80 205,53	16 843,16
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	97 048,69
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251		
Stavba:	Olšanská 1951-4		
Místo:	Olšanská	Datum:	26. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:		
Zhotovitel:	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		80 205,53	97 048,69	
ZL69	Rampa před kantýnou	80 205,53	97 048,69	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL69 - Rampa před kantýnou

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			80 205,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 205,53	21,00%	16 843,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			97 048,69
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olšanská 1951-4

Objekt:

ZL69 - Rampa před kantýnou

Místo:

Olšanská

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

80 205,53

HSV - Práce a dodávky HSV

23 835,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 940,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 850,25

998 - Přesun hmot

44,22

PSV - Práce a dodávky PSV

54 477,09

741 - Elektroinstalace - silnoproud

35 356,68

767 - Konstrukce zámečnické

17 506,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 614,13

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 893,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL69 - Rampa před kantýnou

Místo: Olšanská Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 80 205,53

D HSV Práce a dodávky HSV 23 835,44

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 940,97

1	K	632452518.R	Potěr spádový 10-80 mm, 30 MPa do exteriéru ze suchých směsí prům. tl přes 40 do 45 mm	m2	11,200	1 127,25	12 625,20	odvozená
	PP		Potěr spádový 10-80 mm, 30 MPa do exteriéru ze suchých směsí prům. tl přes 40 do 45 mm					
	VV		"plocha rampy" 11,2		11,200			
2	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	11,200	41,20	461,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632902111					
	VV		"plocha rampy" 11,2		11,200			
3	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	11,700	26,20	306,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		"obvod plochy s odpočtem okrajů bez soklu" 20,57-(0,38+7,9+0,59)		11,700			
4	K	634662111.R	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách silikonovým trvale pružným tmelem	m	11,700	132,29	1 547,79	odvozená
	PP		Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách silikonovým trvale pružným tmelem					
	VV		"obvod plochy s odpočtem okrajů bez soklu" 20,57-(0,38+7,9+0,59)		11,700			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 850,25	
5	K	977171232	Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm	kus	9,000	54,10	486,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977171232					
6	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	0,886	425,00	376,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112132					
	VV		"Vyrovnávací schodiště k rampě, odhad 60%" (0,192+0,3)*0,6*5*0,6		0,886			
7	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,886	45,90	40,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112193					
	VV		"Vyrovnávací schodiště k rampě, odhad 60%" (0,192+0,3)*0,6*5*0,6		0,886			
8	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,676	142,00	1 799,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111					
	VV		"plocha rampy" 11,2		11,200			
	VV		"Vyrovnávací schodiště k rampě" (0,192+0,3)*0,6*5		1,476			
	VV		Součet		12,676			
9	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	12,676	188,00	2 383,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
		VV	"plocha rampy" 11,2		11,200			
		VV	"Vyrovnávací schodiště k rampě" (0,192+0,3)*0,6*5		1,476			
		VV	Součet		12,676			
10	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,886	140,00	124,04	CS ÚRS 2023 02
		PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311912					
		VV	"Vyrovnávací schodiště k rampě, odhad 60%" (0,192+0,3)*0,6*5*0,6		0,886			
		VV	Součet		0,886			
11	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	0,886	280,00	248,08	CS ÚRS 2023 02
		PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311913					
		VV	"Vyrovnávací schodiště k rampě, odhad 60%" (0,192+0,3)*0,6*5*0,6		0,886			
		VV	Součet		0,886			
12	K	98531ZLR02.BSF	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5800 DUO tl přes 20 do 30 mm	m2	0,886	3 115,56	2 760,39	ZL20
		PP	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5800 DUO tl přes 20 do 30 mm					
		VV	"Vyrovnávací schodiště k rampě, odhad 60%" (0,192+0,3)*0,6*5*0,6		0,886			
		VV	Součet		0,886			
13	K	985323111.BSF	Spojovací můstek MasterEmaco P 5000 AP reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,886	680,67	603,07	CS ÚRS 2023 02
		PP	Spojovací můstek MasterEmaco P 5000 AP reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111.BSF					
		VV	"Vyrovnávací schodiště k rampě, odhad 60%" (0,192+0,3)*0,6*5*0,6		0,886			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,886	31,00	27,47	CS ÚRS 2023 02
		PP	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323912					
		VV	"Vyrovnávací schodiště k rampě, odhad 60%" (0,192+0,3)*0,6*5*0,6		0,886			
	D	998	Přesun hmot				44,22	
416	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	0,105	421,10	44,22	SoD
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				54 477,09	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				35 356,68	
189	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-86,000	34,39	-2 957,54	SoD
		PP	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
		VV	-86		-86,000			
94	M	000101105.1	kabel CYKY-J 3x1,5	m	-86,000	20,49	-1 762,14	SoD
		PP	kabel CYKY-J 3x1,5					
		VV	-86		-86,000			
194	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	166,000	34,39	5 708,74	SoD
		PP	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
		VV	166		166,000			
99	M	000101305.1	kabel CYKY-J 5x1,5	m	166,000	33,10	5 494,60	SoD
		PP	kabel CYKY-J 5x1,5					
		VV	166		166,000			
20	M	000509031	Svítildo J - Venkovní nástěnné, IP44, čidlo pohybu	ks	-6,000	2 089,41	-12 536,46	SoD
		PP	Svítildo J - Venkovní nástěnné, IP44, čidlo pohybu					
131	K	210200013	svítidlo venkovní s čidlem	ks	-6,000	515,90	-3 095,40	SoD
		PP	svítidlo venkovní s čidlem					
237	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	5,000	17,20	86,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm					
	VV		-6+11		5,000			
418	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	11,000	425,00	4 675,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371102					
420	M	3483310R	Paulmann PEKANA flexibilní antracitové venkovní nástěnné svítidlo LED 2x6W 3000K, šířka 24cm, IP44	ks	6,000	2 952,40	17 714,40	CN+10%
	PP		Paulmann PEKANA flexibilní antracitové venkovní nástěnné svítidlo LED 2x6W 3000K, šířka 24cm, IP44					
422	M	3483320R	Svítidlo prachotěsné IP 67 FUTURA PC AL 5200/840	ks	5,000	2 237,40	11 187,00	CN+10%
	PP		Svítidlo prachotěsné IP 67 FUTURA PC AL 5200/840					
423	M	Pol1	Dodávka Instalační spínací hodiny TEMPUS roční ASTRO - digit.	ks	1,000	9 871,40	9 871,40	CN+10%
	PP		Dodávka Instalační spínací hodiny TEMPUS roční ASTRO - digit.					
	P		Poznámka k položce: (k pol. č. 420)					
425	M	Pol3	Dodávka pohybové čidlo se soumrakem	ks	1,000	833,80	833,80	CN+10%
	PP		Dodávka pohybové čidlo se soumrakem					
	P		Poznámka k položce: (k pol. č. 422)					
421	K	998741104	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,022	6 240,00	137,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741104					
	D	767	Konstrukce zámečnické				17 506,28	
417	K	767415791	Příplatek k montáži kompozitního panelu za zhotovení otvoru pl do 0,10 m2	kus	5,000	253,00	1 265,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND Příplatek k cenám za vyřezání otvoru v panelu do 0,10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767415791					
377	K	767995115	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	189,000	39,06	7 382,34	SoD
	PP		Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		0,189*1000 'Přepočtené koeficientem množství		189,000			
383	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	0,198	42 992,05	8 512,43	SoD
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200					
	VV		"UPE200" 8,3*22,8/1000		0,189			
	VV		0,189*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,198			
393	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,207	1 673,98	346,51	SoD
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 614,13	
404	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	6,026	41,80	251,89	SoD
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	VV		"UPE 200 (0,7 m2/bm)" 8,3*0,7		5,810			
	VV		"Vyrovnávací schodiště k rampě, ochrana hrany L profil cca 30/30 dl. 600 mm" 0,6*(0,03+0,03)*6		0,216			
	VV		Součet		6,026			
405	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,026	11,94	71,95	SoD
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		"UPE 200 (0,7 m2/bm)" 8,3*0,7		5,810			
	VV		"Vyrovnávací schodiště k rampě, ochrana hrany L profil cca 30/30 dl. 600 mm" 0,6*(0,03+0,03)*6		0,216			
	VV		Součet		6,026			
15	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,216	101,00	21,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801					
	VV		"Vyrovnávací schodiště k rampě, ochrana hrany L profil cca 30/30 dl. 600 mm" 0,6*(0,03+0,03)*6		0,216			
406	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,026	37,34	225,01	SoD
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"UPE 200 (0,7 m2/bm)" 8,3*0,7		5,810			
	VV		"Vyrovnávací schodiště k rampě, ochrana hrany L profil cca 30/30 dl. 600 mm" 0,6*(0,03+0,03)*6		0,216			
	VV		Součet		6,026			
407	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,026	173,16	1 043,46	SoD
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"UPE 200 (0,7 m2/bm)" 8,3*0,7		5,810			
	VV		"Vyrovnávací schodiště k rampě, ochrana hrany L profil cca 30/30 dl. 600 mm" 0,6*(0,03+0,03)*6		0,216			
	VV		Součet		6,026			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 893,00	
16	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	3,000	631,00	1 893,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 70	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“			
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 4.10.2023		
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Ochrana teplovodu - Západ				
Popis a zdůvodnění změny: Po odbourání původní vstupní haly a schodiště byla zjištěna kaverna pod původním schodištěm. V kaverně bylo zjištěno vedení teplovodu bez jakékoliv ochrany potrubí. Potrubí bude o obehedeno z tvárnic ztraceného bednění vyplněného výztuží a betonem. Následně dojde k přiklopení stropním panelem. Konstrukce bude opatřena izolací proti vodě jak na vodorovných, tak svislých plochách.				
Vliv na termín: NE				
Vliv na výkresovou dokumentaci: NE				
Vícepráce 67.593,17 Kč Méněpráce 0,00 Kč Změna celkem 67.593,17 Kč				
Počet připojených listů specifikací:		0		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 70
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	4.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ochrana teplovodu - Západ Popis a zdůvodnění změny: Po odbourání původní vstupní haly a schodiště byla zjištěna kaverna pod původním schodištěm. V kaverně bylo zjištěno vedení teplovodu bez jakékoliv ochrany potrubí. Potrubí bude o obezděno z tvárnic ztraceného bednění vyplněného výztuží a betonem. Následně dojde k přiklopení stropním panelem. Konstrukce bude opatřena izolací proti vodě jak na vodorovných, tak svislých plochách.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	67.593,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
67.593,17 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			67 593,17
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	67 593,17	14 194,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	81 787,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba: Olšanská 1951-4

Místo: Olšanská

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		67 593,17	81 787,74	
ZL70	Ochrana teplovodu	67 593,17	81 787,74	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4

Objekt:
ZL70 - Ochrana teplovodu

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67 593,17	
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	67 593,17		21,00%	14 194,57
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	81 787,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olšanská 1951-4

Objekt:

ZL70 - Ochrana teplovodu

Místo:

Olšanská

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

67 593,17

HSV - Práce a dodávky HSV

39 583,12

1 - Zemní práce

318,59

2 - Zakládání

15 530,82

4 - Vodorovné konstrukce

17 559,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 505,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

822,40

998 - Přesun hmot

3 846,75

PSV - Práce a dodávky PSV

26 117,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 617,05

713 - Izolace tepelné

16 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 893,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: ZL70 - Ochrana teplovodu

Místo: Olšanská Datum: 17. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							67 593,17	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					39 583,12	
D	1	Zemní práce					318,59	
1	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	6,080	52,40	318,59	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
VV			1,6*3,8		6,080			
D	2	Zakládání					15 530,82	
2	K	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl do 150 mm tř. C 25/30	m3	0,570	3 152,02	1 796,65	SoD
PP			Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 150 mm tř. C 25/30					
VV			"podkladní beton" 1,5*3,8*0,1		0,570			
3	K	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	m3	0,684	4 650,00	3 180,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313911					
VV			"podkladní deska pod parovod, šířka 0,25+0,7+0,25, dl. 3,8m, tl. 150 mm" 1,2*3,8*0,15		0,684			
4	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,140	466,11	531,37	SoD
PP			Bednění základů desek zřízení					
VV			"podkladní deska pod parovod, dl. 2x3,8m, v. 150 mm" 2*3,8*0,15		1,140			
5	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,140	139,00	158,46	SoD
PP			Bednění základů desek odstranění					
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	43 589,16	1 525,62	SoD
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			"KARI KY49, 7,667 kg/m2" 1,2*3,8*0,007667		0,035			
7	K	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	4,560	1 580,00	7 204,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113153					
VV			"obezdívka parovodu" 0,6*3,8*2		4,560			
8	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	43 589,16	1 133,32	SoD
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			"vodorovná výztuž 2xR10 do ložné psáry, svislá R10 á 0,5m" (3,8*8+8*0,7*2)*0,617/1000		0,026			
D	4	Vodorovné konstrukce					17 559,00	
9	K	411135001	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti do 1,5 t					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411135001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	59346843	panel stropní předpjatý š 1190mm v 160mm, počet lan 9 + 2	m	8,300	1 930,00	16 019,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		panel stropní předpjatý š 1190mm v 160mm, počet lan 9 + 2					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 505,56	
11	K	631311127	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,266	5 660,00	1 505,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311127					
	VV		"ochranná bet. mazanina mezi tvarovky ZB" 0,7*3,8*0,1		0,266			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				822,40	
12	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	51,40	822,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961112					
	VV		"trnování vypichů ze ZD" 8*2		16,000			
	D	998	Přesun hmot				3 846,75	
13	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	9,135	421,10	3 846,75	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				26 117,05	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 617,05	
14	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně z nopové fólie	m2	11,476	54,30	623,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovně V z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161173					
15	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	13,375	36,90	493,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		"boky, dl. x výška" 3,8*(0,16+0,6+0,15)*2		6,916			
	VV		"strop, dl. x šířka" 3,8*1,2		4,560			
	VV		Součet		11,476			
	VV		11,476*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		13,375			
16	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	4,560	53,10	242,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovně V vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491171					
	VV		"strop, dl. x šířka" 3,8*1,2		4,560			
	VV		Součet		4,560			
17	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	4,560	64,90	295,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovně V vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172					
	VV		"strop, dl. x šířka" 3,8*1,2		4,560			
	VV		Součet		4,560			
18	K	711491175	Přípevnění doplňků izolace proti vodě kotvicími pásy	m	7,600	57,90	440,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií přípevnění izolace kotvicími pásy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491175					
19	M	59053001	páska montážní perforovaná pozinková 12x0,75mm	m	7,752	23,10	179,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska montážní perforovaná pozinková 12x0,75mm					
	VV		"boky, dl. x výška" 3,8*2		7,600			
	VV		Součet		7,600			
	VV		7,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,752			
20	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	6,916	96,00	663,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491271					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"boky, dl. x výška" 3,8*(0,16+0,6+0,15)*2		6,916			
	VV		Součet		6,916			
21	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	6,916	114,00	788,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272					
	VV		"boky, dl. x výška" 3,8*(0,16+0,6+0,15)*2		6,916			
	VV		Součet		6,916			
22	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	25,247	24,54	619,56	SoD
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		"boky, dl. x výška" (3,8*(0,16+0,6+0,15)*2)*2		13,832			
	VV		"strop, dl. x šířka" (3,8*1,2)*2		9,120			
	VV		Součet		22,952			
	VV		22,952*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,247			
23	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2	4,560	77,90	355,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491471					
	VV		"strop, dl. x šířka" 3,8*1,2		4,560			
	VV		Součet		4,560			
24	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	6,916	151,00	1 044,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491571					
	VV		"boky, dl. x výška" 3,8*(0,16+0,6+0,15)*2		6,916			
	VV		Součet		6,916			
25	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	12,624	302,00	3 812,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm					
	VV		"boky, dl. x výška" 3,8*(0,16+0,6+0,15)*2		6,916			
	VV		"strop, dl. x šířka" 3,8*1,2		4,560			
	VV		Součet		11,476			
	VV		11,476*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,624			
26	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,046	1 288,34	59,26	SoD
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	D	713	Izolace tepelné				16 500,00	
239	K	713411R01	D+M tepelné izolace potrubí teplovodu DN110, dl. 2x 3,6m m z vatového pouzdra s AL polemem, ovinutí drátem	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	CN+10%
	PP		D+M tepelné izolace potrubí teplovodu DN110, dl. 2x 3,6m m z vatového pouzdra s AL polemem, ovinutí drátem					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 893,00	
27	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	3,000	631,00	1 893,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 71	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 11.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zídka u rampy Popis a zdůvodnění změny: Rekonstrukce zídky nebyla zahrnuta v PD. Po odkopání byla zjištěna značná degradace betonu. Reprofilací cementovou sanační maltou dojde k nahrazení poškozeného betonu a obnovení původní pevnosti a konstrukční celistvosti. Stávající povrchu bude očištěn od nesoudržných částí degradovaného betonu následně dojde k nátěru obnažené výztuže, k sanaci opravnou maltou a k vyrovnaní stěrky. Zídka bude osazena plotovou stříškou. Vliv na termín: NE Vliv na výkresovou dokumentaci: bude zahrnuto do DSPS Vícepráce67.375,01 Kč Méněpráce 0,00 Kč Změna celkem67.375,01 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			





Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 71
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	11.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zídka u rampy Popis a zdůvodnění změny: Rekonstrukce zídky nebyla zahrnuta v PD. Po odkopání byla zjištěna značná degradace betonu. Reprofilací cementovou sanační maltou dojde k nahrazení poškozeného betonu a obnovení původní pevnosti a konstrukční celistvosti. Stávající povrchu bude očištěn od nesoudržných částí degradovaného betonu následně dojde k nátěru obnažené výztuže, k sanaci opravnou maltou a k vyrovnaní stěrkou. Zídka bude osazena plotovou stříškou.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	67.375,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
67.375,01 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			67 375,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	67 375,01	14 148,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	81 523,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	17. 7. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		67 375,01	81 523,76	
ZL71	Zídka u rampy	67 375,01	81 523,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL71 - Zídka u rampy

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67 375,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67 375,01	21,00%	14 148,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	81 523,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: **ZL71 - Zídka u rampy**
Místo: Olšanská
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		67 375,01
HSV - Práce a dodávky HSV		66 179,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce		6 162,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		30 804,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		27 428,45
997 - Přesun sutě		329,36
998 - Přesun hmot		1 454,57
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		1 196,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL71 - Zídka u rampy

Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							67 375,01	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					66 179,01	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 162,00	
1	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	7,800	790,00	6 162,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272515					
VV			"délka zídky" 7,8		7,800			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					30 804,63	
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,010	267,00	2 939,67	CS ÚRS 2023 02
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, stěny opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3)		11,010			
3	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	331,115	62,10	20 562,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, stěny opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3)		11,010			
VV			"doplnění výměry k pol. 92 a 93 z SoD" 317,921+2,184		320,105			
VV			Součet		331,115			
87	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	16,500	60,97	1 006,01	SoD
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
VV			0,3*3+7,8*2		16,500			
91	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	17,325	21,93	379,94	SoD
PP			profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
VV			16,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,325			
92	K	622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn	m2	11,010	537,40	5 916,77	SoD
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, stěny opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3)		11,010			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					27 428,45	
4	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	2,670	439,55	1 173,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112112					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, cca 20% opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3+0,3*7,8)*0,2		2,670			
VV			Součet		2,670			
136	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	13,350	149,28	1 992,89	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, 100% opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3+0,3*7,8)	13,350				
5	K	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesusušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	m2	13,350	301,43	4 024,09	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesusušeným (torbo)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131221					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, 100% opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3+0,3*7,8)	13,350				
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	13,350	188,00	2 509,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, 100% opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3+0,3*7,8)	13,350				
7	K	985311112.BSF	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 10 do 20 mm	m2	1,335	2 794,22	3 730,28	ZL30
PP			Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 10 do 20 mm					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, cca 10% opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3+0,3*7,8)*0,1	1,335				
VV			Součet	1,335				
8	K	985311113.BSF	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 20 do 30 mm	m2	1,335	4 158,26	5 551,28	ZL30
PP			Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 20 do 30 mm					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, cca 10% opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3+0,3*7,8)*0,1	1,335				
9	K	985312112.BSF	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn MasterEmaco N 305 FC tl přes 2 do 3 mm	m2	13,350	480,16	6 410,14	ZL30
PP			Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn MasterEmaco N 305 FC tl přes 2 do 3 mm					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, 100% opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3+0,3*7,8)	13,350				
10	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	0,668	327,82	218,98	CS ÚRS 2023 02
PP			Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, cca 5% opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3+0,3*7,8)*0,05	0,668				
11	K	985323111.BSF	Spojovací můstek MasterEmaco P 5000 AP reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,670	680,67	1 817,39	ZL30
PP			Spojovací můstek MasterEmaco P 5000 AP reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm					
VV			"sanace venkovní zídky u rampy, cca 20% opravované plochy" (7,8*(0,3+1,1)/2*2+0,3*0,3+0,3*7,8)*0,2	2,670				
VV			Součet	2,670				
D 997			Přesun sutě	329,36				
38	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	0,243	298,56	72,55	SoD
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m					
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,243	119,42	29,02	SoD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,617	17,91	82,69	SoD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			0,243*19 'Přepočtené koeficientem množství	4,617				
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,243	597,11	145,10	SoD
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D 998			Přesun hmot	1 454,57				
45	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	0,812	1 791,34	1 454,57	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdíváného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012024					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	1 196,00				
12	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	598,00	1 196,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 72	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 4.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna vjezdové brány Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nutnosti úpravy opěrné stěny (ZL č. 45) nelze provést zpětné osazení demontované brány po vybudování nové opěrné stěny. Projektantem stavby byla zpracována dokumentace pro provedení nové brány. Nová brána, usazení a pojezd bude respektovat stavebně konstrukční řešení opěrné stěny, kterou bylo nutné změnit s ohledem na nestabilní podloží a na geometrii a charakter konstrukce opěrné stěny. Novou bránu nelze v současné době realizovat, a to z důvodu zásobování stavby a nutnosti zajištění stálého přístupu do sousedního objektu. Realizace nové brány bude provedena v rámci druhého stavebního objektu (SO2). Vliv na termín: NE. Vliv na výkresovou dokumentaci: ANO, Bude zahrnuto v dokumentaci skutečného provedení stavby. Vícepráce0,00 Kč Méněpráce8.956,68 Kč Změna celkem – 8.956,68 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nové stavebně konstrukční řešení opěrné stěny nemá vliv na celkové tepelně-technické parametry navržené v projektu.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 72
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	4.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna vjezdové brány Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nutnosti úpravy opěrné stěny (ZL č. 45) nelze provést zpětné osazení demontované brány po vybudování nové opěrné stěny. Projektantem stavby byla zpracována dokumentace pro provedení nové brány. Nová brána, usazení a pojezd bude respektovat stavebně konstrukční řešení opěrné stěny, kterou bylo nutné změnit s ohledem na nestabilní podloží a na geometrii a charakter konstrukce opěrné stěny. Novou bránu nelze v současné době realizovat, a to z důvodu zásobování stavby a nutnosti zajištění stálého přístupu do sousedního objektu. Realizace nové brány bude provedena v rámci druhého stavebního objektu (SO2).		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
8.956,68 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 8.956,68 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	-8 956,68
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-8 956,68	-1 880,90
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-10 837,58
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba: Olšanská 1951-4

Místo: Olšanská

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-8 956,68	-10 837,58	
ZL72	Vjezdová brána	-8 956,68	-10 837,58	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL72 - Vjezdová brána

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-8 956,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-8 956,68	21,00%	-1 880,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-10 837,58
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: **ZL72 - Vjezdová brána**
Místo: Olšanská
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-8 956,68
PSV - Práce a dodávky PSV	-8 956,68
767 - Konstrukce zámečnické	-8 956,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: ZL72 - Vjezdová brána
Místo: Olšanská
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem -8 956,68

D PSV Práce a dodávky PSV -8 956,68

D 767 Konstrukce zámečnické -8 956,68

1	K	767 - R1.1	Demontáž sloupky a křídla brány a zpětné osazení po vybudování opěrné stěny	kpl	-0,500	17 913,36	-8 956,68	SoD
	PP		Demontáž sloupky a křídla brány a zpětné osazení po vybudování opěrné stěny					

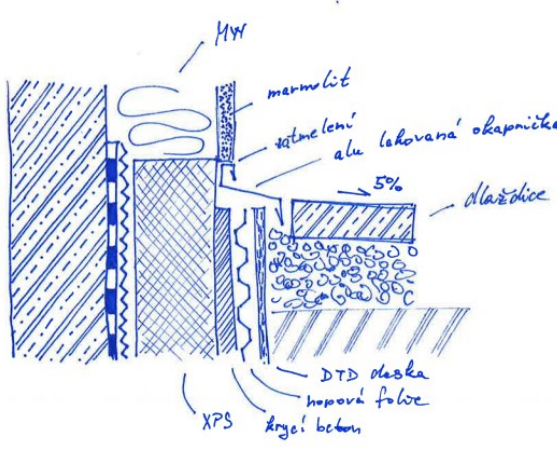

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 73	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 27.9.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	M218 - b101_NS_1.PP - Půdorys 1.PP (Příloha č. 2)	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Lišta u okapového chodníku Popis a zdůvodnění změny: při instalaci tepelné izolace byly zjištěny značné nerovnosti obvodového zdiva. Dochází tak k odskoku mezi navazující skladbou zateplení. Mezi přechodem dvou různých typů zateplení je nutné vložit alu lakovanou okapnici dle návrhu projektanta stavby. Výměra dle přiloženého schématu (Příloha č. 2) 			
Vliv na termín: NE Vliv na výkresovou dokumentaci: nemá vliv na výkresovou dokumentaci. Vícepráce55.137,03 Kč Méněpráce0,00 Kč Změna celkem55.137,03 Kč			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			



Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím. Viz návrh vložení okapnice od projektanta stavby.

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 73
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	27.9.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Lišta u okapového chodníku Popis a zdůvodnění změny: při instalaci tepelné izolace byly zjištěny nerovnosti obvodového zdiva. Dochází tak kodsokoku mezi navazující skladbou zateplení. Mezi přechodem dvou různých typů zateplení je nutné vložit alu lakovanou okapnici dle návrhu projektanta stavby. Výměra dle přiloženého schématu (Příloha č. 2)		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	55.137,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55.137,03 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	55 137,03
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	55 137,03	11 578,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	66 715,81
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba: Olšanská 1951-4

Místo: Olšanská

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		55 137,03	66 715,81	
ZL73	lišta u okapového chodníku	55 137,03	66 715,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL73 - lišta u okapového chodníku

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 137,03
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 137,03	21,00%	11 578,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 715,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt:

ZL73 - lišta u okapového chodníku

Místo: Olšanská

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	55 137,03
PSV - Práce a dodávky PSV	54 506,03
764 - Konstrukce klempířské	54 506,03
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	631,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL73 - lišta u okapového chodníku

Místo: Olšanská

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 137,03


D PSV Práce a dodávky PSV 54 506,03

D 764 Konstrukce klempířské 54 506,03

1	K	764011624	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm	m	128,753	362,00	46 608,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011624					
	VV		"viz. schematický zakres půdorys 1.PP"					
	VV		"jih" 17,86		17,860			
	VV		"před kantýnou" 14,893		14,893			
	VV		"sever + východ" 96		96,000			
	VV		Součet		128,753			
2	M	1000107504	EL 1000987 Hmoždinka do polystyrenu HDP60 25x58 (bal.20)	kus	386,259	18,97	7 327,33	Materiály Online
	PP		EL 1000987 Hmoždinka do polystyrenu HDP60 25x58 (bal.20)					
	VV		"jih" 17,86*3		53,580			
	VV		"před kantýnou" 14,893*3		44,679			
	VV		"sever + východ" 96*3		288,000			
	VV		Součet		386,259			
271	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,221	2 579,70	570,11	SoD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 631,00

3	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000	631,00	631,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					

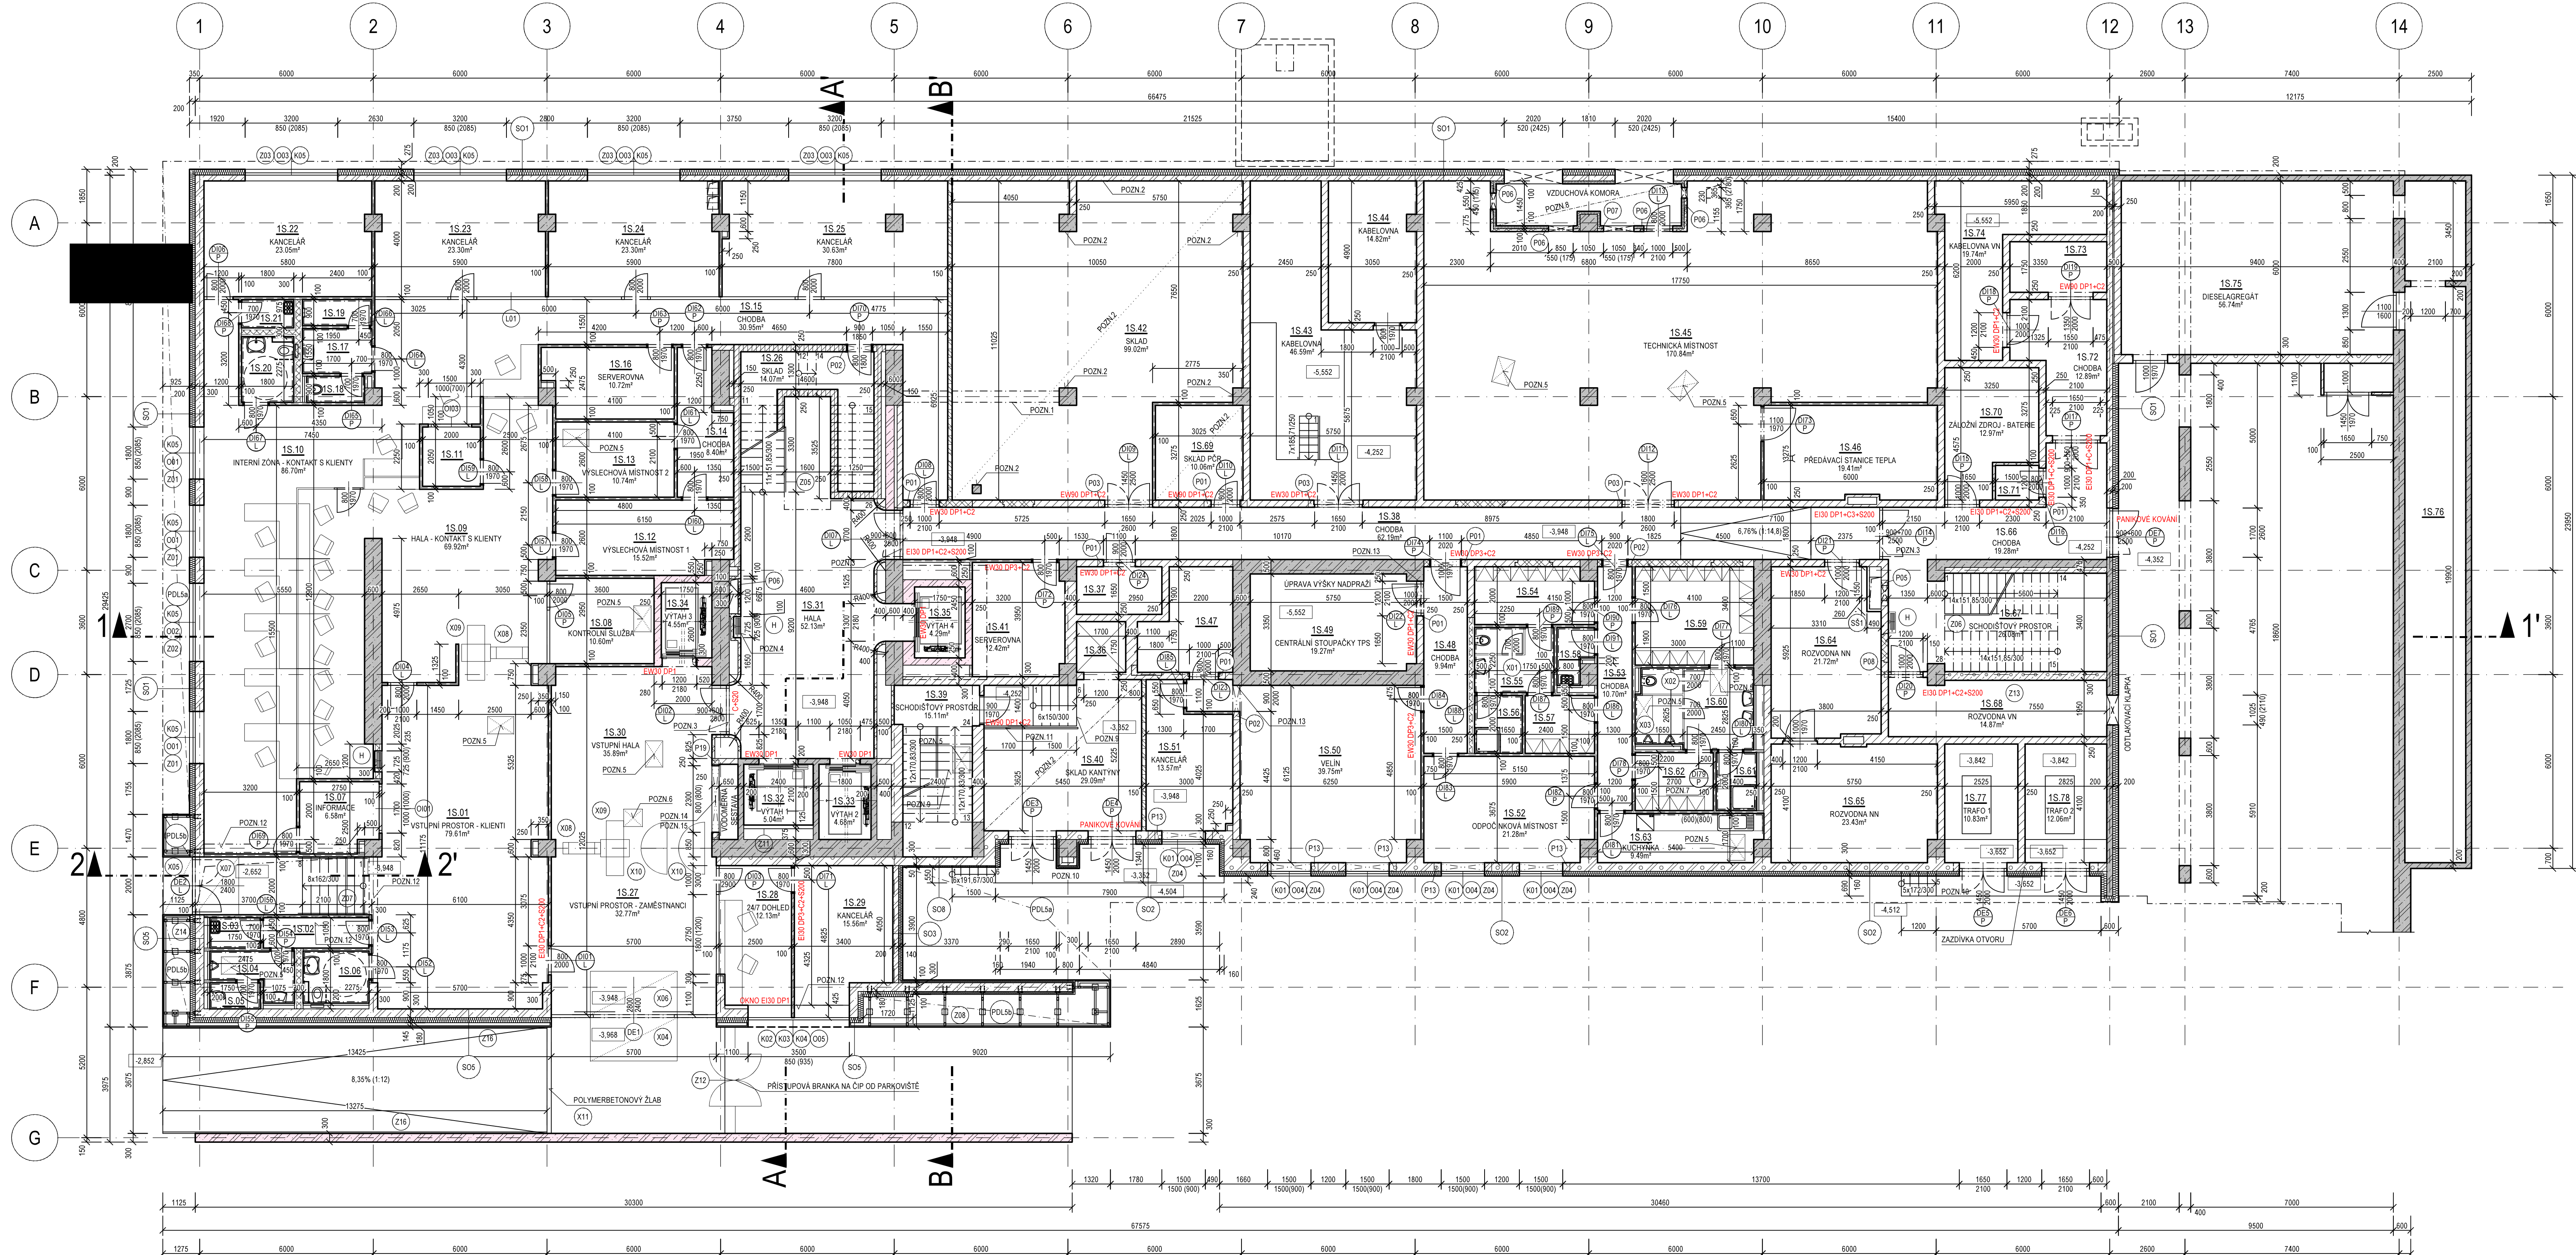

Tabulka místností - 1.PP					
Číslo	Název místnosti	Plocha (m²)	Podlaha	Strop	Výška
15.01	VSTUPNÍ PROSTOR - KLIENTI	79.81	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.02	CHODBA	3.98	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.03	KUCHYNA KOMORA	1.84	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.04	PŘEDSÍN + PISAR - MUŽI - KLIENTI	3.86	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.05	WC - MUŽI - KLIENTI	1.57	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.06	WC ŽENY + MOJELNY - KLIENTI	4.18	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.07	WC - MUŽI - KLIENTI	4.58	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.08	KONTROLNÍ SLUŽBA	10.6	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.09	HALA - KONTAKT S KLIENTY	69.92	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.10	INTERIÉROVÁ - KONTAKT S KLIENTY	99.7	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.11	BIROTRIE	4.18	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.12	VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST 1	15.52	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.13	VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST 2	10.14	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.14	CHODBA	8.4	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.15	CHODBA	36.95	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.16	SEKRETERNA	10.72	PVC	POL18	2.4
15.17	PŘEDSÍN - MUŽI - ZAMĚSTNANCI	3.95	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.18	WC - MUŽI - ZAMĚSTNANCI	1.8	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.19	PISAR - ZAMĚSTNANCI	2.16	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.20	WC ŽENY + MOJELNY - ZAMĚSTNANCI	4.18	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.21	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.75	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.22	KANCELAR	23.05	KOBEREC	POL4	2.4
15.23	KANCELAR	23.3	KOBEREC	POL4	2.4
15.24	KANCELAR	23.3	KOBEREC	POL4	2.4
15.25	KANCELAR	30.63	KOBEREC	POL4	2.4
15.26	SKLAD	14.97	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.27	VSTUPNÍ PROSTOR - ZAMĚSTNANCI	32.78	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.28	247 DOHLÉD	12.13	TRAVERTIN	POL27	2.4
15.29	KANCELAR	15.38	POL27	POL27	2.4
15.30	VSTUPNÍ HALA	35.49	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.31	HALA	52.13	TRAVERTIN	POL2	2.4
15.32	VÝTAH 1	5.54	EPOXID	POL20	2.4
15.33	VÝTAH 2	4.58	EPOXID	POL20	2.4
15.34	VÝTAH 3	4.55	EPOXID	POL20	2.4
15.35	VÝTAH 4	4.29	EPOXID	POL20	2.4
15.36	VÝTAH 5	2.97	EPOXID	POL20	2.4
15.37	STROJOVNA VÝTAHU	5.12	EPOXID	POL19	2.4
15.38	CHODBA	62.19	KERAMICKÁ DL	POL1	2.4
15.39	SCHODISTOVÝ PROSTOR	15.11	KERAMICKÁ DL	POL1	2.4
15.40	SKLAD KANTYNY	29.09	KERAMICKÁ DL	POL1	2.4
15.41	SEKRETERNA	12.42	PVC	POL18	2.4
15.42	SKLAD	99.02	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.43	KABELOVNA	46.95	BETON	-	2.4
15.44	KABELOVNA	14.81	BETON	-	2.4
15.45	TECHNICKÁ MÍSTNOST	172.84	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.46	PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA	19.41	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.47	SKLAD ZBRANÍ A STŘELIVA	10.1	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.48	CHODBA	19.84	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.49	CENTRÁLNÍ STUPOVACÍ TIPS	19.27	POROCOR	POL21	2.4
15.50	VELN	39.75	KOBEREC	POL18	2.4
15.51	KANCELAR	13.57	KOBEREC	POL28	2.4
15.52	OPPOČINOVÁ MÍSTNOST	21.28	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.53	CHODBA	10.7	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.54	SATNA - ŽENY - POLICE	8.13	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.55	WC - HYGIENA - ŽENY	6.27	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.56	SPICHA - ŽENY	3.3	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.57	SATNA - ŽENY - CIVILNÍ ZAMĚSTNANCI	4.88	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.58	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.13	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.59	SATNA - MUŽI - POLICE	13.94	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.60	WC - PISAR, HYGIENA - MUŽI	11.24	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.61	SPICHA - MUŽI	2.9	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.62	SATNA - MUŽI - CIVILNÍ ZAMĚSTNANCI	5.48	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.63	KUCHYNA	9.48	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.64	ROZVOJNA VN	21.72	PVC	POL15	2.4
15.65	CHODBA	19.28	KERAMICKÁ DL	POL1	2.4
15.66	SCHODISTOVÝ PROSTOR	28.18	KERAMICKÁ DL	POL19	2.4
15.67	ROZVOJNA VN	14.87	PVC	POL15	2.4
15.68	SKLAD PČR	10.08	KERAMICKÁ DL	POL3	2.4
15.69	ZALOŽNÍ ZDROJ - BATERIE	12.97	PVC	POL16	2.4
15.70	USTRÉDNA EPS	1.95	KERAMICKÁ DL	POL1	2.4
15.71	CHODBA	12.89	KERAMICKÁ DL	POL1	2.4
15.72	SKLAD NÁTY	6.23	EPOXID	POL17	2.4
15.73	KABELOVNA VN	19.74	BETON	-	2.4
15.74	DISELAAGREGAT	56.74	BETON	-	2.4
15.75	ODTÁH OD DIESELAGREGATU	50.09	BETON	-	2.4
15.76	TRAFID 1	13.43	EPOXID	POL17	2.4
15.77	TRAFID 2	12.86	EPOXID	POL17	2.4

Celková plocha [m²]: 1613.41

Tabulka překladů - 1.PP		
Číslo	Stavba	Podle kusu
P01	2 x RZP 180/12/19 V	5
P02	2 x RZP 118/12/14 V	3
P03	2 x RZP 260/12/19 V	3
P04	2 x RZP 88/12/14 V	3
P05	1 x POROBETONOVÝ NEMOSNÝ 125/10/25	5
P06	1 x RZP 180/12/14 P	1
P07	2 x RZP 180/12/14 P	1
P08	2 x RZP 180/12/14 V	5
P09	2 x RZP 260/12/24 V	1

POZNÁMKY:

- POZN 1 - OCELOVÝ PRŮVLAK HEA 280 BUDE VICEVRSTVĚ OPLÁŠTEN POMOCÍ SÁDROVÁKOVÝCH DESEK V TL. OBLADU MN. 55 mm NA POŽÁDANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST 180 MINUT.
- POZN 2 - ŽB KONSTRUKCE STĚN, STŘEŠNÍ A SKUPY BUDOU OPATŘENY RABOCOVÝM PLETIVEM A PROTIPÓŽÁRNÍ OMIKOTOU PRO ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCI NA MIN. 180 MINUT. PŘED NANAŠENÍM BUDE POVRCH ZBĚVEN VŠECH NEČISTOT A MASTNOSTÍ.
- POZN 3 - NÁDE OVRHNI BUDE K ŽB STROPU DOTAŽENA SÁDROVÁKOVÁ PRÍČKA - SKLADBY SÍ - PRÍČKA TL. 100 mm S 1xR-CW50, 1x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1.
- POZN 4 - POD A NAD HYDROANTOVOU ŠKŘÍNI BUDE PŘEVEDENA SÁDROVÁKOVÁ PŘEDSTĚNA - SKLADBY SÍ - PŘEDSTĚNA TL. 62,5 mm S 1xR-CW50, 1x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, BEZ TL.
- POZN 5 - X14 - HLINIKOVÝ ZADLÁŽBOVÝ POKLOP O ROZMĚRU 600x600 mm S VÝPLNÍ BETONEM TL. CCA 50 mm. NOSNOST POKLOPU 1,5 t.
- POZN 6 - X13 - HLINIKOVÝ ZADLÁŽBOVÝ POKLOP O ROZMĚRU 600x600 mm S VÝPLNÍ BETONEM TL. CCA 60 mm. NOSNOST POKLOPU 1,5 t.
- POZN 7 - X12 - HLINIKOVÝ ZADLÁŽBOVÝ POKLOP O ROZMĚRU 500x500 mm S VÝPLNÍ BETONEM TL. CCA 50 mm. NOSNOST POKLOPU 1,5 t.
- POZN 8 - STŘEP BUDE ULOŽEN NA IMERALNÍ BEZVLÁNNÝCH DESEK TL. 200 mm KOTVENÝM OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM HŘÍDLOVACÍM.
- POZN 9 - HRANA SCHODU BUDE OPATŘENA PROTISKLUZOVÝM PROFILEM Z NERZEDOVÉ OCELI.
- POZN 10 - POVRCH RAMPY BUDE OČIŠTEN A OPATŘEN NOVÝM PU NÁTĚREM S PROTISKLUZOVÝM VÝSPEM.
- POZN 11 - ŽÁRPADLO BUDE ZABUDOVÁNO PODLAŽNÍM NÁTĚREM A BUDE OPATŘENO NOVÝM.
- POZN 12 - OCELOVÉ KONSTRUKCE Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ BUDOU OPATŘENY POMOCÍ SÁDROVÁKOVÝCH DESEK V TL. OBLADU MN. 30 mm (2x DESKA TL. 15 mm) NA POŽÁDANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST 90 MINUT.
- POZN 13 - OHEBNÍK L200x10 mm DL. 250 mm PRO ULOŽENÍ PŘÍKLADU - KOTVEN 2x CHEMICKOU KOTVOU M8.
- POZN 14 - STĚNA BUDE OBOURANÁ K ŽB STŘEŠNÍ. PO OČIŠTENÍ NOVE VODOMĚRNE BĚŽNÝ A PŘEVEDENÍ ROZVOJOU VODY DO OBJEKTU BUDE STĚNA ZNOVU VYZDĚNÁ Z VÁPENOPÍROKOVÝCH TVÁRNIC TL. 240 mm.
- POZN 15 - OVOKUŘIDLA OTVÁŘA VODOMĚRNE BĚŽNÝ 230x600 mm SE ZÁMĚM.

NAD VŠEM SKLENĚNÝM PRÍČKAM BUDE K ŽB STROPU DOTAŽENA SÁDROVÁKOVÁ PRÍČKA - PRÍČKA SKLADBY SÍ - TL. 100 mm S 1xR-CW50, 1x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1.

40000 - ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP
BARVENÉ ŘEŠENÍ JE TŘEBA VYKONZERVAT A ODOLÁVAT S GERNÁLNÍM PROJEKTAŇEM A INVESTOREM
NEJEDINOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA ZKONTROLOVAT A DOMĚŘIT PŘI ZAMĚŘENÍ NUTNO ŘEŠIT NA STAVBĚ. PŘI JAKÝMKOLIV NESLOUŽÍ PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTAŇEM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZELEZOBETONOVÝ SKELET
- ZELEZOBETON
- NOVÉ ZELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STAVAJICI - KERAMICKÉ VÝZDVKY NA MVC
- STAVAJICI - PLYNKUŠKATOVÉ ŽIVO NA MVC
- ZDVO Z VÁPENOPÍROKOVÝCH TVÁRNIC TL. 230 mm NA P-D, VÝŠKOVÝ MODUL 230 mm, P2-1800 NA MALTU PRO TENKE SPÁRY - M 0.7, Rw 58 dB, REI 180 DP1
- ZDVO Z VÁPENOPÍROKOVÝCH TVÁRNIC TL. 240 mm NA P-D, VÝŠKOVÝ MODUL 230 mm, P2-2000 NA MALTU PRO TENKE SPÁRY - M 0.7, Rw 58 dB, REI 180 DP1
- POROBETONOVÉ ŽIVO TL. 200 mm, P4-550 NA MALTU PRO TENKE SPÁRY - M 0.7, Rw 58 dB, REI 180 DP1
- POROBETONOVÉ PRÍČKOVY TL. 150 mm, P3-600 NA MALTU PRO TENKE SPÁRY - M 0.7, Rw 58 dB, REI 180 DP1
- POROBETONOVÉ PRÍČKOVY TL. 100 mm, P2-600 NA MALTU PRO TENKE SPÁRY - M 0.7, Rw 58 dB, REI 180 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 75, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 100, 1x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 125, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 150, 1x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 175, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 200, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 225, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 250, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 275, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 300, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 325, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 350, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 375, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 400, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 425, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 450, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 475, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 500, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 525, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 550, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 575, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 600, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 625, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 650, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 675, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 700, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 725, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 750, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 775, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 800, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 825, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 850, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 875, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 900, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 925, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 950, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 975, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1000, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1025, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1050, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1075, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1100, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1125, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1150, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1175, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1200, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1225, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1250, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1275, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1300, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1325, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1350, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1375, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1400, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1425, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1450, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1475, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1500, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-CW 1525, 2x SÁDROVÁKOVÁ DESKA TL. 12,5 mm, Tl. 40 mm - 15 kg/m², Rw 54 dB, E30 DP1
- SDV PRÍČKA TL. 100 mm - 1xR-C



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 75	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 27.9.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Omítky špalet			
Popis a zdůvodnění změny: Špalety pásového okna u hlavního schodiště a špalety LOP u západního výklenku jsou nerovné a není možné napojení na nově instalované konstrukce. Proto je nutné provést penetraci podkladních a spojovacích vrstev vnitřních omítaných ploch stěn a vyrovnaní lehčenou vápenocementovou omítkou, tak aby byla zajištěna těsnost.			
Vliv na termín: Ne.			
Vliv na výkresovou dokumentaci: NE			
Vícepráce98.631,09 Kč Méněpráce 0,00 Kč Změna celkem98.631,09 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 75
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	27.9.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Omítky špalet Popis a zdůvodnění změny: Špalety pásového okna u hlavního schodiště a špalety LOP u západního výklenku jsou nerovné a není možné napojení na nově instalované konstrukce. Proto je nutné provést penetraci podkladních a spojovacích vrstev vnitřních omítaných ploch stěn a vyrovnaní lehčenou vápenocementovou omítkou, tak aby byla zajištěna těsnost.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	98.631,09 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
98.631,09 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			98 631,09
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	98 631,09	20 712,53
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	119 343,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	26. 9. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		98 631,09	119 343,62	
ZL75	Omítky špalet	98 631,09	119 343,62	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL75 - Omítky špalet

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			98 631,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	98 631,09	21,00%	20 712,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	119 343,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: **ZL75 - Omítky špalet**
Místo: Olšanská
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	98 631,09
HSV - Práce a dodávky HSV	96 738,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	94 761,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	750,60
998 - Přesun hmot	1 226,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 893,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL75 - Omítky špalet

Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							98 631,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 738,09	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				94 761,25	
1	K	613131101	Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	36,300	125,00	4 537,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613131101						
	VV	"Špalety hl. Schodiště š. 200-350 mm" 0			0,000			
	VV	"Špalety okna ve výklenku,detail D2.17, A - ostění 2.NP - Střecha" 31,68			31,680			
	VV	"Špalety oken a dveří v místnostec, C - ostění 1.NP" 4,62			4,620			
	VV	Součet			36,300			
2	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	61,550	95,60	5 884,18	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613131121						
	VV	"penetrace pod lepidlo"						
	VV	"Špalety hl. Schodiště š. 200-350 mm, B - ostění 2.NP - Střecha" 25,25			25,250			
	VV	"Špalety okna ve výklenku,detail D2.17, A - ostění 2.NP - Střecha" 31,68			31,680			
	VV	"Špalety oken a dveří v místnostec, C - ostění 1.NP" 4,62			4,620			
	VV	Součet			61,550			
3	K	613142001.R	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů tmelem bez síťoviny	m2	123,100	307,23	37 820,01	odvozená
	PP	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů tmelem bez síťoviny						
	VV	"Špalety hl. Schodiště š. 200-350 mm, B - ostění 2.NP - Střecha" 25,25*2			50,500			
	VV	"Špalety okna ve výklenku,detail D2.17, A - ostění 2.NP - Střecha" 31,68*2			63,360			
	VV	"Špalety oken a dveří v místnostec, C - ostění 1.NP" 4,62*2			9,240			
	VV	Součet			123,100			
4	K	613322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	36,300	409,00	14 846,70	CS ÚRS 2023 02
	PP	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613322121						
	VV	"Špalety hl. Schodiště š. 200-350 mm" 0			0,000			
	VV	"Špalety okna ve výklenku,detail D2.17, A - ostění 2.NP - Střecha" 31,68			31,680			
	VV	"Špalety oken a dveří v místnostec, C - ostění 1.NP" 4,62			4,620			
	VV	Součet			36,300			
5	K	613322191	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	290,400	96,60	28 052,64	CS ÚRS 2023 02
	PP	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613322191						
	VV	"Špalety hl. Schodiště š. 200-350 mm" 0			0,000			
	VV	"Špalety okna ve výklenku,detail D2.17, A - ostění 2.NP - Střecha" 31,68*8			253,440			
	VV	"Špalety oken a dveří v místnostec, C - ostění 1.NP" 4,62*8			36,960			
	VV	Součet			290,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	59,400	19,00	1 128,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143005					
	VV		"Špalety hl. Schodiště š. 200-350 mm" 0		0,000			
	VV		"Špalety okna ve výklenku,detail D2.17, A - ostění 2.NP - Střecha" 3,3*2*8		52,800			
	VV		"Špalety oken a dveří v místnostec, C - ostění 1.NP" 3,3*2		6,600			
	VV		Součet		59,400			
7	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,262	9 510,00	2 491,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m					
	VV		"Špalety hl. Schodiště š. 200-350 mm" 0		0,000			
	VV		"Špalety okna ve výklenku,detail D2.17, A - ostění 2.NP - Střecha" 3,3*2*8*0,16*0,024		0,203			
	VV		"Špalety oken a dveří v místnostec, C - ostění 1.NP" 3,3*2*0,16*0,024		0,025			
	VV		Součet		0,228			
	VV		0,228*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,262			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				750,60	
92	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	23,88	477,60	SoD
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
8	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	65,000	4,20	273,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021					
	D	998	Přesun hmot				1 226,24	
125	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	2,912	421,10	1 226,24	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 893,00	
9	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	3,000	631,00	1 893,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					

A - ostění 2.NP - Střecha							
x (m)	y (m)	x+y (m)	h patra (m)	plocha na patře (m2)	počet pater	plocha ostění (m2)	plocha celkem (m2)
0,4	0,2	0,6	3,3	1,98	8	15,84	31,68

Vyrovnání ostění jádrovou omítkou tl. 20-60 mm

2x stěrkování lepidlem

B - ostění 2.NP - Střecha							
x (m)	y (m)	x+y (m)	h (m)	plocha ostění (m2)	šířka nadpraží (m)	plocha nadpraží (m2)	plocha celkem (m2)
0,3	0,2	0,5	25,25	12,625	0	0	25,25

bez nadpraží

2x stěrkování lepidlem

C - ostění 1.NP					
x (m)	y (m)	x+y (m)	h (m)	plocha ostění (m2)	plocha celkem (m2)
0,35	0,35	0,7	3,3	2,31	4,62

Vyrovnání ostění jádrovou omítkou tl. 20 - 60 mm

2x stěrkování lepidlem



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 76	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 2.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Bourání ŽB věnce, zadržka zhlaví			
Popis a zdůvodnění změny: Pro potřeby vzduchotechniky je nutná úprava otvorů v 9.NP. Dotčené otvory se musí mírně rozšířit jak do stran, tak hlavně pod strop. V původní PD se počítalo s osazením překladu do stáv. zdiva, vzhledem k posunu otvoru je překlad nutné osadit v místech původního ŽB věnce. Dutiny překladů budou zednický zapraveny.			
Vliv na termín: Ne.			
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zaneseno do DSPS			
Vícepráce13.484,21 Kč Méněpráce569,52 Kč Změna celkem12.914,69 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
		odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 76
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	2.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání ŽB věnce, zazdívka zhlaví Popis a zdůvodnění změny: Pro potřeby vzduchotechniky je nutná úprava otvorů v 9.NP. Dotčené otvory se musí mírně rozšířit jak do stran, tak hlavně pod strop. V původní PD se počítalo s osazením překladu do stávajícího zdiva, vzhledem k posunu otvoru je překlad nutné osadit v místech původního ŽB věnce. Dutiny překladů budou zednický zapraveny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
569,52 Kč	13.484,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.914,69 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			12 914,69
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	12 914,69	2 712,08
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	15 626,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba: Olšanská 1951-4

Místo: Olšanská

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

12 914,69

15 626,77

ZL76 Bourání ŽB věnce

12 914,69

15 626,77

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL76 - Bourání ŽB věnce

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 914,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 914,69	21,00%	2 712,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			15 626,77
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Olšanská 1951-4			
Objekt:		ZL76 - Bourání ŽB věnce			
Místo:		Olšanská		Datum:	26. 9. 2023
Zadavatel:				Projektant:	
Zhotovitel:				Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		12 914,69
HSV - Práce a dodávky HSV		11 021,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce		732,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 112,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 982,72
997 - Přesun sutě		1 194,33
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		1 893,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL76 - Bourání ŽB věnce

Místo: Olšanská

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 914,69

D HSV Práce a dodávky HSV 11 021,69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 732,24

56	K	310271035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	0,324	2 260,00	732,24	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310271035					
VV	"zazdívka mezi překladem a stropem, 9NP, pro 3ks P17, dl. 2,4m, výška 150 mm, šířka 300mm" 2,4*0,3*0,15*3					0,324

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 112,40

57	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,080	1 030,00	1 112,40	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325101	
VV	"zazdívka mezi překladem a stropem, 9NP, pro 3ks P17, dl. 2,4m, výška 150 mm, šířka 300mm" 2,4*0,15*3	1,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 982,72

12	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,540	7 643,03	4 127,24	SoD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

PP	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	
VV	"bourání ŽB věnce pro usazení překladů 9NP, pro 3ks P17, dl. 2,4m, tl. věnce 300 mm, bouraná výška 140 mm"	0,540
VV	2,4*0,3*0,25*3	
VV	Součet	0,540

32	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	-0,251	2 269,02	-569,52	SoD
----	---	-----------	---	----	--------	----------	---------	-----

PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm			
VV	"odpočet výměr SoD"			
VV	"viz výkres - b110"			
VV	"9.NP"			
VV	"m.č. 9.03 - P17" -(2,32*0,12*3)*0,3			-0,251
VV	Součet			-0,251

55	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	1,500	2 950,00	4 425,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm			
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112			
VV	"odřezání bourané části ŽB věnce pro usazení překladů 9NP, P17, dl. řezu 250 mm" (0,25*2)*3			1,500

D 997 Přesun sutě 1 194,33

45	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	0,844	358,27	302,38	SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m						
----	---	--	--	--	--	--	--

46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,844	119,42	100,79	SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,036	17,91	287,20	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,844*19 'Přepočtené koeficientem množství		16,036			
48	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,844	597,11	503,96	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 893,00	
6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	3,000	631,00	1 893,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					
