

ZL 21

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL021-ochrana revizní šachty u přejezdu

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 05.09.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
MK01 – Místní komunikace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

Nové řešení:

Ochrana šachty odnímatelným profilovým plechem v úrovni zámkové dlažby s 12 cm ohybem na úroveň poklopu.
Plech bude kotven šrouby na chemickou kotvu do betonového základu a kamenné obruby.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu vyvolanou požadavky třetí strany VODAKVA v průběhu realizace stavby.

Šachta se nachází v trase silničního obrubníku.
Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín realizace díla.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 7 126,40 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je 7 126,40 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL021 A - ochrana revizní šachty u přejezdu

Návrh zakrytí

Situace

Fotodokumentace

ZL 21

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL021-ochrana revizní šachty u přejezdu

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 31.10.

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorha

Datum: 31.10.2023

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 31.10.2023

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023

Souhlasím.

Podpis:

ZL 21

Ocenění ke změně č. ZL021 A - ochrana revizní šachty u přejezdu

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL021 A - ochrana revizní šachty u přejezdu
05.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 05.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

028 - ZL021 - ochrana revizní šachty u přejezdu

Místo:

Datum: 05.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Pa	Tm	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 126,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 126,40
D	1		Zemní práce				6 500,00
302	K	119002411R	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení a ochranu kanalizační šachty	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně položené z listového ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení				
VV			kompletní dodávka - ochranného plechu				
VV			1		1,000		
D	2		Zakládání				626,40
215	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,144	4 350,00	626,40
PP			Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30				
VV			betonáž základu pro kotvení pojezdového plechu				
VV			2,4*0,2*0,3		0,144		

V Karlových Varech 31.10.2023

Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolář

Projektant:

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorc

TDS:


INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kolář

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary,


ZL 21

Ochrana revizní šachty v přejezdu

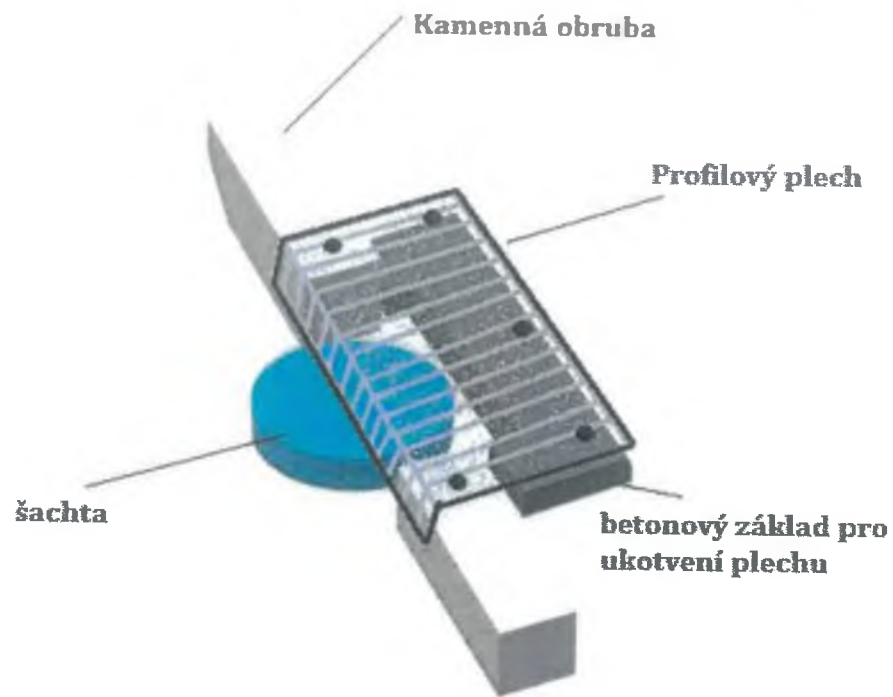

ZL 21

Ochrana rizikni šachty u přejezdu

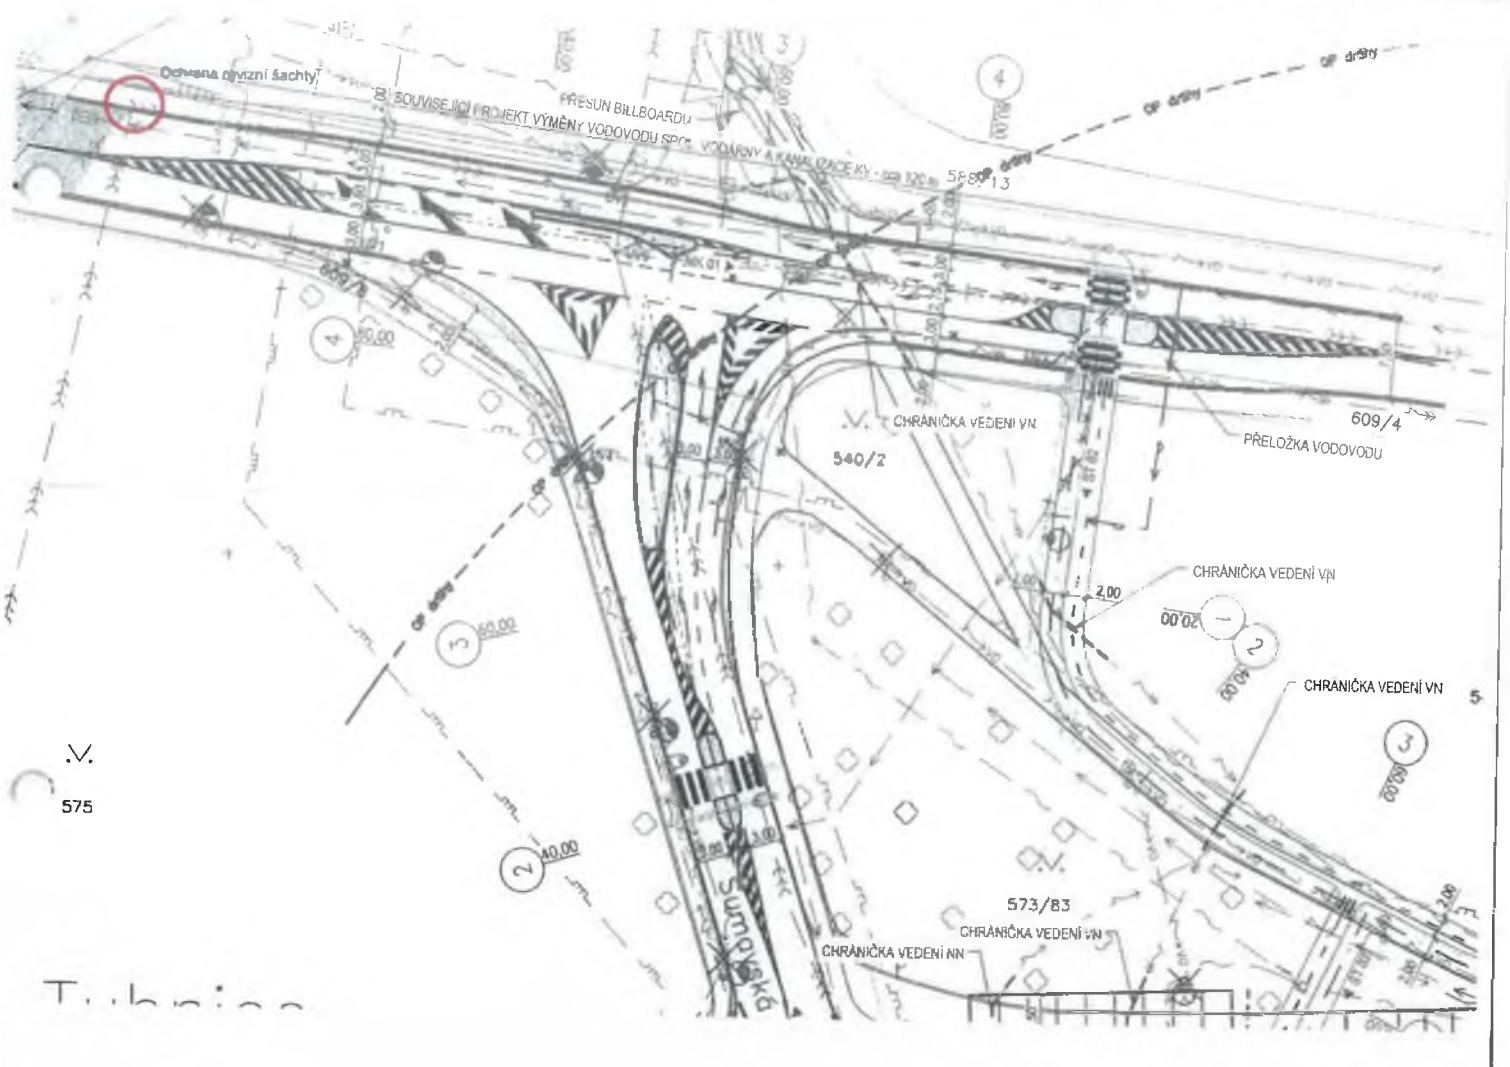

575

Tubnice



ZL 21

Ochrana riziků šachty u přejezdů



ZL 22

Místní komunikace (ul. Západní a Šumavská)

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL022-žulový záliv-posun chodníku MK01

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 18.07.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
MK01 – Místní komunikace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nově budovaný chodník měl být polohově v místě stávajícího chodníku.

Nové řešení:

Z důvodu montáže nových stožárů VO v blízkosti vzrostlých stromů, bude chodník polohově posunut směrem ke komunikaci pro zamezení narušení kořenových balů.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín realizace díla.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 23 172,57 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je 24 555,30 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací je 1 382,73 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL022 A - žulový záliv-posun chodníku MK01

Ocenění ke změně č. ZL022 B - žulový záliv-posun chodníku MK01

Situace

ZL 22

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL022-žulový záliv-posun chodníku MK01

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 31.10.2023

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 31.10.2023

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 31.10.2023

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 31.10.2023

Souhlasím.

Podpis:

ZL 22

Ocenění ke změně č. ZL022 A - žulový záliv-posun chodníku MK01

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL022 A - žulový záliv-posun chodníku MK01 18.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

029 - ZL022 A - žulový záliv - posun chodníku MK01

Místo:

Datum: 18.07.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Pr	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 555,30
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 555,30
D	1		Zemní práce				422,55
24	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	15,000	28,17	422,55
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	VV		15*1		15,000		
D	5		Komunikace pozemní				24 132,75
31	K	564871111	Podklad ze štěrkuodřtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	15,000	306,00	4 590,00
	PP		Podklad ze štěrkuodřtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		15*1		15,000		
40	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	15,000	721,60	10 824,00
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: Skladba G				
	VV		15*1		15,000		
40	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	15,000	581,25	8 718,75
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		15*1		15,000		

ZL 22.

Živlový zářiv - posuv chodníku MK01

V Karlových Varech 31.10.2023

Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolář

Projektant:

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorčík

TDS:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kocourek

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

ZL 22

Ocenění ke změně č. ZL022 B - žulový záliv-posun chodníku MK01

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL022 B - žulový záliv-posun chodníku
MK01
18.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt

030 - ZL022 B - žulový záliv - posun chodníku MK01

Místo:

Datum 18.07.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Pr.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 382,73
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 382,73
D	1		Zemní práce				-1 382,73
25	K	181351113	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	-15,000	17,40	-261,00
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		15*1		-15,000		
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-2,400	421,40	-1 011,36
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		-15*0,16		-2,400		
27	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výševem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-15,000	5,46	-81,90
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výševem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		-15*1		-15,000		
28	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	-0,300	94,90	-28,47
	PP		osivo směs travní univerzální				
	VV		-15*1*0,02		-0,300		

V Karlových Varech 31.10.2023

Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kocourek

Projektant:


GEOprojektKV s.r.o., Petr Švoch

TDS:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kocourek

Objednatel:


Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

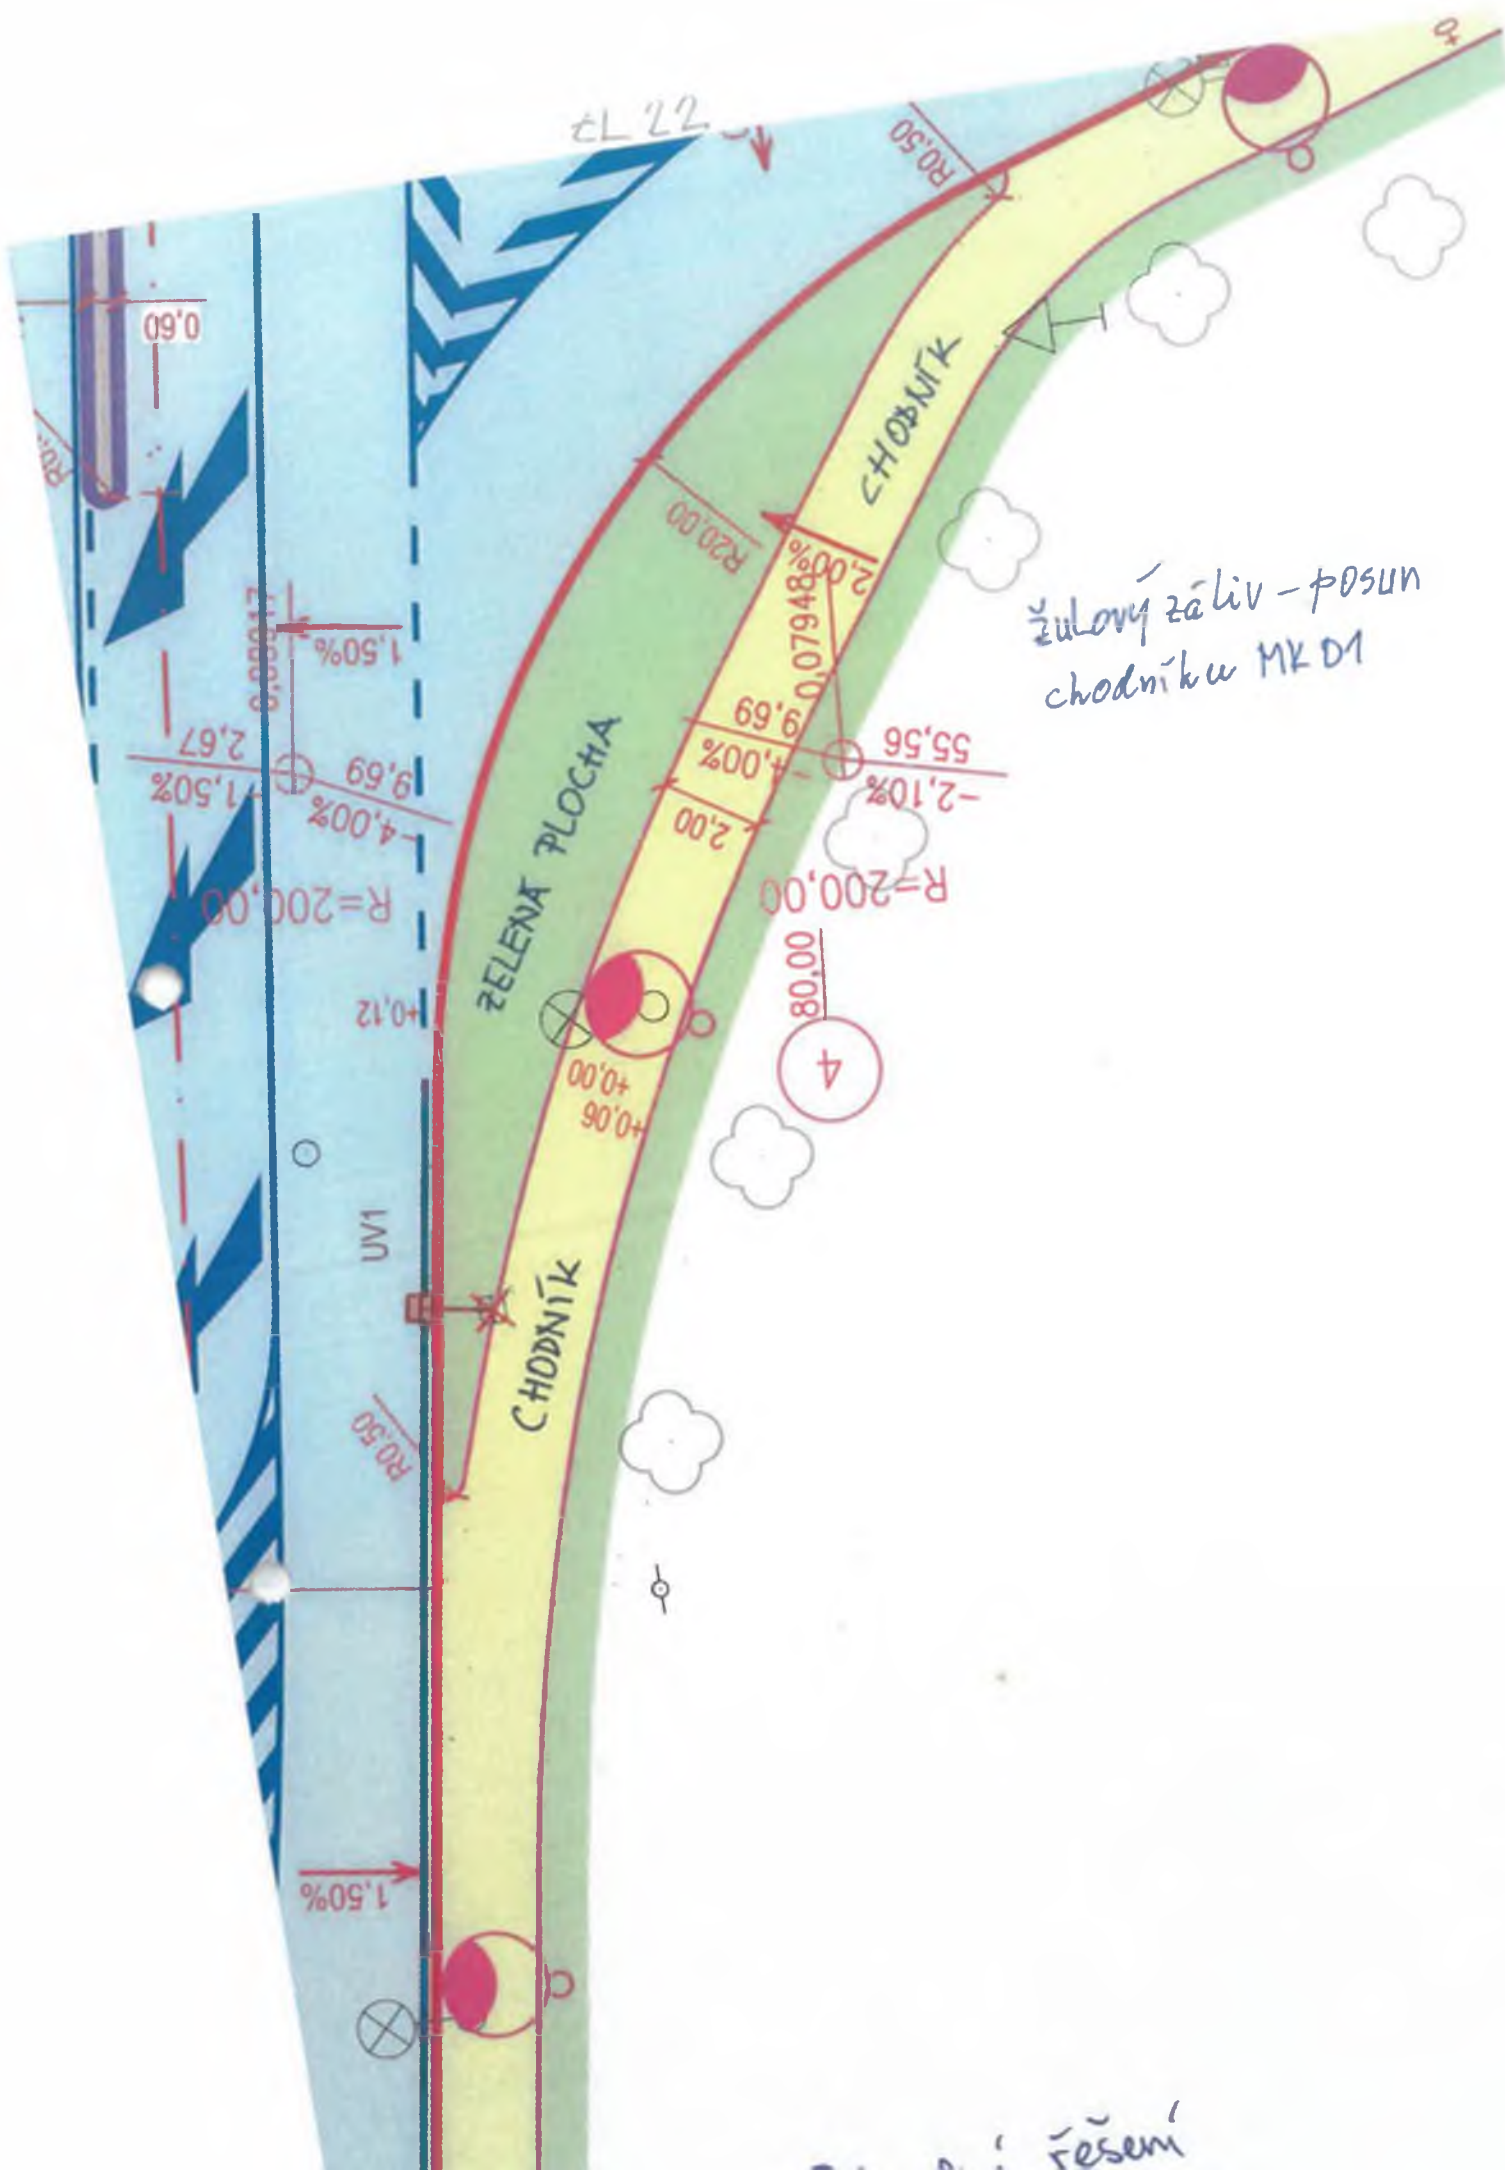

žulový zářiv - posun
 chodníku MK D1

řešení

ZL 22
žulový zářiv - posun chodníku MK 01

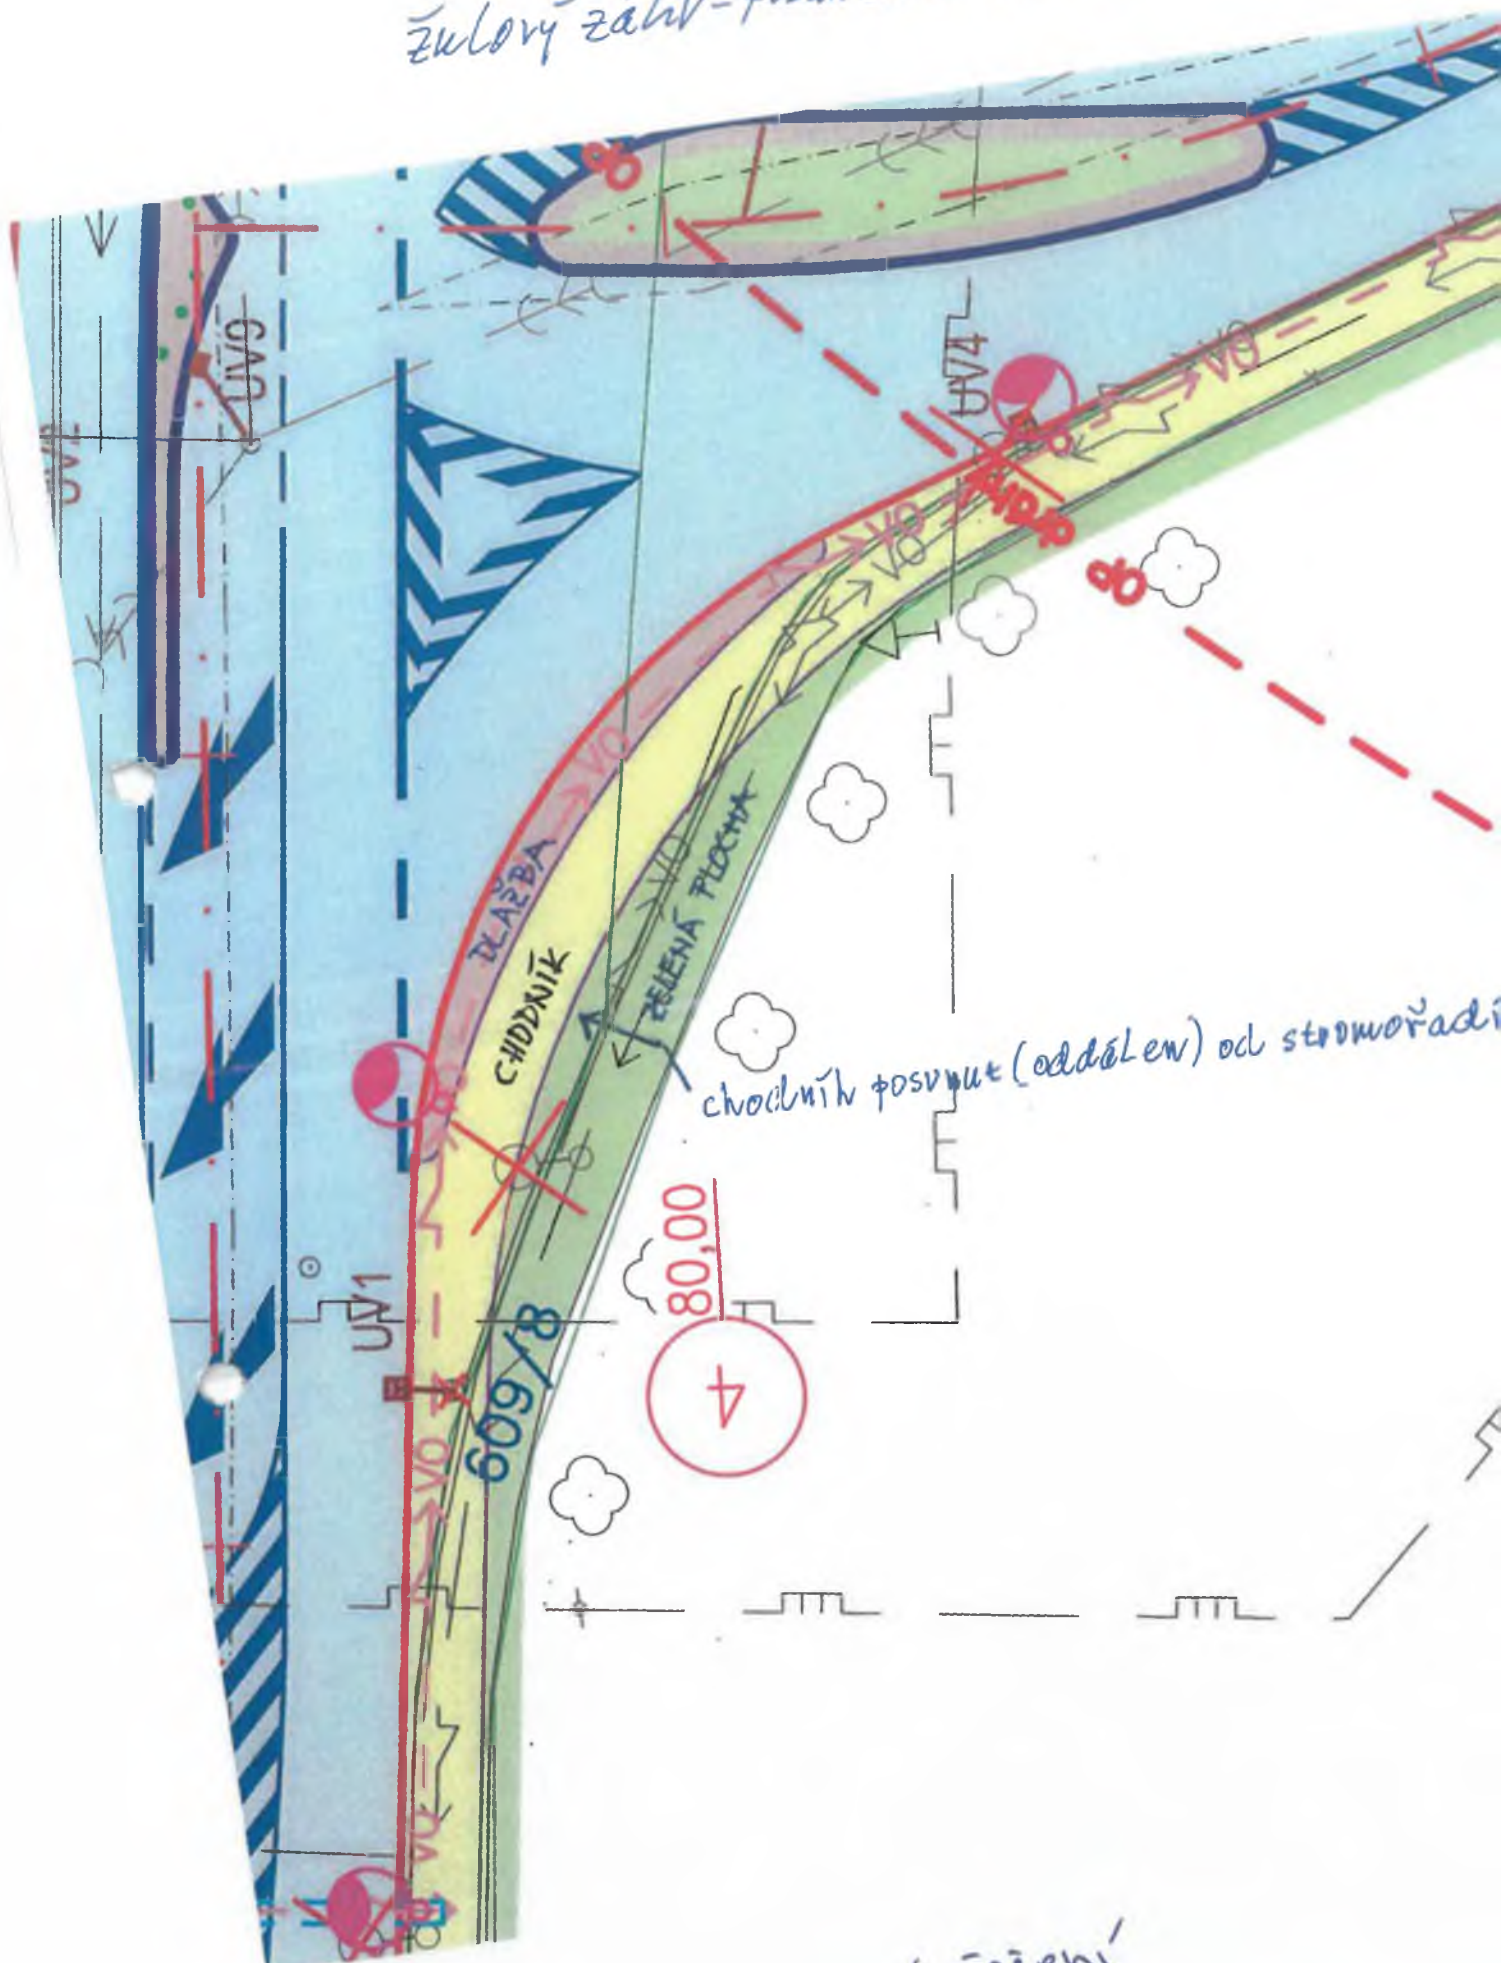

č. zápisu

ZL 23

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL023 - **vypuštěný chodník Šumavská**

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 29.08.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
MK03 – komunikace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Zpevněná plocha komunikace pro pěší.

Nové řešení:
Na žádost objednatele nebude prováděno.

Zdůvodnění změny:
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde ke snížení ceny díla o 88 347,67 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací je 88 347,67 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL023 B - vypuštěný chodník Šumavská
Situace

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL023 - vypuštěný chodník Šumavská

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: [redacted]

Podpis: [redacted]

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2023

Podpis: [redacted]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023

Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Souhlasím.

Podpis: [redacted]

ZL 23

Ocenění ke změně č. ZL023 B - vypuštěný chodník Šumavská

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL023 B - vypuštěný chodník Šumavská
29.08.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 29.08.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

031 - ZL023 - vypuštěný chodník Šumavská

Místo:

Datum: 29.08.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

PC	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-88 347,67
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-85 228,17
D	1		Zemní práce				-14 271,07
11	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m ³	m ³	-15,120	100,80	-1 524,10
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m ³				
	VV		-63*0,24		-15,120		
13	K	132154102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m ³	m ³	-0,750	472,80	-354,60
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m ³				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: přípojky UV a chráničky -5*0,15		-0,750		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-15,120	229,60	-3 471,55
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		-63*0,24		-15,120		
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	-15,120	17,71	-267,78
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000				
	VV		-63*0,24		-15,120		

21 23 Vypuštěný chodník Šumavská

22	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-24,192	150,00	-3 628,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		-15,12*1,6		24,192		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-15,120	20,16	-304,82
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		-63*0,24		-15,120		
23	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-0,750	239,00	-179,25
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		-5*0,15		-0,750		
24	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	-63,000	28,17	-1 774,71
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	VV		63		-63,000		
25	K	181351113	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-30,000	17,40	-522,00
	PP		Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		30		-30,000		
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	-4,800	421,40	-2 022,72
	PP		zemina pro terénní úpravy - omnice				
	VV		-30*0,16		-4,800		
27	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-30,000	5,46	-163,80
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		30		-30,000		
28	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	-0,600	94,90	-56,94
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		-30*0,02		-0,600		
	D	5	Komunikace pozemní				-46 746,00
30	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-63,000	189,00	-11 907,00
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		63		-63,000		
42	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drobného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A pro ploch	m2	-63,000	300,00	-18 900,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drobného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
	P		Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: Skladba C				
	VV		63		-63,000		
44	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-63,000	253,00	-15 939,00
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	P		Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: Skladba C				
	VV		63		-63,000		

TL 1.3
Vypuštěný chodník Šumavská

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-23 568,00
124	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-60,000	264,00	-15 840,00
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
					60		-60,000
125	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-56,000	108,00	-6 048,00
			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
					56		-56,000
127	M	59217035R1	obrubník betonový obloukový vnější 780x80x250mm	m	-4,000	420,00	-1 680,00
			obrubník betonový obloukový vnější 780x80x250mm				
			Poznámka k položce. Poznávat a k položce. R0,5 - 5 m R1 - 22 m				
					4		-4,000
D	998	Přesun hmot					-643,10
137	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-10,937	58,80	-643,10
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
					10,937		-10,937
D	M	Práce a dodávky M					-3 119,50
D	21-M	Elektromontáže					-3 119,50
138	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	-5,000	61,80	-309,00
			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm				
					5		-5,000
140	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	-5,000	562,10	-2 810,50
			trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE				
					5		-5,000

V Karlových Varech 16.11.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kold


Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kold

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

ZL 23 Vypuštěný chodník Žumavská

DETAIL

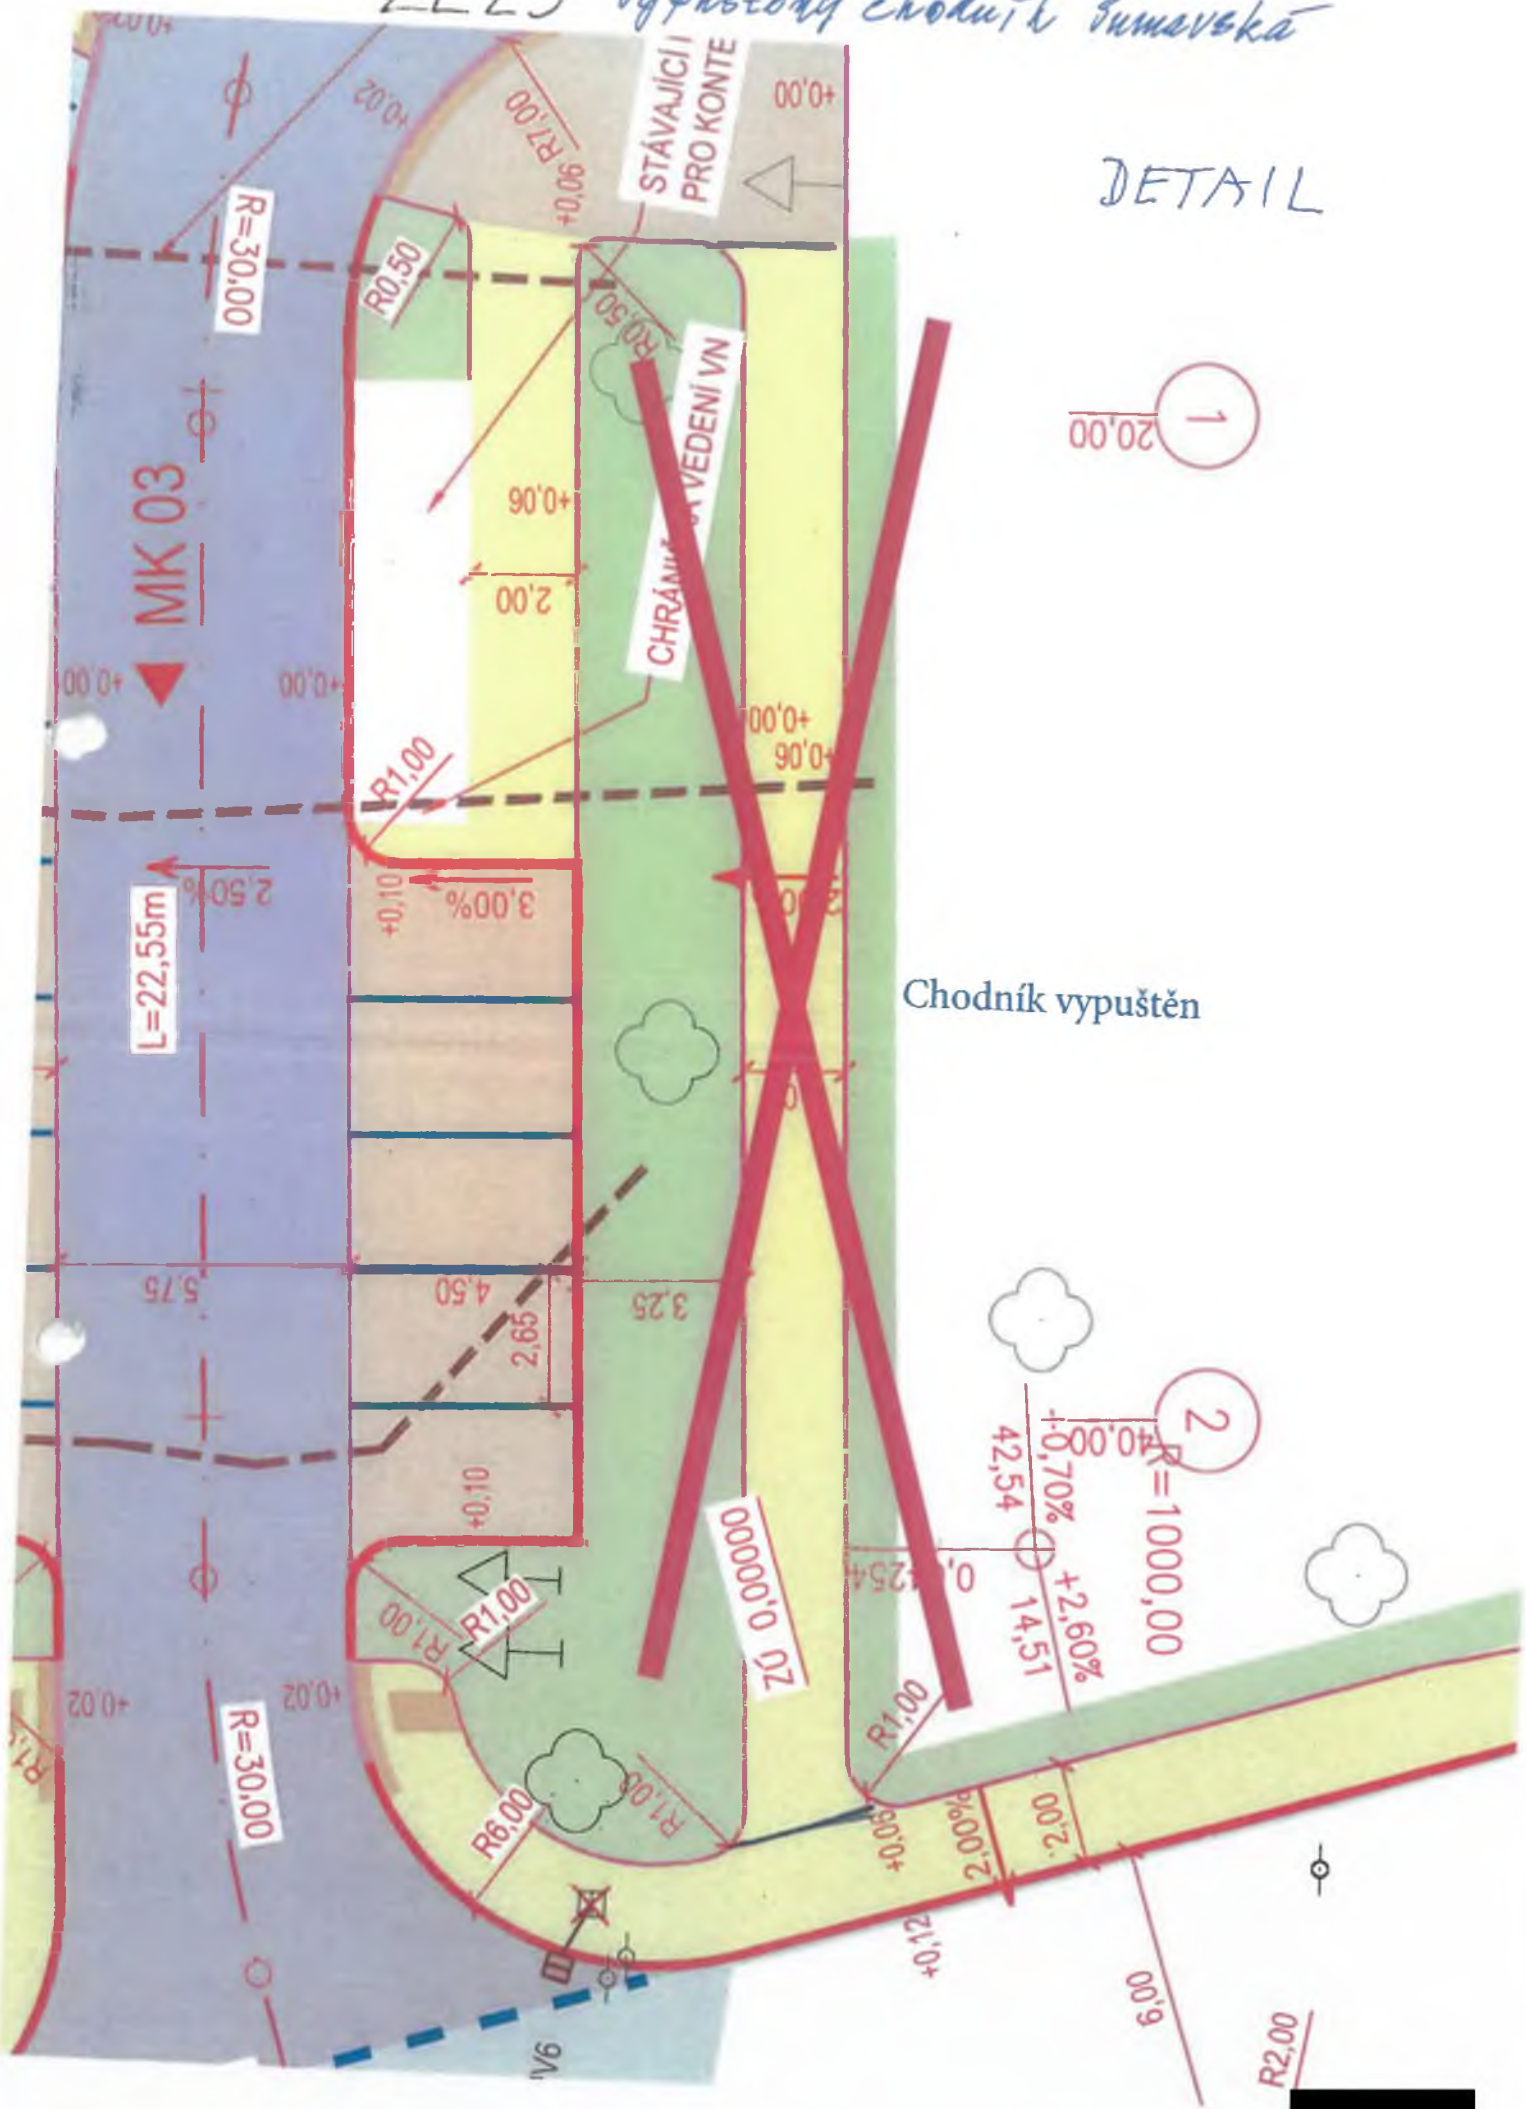

Chodník vypuštěn

2
R=1000,00

R2,00

ZL 24

ULIČNÍ VPUSŤ
místní komunikační
kace (západní ul.)

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL024-zrušení UV u přejezdu MK01

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 19.09.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
MK01 – Místní komunikace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

Nové řešení:
Uliční vpust' bude zrušena.

Zdůvodnění změny:

Při provádění odkopávek byla objevena stará uliční vpust'. Po prověření ze strany pracovníků VODAKVA bylo konstatováno, že vpust' je nefunkční, není napojena na kanalizaci. Bylo rozhodnuto o jejím zrušení.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín realizace díla.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 4 984,20 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je 4 984,20 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL024 A - zrušení UV u přejezdu MK01

Situace

Fotodokumentace

ZL 24

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL024-zrušení UV u přejezdu MK01

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Soublesím.

ZL 24

Ocenění ke změně č. ZL024 A - zrušení UV u přejezdu MK01

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL024 A -zrušení UV u přejezdu MK01
19.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 19.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKA

Objekt:

032 - ZL024 A - zrušení UV u přejezdu MK01

Místo:

Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 984,20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 984,20
D	1		Zemní práce				1 697,70
23	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1,500	239,00	358,50
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	VV		1,5		1,500		
267	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	2,700	496,00	1 339,20
	PP		šterkodrt frakce 0/32				
	VV		1,5*1,8		2,700		
D	8		Trubní vedení				3 286,50
52	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	1,500	2 191,00	3 286,50
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží				
	VV		MK01 - UV u přejezdu				
	VV		1,5		1,500		

V Karlových Varech 16.11.2023

Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolář

Projektant:

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosí


Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

ZL 24
Zrušení UV u přejezdu MK01

PŘESUN BILLBOARDU

SOUVISEJÍCÍ PROJEKT VÝMĚNY VODOVODU SPOL. VODA

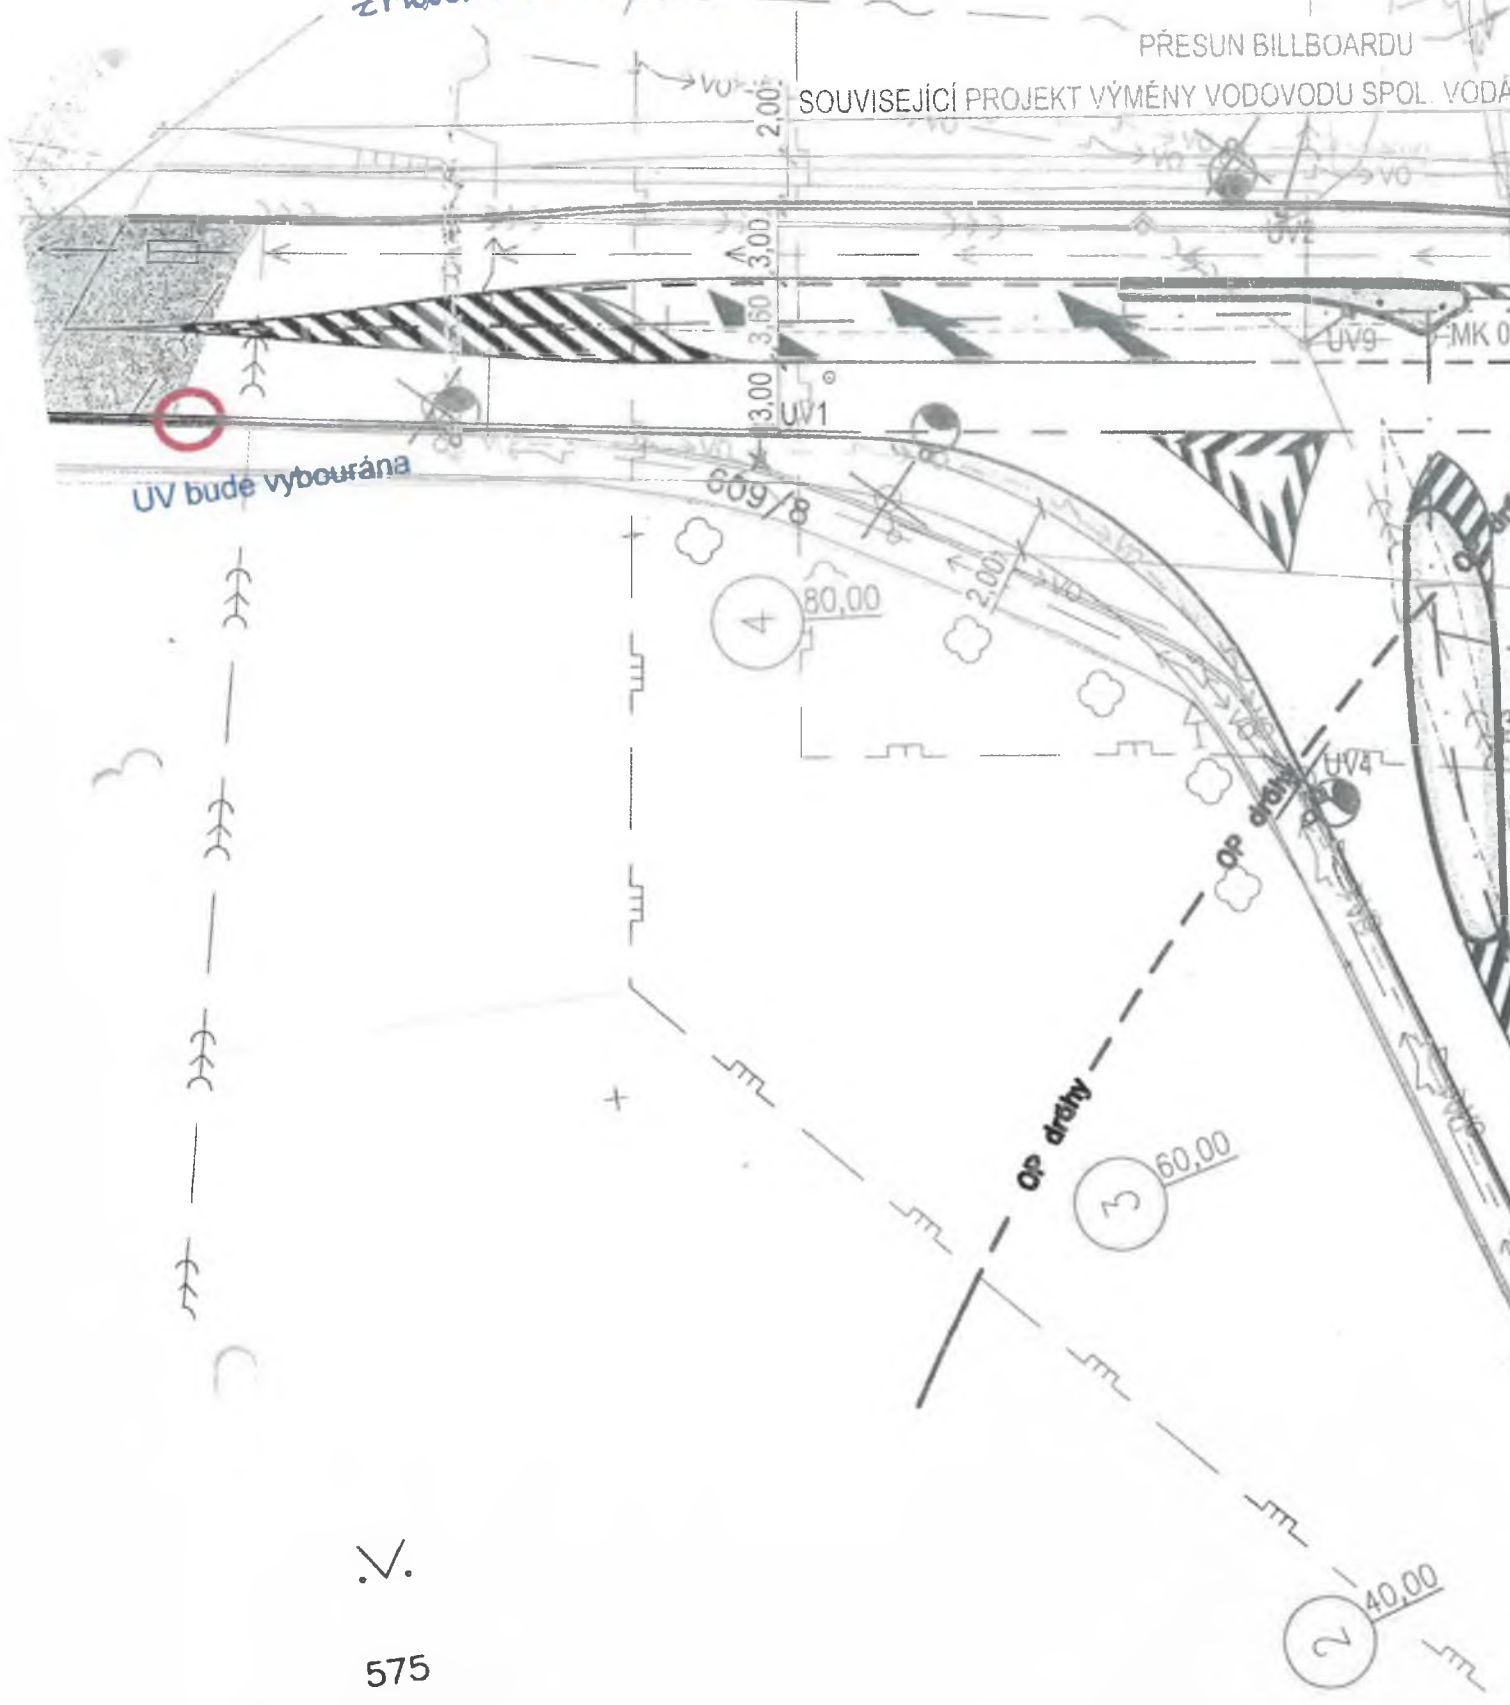

√.

575

ZL 24

Zrušení UV u přejezdu MK 01



3

0



ZL 25

dopravně inženýrské
opětření

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL025 - DIO II. - III. - IV. etapa

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 22.08.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
MK01 – Místní komunikace
MK02 – Místní komunikace
MK03 – Místní komunikace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V zadávací dokumentaci bylo DIO řešeno na tři etapy. DIO pro II. etapu nebylo možné realizovat z důvodu stísněných podmínek stavby.

Nové řešení:

Kompletní dodávka demontáže provizorní panelové cesty vč. nakládky, převozu a skládání panelů na LLPKV. Provedení provizorního jízdniho pruhu pro II. a III. etapu u přejezdu bude provedeno v živичném zpevnění. U DIO pro IV. etapu bude tento provizorní jízdni pruh odstraněn a nahrazen chodníkem pro pěší dle zadávací dokumentace. Pro provedení provizorního jízdniho pruhu pro II. a III. etapu na křižovatce ul. Šumavská a Bečovská bude vytrhána stávající obruba a proveden nájezd z betonu.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k předloženému DIO v zadávací dokumentaci nebylo možné DIO provádět z důvodu stísněných podmínek stavby. Realizaci stavby bylo nutné členit na jiné etapy.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín realizace díla.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 178 445,35 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je 178 445,35 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL025 A - DIO II. - III. - IV. etapa
Situace DIO II. - III. etapa
Situace DIO IV. etapa

ZL 25

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL025 - DIO II. - III. - IV. etapa

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 16.11.2023

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2023

Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Souhlasím.

Podpis:



ZL 25

Ocenění ke změně č. ZL025 A - DIO II. - III. - IV. etapa

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL025 A - DIO II. - III. - IV. etapa
22.08.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 22.08.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

033 - ZL025 A - DIO II.-III.-IV. etapa

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 445,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				94 445,35
D	1		Zemní práce				13 838,79
7	K	113107242	Odstránění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	57,000	40,72	2 321,04
		PP	Odstránění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
		P	Poznámka k položce: stávající chodníky				
		VV	provizorní jízdní pruh - u přejezdu				
		VV	25*2		50,000		
		VV	následná úprava nivelety komunikace u přejezdu				
		VV	3,5*2		7,000		
		VV	Součet			57,000	
242	K	113107432	Odstránění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m ²	m ²	9,600	650,00	6 240,00
		PP	Odstránění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
		VV	provizorní jízdní pruh Bečovská				
		VV	24*0,4		9,600		
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	52,000	71,70	3 728,40
		PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
		P	Poznámka k položce: odvoz na skládku místa				
		VV	provizorní jízdní pruh u přejezdu				
		VV	28		28,000		
		VV	provizorní jízdní pruh Bečovská				
		VV	24		24,000		
		VV	Součet			52,000	

ZL 25 D10 II.-III.-IV. etapa

24	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	55,000	28,17	1 549,35
			Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním provizorní jízdní pruh 25*2,2		55,000		
	D	2	Zakládání				12 528,00
215	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	2,880	4 350,00	12 528,00
			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 provizorní jízdní pruh Bečovská 24*0,4*0,3		2,880		
	D	5	Komunikace pozemní				52 490,00
31	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	55,000	306,00	16 830,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		provizorní jízdní pruh 25*2,2		55,000		
33	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	52,100	600,00	31 260,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm				
	P		Poznámka k položce: Sítňovka A				
	VV		provizorní jízdní pruh 25*2		50,000		
	VV		7*0,3		2,100		
	VV		Součet		52,100		
51	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	44,000	100,00	4 400,00
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou				
	VV		provizorní jízdní pruh u přejezdu - následné zalití obrub 20		20,000		
	VV		provizorní pruh Bečovská - následné zalití obrub 24		24,000		
	VV		Součet		44,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání				8 637,20
130	K	919735113	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	71,500	120,80	8 637,20
	PP		Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	VV		provizorní jízdní pruh - u přejezdu 68		68,000		
	VV		následná úprava nivelety komunikace u přejezdu 3,5		3,500		
	VV		Součet		71,500		

ZL 25 D10 II. - III. - IV. etapa

	D	997	Přesun sutě					6 951,36
132	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	29,200	53,10		1 550,52
			Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				29,2	
							29,200	
133	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	292,000	4,77		1 392,84
			Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
							292,000	
134	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,000	250,00		1 500,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
							6,000	
135	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,540	200,00		2 508,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
							12,54	
							12,540	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					84 000,00
	D	VRN7	Provozní výhy					84 000,00
10	K	072002000	Silniční provoz		0,700	120 000,00		84 000,00
			Silniční provoz					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Dopravné úžehnyrské oprátení během vystavby</i>					
			dopravní značení					
			0,3		0,300			
			demontáž provizor jízdního pruhu					
			(mechanizace/nakládka+skládání/přeprava)					
			0,4		0,400			
			Součet		0,700			


V Karlových Varech 16.11.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocour

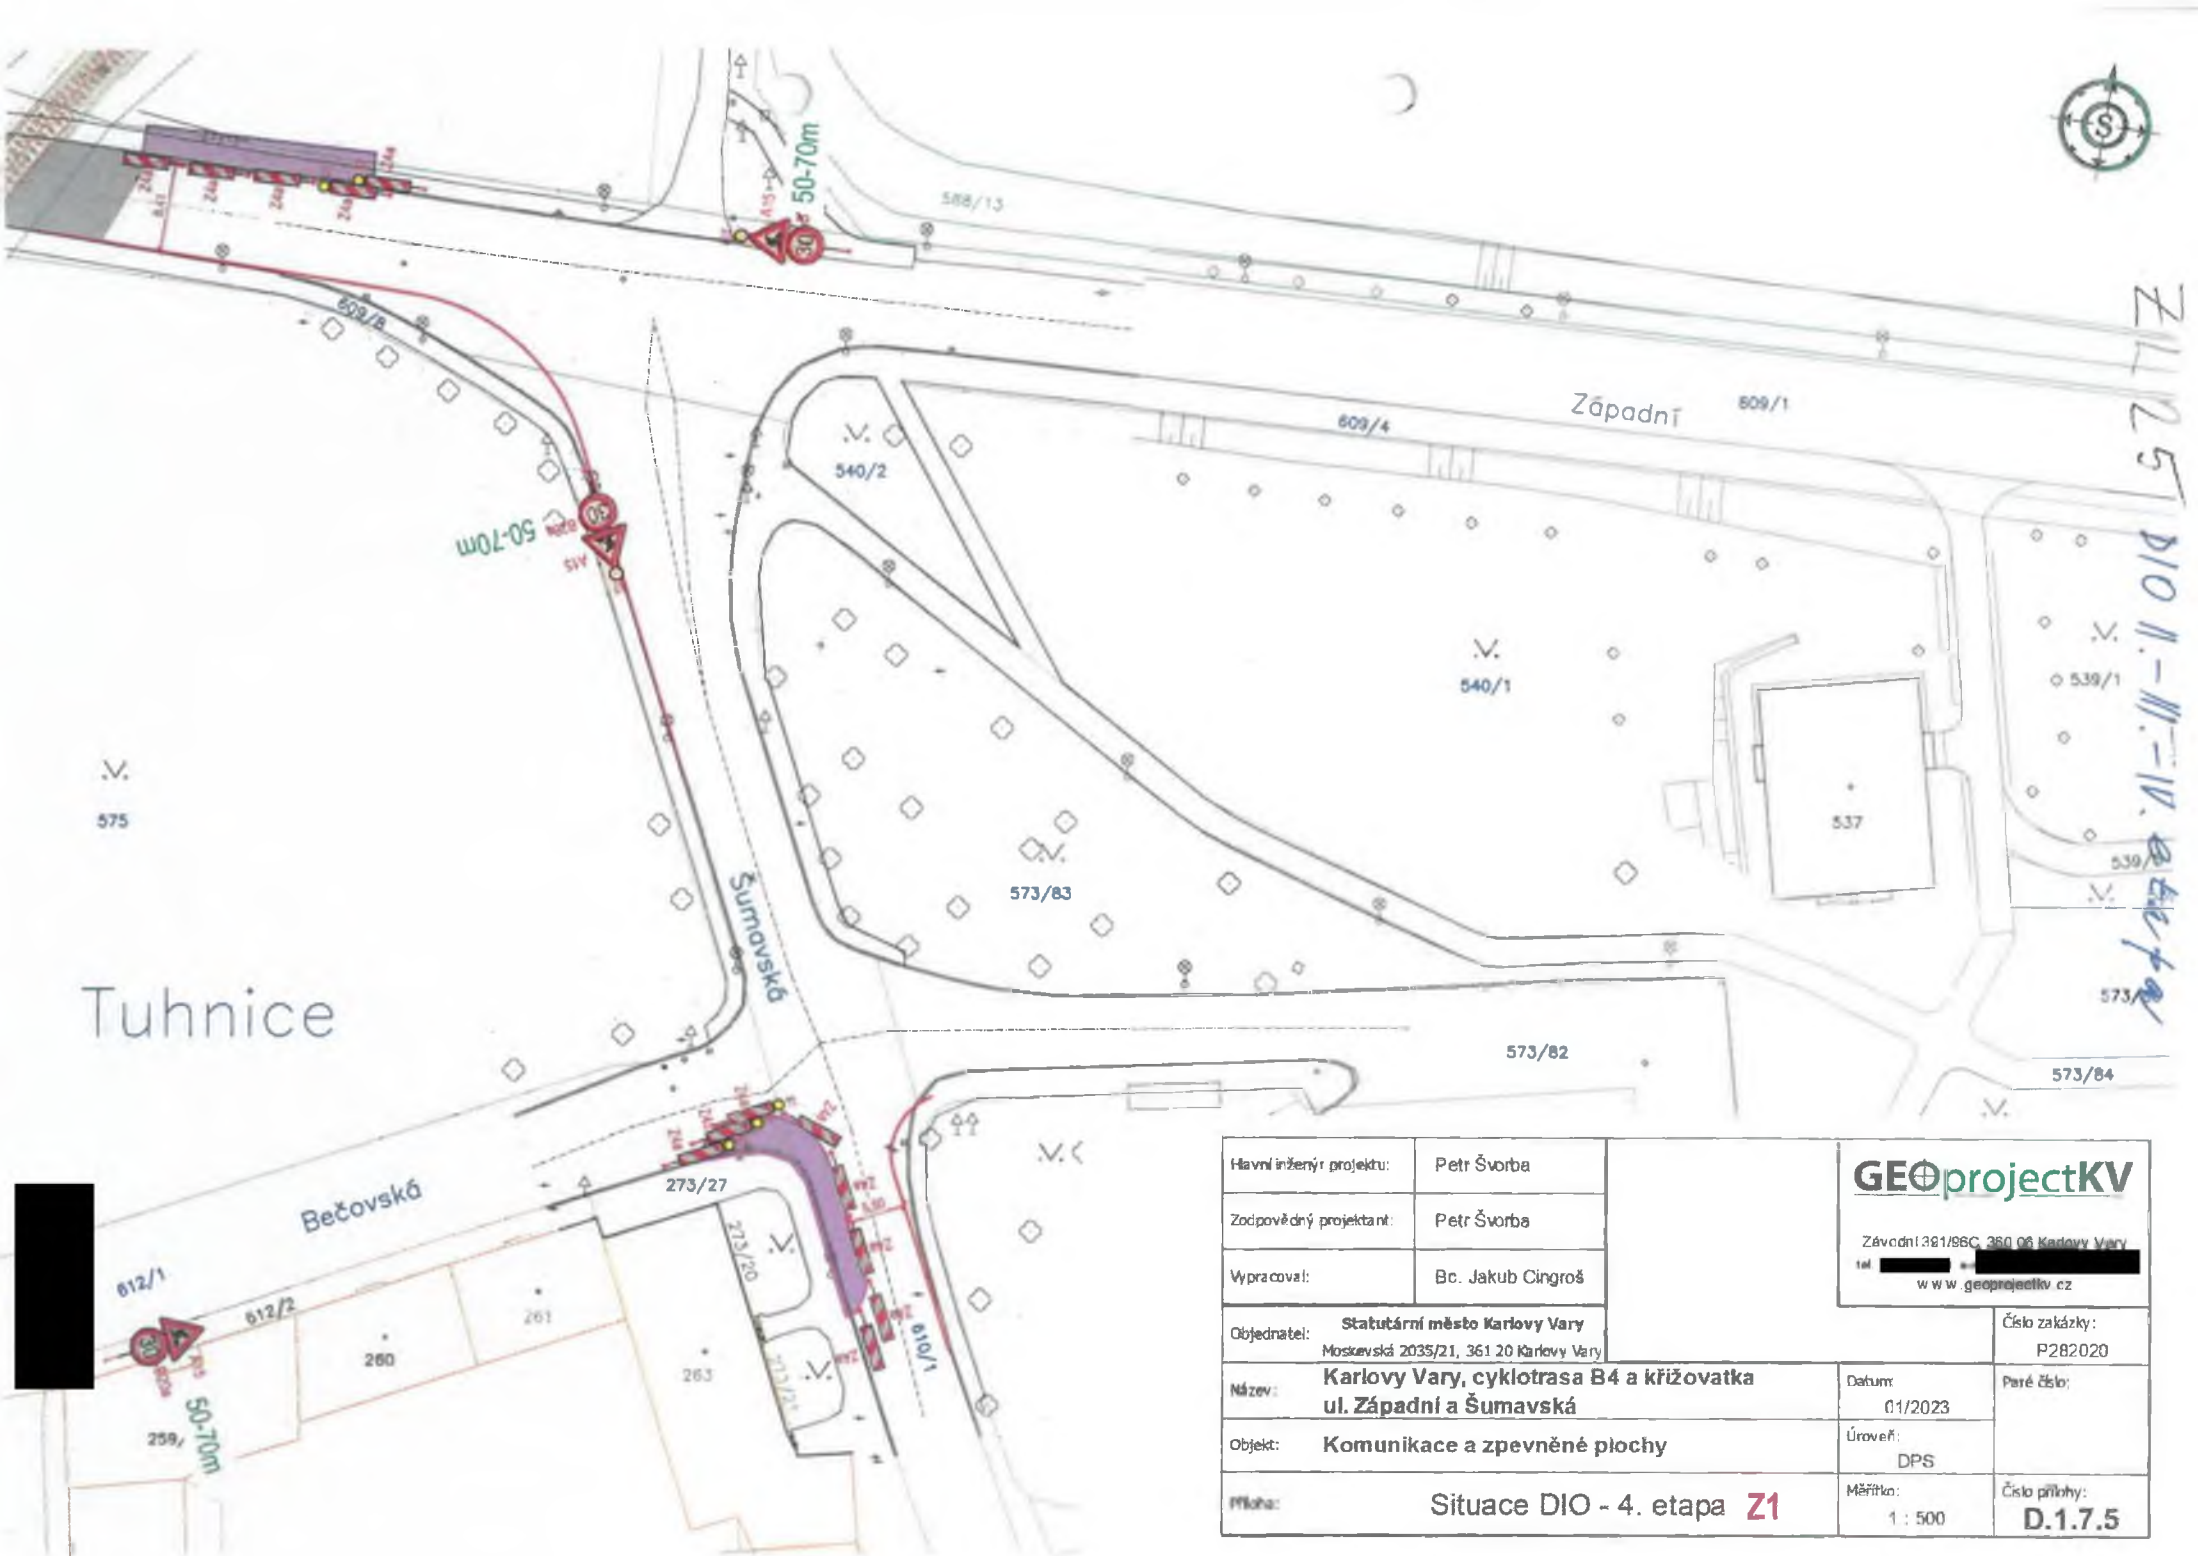

Tuhnice

ZIL 251 DIO II.-III.-IV. etapa

Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba	GEOprojectKV Závodní 391/BSC, 360 06 Karlovy Vary tel. [redacted] www.geoprojektkv.cz	Číslo zakázky:	P282020	
Zodpovědný projektant:	Petr Švorba		Paré číslo:		
Vypracoval:	Bc. Jakub Cingroš		Úroveň:	DPS	
Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary	Měřítko:	1 : 500	Číslo přílohy:	D.1.7.5
Název:	Karlovy Vary, cyklotrasa B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská	Datum:			01/2023
Objekt:	Komunikace a zpevněné plochy	Měřítko:			1 : 500
Příloha:	Situace DIO - 4. etapa Z1				

ZL 26

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL026 - podkladní beton

chodník+komunikace MK03

← *místní komunikace*

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 26.09.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
MK03 – Místní komunikace - chodník + komunikace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Odstranění podkladu z kameniva.

Nové řešení:

Odstranění podkladu z betonu prostého, ochrana stromů bedněním z důvodu použití větší mechanizace, viz nové stanovisko OŽP.

Zdůvodnění změny:

Oproti předpokladu zadávací dokumentace byl po vytrhání živičného krytu stávajících chodníků a místy komunikace nalezen podklad z betonu prostého namísto podkladu z kameniva.
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 38 900,08 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je 52 599,67 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací je 13 699,59 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL026 A – podkladní beton chodník+komunikace MK03
Ocenění ke změně č. ZL026 B – podkladní beton chodník+komunikace MK03
Situace
Fotodokumentace



ZL26

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL026 - podkladní beton
chodník+komunikace MK03

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolář

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Souhlasím.

Podpis:

ZL 26

Ocenění ke změně č. ZL026 A – podkladní beton chodník+komunikace MK03

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL026 A -podkladní beton
chodník+komunikace MK03
26.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 26.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

034 - ZL026 A - podkladní betony chodník+komunikace MK03

Místo:

Datum: 26.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 599,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 599,67
D	1		Zemní práce				23 074,00
205	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	166,000	139,00	23 074,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	VV		chodník MK03				
	VV		40*2,5		100,000		
	VV		komunikace u nábytku				
	VV		6*6		36,000		
	VV		křižovatka				
	VV		10*3		30,000		
	VV		Součet		166,000		
D	997		Přesun sutě				29 525,67
132	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	53,950	53,10	2 864,75
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV				53,950		

EL 26
Podkladní beton, chodník + komunikace MK03

133	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovřádáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	539,500	4 77	2 573,42
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovřádáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
			53,95*10		539,500		
134	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	53,950	250,00	13 487,50
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
			vypourané betony				
			53,95		53,950		
206	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	10,000	1 060,00	10 600,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provazem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm				
			ochrana stromů viz. nové stanovisko OŽP				
			10		10,000		

V Karlových Varech 16.11.2023

Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolář

Projektant:

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

ZL 26

Ocenění ke změně č. ZL026 B – podkladní beton chodník+komunikace MK03

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL026 B -podkladní beton
chodník+komunikace MK03
26.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 26.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

035 - ZL026 B - podkladní betony chodník+komunikace MK03

Místo:

Datum: 26.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Př.	Inv.	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-13 699,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-13 699,59
D		1	Zemní práce				-4 635,68
6	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-100,000	23,60	-2 360,00
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm				
		P	Poznámka k položce				
		VV	Poznámka k položce: stávající chodníky				
		VV	chodník MK03				
		VV	-40*2,5		-100,000		

ZL 26
Podhledy beton, chodník + komunikace MK 03

4	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	-66,000	34,48	-2 275,68
	PP		Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	VV		komunikace u nábýtku		-36,000		
	VV		krížovatka				
	VV		10*3		-30,000		
	VV		Součet		-66,000		
D	997		Přesun sutě				-9 063,91
132	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-36,140	53,10	-1 919,03
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		odpočet kameniva z důvodu bet. podkladu chodníků a komunikace				
	VV		36,14		-36,140		
133	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-361,400	4,77	-1 723,88
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		36,14*10		-361,400		
136	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-36,140	150,00	-5 421,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		36,14		-36,140		

V Karlových Varech 16.11.2023

Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant:

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:


INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

ZL 26

Podkladní beton, chodník + komunikace MK 03

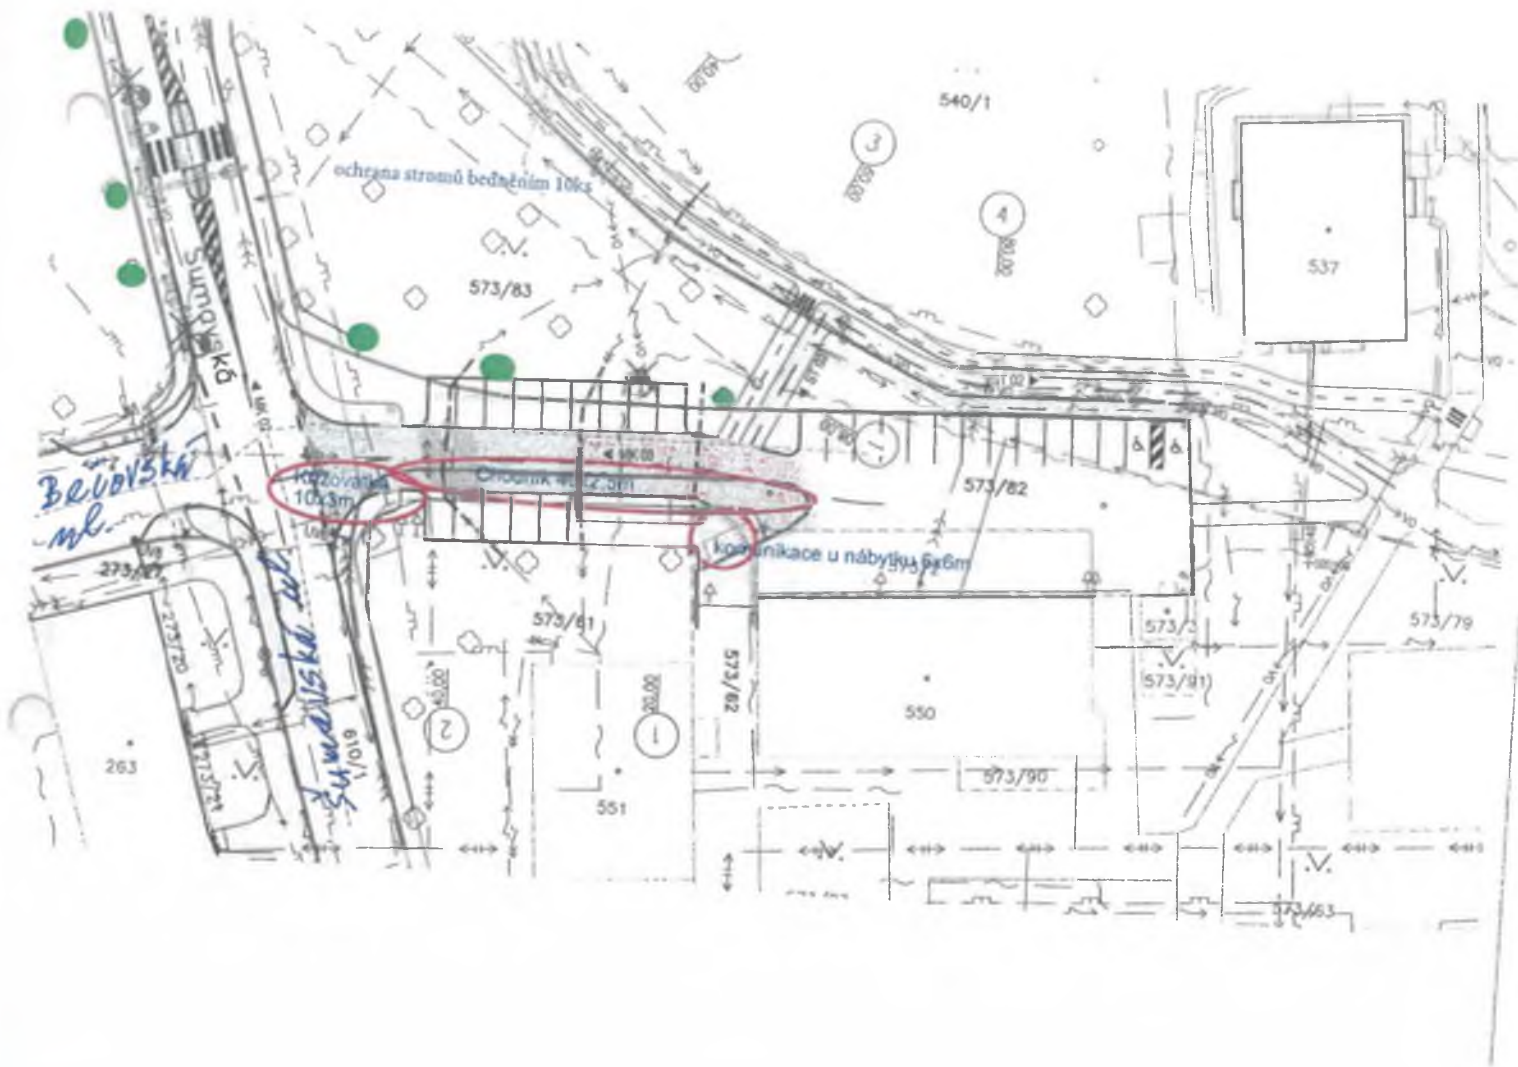

ZL 26

Podkladní beton, chodník + komunikace MK03



ZL 27

stezka

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL027 - ztracená šachta ST02

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 19.09.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
ST02 – dělená stezka

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

Nové řešení:
Stávající železobetonový poklop bude demontován a nahrazen novým litinovým vč. výškové úpravy.

Zdůvodnění změny:
Při provádění odkopávek byla objevena stávající kanalizační šachta. Jedná se o koncovou revizní šachtu. Bylo rozhodnuto o jejím zachování.
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí.
Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 2 868,- Kč bez DPH.
Hodnota víceprací je 2 868,- Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL027 A - ztracená šachta ST02
Situace
Fotodokumentace



ZL 27

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL027 - ztracená šachta ST02

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 16.11.2023

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2023

Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Souhlasím.



ZL 27

Ocenění ke změně č. ZL027 A - ztracená šachta ST02

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL027 A - ztracená šachta ST02
19.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 19.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

036 - ZL027 - ztracená šachta ST02

Místo:

Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Pr	Tm	Nad	Popis	MJ	Množstv.	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 868,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 868,00
D	4		Vodorovné konstrukce				1 236,00
230	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	892,00	892,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm				
	VV				1,000		
234	M	59224013	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000	344,00	344,00
	PP		prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm				
	VV				1,000		
D	8		Trubní vedení				1 632,00
250	K	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	457,00	457,00
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg				
	VV				1,000		
54	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 175,00	1 175,00
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				
	VV				1,000		

V Karlových Varech 16.11.2023

Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolář

Projektant:

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:


INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kos

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

ZL 77

Ztracená šachta ST02

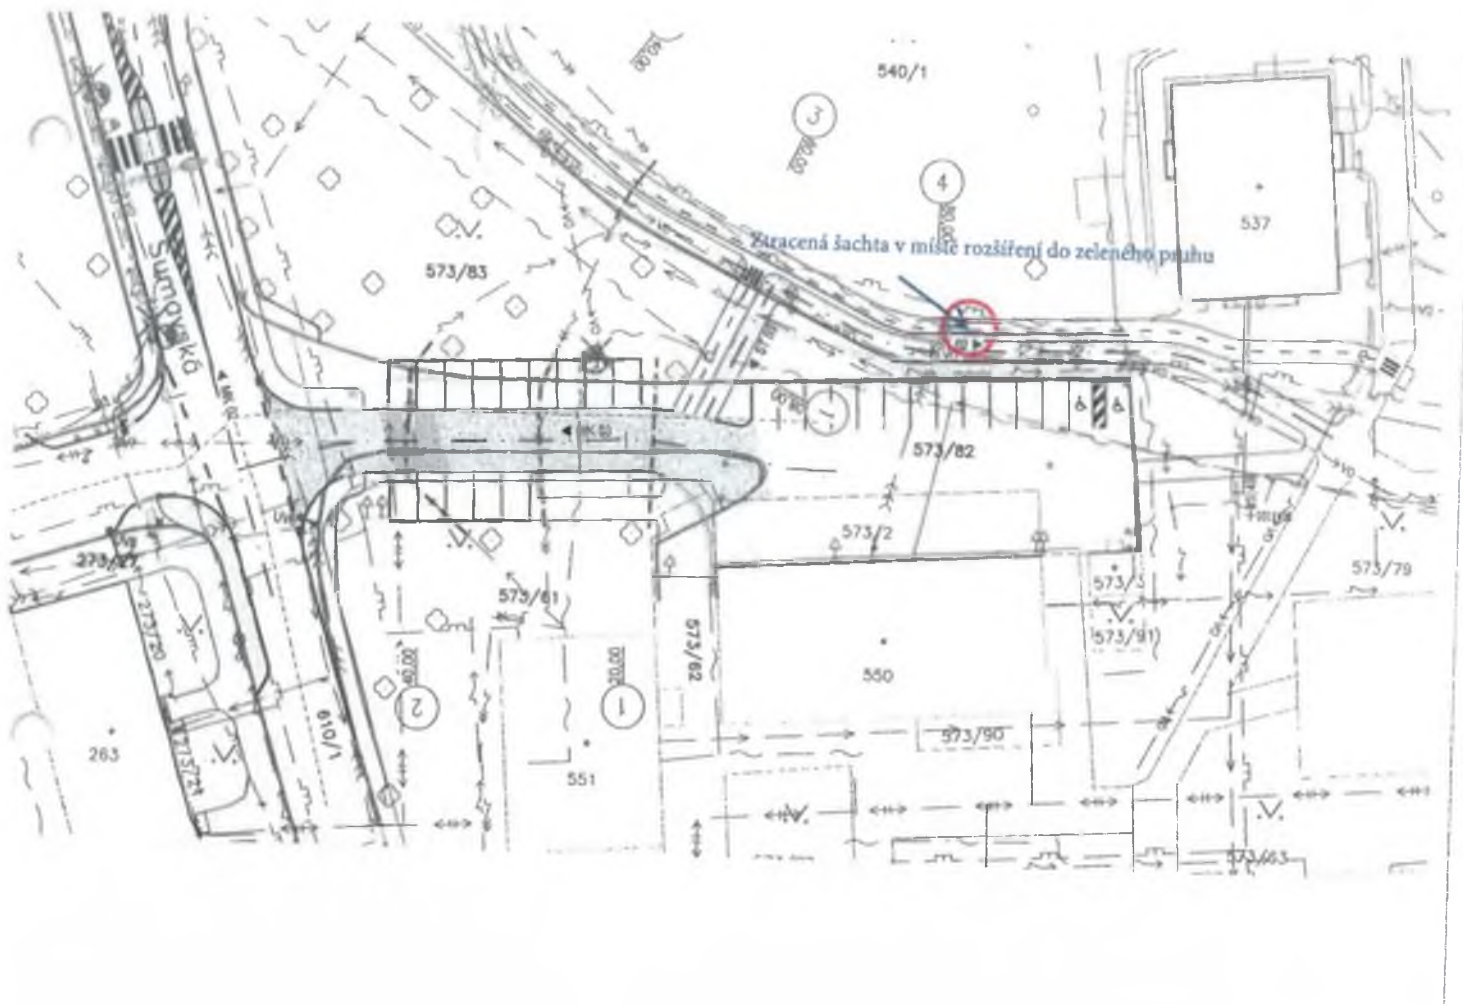

ZL 27
Ztracená šachta ST 02



ZL 28

kebelu



reřejně
osrřtlenř

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL028 – rýhy+zásyp VO

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 26.09.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
MK01 – Místní komunikace - chodník + zeleň
MK02 – Místní komunikace - chodník
ST02 - zeleň

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Hloubení pažených rýh s deponizací vytěženého výkopku v místě stavby pro zpětný zásyp.

Nové řešení:

Hloubení nepažených rýh s částečným odvozem nevhodného výkopku na řízenou skládku. Dodávka vhodného zásyrového materiálu.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o nahrazení položky soupisu stavebních prací s ohledem na prováděné práce. Část výkopku není vhodná pro zpětný zásyp.

Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 65 070,85 Kč bez DPH

Hodnota víceprací je 74 999,65 Kč bez DPH

Hodnota méněprací je 9 928,80 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL028 A – rýhy+zásyp VO

Ocenění ke změně č. ZL028 B – rýhy+zásyp VO

Situace

Fotodokumentace

ZL 28

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL028 – rýhy+zásyp VO

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Souhlasím.

ZL 28

Ocenění ke změně č. ZL028 A – rýhy+zásyp VO

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL028 A – rýhy+zásyp VO
26.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 26.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt

037 - ZL028 A - rýhy+zásyp V.O.

Místo:

Datum: 26.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Pr	Tun	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 999,65
D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 999,65
D	1		Zemní práce				74 999,65
1	K	132151103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	68,240	304,30	20 765,43
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
	VV		MK01+MK02 chodník				
	VV		100*0,6*0,8		48,000		
	VV		MK01 zeleň - V.O přechodový stžár				
	VV		8*0,5*0,5		2,000		
	VV		ST01				
	VV		5*0,3*0,4		0,600		
	VV		ST02				
	VV		40*0,6*0,6		14,400		
	VV		MK03				
	VV		9*0,6*0,6		3,240		
	VV		Součet		68,240		
8	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	84,800	297,00	25 185,60
	PP		šterkopisek netříděný				
	VV		dopočet zpětného zásypu - nahrazení nevhodného výkopku				
	VV		42,4*2		84,800		

ZL 28
Rýhy a zásyp kabelu VO

16	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	18,440	61,46	1 133,32
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m dopočet původního rozpočtu 18,44		18,440		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,800	229,60	6 612,48
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz nevhodného výkopku ke zpětnému zásypu MK01+MK02 100*0,6*0,4 ST02 40*0,6*0,2 Součet		24,000 4,800 28,800		
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	28,800	17,71	510,05
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz nevhodného výkopku ke zpětnému zásypu MK01+MK02 100*0,6*0,4 ST02 40*0,6*0,2 Součet		24,000 4,800 28,800		
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,440	45,99	848,06
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 dopočet původního rozpočtu 18,44		18,440		
20	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	18,440	50,04	922,74
			Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných dopočet původního rozpočtu 18,44		18,440		
22	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,080	150,00	6 912,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 28,8*1,6		46,080		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	28,800	20,16	580,61
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru odvoz nevhodného výkopku ke zpětnému zásypu MK01+MK02 100*0,6*0,4 ST02 40*0,6*0,2 Součet		24,000 4,800 28,800		
23	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	48,240	239,00	11 529,36
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách dopočet zpětného zásypu 48,24		48,240		

ZL 28
Rýhy a zásyb lebeľa VO

V Karlových Varech 16.11.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Ko

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švo

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel K

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocour

ZL28

Ocenění ke změně č. ZL028 B – rýhy+zásyp VO

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL028 B– rýhy+zásyp VO
26.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 26.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

038 - ZL028 B - rýhy+zásyp V.O.

Místo:

Datum: 26.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

PC	Tun	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 928,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-9 928,80
D	1		Zemní práce				-9 928,80
13	K	132154102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	-21,000	472,80	-9 928,80
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			<i>Poznámka k položce: přípojky UV a chráničky</i>				
VV			odpočet pažených rýh pro V.O. - nebyly prováděny				
VV			21		-21,000		

V Karlových Varech 16.11.2023

Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolář

Projektant:

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba


TDS:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kos

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

ZL 28
Rýhy a zásep kabelu VO

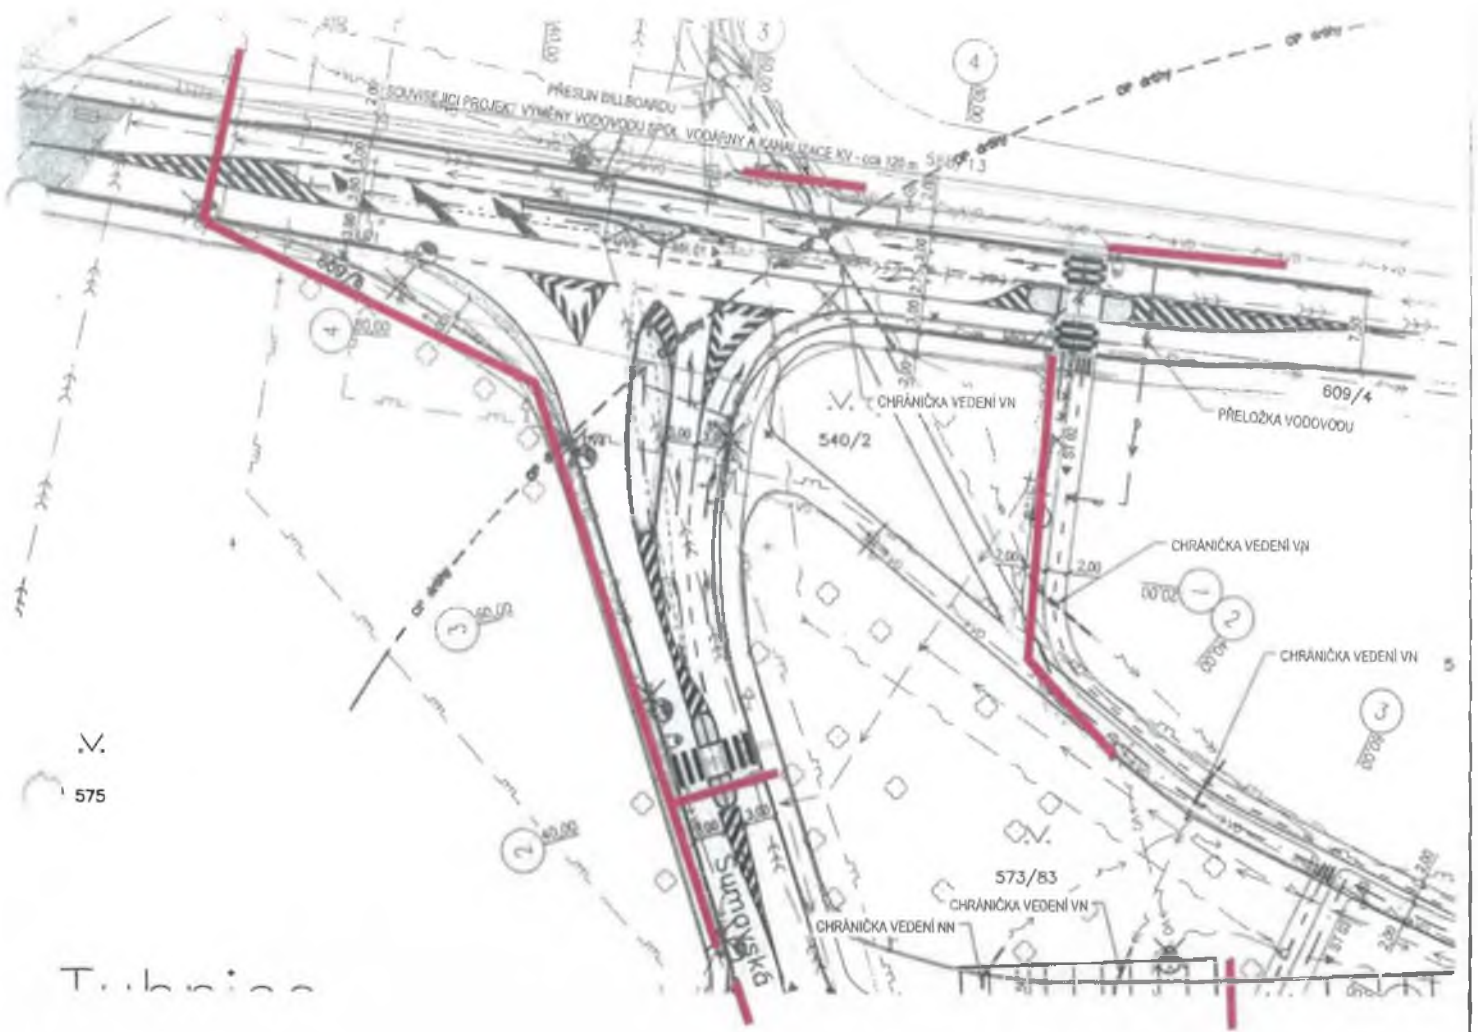

Tubnice



ZL 28
Rýby a zásyb kabeku VO



ZL 28

řepky a zémp kebeku VO



←
cibly
a konoxy



ZL 29

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL029 - stávající plocha pro kontejnery

MK03

← místní komunikace 03

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 26.09.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
MK03 – Místní komunikace - stávající plocha pro kontejnery

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

Nové řešení:

Stávající zdlážděná plocha bude rozebrána, a osazena zpět do potřebné nivelety. Přilehlý chodník bude zúžen z důvodu kořenové soustavy vzrostlého smrku.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 17 107,77 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je 28 101,62 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací je 10 993,85 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL029 A - stávající plocha pro kontejnery MK03

Ocenění ke změně č. ZL029 B - stávající plocha pro kontejnery MK03

Situace

Fotodokumentace

ZL 29

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL029 - stávající plocha pro kontejnery
MK03

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Souhlasím.

Podpis:

ZL 29

Ocenění ke změně č. ZL029 A - stávající plocha pro kontejnery MK03

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL029 A - stávající plocha pro kontejnery
MK03
26.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 26.09.2023 se odsouhlasuje změna:

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

039 - ZL029 A - stávající plocha pro kontejnery MK03

Místo:

Datum: 26.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 101,62
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 101,62
D	1		Zemní práce				9 557,43
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	21,250	27,90	592,88
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: stávající chodník 8,5*2,5		21,250		
6	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	21,250	23,60	501,50
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: stávající chodníky 8,5*2,5		21,250		

ZL29 Stářející plocha pro kontejnery MK 03

9	K	113204111	Vyrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	13,500	51,00	688,50
	PP		Vyrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
	VV		2,5*2,5*0,35		13,500		
11	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	10,501	100,80	1 058,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3				
	VV		8,5*2,5*0,35		7,438		
	VV		3,5*2,5*0,35		3,063		
	VV		Součet		10,501		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,501	229,60	2 411,03
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		8,5*2,5*0,35		7,438		
	VV		3,5*2,5*0,35		3,063		
	VV		Součet		10,501		
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	10,501	17,71	185,97
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		8,5*2,5*0,35		7,438		
	VV		3,5*2,5*0,35		3,063		
	VV		Součet		10,501		
22	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,415	150,00	3 062,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		10,501*1,6		16,802		
	VV		3,613		3,613		
	VV		Součet		20,415		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,501	20,16	211,70
	PP		Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		8,5*2,5*0,35		7,438		
	VV		3,5*2,5*0,35		3,063		
	VV		Součet		10,501		
24	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	30,000	28,17	845,10
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	VV		8,5*2,5		21,250		
	VV		3,5*2,5		8,750		
	VV		Součet		30,000		
D	5		Komunikace pozemní				18 180,00
31	K	564871111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	30,000	306,00	9 180,00
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		8,5*2,5		21,250		
	VV		3,5*2,5		8,750		
	VV		Součet		30,000		

ZL 29 Stěrojící plocha pro kontejnery MK D3

42	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m ²	30,000	300,00	9 000,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²				
	P		Poznámka k položce				
	VV		Poznámka k položce Skladba C				
	VV		8,5*2,5		21,250		
	VV		3,5*2,5		8,750		
	VV		Součet		30,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
	D	997	Přesun sutě				364,19
132	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,613	53,10	191,85
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		3,613		3,613		
133	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	36,130	4,77	172,34
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		3,613*10		36,130		

V Karlových Varech 16.11.2023

Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolář

Projektant:

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorčík

TDS:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kocourek

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

ZL29

Ocenění ke změně č. ZL029 B - stávající plocha pro kontejnery MK03

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL029 B - stávající plocha pro kontejnery
MK03
26.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 26.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

040 - ZL029 B - stávající plocha pro kontejnery MK03

Místo:

Datum: 26.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Pr	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-10 993,85
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-10 993,85
D	1		Zemní práce				-2 089,85
11	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m ³	m ³	-2,880	100,80	-290,30
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m ³				
	VV		-12*1*0,24		-2,880		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-2,880	229,60	-661,25
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		-12*1*0,24		-2,880		
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	-2,880	17,71	-51,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		-12*1*0,24		-2,880		

ZL 29 Stavějící plocha pro kontejneru MK 03

22	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-4,608	150,00	-691,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		-2,88*1,6		-4,608		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-2,880	20,16	-58,06
	PP		Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		-12*1*0,24		-2,880		
24	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	-12,000	28,17	-338,04
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	VV		-12*1		-12,000		
	D	5	Komunikace pozemní				-8 904,00
30	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-12,000	189,00	-2 268,00
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		-12*1		-12,000		
42	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy	m2	-12,000	300,00	-3 600,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
	P		Poznámka k položce				
	VV		Poznámka k položce: Skladba C -12*1		-12,000		
44	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-12,000	253,00	-3 036,00
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: Skladba C -12*1		-12,000		

V Karlových Varech 16.11.2018

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Luk

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Pet

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Da

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Koc

ZL29

Stávající plocha pro kontejnery MK03



ZL 30

místní
komunikace
02
(šumavské
ul.)

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL030 - nalezené uliční vpusti MK02

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 03.10.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
MK02 – Místní komunikace
MK03 – Místní komunikace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

Nové řešení:

Stávající nepoužívané/nefunkční vpusti budou vybourány a zasypány PDK fr. 16-32.

↑ přírodní drcení kamení ve
frakce 16-32 mm

Zdůvodnění změny:

Při zemních pracích byly nalezeny tři původní uliční vpusti a revizní šachta (nepoužívané/nefunkční). Tyto byly vybourány a zasypány PDK fr. 16-32 pro případný vsak původních přítoků. Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín realizace díla.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 31 083,49 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je 31 083,49 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL030 A - nalezené uliční vpusti MK02

Situace

Fotodokumentace

ZL 30

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL030 - nalezené uliční vpusti MK02

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Souhlasím.

ZL 30

Ocenění ke změně č. ZL030 A - nalezené uliční vpusti MK02

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL030 A -nalezené uliční vpusti MK02
03.10.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 03.10.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘÍŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Objekt:

041 - ZL030 A - nalezené uliční vpusti MK02

Místo:

Datum: 04.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Pr	Kód	Popis	Mj	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						31 083,49
D	HSV	Práce a dodávky HSV				31 083,49
D	1	Zemní práce				3 798,53
17	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,500	228,60	1 722,00
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV	dovoz nakoupeného kameniva		7,5	7,500	
	VV					
18	K 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	7,500	17,71	132,83
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV	dovoz nakoupeného kameniva		7,5	7,500	
	VV					
21	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,500	20,16	151,20
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV	dovoz nakoupeného kameniva		7,5	7,500	
	VV					

2L30
Nalezené uliční vpusti MK02

23	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	7,500	239,00	1 792,50
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách "ztracené LV" 3*1,5 "nefunkční šachta MK03 stan. 0.025km komunikace" 3 Součet		4 500 3,000 7,500		
D		8	Trubní vedení				23 243,75
52	K	890411851	Bourání šachet a jímk strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	6,000	2 191,00	13 146,00
			Bourání šachet a jímk strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží Ztracené LV 3*1,5 Nefunkční šachta komunikace MK03 1,5 Součet		4,500 1,500 6,000		
53	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	4,000	545,00	2 180,00
			Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg 4		4,000		
241	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	12,750	621,00	7 917,75
			kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 7,5*1,7		12,750		
D		997	Přesun sutě				4 041,21
132	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,520	53,10	611,71
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km vybourané vpusti+šachta 11,52		11,520		
133	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	115,200	4,77	549,50
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km vybourané vpusti 11,52*10		115,200		
134	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,520	250,00	2 880,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 11,52		11,520		

V Karlových Varech 16.11.2023

Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolář

Projektant:

GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:


INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kos

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

ZL 30

Nalezené uliční vpusti MK 02

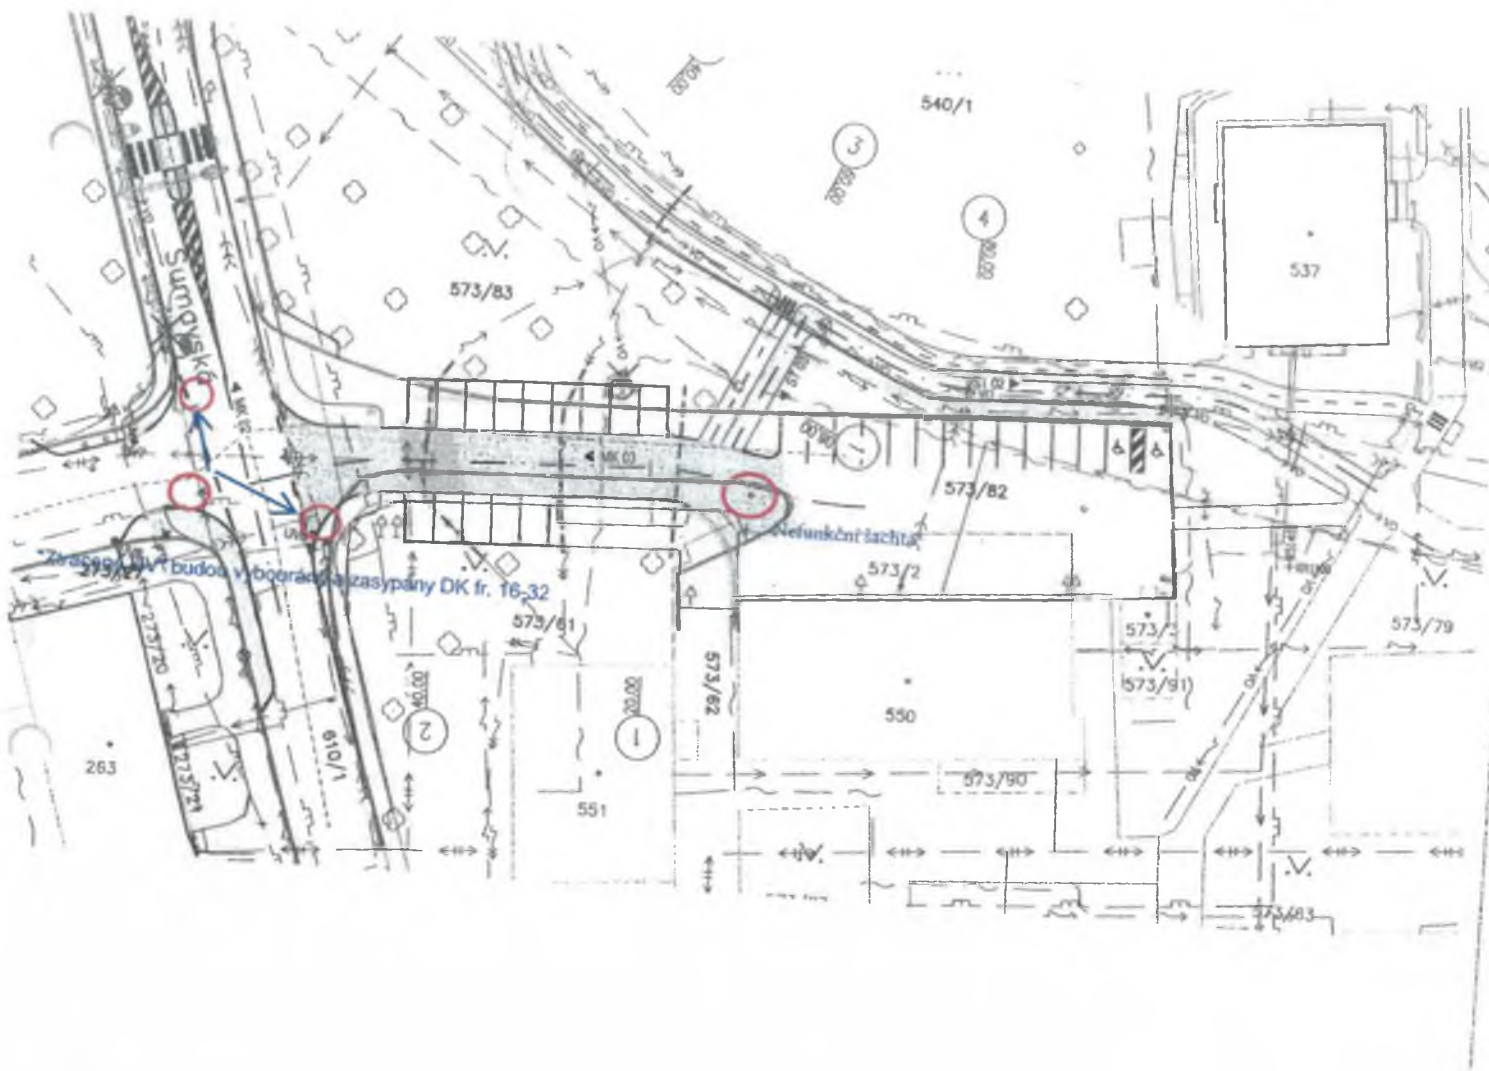

ZL 30
Nalezene uhlí v proužku MK 02



ZL 30 Nalezené odvětví vpruosti MK 02

