

| | |
|--|---|
| Stavba: Rekonstrukce chladicího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě | |
| ZMĚNOVÝ LIST ZL - 06 | |
| Dotčená část díla: | Ledová plocha |
| Předmět změny: | Změna dimenze odvodňovacího žlabu z DN 150 na DN 100 a záměna zatížení roštu z D400 na C250 |
| Objednatel: | Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00 |
| Zhotovitel: | Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00 |
| ZL zpracoval za zhotovitele : | Ing. Vojtěch Bureček Datum : |
| Popis změny: Na základě požadavku investora došlo ke snížení dimenze odvodňovacího žlabu z DN 150 na DN 100 a záměně krycího roštu z D400 litina na C250 kompozit v ploše, v přejezdech zůstává D400 Zdůvodnění: Řešení: | |
| Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla. | |
| Předpoklad změny termínu : | zpoždění o: nebude |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH -280 096,78 Kč |
| Seznam příloh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet 2. PD 3. Zákres rozsahu, popis a náhled TL | |
| Za Zhotovitele : Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko : | Za objednatele: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ing. Jaroslav Kovář <i>jednatel společnosti</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko : |
| Za AD: B.B.D., s.r.o. Michal Maiwald <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko : | Za TDS: PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o. Ing. Ladislav Procházka zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko : |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|---|
| S: | Rekonstrukce chladicího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě |
| O: | |
| R: | |

ZL06 odvodňovací žlaby celkem - 280 096,78 Kč

Nerealizované položky - 770 560,00 Kč
Nové položky 490 463,22 Kč

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Nerealizované položky 770 560,00

Ledová plocha I.

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---|---|---------|----------|------------|
| 44 | M | 56241021 | žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 150mm | m | 162,000 | 1 890,00 | 306 180,00 |
| | | | <small>žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 150mm</small> | | | | |
| 45 | M | 56241025 | rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm | m | 162,000 | 2 590,00 | 419 580,00 |
| | | | <small>rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm</small> | | | | |

Zázemí (rolbovna)

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---|---|--------|----------|-----------|
| 20 | M | 56241021 | žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 150mm | m | 10,000 | 1 890,00 | 18 900,00 |
| | | | <small>žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 150mm</small> | | | | |
| 21 | M | 56241025 | rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm | m | 10,000 | 2 590,00 | 25 900,00 |
| | | | <small>rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm</small> | | | | |

Nové položky

490 463,22

Ledová plocha I.

| | | | | | | | |
|------|--|----------|--|---|---------|----------|------------|
| nová | | 56241001 | žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 100mm | m | 162,000 | 1 265,48 | 205 007,48 |
| nová | | 56241018 | rošt můstkový D400 litina pro žlab š 100mm | m | 8,000 | 1 699,36 | 13 594,85 |
| nová | | 56241015 | rošt můstkový C250 kompozitní pro žlab š 100mm | m | 154,000 | 1 572,81 | 242 212,54 |

Zázemí (rolbovna)

| | | | | | | | |
|------|--|----------|--|---|--------|----------|-----------|
| nová | | 56241001 | žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 100mm | m | 10,000 | 1 265,48 | 12 654,78 |
| nová | | 56241018 | rošt můstkový D400 litina pro žlab š 100mm | m | 10,000 | 1 699,36 | 16 993,57 |

Výpočty a koeficienty

Koeficient URS cen

| | |
|---|----------------|
| předpokládaná cena veřejné zakázky 115 000 000 Kč | 115 000 000 Kč |
| naše smluvní cena 103 950 000 Kč | 103 950 000 Kč |
| koeficient dle SoD 103 950 000 / 115 000 000 = | 0,903913043 |

Poznámka


nové jednotkové ceny = URS 2023/2 * koeficient 0,9039...

Provedení odvodňovacího žlabu

všechny 4 oblouky budou provedeny ze žlabů délky 0,5m, celkem 30m, spoje tmelené
rovné délky budou provedeny ze žlabu délky 1,0m

V zázemí rolny 2x5m + 2x4m a v rozích u tribuny D viz nákres níže budou použity rošty D400 litina
na všech zbylých žlabech bude použit rošt C250 kompozit


LEDOVÁ PLOCHA I. - HLAVNÍ PLOCHA 60m x 28m; R8,5m

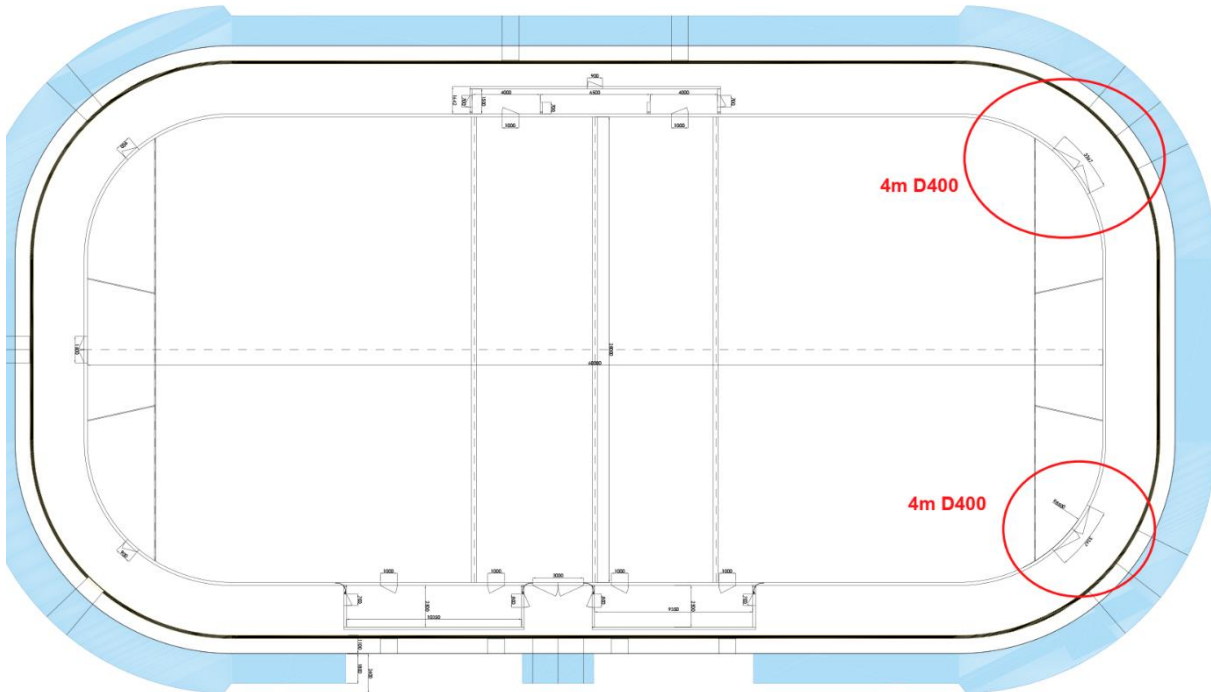


KOMPOZITNÍ PLAST-MŮSTKOVÝ ROŠT, REGRANULÁT

Délka: 500 mm
Světla šířka: 100 mm
Třída zatížení: C 250

DETAIL ŽLABU MEARIN PLUS/EXPERT 100 M 1:20



MŮSTKOVÝ LITINOVÝ ROŠT D400 OKA 12/96



tmelní spoje

PODÉLNÝ ŘEZ ŽLABOVOU LINIÍ DETAIL VYTMELENÍ DRÁŽKY UVNITŘ ŽLABU V MÍSTĚ STYKU DVOU ŽLABOVÝCH TVAROVEK M 1:5

