

Stavba: Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě	
ZMĚNOVÝ LIST ZL - 26	
Dotčená část díla:	Tribuny
Předmět změny:	Nové malby stěn na tribunách
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00
Zhotovitel:	Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00
ZL zpracoval za zhotovitele :	Ing. Vojtěch Bureček Datum :
Popis změny: Dle pokynů investora byly provedeny nové malby a výsrazení stěn na tribunách	
Zdůvodnění:	
Řešení:	
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.	
Předpoklad změny termínu :	zpoždění o: 0
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH 134 304,30 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. PD 3. Fotodokumentace	
Za Zhotovitele : Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ing. Jaroslav Kovář <i>jednatel společnosti</i> schváleno Datum : Podpis, razítko :
Za AD: B.B.D., s.r.o. Michal Maiwald <i>autorský dozor a projektant</i> schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za TDS: PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o. Ing. Ladislav Procházka schváleno Datum : Podpis, razítko :

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Rekonstrukce chladicího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě
O:		
R:		


ZL26 celkem

134 304,30 Kč

101	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	794,700	15,00	11 920,50
			<small>PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení</small>				
102	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	794,700	30,00	23 841,00
			<small>PP Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) akrylátový</small>				
103	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	794,700	85,00	67 549,50
			<small>PP Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) akrylátový</small>				
24	K	612111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	79,470	390,00	30 993,30
			<small>PP Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vsprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn 10% plochy 794,7 * 0,1 = 79,47 m2</small>				

Poznámka položky použity z rozpočtu – Stavba - Plocha I.

Výpočty	viz výkres v příloze	
	průchody pod tribuny	38,5 m2
	čela tribun	513,2 m2
	pod VIP	35 m2
	výklenky na levé a pravé straně	208 m2
	Celkem	794,7 m2

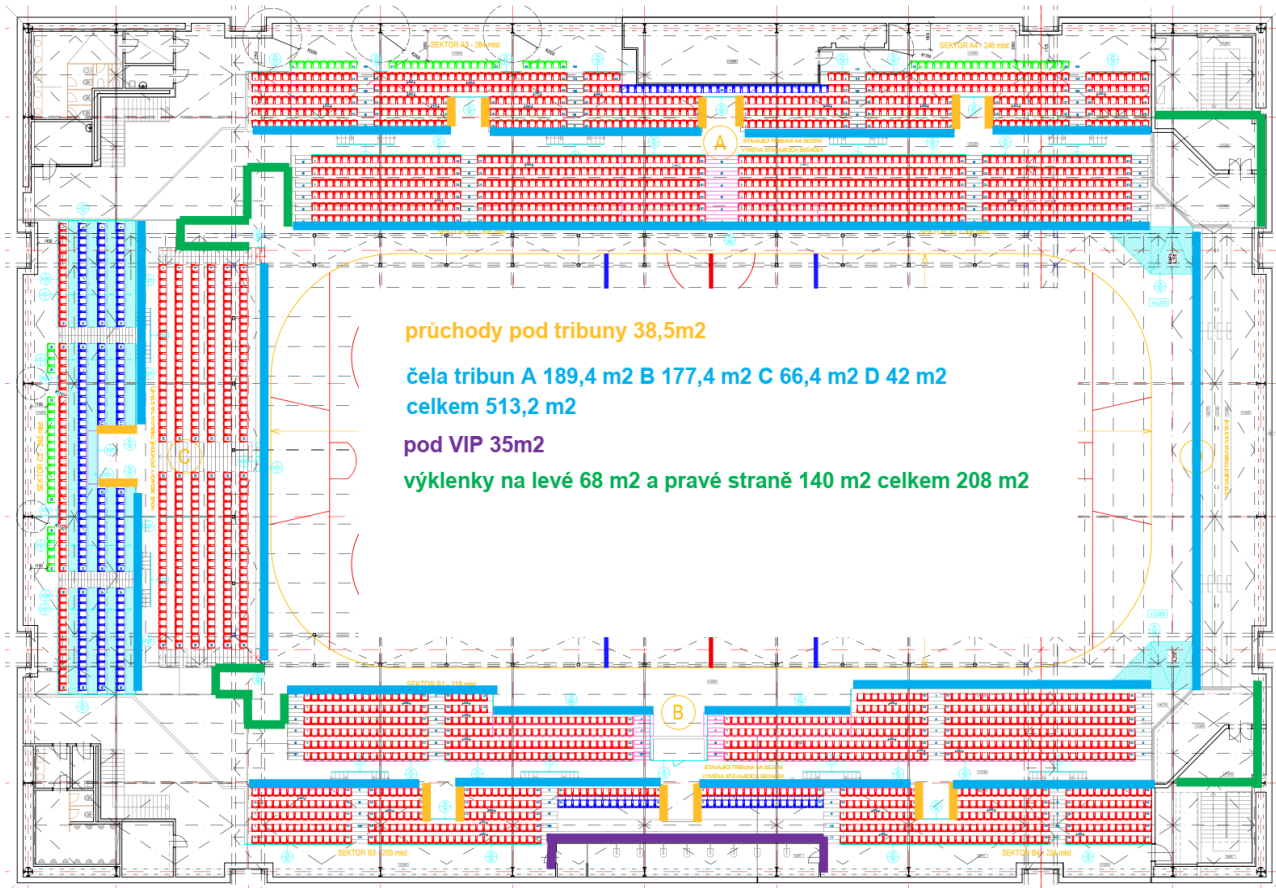

průchody pod tribuny 38,5m²

čela tribun A 189,4 m² B 177,4 m² C 66,4 m² D 42 m²
celkem 513,2 m²

pod VIP 35m²

výklenky na levé 68 m² a pravé straně 140 m² celkem 208 m²

