

DOHODA O NAROVNÁNÍ

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená v souladu s ust. § 1903 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

STRANY DOHODY:

1. **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**, IČO: 646 10 250, se sídlem Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl: B, vložka 1234, zastoupen: Milan Semera, předseda představenstva

(dále jen „Objednatel“, nebo „MDPO“)

a

2. **Bohemia Müller s.r.o.**, IČO: 250 15 265, se sídlem Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl: C, vložka 11885, zastoupen: Ing. Václav Langheinrich, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Bohemia Müller“)

(MDPO a Bohemia Müller společně dále jen „Strany dohody“ a každá z nich jednotlivě také jako „Strana dohody“)

PREAMBULE:

- (A) MDPO v pozici zadavatele zahájila výběrové řízení k zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnirny Čajkovského a vlastního objektu měnirny**“ (dále jen „**zakázka**“). Předmětem zakázky byla v rámci technické a stavební části rekonstrukce, revitalizace a jiné zásahy do objektu měnirny Čajkovského;
- (B) Vzhledem na výsledek zadávacího řízení Strany dohody spolu uzavřely Smlouvu o dílo ze dne 10.02.2022 dále jen „**Smlouva**“ včetně Dodatku č.1 ze dne 11.08.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 05.10.2022 (dále jen společně jako „**Dodatky**“, nebo samostatně jako „**Dodatek č. 1**“ a „**Dodatek č. 2**“);
- (C) Dílo bylo ze strany Zhotovitele odevzdané Objednateli dne 15.11.2022 na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“). Skutečná uhrazená cena díla ke dni podpisu Protokolu činila částku 7.964.276,83 Kč bez DPH.
- (D) Na Smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jako „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Vzhledem na kontrolu vykonanou ze strany Ministerstva dopravy České republiky bylo zjištěno, že Smlouva (včetně Dodatků) nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že Smlouva (včetně Dodatků) byla zrušena od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv;
- (E) Tato Dohoda se uzavírá za účelem postavení na jisto právních vztahů mezi Stranami dohody, předcházení hrožící újmě, případným soudním sporům, ujednání oprávněnosti fakturace Zhotovitele dle Smlouvy a oprávněnosti dosud uhrazených částek, zachování vymezených práv Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, včetně práv vyplývajících z případné odpovědnosti za vady, práv Objednatele na případné budoucí smluvní pokuty, případné budoucí náhrady újmy a za účelem maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivit).

1. Předmět a účel Dohody

- 1.1. Předmětem této Dohody je narovnání všech sporných nebo pochybných nároků vzniklých v souvislosti se Smlouvou a Dodatky, respektive v souvislosti s realizací předmětu Smlouvy a úhradou ceny díla. Sporná nároky jsou blíže popsána v čl. 2 této Dohody.
- 1.2. Účelem této Dohody je odstranění sporných a pochybných práv, respektive vypořádání možných sporných nároků, jak jsou níže definovány. Účelem této Dohody je zabránění vzniku nejasností vzhledem na vzniklou situaci tak jako je popsán v Preambuli.

2. Sporná práva

- 2.1. Mezi Stranami dohody je sporné, jestli vzhledem na uplatnění zákonné domněnky o zrušení Smlouvy od počátku dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv vznikla:
 - Bohemia Müller povinnost vrátit úhrady provedené dle Smlouvy MDPO, a to z jakéhokoliv právního titulu, zejména z titulu bezdůvodného obohacení
 - MDPO povinnost vrátit Bohemia Müller poskytnuté plnění, resp. poskytnout peněžní náhradu za vykonané dílo
- 2.2. Mezi Stranami dohody je rovněž sporné, jaká náhrada případně přináleží Bohemia Müller z titulu nemožnosti vrácení vykonaných prací na díle, respektive v jaké výši.
- 2.3. Sporné nároky Stran dohody popsáné v čl. 2.1 a 2.2 jsou dále souhrnně označovány jako „**Sporné nároky**“.

3. Narovnání

- 3.1. Strany dohody tímto mezi sebou **narovnávají Sporné nároky**, a to tak, že tyto Sporné nároky zanikají a jsou v plném rozsahu **nahrazeny** právy a povinnostmi stanovenými v čl. 4 této Dohody.
- 3.2. Strany dohody potvrzují, že tato Dohoda řeší s konečnou platností veškeré existující i potenciální, aktuální i budoucí vzájemné nároky Stran dohody jakkoli související se Smlouvou o dílo, Spornými nároky, není-li v této Dohodě výslovně stanoveno jinak.

4. Závazky z narovnání

- 4.1. Strany dohody se dohodly v rámci narovnání Sporných nároků na následujícím:
 - (a) MDPO nemá povinnost vrátit Bohemia Müller poskytnuté plnění, resp. poskytnout peněžní náhradu za vykonané dílo dle Smlouvy
 - (b) Bohemia Müller nemá povinnost vrátit MDPO již uhrazenou cenu za dílo dle Smlouvy z titulu bezdůvodného obohacení či jakéhokoliv jiného právního titulu
 - (c) MDPO činí nesporným, že od Bohemia Müller převzala dílo řádně vykonané v rozsahu dle čl. III odst. 3.1 a 3.2 Smlouvy
 - (d) Bohemia Müller činí nesporným, že od MDPO přijala částku ve výši 7.964.276,83 Kč bez DPH, přičemž tato částka není bezdůvodným obohacením, jde o úhradu ceny díla dle Smlouvy

- (e) Pro odstranění pochybností Strany dohody výslovně prohlašují a sjednávají, že ke dni účinnosti této Dohody jsou veškeré možné nároky MDPO na vrácení částky odpovídající uhrazené ceně za dílo, zejména z titulu bezdůvodného obohacení a možné nároky Bohemia Müller na náhradu vykonaných prací za **zcela vypořádané**.
- 4.2. Strany dohody se dohodly, že v části záruky za jakost, odpovědnosti za vady, nároku na smluvní pokuty se Strany dohody řídí, zejména články XIV – XVI Smlouvy o dílo a Dodatky, které jsou přílohou č. 1 této Dohody. Strany se dále budou řídit všemi ustanoveními Smlouvy o dílo a Dodatky, z jejichž povahy plyne závaznost mezi Stranami i po odevzdání díla a zaplacení ceny díla.

5. *Prohlášení Stran dohody*

- 5.1. Každá ze Stran dohody prohlašuje, že žádné nároky přímo nebo nepřímo související se Smlouvou nepostoupila před Dnem podpisu na třetí osobu, ani je neposkytla jako předmět zajištění.
- 5.2. Strany dohody prohlašují, že nepodaly vůči druhé Straně dohody žádné žaloby, návrhy na předběžná opatření ani jiná podání k orgánům veřejné moci a ke dni podpisu Dohody nemají žádné další nároky, které by zakládaly důvod pro podání takových žalob nebo návrhů.
- 5.3. Každá Strana dohody, že je oprávněna tuto Dohodu uzavřít a plnit. Každá Strana dohody dále prohlašuje, že získala veškeré potřebné souhlasy, povolení a potvrzení k uzavření a plnění této Dohody a že jí v uzavření ani plnění této Dohody nebrání žádné smluvní, zákonné nebo jiné překážky.
- 5.4. Strany dohody se zavazují zajistit správnost a úplnost příslušných prohlášení uvedených v tomto článku.

6. *Závěrečná ustanovení*

- 6.1. Tato Dohoda nabývá platnost jejím podpisem poslední Stranou dohody.
- 6.2. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv. Strany dohody se dohodly, že její uveřejnění zajistí MDPO.
- 6.3. Pokud některé z ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Dohody jako celku ani jiných ustanovení této Dohody, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Dohody. Strany dohody se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- 6.4. Tato Dohoda může být měněna pouze písemnou dohodou Stran dohody.
- 6.5. Tato Dohoda se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 6.6. Strany dohody se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí, které po nich lze požadovat, aby urovnaly veškeré spory související s touto Dohodou smírnou cestou. Pokud se jim spor nepodaří vyřešit smírnou cestou ve lhůtě dvaceti (20) dne ode dne, kdy se kterákoliv Strana zahájí jednání o smíru písemnou výzvou anebo ve lhůtě, na niž se Strany dohodnou, je kterákoliv ze Stran oprávněna předložit spor na rozhodnutí příslušnému soudu.

- 6.7. Veškeré spory z této Dohody nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 6.8. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá Strana dohody obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 6.9. Zástupci Stran dohody prohlašují, že se s obsahem Dohody před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 6.10. Nedílnou součástí této Dohody jsou její následující přílohy:
- (a) Příloha č. 1 – Smlouva o dílo a Dodatky.

V Opavě dne _____

V _____ dne _____

Městský dopravní podnik Opava, a.s:

**Milan
Semera**

Digitálně podepsal
Milan Semera
Datum: 2024.04.24
11:17:42 +02'00'

Milan Semera
předseda představenství

Bohemia Müller s.r.o.:

**Ing. Václav
Langheinrich**

Digitálně podepsal Ing.
Václav Langheinrich
Datum: 2024.04.24
10:19:44 +02'00'

Ing. Václav Langheinrich
jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**
IČ: **64610250**
DIČ: **CZ64610250**
Datová schránka: **h49e6w2**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**
Zapsán: **v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 1234**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	Bohemia Müller s.r.o.
Sídlo:	Loupanická 139, Janov, 435 42 Litvínov
IČ:	25015265
DIČ:	CZ25015265
Datová schránka:	gskrg86
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	Karel Müller, jednatel
Zapsán:	v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	Ing. Václav Langheinrich, jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovského včetně vlastního objektu měnírny“,

jehož součástí je:

D.Technologická část:

- PS1 Střídavá část
- PS2 Trakční technologie
- PS3 Vlastní spotřeba
- PS4 Hromosvod
- PS5 Stavební elektroinstalace

E.Stavební část

- Revitalizace obvodového pláště zahrnující výměnu vratových, okenních a dveřních otvorů, zateplení obvodových stěn budovy
- Sanace svislého obvodového zdiva, izolace proti zemní vlhkosti
- Klempířské a zámečnické práce
- Opravy vnitřních stěn a omítek
- Oprava přístupových zpevněných ploch kolem objektu

Vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby
(dále také jen "dílo").

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu Zadávací dokumentace a stanoveném, projektovou dokumentací pro provádění stavby z 08/2017 zpracovanou Ing. Petrem Tillem, OHS ŽS, a.s., Dopravní stavby, divize technologie, ul. Světlá 5, 614 00 Brno (dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 15.11.2021, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

3.2. Součástí díla je rovněž:

- odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot,
- zajištění úklidu celého objektu a zahrady.

3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV.
Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty

6 776 298 Kč

(slovy: šestmilionůsedmsetšedesátšesttisícdevětstědevadesátosm korun českých)

4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku

1 423 022, 58 Kč

4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku

0 Kč

4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

8 199 320, 58 Kč

(slovy: osmmilionůstodevadesátdevěttisíctřístadvacet korun českých a padesátosm haléřů)

- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště a nutnou koordinaci s provozem měnírny.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně
a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly,
že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- a) adresa objednatele pro doručování faktur: Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava-Kylešovice;
 - b) Název a číslo dotačního projektu: Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měření Čajkovského a Kylešovská a vlastních objektů měření, číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/18_0570000401
 - c) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - d) číslo faktury;
 - e) den vystavení a den splatnosti;
 - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - g) soupis provedených prací za fakturační období;
 - h) fakturovanou částku;
 - i) označení díla, označení názvu a čísla projektu;
 - j) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich

dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění do 30-tého dne daného kalendářního měsíce.
- 5.9.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI.

Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to

až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.

- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII.

Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků,
s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 365 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
- 7.4. Před započatím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.

- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.

Místo plnění

Místem plnění je:

-objekt měnírny na ul. Čajkovského 2696/31, 746 01 Opava-předměstí, pozemek parcela číslo 2373/549 v k.ú. Opava-předměstí a parcelách sousedních, předmětu díla a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX.

Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. Příslušné pokyny (např. podmínky správců inženýrských sítí) a doklady vydané příslušnými orgány státní správy, související s předmětem díla, se objednatel zavazuje předat zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto zaznamenané změny v jednom písemném a grafickém provedení předá objednateli při předání a převzetí díla objednatelům.
- 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)
a dalšími platnými předpisy.
- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.22.
- 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.

- 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.28. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem objektu dle jeho pokynů a nařízení.
- 10.29. Zhotovitel je povinen zabezpečit, po vzájemné dohodě s objednatelem, bez omezení fungování všech technologických zařízení umístěných v objektu stavby.
- 10.30.
- 10.31. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.32. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit objednatelem.
- 10.33.
- 10.34.
- 10.35.
- 10.36. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu
- kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného správcem majetku objednatele. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu

veškerého přebytkového materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními listy atd.

Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními listy apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli

do 7 kalendářních dnů od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.

- 10.37. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.38. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.39. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.40. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.39. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI.

Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
 - a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn odsouhlasit správce majetku.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.

Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
 - název zhotovitele
 - termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.

Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále

zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době _____ od _____ 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.

- 13.3. Zhotovitel zajistí včasné zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.

- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.

Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **3■** ■■■■■■ za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na ■■■■■■ za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši [REDACTED] za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši [REDACTED] za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši [REDACTED] za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu [REDACTED] za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED].
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy

za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 17.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala
či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům objednatele, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření

Městský dopravní podnik Opava, a.s. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

17.17.

Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací
- příloha č. 3 projektová dokumentace v tištěné podobě (1 x paré)

V Opavě dne 3.2.2022

V Litvínově dne 10-02-2022

Za objednatele
Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Za zhotovitele
Karel Müller
jednatel
Bohemia Müller s.r.o.

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost 
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250



Příloha č. 1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132A
Stavba: MR Čajkovského

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2021

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 776 298,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	6 776 298,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	6 776 298,00	1 423 022,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 199 320,58
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost
747 06 OP
DIČ: 4610250
Bílovecká 98

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132A

Stavba: MR Čajkovského

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 776 298,00	8 199 320,58
PS 01	Střídavá část	1 129 803,18	1 367 061,85
PS 02	Trakční technologie	1 580 517,69	1 912 426,40
PS 03	Vlastní spotřeba	185 452,58	224 397,62
PS 04	Hromosvod a uzemnění	33 605,00	40 662,05
PŠ 05	Stavební elektroinstalace	538 911,80	652 083,28
SO 01	Rekonstrukce budovy	3 102 007,75	3 753 429,38
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	206 000,00	249 260,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 776 298,00	8 199 320,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského
Objekt: PS 01 - Střídavá část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 129 803,18
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 129 803,18
DPH základní	21,00%	ze	1 129 803,18	237 258,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 367 061,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský dopravní podnik Opava
 s.r.o.
 747 06 000
 DIČ: 4610250

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 01 - Střídavá část

Místo:

Datum: 12.11.2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 129 803,18
D1 - PS1 Střídavá část	1 129 803,18
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 129 803,18

ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 01 - Střídavá část

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


1 129 803,18

D1 - PS1 Střídavá část

1 129 803,18

1	K	Pol1	Třířákový suchý trakční transformátor dvouvinutový pro šestipulsní usměrňovač bez nulové tlumivky s parametry, dle položky č. 1 TOS oddílu 1.1	kpl	1,000		
2	K	Pol2	Výroba a montáž svarovaných konstrukcí z ocelových C profilů. Tato konstrukce bude natřena a opatřena podpěrnými izolátory (3x izolátor 25kV, 3x izolátor 1kV). Konstrukce bude pro primární i sekundární stranu transformátoru. Více viz výkresová dokumentace	kpl	1,000		
3	K	Pol3	Napojení pasovín na transformátory s použitím pružných spojek viz. výkresová dokumentace	kpl	1,000		
4	K	Pol4	Přestavení 4 ks ochran, výměna 1 ks relé A11/3A za nový typ papř. A11/5A.	kpl	1,000		
5	K	Pol5	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl	1,000		
6	K	Pol6	Montáž kabeláže průřezů 10 mm ² a menší	kpl	1,000		
7	K	Pol7	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000		
8	K	Pol8	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl	1,000		
9	K	Pol9	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího trakčního transformátoru T1	kpl	1,000		

100

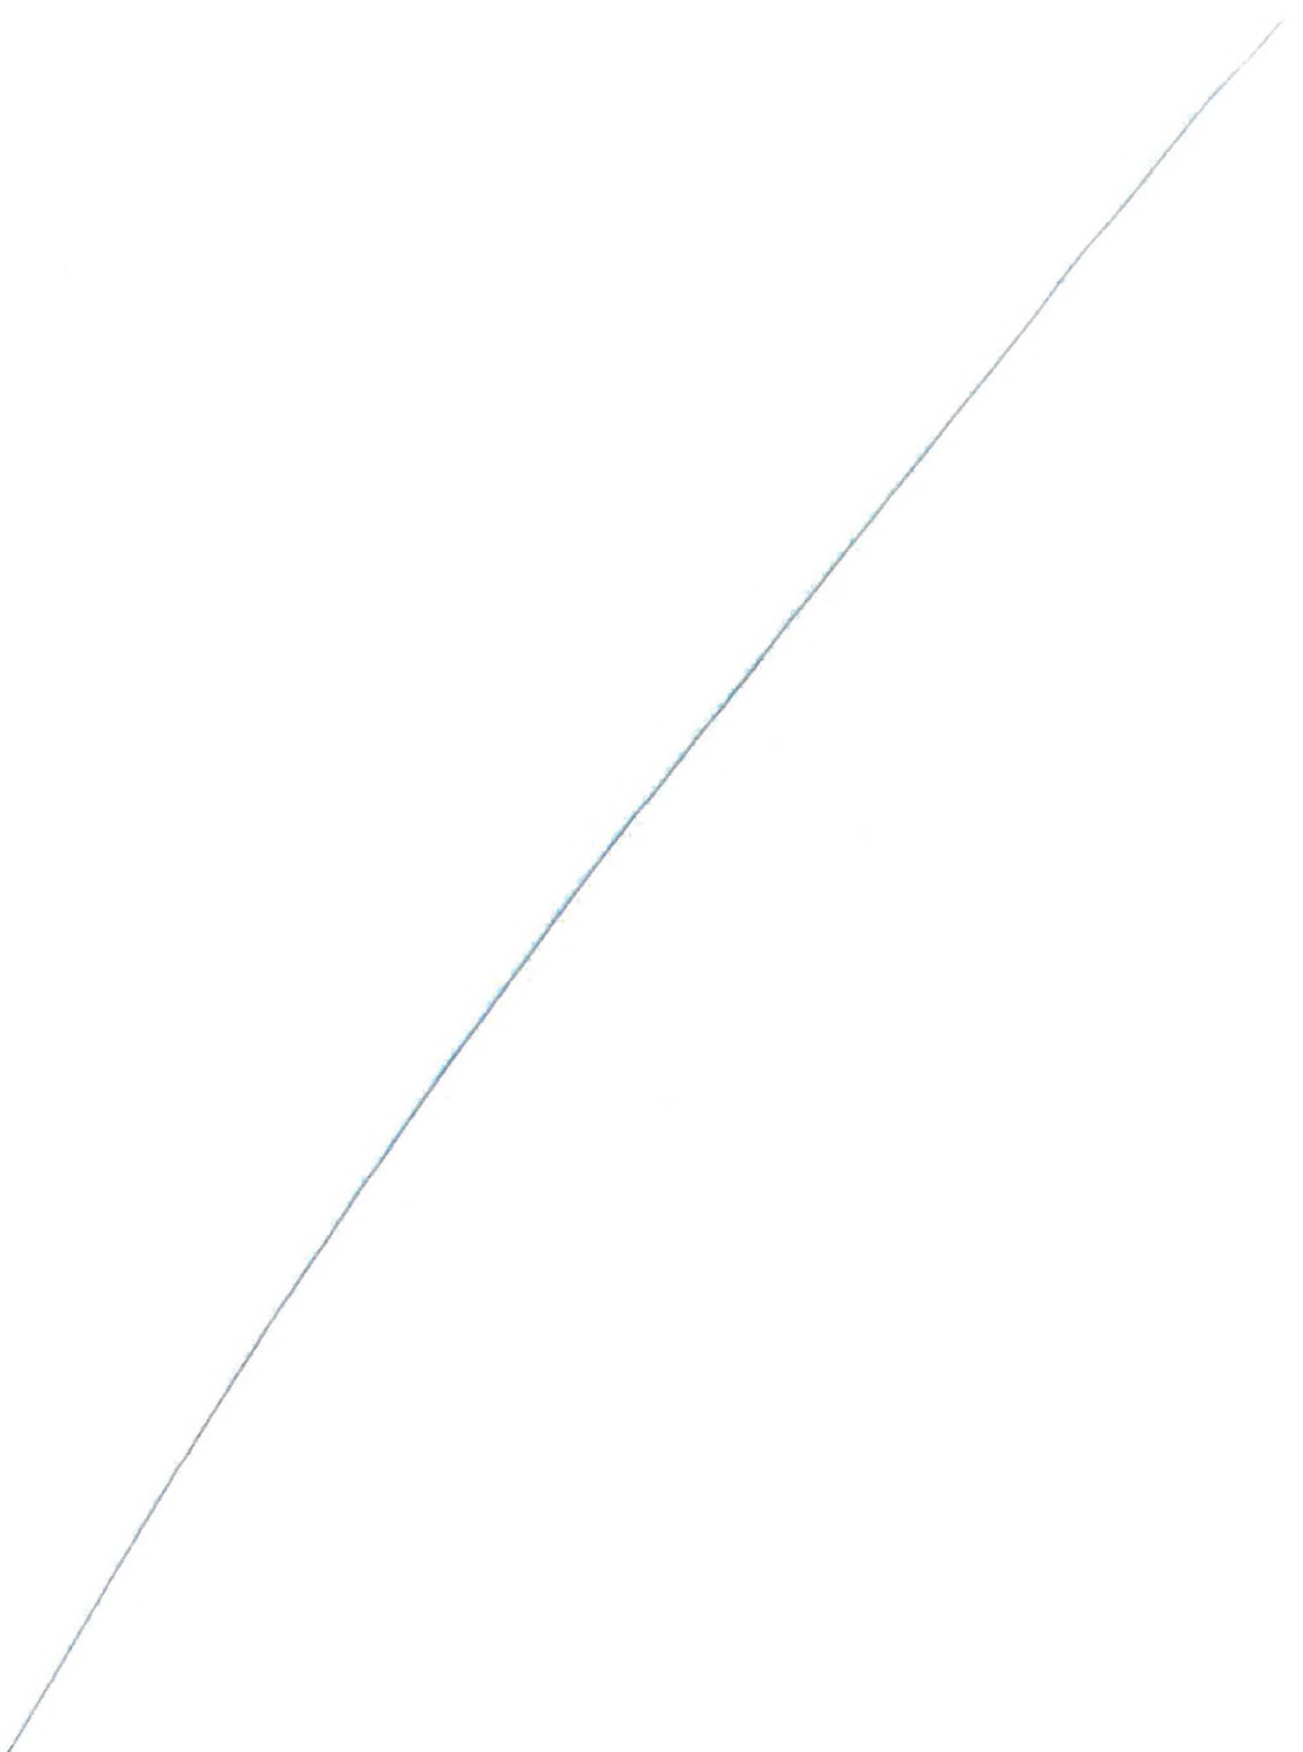

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 02 - Trakční technologie

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 580 517,69

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 580 517,69

DPH základní

21,00%

ze

1 580 517,69

331 908,71

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 912 426,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský dopra
akciová
747 06 OPA
DIČ: C

podnik Opava
lečnost ⑧
Mílovecká 98
510250

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 02 - Trakční technologie

Místo:

Datum: 12.11.2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 580 517,69
D1 - PS2 Trakční technologie	1 580 517,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 580 517,69

ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 02 - Trakční technologie

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

1 580 517,69

D1 - PS2 Trakční technologie

1 580 517,69

1	K	Pol10	Diodový šestipulzní usměrňovač skříňového provedení pro zástavbu do řady napáječových skříní včetně odpojitelného připojení k přípojnícím, dle položky č. 1 TOS oddílu 1.2	kpl	2,000	7 000 000	
2	K	Pol11	Úprava napojení pasovin na usměrňovač	kpl	1,000		
3	K	Pol12	Lisovací kabelové oko pro připojení kabelu AYKFY 500 mm2	ks	16,000		
4	K	Pol13	Protipožární ucpávka prostupů pod usměrňovací cca 0,25m2	kpl	1,000		
5	K	Pol14	Demontáž a ekologická likvidace stávajících usměrňovačů U1 a U2	kpl	1,000		
6	K	Pol15	Napěťová zemní ochrana, nap. napětí 24V DC, včetně předřadného odporu a redukčního plechu	kpl	1,000		
7	K	Pol16	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl	1,000		
8	K	Pol17	Montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší	kpl	1,000		
9	K	Pol18	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000		
10	K	Pol19	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl	1,000		
11	K	Pol20	Odpojení stávající zemní ochrany. Ochrana ale bude ponechána ve dveřích.	kpl	1,000		

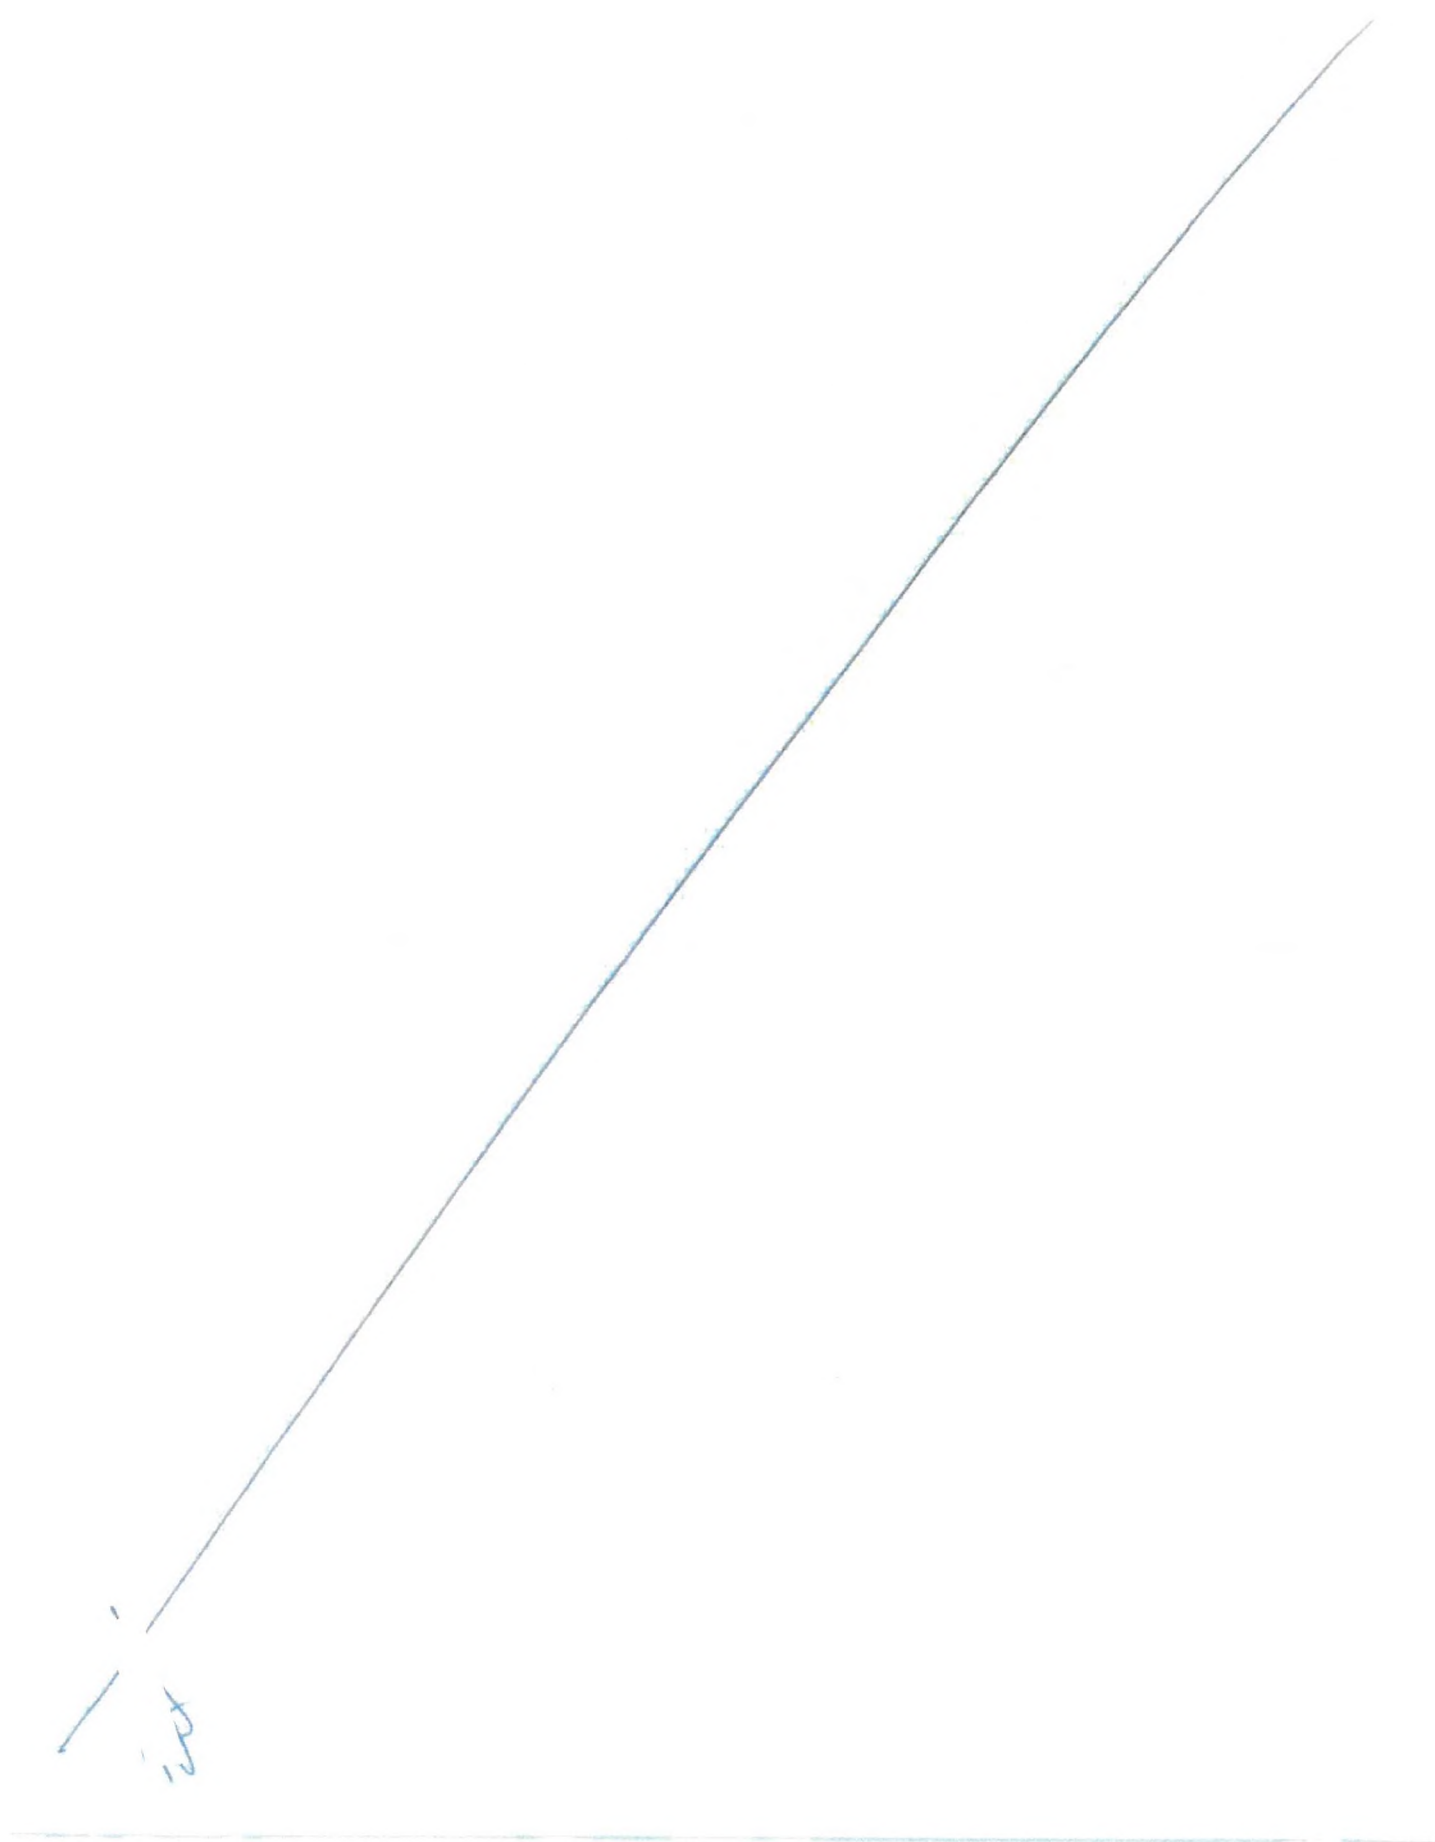

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 03 - Vlastní spotřeba

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				185 452,58
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				185 452,58
DPH základní	21,00%	ze	185 452,58	38 945,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		224 397,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost
747 06 OP
DIČ: C610250

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 03 - Vlastní spotřeba

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	185 452,58
D1 - PS3 Vlastní spotřeba	185 452,58
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	185 452,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 04 - Hromosvod a uzemnění

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				33 605,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				33 605,00
DPH základní	21,00%	ze	33 605,00	7 057,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				40 662,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městský dopr.
akciov.
747 08 00
DIČ:

podnik Opava
plečnost ⑧
Bílavecká 98
1610250

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 04 - Hromosvod a uzemnění

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 605,00
D1 - PS4 Hromosvod a uzemnění	33 605,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 605,00

ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 04 - Hromosvod a uzemnění

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

33 605,00

D1 - PS4 Hromosvod a uzemnění

33 605,00

1	K	Pol27	Úprava hromosvodu spojená s rekonstrukcí atiky objektu	kpl	1,000		
2	K	Pol28	oprava uzemnění poškozeného při výkopových pracích	kpl	1,000		
3	K	Pol29	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl	1,000		

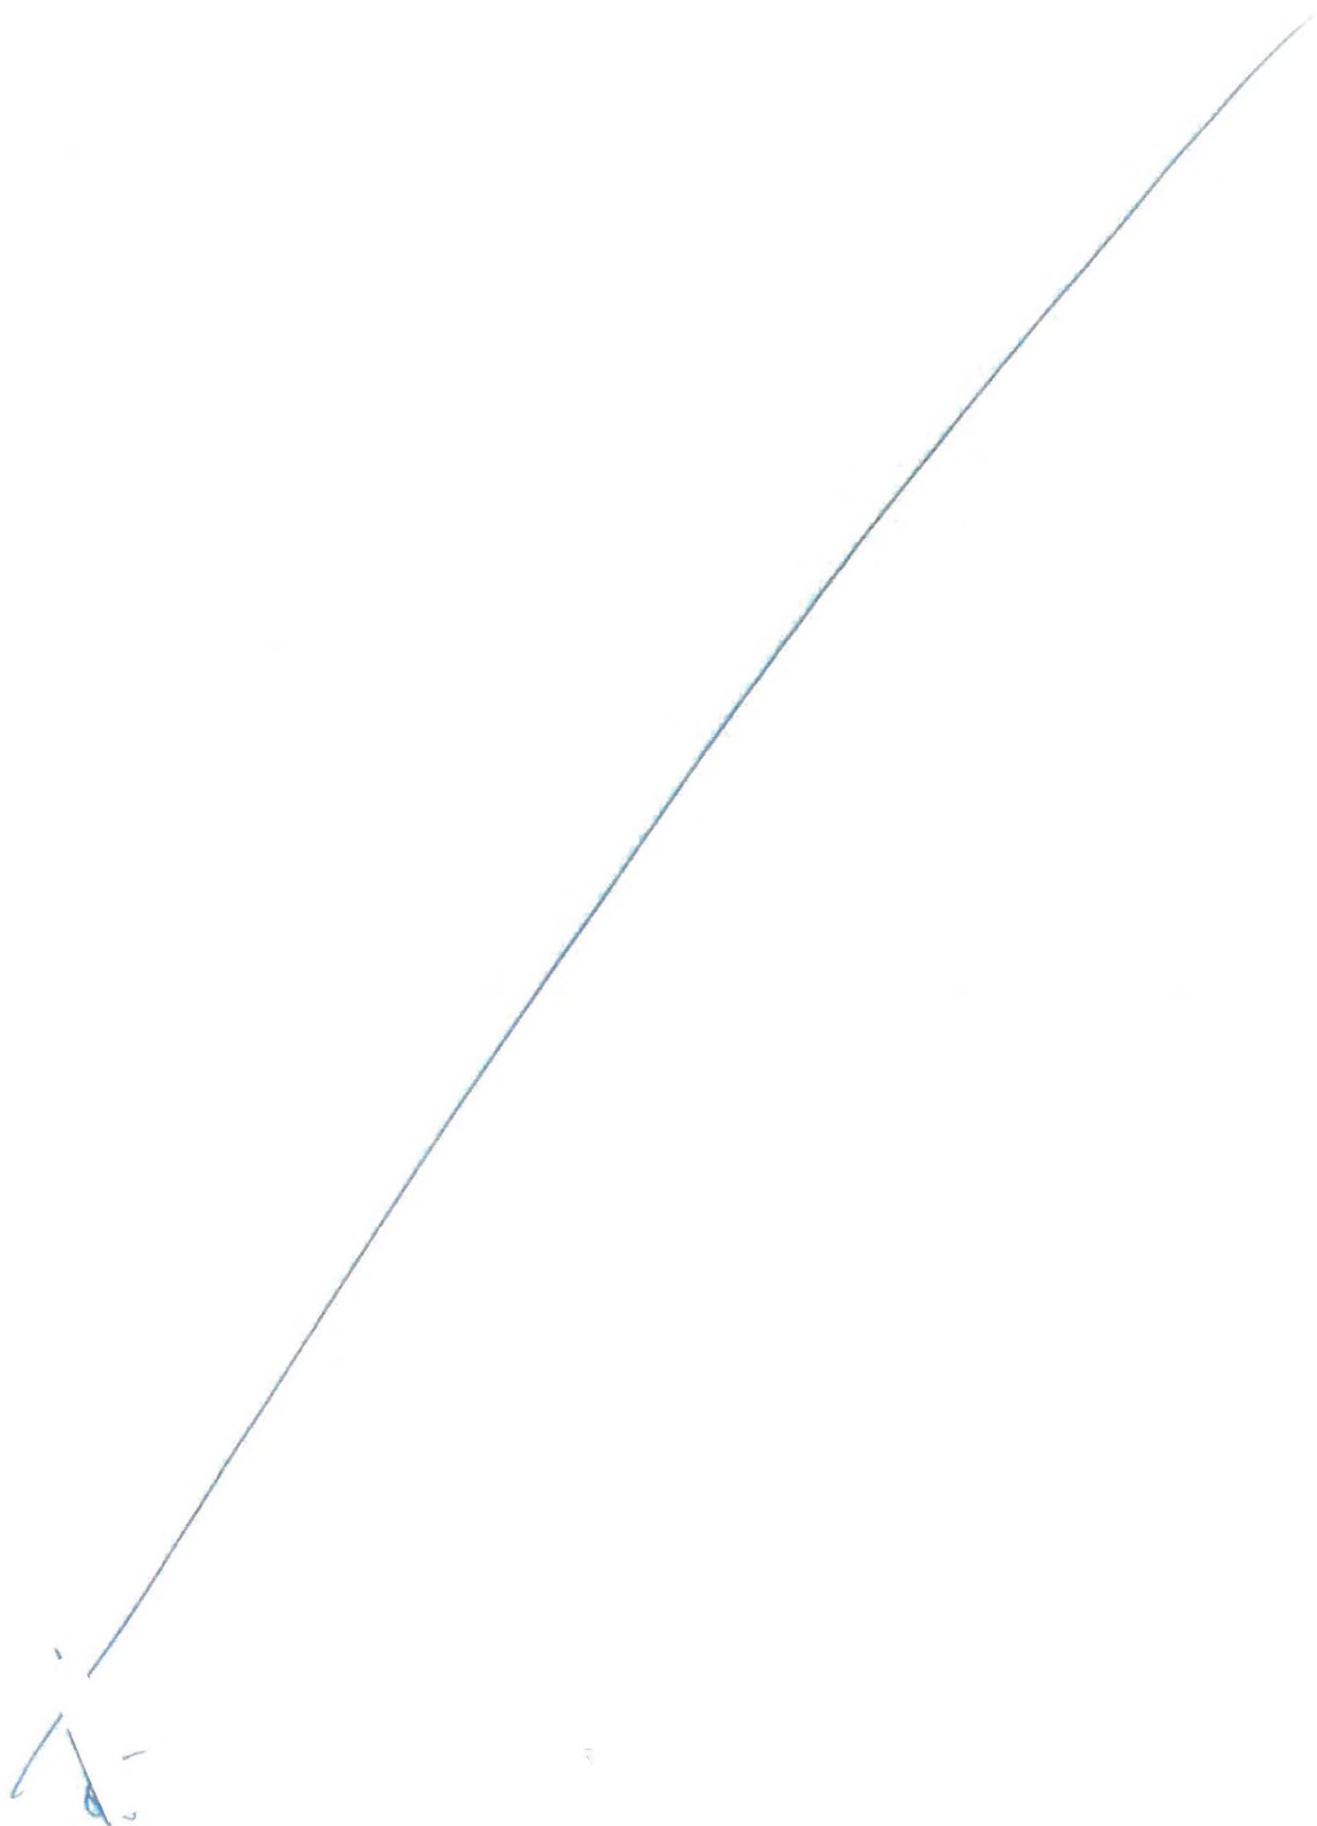

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

538 911,80

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

538 911,80

DPH základní

21,00%

ze

538 911,80

113 171,48

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

652 083,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský dopravní podnik

akciovní společnost

147 06 OP

DIČ: CZ

Opava

8

98

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	538 911,80
D1 - PS5 Stavební elektroinstalace	538 911,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	538 911,80

ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--

Náklady z rozpočtu

D1 - PS5 Stavební elektroinstalace

1			Nástěnný rozváděč stavební elektroinstalace, dle položky č. 1 TOS oddílu 1.6				
1			Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozváděče pro elektroinstalaci RMS-1				
1			LED svítidlo stropní 1x 54 W, 230V AC				
1			LED svítidlo nástěnné 2x 24 W, 230V AC				
1			LED nástěnné svítidlo 1x60 W, E27, 230V AC				
1			LED stropní svítidlo 1x100 W, E27, 230V AC				
1			LED venkovní nástěnné svítidlo 1x100W, 230V AC, IP43				
1			LED svítidlo 24V DC (náhradní osvětlení), např. SVD-02 WW 24VDC 30LED od firmy ELECO				
1			vypínač jednopólový, řazení 1				
1			přepínač střídavý, řazení 6				
1			přepínač střídavý, řazení 6, IP43				
1			přepínač křížový, řazení 7				
1			zásuvka 230V AC, 16A				
1			Elektrický přímotopný konvertor s termostatem od +5 °C, 230V AC, 2000 W				
1			Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 3 ks 230V AC, 16A				
1			Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 1 ks 400V AC, 16A; 3 ks 230V AC, 16A				
1			Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvkových skříní, svítidel, vypínačů, zásuvek a akumulčních kamen.				
1			Kabel CYKY-J 4x16 mm ²				
1			Kabel CYKY-J 5x2,5 mm ²				
1			Kabel CYKY-O 2x1,5 mm ²				
1			Kabel CYKY-J 3x1,5 mm ²				
1			Kabel CYKY-J 4x1,5 mm ²				
1			Kabel CYKY-J 3x2,5 mm ²				
1			Odstranění a ekologická likvidace stávajících dielektrických kobereců				
1			Dodávka a pokládka nových dielektrických kobereců				
1			Elektroinstalační trubky, lišty, přichytky, atd.				
1			Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie				
1			Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně výpočtu osvětlení a dokumentace skutečného stavu				
1			Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ				

$\angle$
uu

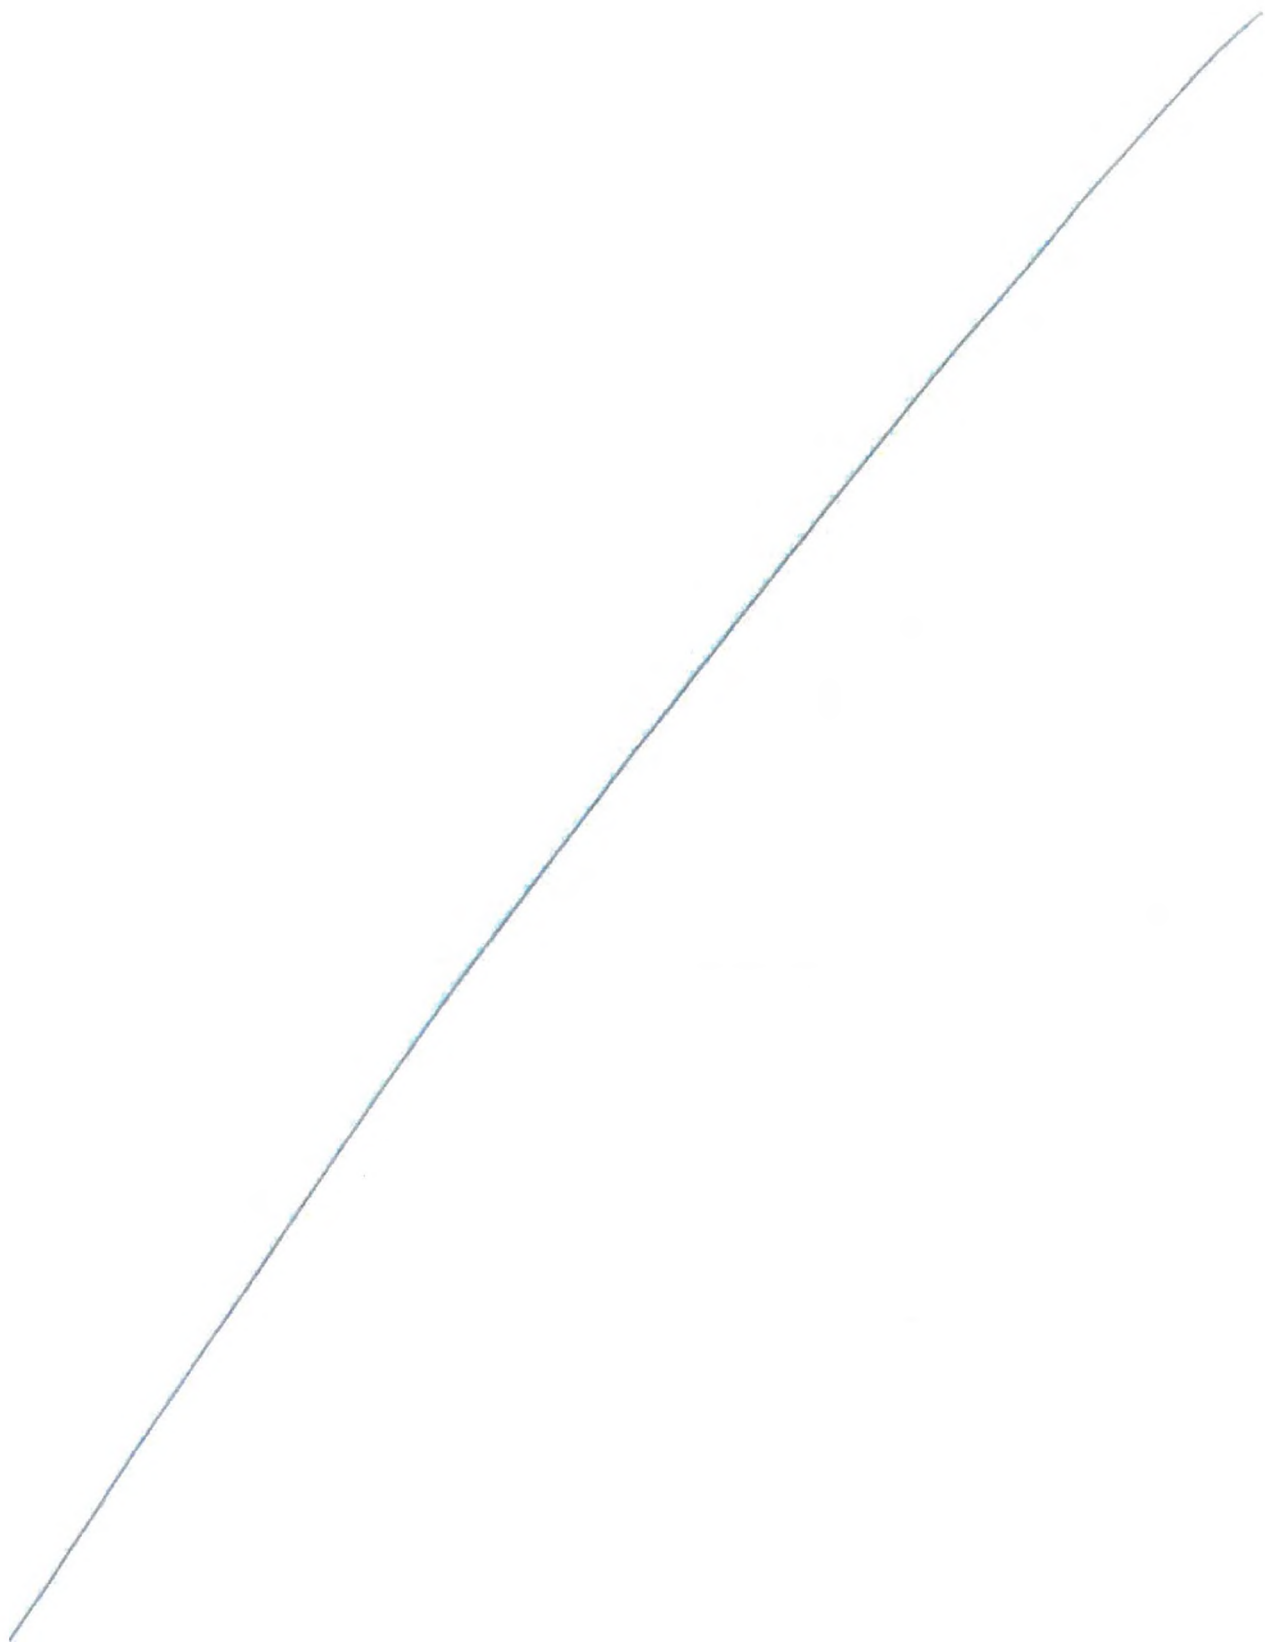

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	3 102 007,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 102 007,75
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	3 102 007,75	651 421,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 753 429,38
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost
747 06 OP
DIČ: C
3/lovecká 98
610250

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 102 007,75
HSV - Práce a dodávky HSV	2 027 098,42
1 - Zemní práce	200 485,32
2 - Zakládání	1 574,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	92 813,42
4 - Vodorovné konstrukce	55 937,40
5 - Komunikace pozemní	28 435,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 146 971,54
8 - Trubní vedení	13 286,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	322 770,25
997 - Přesun sutě	118 840,44
998 - Přesun hmot	45 983,23
PSV - Práce a dodávky PSV	1 074 909,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	120 710,73
713 - Izolace tepelné	13 377,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	26 430,05
764 - Konstrukce klempířské	109 893,55
766 - Konstrukce truhlářské	93 360,54
767 - Konstrukce zámečnické	203 624,27
771 - Podlahy z dlaždic	4 945,53
777 - Podlahy lité	60 254,44
781 - Dokončovací práce - obklady	20 861,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	333 479,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	87 971,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 102 007,75

ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 102 007,75

HSV - Práce a dodávky HSV

2 027 098,42

1 - Zemní práce

200 485,32

1	K	1-1	Zajištění stávajícího potrubí kanalizace	m	30,500		
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	28,680		
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	45,750		
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,238		
5	K	132212201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	117,323		
6	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	7,575		
7	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	7,575		
8	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	7,575		
9	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	7,575		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,640		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	73,200		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,640		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkové)	t	23,424		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,110		
15	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	52,380		
16	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,380		
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,786		

2 - Zakládání

1 574,70

18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	28,350		
19	M	693110420	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 400 g/m2, šíře 300 cm	m2	32,603		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20	K	3-1	Dod+osazení plastové větrací mřížky se sítí D 125 mm - Z20	ks	19,000		
21	K	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,000		
2	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,152		
23	K	311273409	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárnic PDK Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3	13,133		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - Z6,11,12,13,15	t	0,253		
25	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů - Z18,19	t	0,068		
26	M	562452540	světlik sklepní ACO Allround® včetně odvodňovacího prvku, rošt tahokov 125x100x40 cm vč. osazení - OP6	kus	2,000		
27	K	331231159-1	Zdivo pilířů z cihel dl 290 bílých	m3	0,624		
28	K	346244381-1	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	25,690		
29	K	348262424	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x500 mm přírodní	kus	4,000		

4 - Vodorovné konstrukce

30	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3	1,620		
31	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF4	m3	0,387		
32	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	14,772		
33	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	14,772		
34	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	10,800		
35	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	10,800		
36	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,134		
37	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,511		
38	K	451541111-1	Podsyp a obsyp potrubí otevřený výkop pískem	m3	14,640		

5 - Komunikace pozemní

28 435,42

39	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	28,350		
40	K	564861111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - okapový chodník	m2	20,175		
41	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 mm	m2	28,350		
42	M	592451100	dlažba skladebná tl. 6 cm přírodní	m2	28,350		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 146 971,54

43	K	6-1	Rekrystalizační nátěr 2*na beton	m2	2,979		
44	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně - pod obklady	m2	19,240		
45	K	612331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,240		
46	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	13,200		
47	K	6-2	Vyspravení zdi cementovou reprofilační maltou - čelní stěna	m2	19,910		
48	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm vč. rohových a ukončovacích lišt	m2	20,429		
49	M	283763650	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 40 mm	m2	20,838		
50	K	622211011-1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm vč. ukončovacích a rohových lišt	m2	302,075		
51	M	283759460	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 60 mm	m2	308,117		
52	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	142,600		
53	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	29,946		
54	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm vč. rohových a zakládacích lišt	m2	84,220		
55	M	631515090	deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 60 mm	m2	85,904		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně - podklad pod KZS	m2	376,722		
57	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně - doplnění pod KZS nové zdivo	m2	36,680		
58	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	45,809		
59	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	330,913		
60	K	629135102-1	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z vysokopevnostní reprofilační malty tl. 10 - 30 mm š do 300 mm - atika	m	39,460		
61	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	59,180		
62	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - fasáda	m2	375,913		
63	K	6-3	Zřízení fabionu z cementové malty	m	53,010		
64	K	6-4	Plošná hydroizolační chemická injektáž stěn	m2	17,050		
65	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 - Z1,2	kus	5,000		
66	M	553311430	zářubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P - Z1	kus	2,000		
67	M	553311450	zářubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P - Z2	kus	3,000		
68	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2 - Z5	kus	2,000		
69	K	6-5	Armovaná vodotěsná malta tl. 10 mm - skladba b	m2	89,527		
70	K	6-6	Očištění a vyrovnaní povrchu stěn pod izolaci - skladba b	m2	89,527		
71	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,560		
72	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,000		
73	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	17,050		
74	K	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním	m2	47,502		
75	K	6-7	Nátěr stávající fasády 2* silikonový vc. penetrace- nadstřešní konstrukce	m2	47,502		
76	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - pod okapový chodník	m3	3,026		
77	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	21,300		
78	K	6-8	Nátěr fasády 2*hydrofobní	m2	376,722		

8 - Trubní vedení

13 286,70

79	K	8-1	Dod+osazení větrací protidešťové žaluzie 750*400 s ochrannou sítí - Z9	ks	1,000		
80	K	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg - Z3,4	kus	2,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

322 770,25

81	K	916921114-1	Monolitický práh pl do 0,25 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m - pro osazení žlabu	m	19,125		
82	K	931626212	Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy	m2	16,130		
83	M	9-1	Líniový žlab z polymerbetonu	m	18,000		
84	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m - fasáda	m2	446,820		
85	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	26 809,200		
86	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	446,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	143,500		
88	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	352,533		
89	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z7	kus	3,000		
90	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z17	kus			
91	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z16	kus			
92	M	9-2	Ocelový úhelník lemování - Z7,16,17	kg			
93	K	96-1	Vybourání plechu 1300*1000	ks			
94	K	96-2	Demontáž ventilátoru	ks	2,000		
95	K	96-3	Demontáž průvětrníku	ks			
96	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - přízdívky	m2			
97	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,675		
98	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 - světlíky	m3	1,975		
99	K	962081131	Bourání přiček ze skleněných tváří tl do 100 mm	m2	0,400		
100	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,185		
101	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,306		
102	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 - 1NP	m2	4,500		
103	K	966079871	Prerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	6,000		
104	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,900		
105	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	2,250		
106	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	8,100		
107	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,152		
108	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	8,680		
109	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	32,400		
110	K	968072875-1	Vybourání mříží	m2	5,250		
111	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2			
112	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3			
113	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus			
114	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3			
115	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m			
116	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m			
117	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2			
118	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2			
119	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
120	K	978059641	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
121	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svíslé pl přes 1 m2	m2			
122	K	96-4	Ostatní nepodchycené bourání	hod			
123	K	985231111	Spárování zdiva	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

118 840,44

124	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	66,563		
125	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	66,563		
126	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	931,882		
127	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,422		
128	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,141		

998 - Přesun hmot

45 983,23

129	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	73,295	627,37	45 983,23
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 074 909,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

120 710,73

130	K	711-1	Dod+Mont 2*bezešvá pružná asfaltová hydroizolační stěrka s armovacím roumem - b	m2	86,139		
131	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	172,279		
132	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,060		
133	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm	m2	103,367		
134	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	3,200		
135	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	16,880		
136	K	711-2	Utěsnění prostupu (penetrace, butylkaučukový tmel, nalepení pásu z butylkaučuku na nopovou folii)	soub	1,000		
137	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 110,703		

713 - Izolace tepelné

13

138	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm - fasáda	m2	301,536		
139	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	54,880	5,00	

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

26 430,05

140	K	721-1	Napojení plastových světlíků a odvodňovacího žlabu na kanalizaci PVC D 100, m 4,50	soub	1,000		
141	K	721-3	Revize dešťové kanalizace a vodovodní přípojky	soub	1,000		
142	K	721-4	Napojení lapače střešních splavenin	ks	3,000		
143	M	552441020	lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	3,000		
144	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	200,300		

764 - Konstrukce klempířské

109 893,55

145	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	39,440		
146	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	21,100		
147	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do sutí	kus	1,000		
148	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	44,000		
149	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	32,000		
150	K	764-1	Demontáž ostatních klempířských konstrukcí	soub	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
151	K	764-2	Větrací komíněk D 100 mm s povrch. úpravou vč. oplechování	ks	1,000		
152	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrch. úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm - K3	m	39,500		
153	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm - K1	m	8,400		
154	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - K1	m	25,000		
155	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - K4	m	44,000		
156	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	5,000		
157	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm - K5	m	28,000		
158	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	887,884		

766 - Konstrukce truhlářské

93 360,54

159	K	76622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdíva - OP1	ks	1,000		1 122,38
160	M	766-1	Okno plastové 1500*1500 otevíravé, izol. dvojsklo - OP1	ks	1,000		
161	K	76622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m ² otevíracích s rámem do zdíva - OP2,3,4,5	kus	18,000		
162	M	766-2	Okno plastové 600*1500 otevíravé, sklápěcí, izol. dvojsklo - OP2	ks	1,000		
163	M	766-3	Okno plastové 600*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, ovládání z úrovně podlahy, síťka proti hmyzu - OP3	ks	14,000		
164	M	766-4	Okno plastové 900*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, síťka proti hmyzu - OP4	ks	2,000		
165	M	766-5	Okno plastové 900*900 sklápěcí, izol. dvojsklo, síťka proti hmyzu - OP6	ks	1,000		
166	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m - OP2,3	kus	15,000		
167	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m - OP1	kus	1,000		
168	M	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m - OP1,2,3	m	10,500		
169	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	32,000		
170	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,000		
171	M	611871560	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	2,000		
172	M	611871760	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	3,000		
173	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	840,595		

767 - Konstrukce zámečnické

203 624,27

174	K	767134831	Demontáž obložení stěn lamelami	m ²	301,536		
175	K	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m ²	301,536		
176	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku - Z1	kus	2,000		
177	M	767-2	Dveře ocelové jednokřídlové vnější zateplené 800*1970 - Z1	ks	2,000		
178	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových - Z2	kus	3,000		
179	M	767-3	Dveře ocelové vnitřní plně hladké 900*1970 - Z2	ks	3,000		
180	K	767651210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m ² - Z5	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
181	M	767-5	Vrata ocelová otevíravá 1750*2480 zateplená vč. zárubně, bezpečnostní kování - Z5	ks	2,000	26 973,00	
182	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	4,000		
183	K	767-1	Úprava žebříku - prodloužení kotvení	celk	1,000		
184	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - Z4,10	kg	57,480		
185	M	767-4	Mříž vnější z ocelových profilů - Z3,4,10	kg	87,250		
186	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg - Z3	kg	29,750		
187	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - Z8	kg	67,050		
188	M	767-6	Ocelové válcované profily - Z8	kg	67,050		
189	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 382,980		

771 - Podlahy z dlaždic

4 945,53

190	K	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	4,500		
191	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,500		
192	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	4,500		
193	M	771-1	Dlažba keramická	m2	4,680		
194	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	33,485		

777 - Podlahy lité

60 254,44

195	K	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit	m2	62,800		44 606,15
196	K	777615114-1	Nátěry epoxidové podlah betonových	m2	58,300		14 560,43
197	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	217,790		1 087,86

781 - Dokončovací práce - obklady

20 861,57

198	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,240		
199	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	19,240		
200	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování	m2	19,240		
201	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	21,000		
202	M	781-1	Obklady keramické vnitřní	m2	19,817		
203	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	169,164		

783 - Dokončovací práce - nátěry

333 479,81


204	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,000		
205	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	74,748		
206	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	74,748		
207	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru - střecha	m2	397,550		
208	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	397,550		
209	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	795,100		
210	K	783506805	Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° oškrábáním	m2	397,550		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

87 971,01

I	K	784-1	Malby z malířských směsí vč. očištění a penetrace podkladu	m2	1 601,074	54,95	87 971,01
---	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------

1-

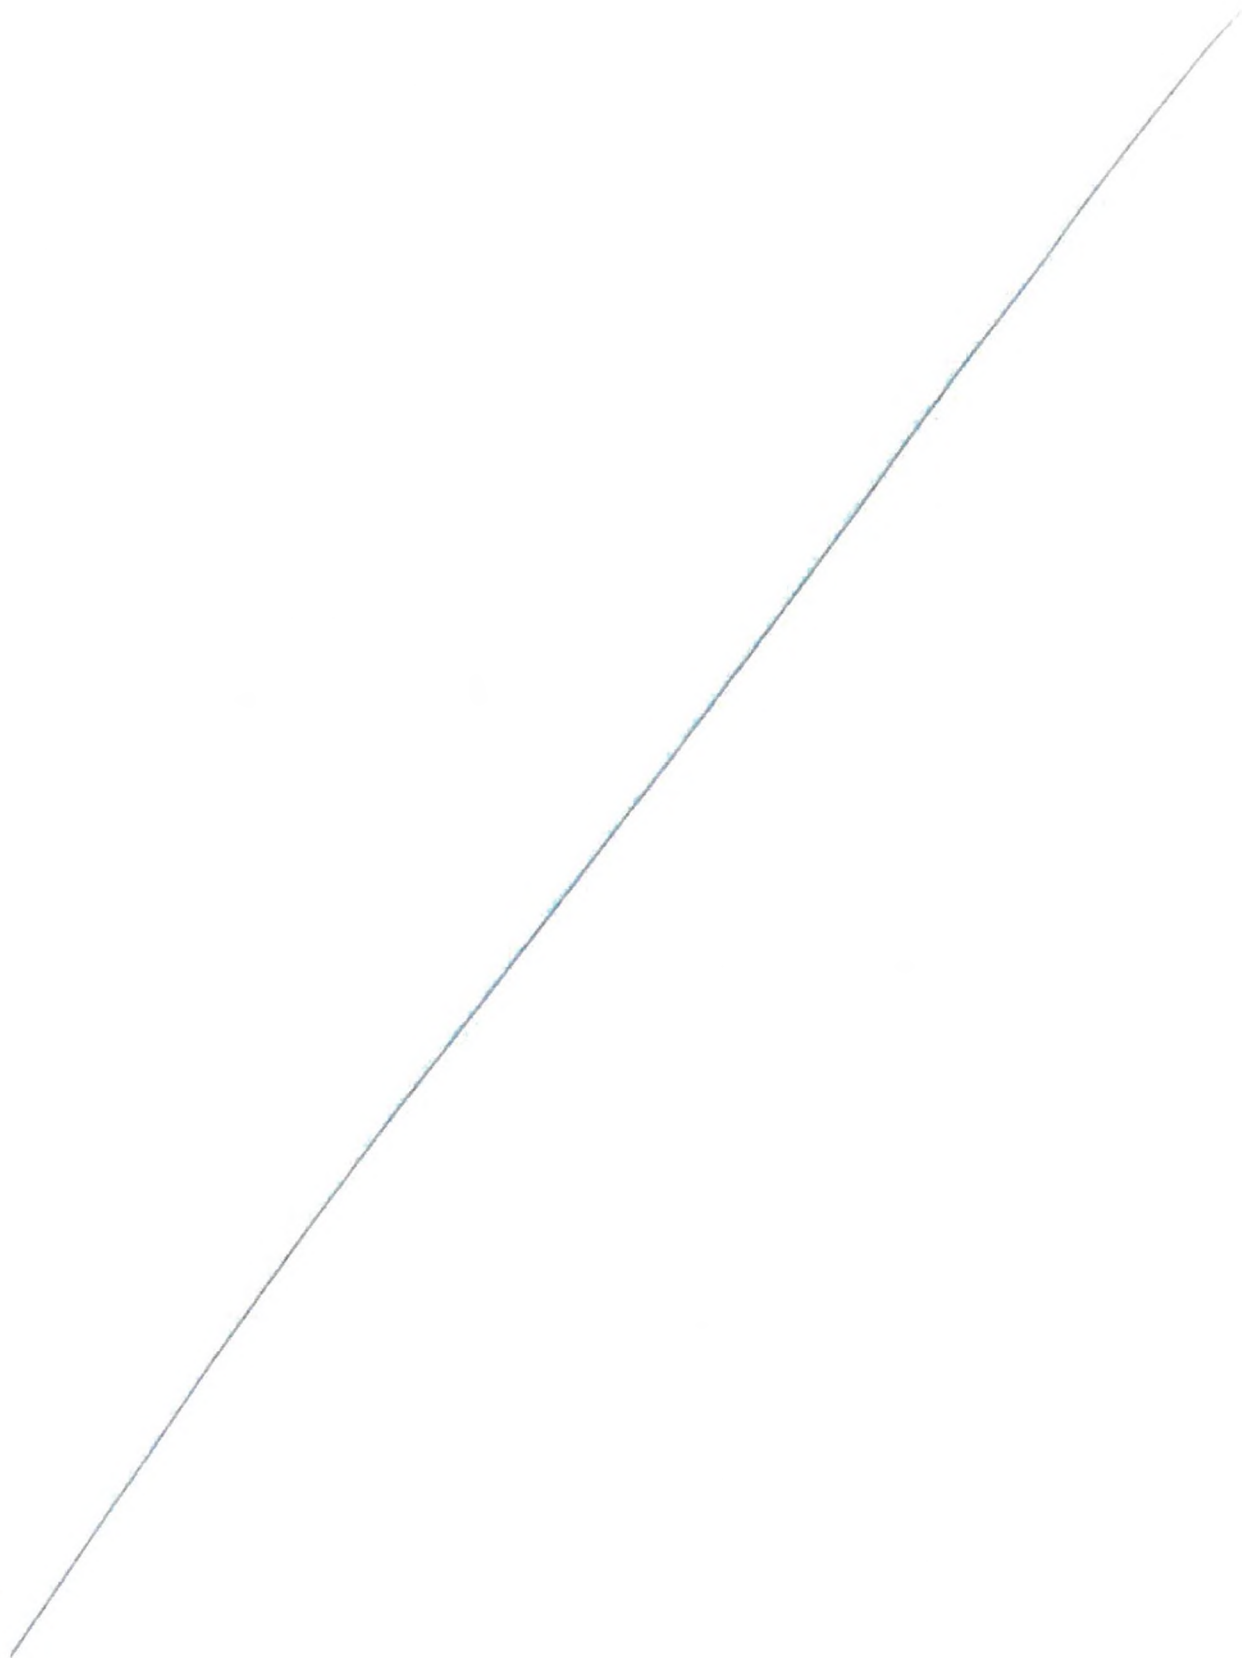

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				206 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				206 000,00
DPH základní	21,00%	ze	206 000,00	43 260,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	249 260,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost
747 06 OP
DIČ: 610250

podnik Opava
s.r.o.
Bílá 98
DIČ: 610250

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	206 000,00
N00 - MR Čajkovského	206 000,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	206 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	206 000,00

ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

206 000,00

N00 - MR Čajkovského

206 000,00

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady

206 000,00

1	K	001	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
2	K	002	Provozní vltvy	kpl	1,000		

Orientační návrh harmonogramu realizace díla – Čajkovského

Činnost	Trvání kalendářních dnů	Datum zahájení	Datum ukončení
Vypracování projektové dokumentace ke schválení	45 dnů	T	T+45 dnů
Schvalovací proces dokumentace	10 dnů	T+45 dnů	T+55 dnů
Výroba + dodávka technologických dodávek	180 dnů	T+55 dnů	T+235 dnů
Stavební úpravy + rekonstrukce elektroinstalace	150 dnů	T+85 dnů	T+235 dnů
Montáž technologie	30 dnů	T+235 dnů	T+265 dnů
Výchozí revize, individuální zkoušky, oživení	10 dnů	T+265 dnů	T+275 dnů
Předání díla včetně dokladové části a dokumentace skutečného stavu	10 dnů	T+275 dnů	T+285 dnů

Finanční harmonogram - vyjádření

Souhlasíme s návrhem podmínek uvedených SoD v článku V. platební podmínky, a to:

Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl.

Bohemia Müller s.r.o.
Loupnická 139, Janov
435 42 Litvínov

Tel.: +420 476 742 881
Fax: +420 476 742 882
sekretariat@bohemiarmuller.cz
Datová schránka: 9skr986

IČ 25015265
DIČ CZ25015265
ČS 3781842/0800

Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885

www.bohemiarmuller.cz

DODATEK ČÍSLO 1

SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.2.2022

(DÁLE TÉŽ „SMLOUVA“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**
IČ: **64610250**
DIČ: **CZ64610250**
Datová schránka: **h49e6w2**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**
Zapsán: **v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 1234**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
[REDACTED]
dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	Bohemia Müller s.r.o.
Sídlo:	Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov
IČ:	25015265
DIČ:	CZ25015265
Datová schránka:	gskrg86
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	Karel Müller, jednatel
Zapsán:	v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	Ing. Václav Langheinrich, jednatel

Kontaktní osoby ve věcech technických:	
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Předmět dodatku číslo 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku IV. Cena díla, v odstavcích 4.1.-4.4., které se ruší v původním znění a nahrazují se následujícím novým zněním:

4.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty

7 895 049,29 Kč

(slovy: sedmmilionůosmsetdevadesátpěttisícčtyřicetdevět korun českých a 29 haléřů)

Z toho:

Cena z původní SOD 6 776 298 Kč

Cena dle Dodatku číslo 1 1 118 751,29 Kč

Cena díla podle odst. 4.1. nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných daňových předpisů. Předmět plnění díla je zařazen pod číslo klasifikace produkce VZ CPA 42.22.22 a podléhá od režimu přenesené daňové povinnosti.

4.2. Celková cena díla

7 895 049,29 Kč

(slovy: sedmmilionůosmsetdevadesátpěttisícčtyřicetdevět korun českých a 29 haléřů)

Článek III.

Ostatní ujednání k dodatku číslo 1

- 3.1. Dodatek číslo 1 Smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek číslo 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek číslo 1 tak jak je sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet více a méně prací

V Opavě dne 11.8.2022

V Litvínově dne _____

Za objednatele
Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost (B)
747 05 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

Za zhotovitele
Ing. Václav Langheinrich
jednatel
Bohemia Müller s.r.o.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132A
Stavba: MR Čajkovského

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.08.2022

Objednatel:
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČ: 64610250
DIČ: CZ64610250

Zhotovitel:
Bohemia Müller s.r.o.

IČ: 25015265
DIČ: CZ25015265

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 118 751,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 118 751,29
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 118 751,29
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132A

Stavba: MR Čajkovského

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 118 751,29	1 118 751,29
PS 05	Stavební elektroinstalace	-8 945,71	-8 945,71
SO 01	Rekonstrukce budovy	1 110 547,00	1 110 547,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	17 150,00	17 150,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 118 751,29	1 118 751,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

IČ: 64610250

DIČ: CZ64610250

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-8 945,71
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-8 945,71
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-8 945,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-8 945,71

D1 - PS5 Stavební elektroinstalace

-8 945,71

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-8 945,71

ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-8 945,71

D1 - PS5 Stavební elektroinstalace

-8 945,71

1	K	Pol30	Nástěnný rozváděč stavební elektroinstalace, dle položky č. 1 TOS oddílu 1.6	kpl	0,000		
2	K	Pol31	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozváděče pro elektroinstalaci RMS-1	kpl	0,000		
3	K	Pol32	LED svítidlo stropní 1x 54 W, 230V AC	ks	2,000		
4	K	Pol33	LED svítidlo nástěnné 2x 24 W, 230V AC	ks	0,000		
5	K	Pol34	LED nástěnné svítidlo 1x60 W, E27, 230V AC	ks	-1,000		
6	K	Pol35	LED stropní svítidlo 1x100 W, E27, 230V AC	ks	0,000		
7	K	Pol36	LED venkovní nástěnné svítidlo 1x100W, 230V AC, IP43	ks	-2,000		
8	K	Pol37	LED svítidlo 24V DC (náhradní osvětlení), např. SVD-02 WW 24VDC 30LED od firmy ELECO	ks	0,000		
9	K	Pol38	vypínač jednopólový, řazení 1	ks	1,000		
10	K	Pol39	přepínač střídavý, řazení 6	ks	1,000		
11	K	Pol40	přepínač střídavý, řazení 6, IP43	ks	-4,000		
12	K	Pol41	přepínač křížový, řazení 7	ks	0,000		0,00
13	K	Pol42	zásuvka 230V AC, 16A	ks	-1,000		
14	K	Pol43	Elektrický přímotopný konvertor s termostatem od +5 °C, 230V AC, 2000 W	ks	2,000		
15	K	Pol44	Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 3 ks 230V AC, 16A	ks	0,000		
16	K	Pol45	Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 1 ks 400V AC, 16A; 3 ks 230V AC, 16A	ks	0,000		
17	K	Pol46	Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvkových skříní, svítidel, vypínačů, zásuvek a akumulčních kamen.	kpl	0,000		
18	K	Pol47	Kabel CYKY-J 4x16 mm2	m	0,000		
19	K	Pol48	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	0,000		
20	K	Pol49	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	0,000		
21	K	Pol50	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	0,000		
22	K	Pol51	Kabel CYKY-J 4x1,5 mm2	m	0,000		
23	K	Pol52	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	300,000		
24	K	Pol53	Odstranění a ekologická likvidace stávajících dielektrických kobereců	m	-55,000		
25	K	Pol54	Dodávka a pokládka nových dielektrických kobereců	m	-55,000		
26	K	Pol55	Elektroinstalační trubky, lišty, příchytky, atd.	kpl	0,000		
27	K	Pol56	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl	0,000		
28	K	Pol57	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně výpočtu osvětlení a dokumentace skutečného stavu	kpl	0,000		
29	K	Pol58	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	Pol59	Zásuvka 400V AC	ks	1,000		
31	K	Pol60	Drát FeZN p10	m	26,000		
32	K	Pol61	Štítek c. pro označ. Svodu	ks	5,000		
33	K	Pol62	Pásek uzemňovací FeZn 30x40 mm	m	75,000		
34	K	Pol63	Svorka spoj S5	ks	10,000		
35	K	Pol64	Svorka zkušeb SZ	ks	5,000		
36	K	Pol65	Svorka vod SR 02 30x4 mm pas	ks	10,000		
37	K	Pol66	Svorka vodov SR 03	ks	10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VCP Rekonstrukce budovy Čajkovského vč. bourání ŽB stěny

Místo: Datum: 04.08.2022
 Zadavatel: IC: 64610250
 Městský dopravní podnik Opava, a.s. FIC: CZ64610250
 Zhotovitel: IC: 42869285
XXXXXXXXXX DIC: CZ42869285
 Projektant: IC:
XXXXXXXXXX DIC:
 Zpracovatel: IC:
XXXXXXXXXX DIC:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 110 547,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 110 547,00

DPH základní	Základ dane	Sazba daně	Vyše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 110 547,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Režitko	Datum a podpis	Režitko
----------------	---------	----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis	Režitko	Datum a podpis	Režitko
----------------	---------	----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **VCP Rekonstrukce budovy Čajkovského vč. bourání ŽB stěny**
 Místo:

Zadavatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
 Zhotovitel: **FUS a HARAZIM s.r.o.**

Datum: 04.08.2022

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 110 547,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				345 553,17	
D	3		Svislá a kompletní konstrukce				3 605,25	
2073	K	31023821R	Zazdívká rýh zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,500	7 210,50	3 605,25	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 267,02	

2074	K	63131214R	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	4,193			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
2075	K	96105511R	Bourání ŽB stěny	m3	16,750			
2076	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,306			
2077	K	96305111R	Bourání ŽB stropů deskových tl 150 mm	m3	1,219			
D 997 Přesun sutě								
2078	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	44,720			
2079	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,720			
2080	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	626,080			
2081	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	44,720			
D 998 Přesun hmot								
2082	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				53 732,53	
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické								
2083	K	76716181R	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	28,750			
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
2065	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných hominách tříd v těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,600			
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 3	m3	0,480			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	5,600			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,000			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,600			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	57,600			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,600			
2061	M	58343920	kamenivo frakce 0/8	t	84,631		61	
D 2 Zakládání								
2084	K	21275110R	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN	m	23,750			
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	45,375			
19	M	693110420	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 400 g/m2, šíře 300 cm	m2	53,001			
2059	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,192			
2058	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,520			
2057	K	27911314R	Základová zeď tl 200 mm z tvárné ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	8,890			
2093	K	34827251R	Plotová stříška pro zeď tl 200 mm z tvarovek hladkých	m	28,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
2087	K	338171123	Osazování sloupku a vzpěr plotových ocelových v do 2 60 m se zabetonováním	kus	2,000			
2088	K	55342254	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm	kus	2,000			
2089	K	34817291R	Sloupek pro bránu - bourání, betonáž, D+M sloupku	kpl	1,000			
2090	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	7,000			
2091	K	31324788	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	7,350			
1026	K	31027884R	Zazdívka otvoru pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdívu z nepálených tvárcí YTONG tl. 375 mm	m3	5,760			
23	K	311273409	Zdívo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárcí PDK Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3	-3,251	1 818,18	-5 910,90	
24	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - Z6,11,12,13,15	t	-0,076			
25	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů - Z18,19	t	-0,068			
26	M	562452540	svislé skřípní ALU Aluround včetně odvodňovacího prvku, rošt tahokov 125x100x40 cm vč. osazení - OPE	kus	-2,000			
2051	K	33817111R	Osazování sloupku pro vstupní branku v 2,00 m se zabetonováním	kus	4,000			
2052	M	55342166R	sloupek pro branku ocelový D100mm dl 2,0	kus	4,000			
2053	K	34810122R	Osazení branky k oplocení na ocelové sloupky	kus	2,000			
2054	M	55342336R	branka plotová jednokřídlá pozinkovaná vč. kování a zámků	kus	2,000			
D 4 Vodorovné konstrukce								
30	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3	-1,620			
31	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF4	m3	-0,387			5
32	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	-14,772			-7 968,90

33	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	-14,772		
34	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	-10,800		
35	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	-10,800		
36	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,134		
37	K	41138531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropích	m3	-0,511		
2064	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	8,400		
D 5			Komunikace pozemní			39 607,54	
1037	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě SD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	21,625		
39	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	14,000		
41	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000		
42	M	592451100	dlažba skladebná tl. 6 cm přírodní	m2	14,000		
43	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	21,625		
2044	M	59246015R	dlažba plošná betonová 500x500x50mm	m2	23,788		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			105 887,07	
2072	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropích	kus	15,000	3	5 934,00
1038	K	61232522R	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1 m2 na stěnách	kus	18,000		11 529,90
45	K	612331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,160		7 517,91
2045	K	622142001	Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,160		
2046	K	62215100R	Penetrační nátěr vnějších omítek stěn	m2	17,160		
48	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm vč. rohových a ukončovacích lišt	m2	39,240		
49	M	283763650	deska z extrudovaného polystyrenu URSA XPS III - IS G NF I - 1250 x 600 x 40 mm	m2	43,164		
58	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	17,160		11 417,13
2062	K	63131123R	Mazanina tl. 200 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,264		
2063	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,195	8	
65	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 - Z1,2	kus	-3,000		
67	M	553311450	zárubní ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P - 72	kus	-3,000		
D 8			Trubní vedení			29 583,75	
2048	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třída SN8 DN 160	m	35,000		
2049	K	87735512R	Napojení stávající kanalizace vč. přechodu na kameninové potrubí	kpl	2,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			23 343,97	
2067	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000		
2068	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	9,180		
2066	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	14,000		
1033	K	94611211R	Montáž pojízdných věží dílcových š 2 m dl 2 m v 4,0 m	kus	2,000		
1034	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	20,000		
1035	K	94611281R	Demontáž pojízdných věží dílcových	kus	2,000		
89	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z7	kus	-3,000		
90	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z17	kus	-1,000		
91	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z16	kus	-2,000		
92	M	9-2	Ocelový úhelník lemování - Z7,16,17	kg	-206,400		
93	K	96-1	Vybourání plechu 1300*1000	ks	4,000		
99	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 100 mm	m2	7,860		
2047	K	96901111R	Vybourání kameninového potrubí DN 150	m	35,000		
112	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	-1,025		
D 997			Přesun sutě				
124	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,909		
125	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,909		
126	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-12,726		
128	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,909		
D 998			Přesun hmot			52 420,07	
129	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	83,555		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			22 570,76	
130	K	711-1	Dod+Mont 2*bezešvá pružná asfaltová hydroizolační stěrka s armovacím roumem - b	m2	19,040		

131	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	38,080			
132	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ I) bal 9 kg	t	0,013			
133	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm	m2	19,040			
137	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	215,193			
D 713 Izolace tepelné								
1027	K	71311112R	Montáž izolace tepelné stropů s mechanickým kotvením rohoží	m2	1,920			
1028	M	63152108R	minerální rohož tl. 400 mm	m2	1,958			
1029	K	71319113	Montáž parozábrany stropů - překrytí fólií	m2	3,840			
1030	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 1500mm2 s integrovanou lepicí páskou	m2	4,476			
1036	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	34,553			
D 763 Konstrukce suché výstavby								
1031	K	76313298R	Vyspravení SDK podhledu, pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xH2DF 15	kus	1,920			
1032	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	16,819			
D 764 Konstrukce klempířské								
2070	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	6,000			21 705,54
152	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm - K3	m	-39,500			
2071	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 450 mm	m	39,500			
2069	K	764242404	Oplechování štítu závětnou lištou z TiZn předzvětrálného plechu rš 330 mm	m	6,000			
158	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	142,108			
D 766 Konstrukce truhlářské								
161	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva - OP2,3,4,5	kus	-6,000			
163	M	766-3	Okno plastové 600*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, ovládání z úrovně podlahy, sítko proti hmyzu - OP3	ks	-14,000			
164	M	766-4	Okno plastové 900*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, sítko proti hmyzu - OP4	ks	-2,000			
165	M	766-5	Okno plastové 900*900 sklápěcí, izol. dvojsklo, sítko proti hmyzu - OP6	ks	-1,000			
2042	M	766-13R	Okno plastové 1000*800 fixní	ks	6,000			
2043	M	766-14R	Okno plastové 1000*800 sklápěcí, izol. dvojsklo, sítko proti hmyzu ovládání z podlahy	ks	5,000			
1052	M	766-5R	D+M vnitřní dveře 800*1970 mm vč. kování	ks	3,000			
1053	M	766-6R	D+M vnitřní dveře 600*1970 mm vč. kování	ks	2,000			
173	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	310,760			
D 767 Konstrukce zámečnické								
178	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových - Z2	kus	-3,000			
179	M	767-3	Dveře ocelové vnitřní plně hladké 900*1970 - Z2	ks				
180	K	767651210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m2 - Z5	kus				
181	M	767-5	Vrata ocelová otevíravá 1750*2480 zateplená vč. zárubně, bezpečnostní kování - Z5	ks				
1044	K	76766181R	Demontáž plechových žaluzií oken	m2	6,720			
1045	K	76765221R	Montáž vrat vč. osazení a zazdění úhelníkové zárubně plochy do 6 m2	kus	5,000			
1046	M	767-01R	Vrata ocelová zateplená 1730*1970 mm vč. bezpeč. kování a zárubně		1,000			
1047	M	767-02R	Vrata ocelová zateplená 1430*1970 mm vč. bezpeč. kování a zárubně		1,000			
1048	M	767-03R	Vrata ocelová nezateplená 1750*1970 mm vč. bezpeč. zámku a zárubně		2,000			
1049	M	767-04R	Vrata ocelová nezateplená 900*1970 mm vč. bezpeč. zámku a zárubně		1,000			
1050	K	76783211R	Montáž venkovních žebříků bez suchovodu	m	4,200			
1051	M	4498300R	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	4,200			
182	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	-4,000			
183	K	767-1	Úprava žebříku - prodloužení kotvení	celk	-1,000			
187	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg - Z8	kg	-67,050			
188	M	767-6	Ocelové válcované profily - Z8	kg	-67,050			
198	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 250 kg	kg	669,000			
199	M	767-9	Ocelová konstrukce schodiště	kg	669,000			
189	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 707,176			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

IČ: 64610250

DIČ: CZ64610250

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				17 150,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				17 150,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				17 150,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	17 150,00
N00 - MR Čajkovského	17 150,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	17 150,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 150,00

ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 150,00

N00 - MR Čajkovského

17 150,00

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady

17 150,00

1	K	001	Zařízení staveniště	kpl			
2	K	002	Provozní vlivy	kpl			

DODATEK ČÍSLO 2
SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.2.2022
VE ZNĚNÍ DODATKU ČÍSLO 1 UZAVŘENÉHO
11.8.2022
(DÁLE TÉŽ „SMLOUVA“)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**
IČ: **64610250**
DIČ: **CZ64610250**
Datová schránka: **h49e6w2**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**
Zapsán: **v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 1234**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
[REDACTED]
dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	Bohemia Müller s.r.o.
Sídlo:	Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov
IČ:	25015265
DIČ:	CZ25015265
Datová schránka:	gskrg86
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	Karel Müller, jednatel

Zapsán:	v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	Ing. Václav Langheinrich, jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	████████████████████ ████████████████████
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Předmět dodatku číslo 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku IV. Cena díla, v odstavcích 4.1.-4.4., které se ruší v původním znění a nahrazují se následujícím novým zněním:

4.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty

7 964 276,83 Kč

(slovy: sedmmilionůdevětsetšedesátčtyřitisícdevětšedesátšest korun českých a 83 haléřů)

Z toho:

Cena z původní SOD 6 776 298,00 Kč

Cena dle Dodatku číslo 1 1 118 751,29 Kč

Cena dle Dodatku číslo 2 69 227,54 Kč

Cena díla podle odst. 4.1. nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných daňových předpisů. Předmět plnění díla je zařazen pod číslo klasifikace produkce VZ CPA 42.22.22 a podléhá od režimu přenesené daňové povinnosti.

4.2. Celková cena díla

7 964 276,83 Kč

(slovy: sedmmilionůdevětsetšedesátčtyřitisícdevětšedesátšest korun českých a 83 haléřů)

Článek III.

Ostatní ujednání k dodatku číslo 2

- 3.1. Dodatek číslo 2 Smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Dodatek číslo 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek číslo 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek číslo 2 tak jak je sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: - položkový rozpočet více a méně prací

V Opavě dne 29.9.2022

V Litvínově dne 05-10-2022

Za objednatele

Ing. Vladimír Schreier

předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost (8)
747 06 OPAVA, Břilovecká 98
DIČ: CZ64610250

Za zhotovitele

Ing. Václav Langheinrich

jednatel
Bohemia Müller s.r.o.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132A
Stavba: MR Čajkovského

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2022

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bohemia Müller s.r.o.

IČ: 25015265
DIČ: CZ25015265

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	69 227,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	69 227,54
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	16 308,48	3 424,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	72 652,32
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132A

Stavba: MR Čajkovského

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		69 227,54	83 813,82
SO 01	Rekonstrukce budovy	67 047,54	81 176,02
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 180,00	2 637,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		69 227,54	83 813,82

VCP Rekonstrukce budovy Čajkovského vč. bourání ŽB stěny

1. Datum	19.09.2022
2. Dokument	
3. Objekt	
4. Objekt	
5. Objekt	
6. Objekt	
7. Objekt	
8. Objekt	
9. Objekt	
10. Objekt	
11. Objekt	
12. Objekt	
13. Objekt	
14. Objekt	
15. Objekt	
16. Objekt	
17. Objekt	
18. Objekt	
19. Objekt	
20. Objekt	
21. Objekt	
22. Objekt	
23. Objekt	
24. Objekt	
25. Objekt	
26. Objekt	
27. Objekt	
28. Objekt	
29. Objekt	
30. Objekt	
31. Objekt	
32. Objekt	
33. Objekt	
34. Objekt	
35. Objekt	
36. Objekt	
37. Objekt	
38. Objekt	
39. Objekt	
40. Objekt	
41. Objekt	
42. Objekt	
43. Objekt	
44. Objekt	
45. Objekt	
46. Objekt	
47. Objekt	
48. Objekt	
49. Objekt	
50. Objekt	
51. Objekt	
52. Objekt	
53. Objekt	
54. Objekt	
55. Objekt	
56. Objekt	
57. Objekt	
58. Objekt	
59. Objekt	
60. Objekt	
61. Objekt	
62. Objekt	
63. Objekt	
64. Objekt	
65. Objekt	
66. Objekt	
67. Objekt	
68. Objekt	
69. Objekt	
70. Objekt	
71. Objekt	
72. Objekt	
73. Objekt	
74. Objekt	
75. Objekt	
76. Objekt	
77. Objekt	
78. Objekt	
79. Objekt	
80. Objekt	
81. Objekt	
82. Objekt	
83. Objekt	
84. Objekt	
85. Objekt	
86. Objekt	
87. Objekt	
88. Objekt	
89. Objekt	
90. Objekt	
91. Objekt	
92. Objekt	
93. Objekt	
94. Objekt	
95. Objekt	
96. Objekt	
97. Objekt	
98. Objekt	
99. Objekt	
100. Objekt	

1st Zähltag	Zählerzeit	Stahlzahl	Wegdreh
67.11.58	21.10.58	11.10.58	11.10.58

Cena s DPH	v CZK	81 176,02
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Letum 2 10

14-5-56

Environ Biol Fish (2015) 98:103–113

kazit.0

Objednavatel

Zhotovitel

[illegible] K_2O

Mathematics 2023, 11, 1012

ka' ɪʃ

VCP Rekonstrukce budovy Čajkovského vč. bourání ŽB stěny

1. Názov	1. Dátum	19.09.2022
2. Príjemca	2. Miesto	
3. Adresa	3. Podpis	
FUS a HARAZIM s.r.o.		

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 047,54	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-47 247,14	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
77	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	-21,300			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

83	M	9-1	Liniový žlab z polymerbetonu	m	-18,000	1 890,00	-34 020,00
D 997			Přesun sutě				4 274,11
128	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,662		
129	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	2,662		
130	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,268		
132	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,662		
D 998			Přesun hmot				-1 455,96
133	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-2,576		
D PSV			Práce a dodávky PSV				-13 570,77
148	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	51,320		
D 777			Podlahy lité				-13 801,71
196	K	777615114-1	Nátěry epoxidové podlah betonových	m2	-58,300		
197	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	-152,046		
D HSV			Práce a dodávky HSV				43 614,72
D 2			Zakládání				6 875,71
601	K	27335121R	Zřízení jednostranného bednění základových desek	m2	4,000		
602	K	27335122R	Odstranění jednostranného bednění základových desek	m2	4,000		
603	K	27531371R	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,320		
604	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,200		
605	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,200		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				36 739,01
606	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do sřezaných otvorů	t	0,084		
607	K	33992113R	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,600		
608	M	5922827R	palisáda betonová hranatá šedá 200x100x800mm	kus	20,000		
609	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,800		
610	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýh	m2	1,950		
611	K	61232512R	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,950		
612	K	63131212R	Vyrovnání podkladu betonem prostým tloušťky 50 mm	m3	0,800		
613	K	96504214R	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,800		
614	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000		
615	M	97303133R	Výsekání kapes ve zděvu cihelném na MVC pl do 0,16 m2 hl do 500 mm	kus	4,000		
616	K	974031155	Výsekání rýh ve zděvu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	13,000		
D PSV			Práce a dodávky PSV				84 481,67
D 721			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 125,20
617	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	2,000		
618	K	72114090R	Uprava potrubí litinového - napojení, řezání, přetáčení	soubor	1,000		
619	M	72117180R	Demontáž HT potrubí D50	m	2,000		
620	K	72117181R	Demontáž HT potrubí D110	m	1,000		
621	K	72117404R	Potrubí kanalizační z HT přípojovací DN 50	m	2,000		
622	K	72117405R	Potrubí kanalizační z HT přípojovací DN 110	m	1,000		
623	K	72121081R	Demontáž vpustí podlahových	kus	1,000		
624	K	72121145R	Vpust podlahová	kus	1,000		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				12 237,08
625	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	13,000		
626	K	72213082R	Demontáž ventilů 3/4"	kus	3,000		
627	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPRK svar polyuretan 16, 20, 25, 32, 40 mm	m	13,000		
628	K	72223114R	Ventil závitový rohový G 1/2"	kus	3,000		
629	K	72224010R	Ventily plastové PPR DN 25	kus	3,000		
630	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	100,946		
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				1 260,00
631	K	72431181R	Demontáž stávajícího ohříváče vody 80 litrů	soubor	1,000	1 260,00	

D 725		Zdravotnická - zařizovací předměty					
632	K	72511081R	Demontáž klozetů	soubor	1		
633	K	72511217R	Kombi klozet, vč. sedátka	soubor	1,000		
634	K	72521082R	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	1	
635	K	72521163R	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm	soubor	1,000		
636	K	72553210R	D+M Elektrický ohříváč vody 10 l	soubor	1,000		
637	K	72582083R	Demontáž baterie	soubor	2,000		
638	K	72582261R	Baterie umyvadlová	soubor	1,000		
639	K	72584132R	Baterie sprchová s toaletou, vč. sprchové hlavice	soubor	1,000		3 420,00
641	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	237,220		
D 762		Konstrukce tesařské					34 333,21
642	K	767640311	D+M podkladový rošt	m	44,000		
643	K	767-3	Montáž podbíjení stropů a střeš vodorovných z palubek	m2	22,000		
644	K	767651210	palubky obkladové smrk profil klasický 19x198mm lekosť A/B	m2	23,760		
645	M	767-5	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	272,149		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 180,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 180,00
DPH základní	21,00%	ze	2 180,00	457,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	2 637,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

19.09.2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 180,00
N00 - MR Čajkovského	2 180,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 180,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 180,00

ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

19.09.2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							2 180,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

N00 - MR Čajkovského							2 180,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady							2 180,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

1	K	001	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
2	K	002	Provozní vlivy	kpl	1,000		
