

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021, změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:	Odkanalizování Lhoty II
	Změnový list 01

Změna stavby / projektové dokumentace č.:	Změna stavby
---	--------------

Dotčená část stavby:	Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov		
Název / označení změny:	ZL 1 - Doplnění živičného nátěru krytu komunikace v lokalitě Polívkov		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal: objednatel		Dne:	

Při geodetickém vytýčení trasy kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Polívkov bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné odřezování živičného krytu tl. 40 v místě výkopů pro kanalizaci a přeložku vodovodu s přesahem 25cm na každou stranu výkopu. Dle požadavku správce komunikace se provede doplnění konstrukce komunikace nad rýhou pro kanalizaci a přeložce vodovodu v Mátové ulici a části ulice Cedrové živičnou frézovanou drtí v tl. 10cm, asfaltového nátěru s předdrcením štěrkem frakce 8/16 a následným poddrcením štěrkem frakce 4/8, vč. výškové úpravy poklopů kanalizačních šachet a hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů. Po geodetickém zaměření je plocha úprav v Cedrové ulici 673 m² a Mátové ulici 855m². Vzhledem k tomu, že tato úprava je dočasná je její provedení je bez záruky.

Identifikace plnění	Náklady na plnění dle příložených rozpočtů víceprací a méněprací spadají v plném rozsahu pod část : spolufinancováno z prostředků OPŽP vícepráce ██████████ Kč Méněpráce ██████████ financováno mimo prostředky OPŽP vícepráce ██████████ Kč Méněpráce ██████████	A) B)
---------------------	---	----------

Při geodetickém vytýčení trasy kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Polívkov bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné odřezování živičného krytu tl. 40 nad rýhou pro kanalizaci a přeložku vodovodu. Dle požadavku správce komunikace se provede doplnění konstrukce komunikace živičnou frézovanou drtí v tl. 10cm a asfaltového nátěru s předdrcením štěrkem frakce 8/16 a následným poddrcením štěrkem frakce 4/8, vč. výškové úpravy poklopů kanalizačních šachet a hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	10 dní
Vliv změny na cenu díla:	ANO	

Náklady na změnu celkem (bezDPH):	██████████
přípočty celkem (bezDPH):	██████████
odpočty celkem (bezDPH):	██████████

Přílohy:	
- č.1 - Ocenění změny díla	Rozpočet víceprací + méněprací
- č.2 - Projektová dokumentace	
- č.3 - Geodetické zaměření	
- č.4 - Fotodokumentace	
- č.5 - Zápis ze stavebního deníku	l.č. ██████████ 14.1.2022
- č.6 - Vyjádření TDS, AD, objednatel	Vyjádření AD

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum
zhotovitel /VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, společnost s ručením omezeným./ -	██████████	24.6.2024
projektant /EGYPROJEKT spol s r.o./ -	██████████	24.6.2024
techn. dozor stavebníka /RAVAL projekt v.o.s./ -	██████████	24.6.2024
objednatel /Vodárna Plzeň, a.s./ -	██████████	24.6.2024



Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 , změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II Změnový list 01

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov

Název / označení změny:

ZL 1 - Doplnění živičného nátěru krytu komunikace v lokalitě Polívkov

Přípočty uznatelné

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		Komunikace					
	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2				
3	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2				
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	W		Cedrová dle zaměření 673					
	W		Mátová ulice dle zaměření					
	W							
	K	564930512	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2				
	K	5734220000R	Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením ze silicidní emulze v množství 2,5 kg/m2 s posypem - sub. EUROVIA Silba, a.s.	m2				
56	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
			1528 * 0,015*2		45,84			
			1528 * 0,1*2		305,60			
4	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	18,00	██████	██████	
5	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,00	██████	██████	
103	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	615,63	██████	██████	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			1528*0,1*2 = 305,6					
	VV		1528*0,1*2,029=310,03					
104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 540,67	██████	██████	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním; Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"skládka 10 km , příplatek 9x"					
	VV		9*615,63		5 540,67			
105	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	305,60	██████	██████	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV							
	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového	t	310,03	██████	██████	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 ,
změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II Změnový list 01

Změna stavby / projektové

Dotčená část stavby:

Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov

Název / označení změny:

ZL 1 - Doplnění živičného nátěru krytu komunikace v lokalitě Polívkov

Odpočty neuznatelné

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 ,
změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II Změnový list 01

Změna stavby / projektové

Dotčená část stavby:

Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov

Název / označení změny:

ZL 1 - Doplnění živičného nátěru krytu komunikace v lokalitě Polívkov

Přípočty uznatelné

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					

Denní záznam stavby:

List č. [redacted]

Datum:

Počasi: ráno - 4°C přehledně, odpoledne +4°C polojasno

čtvrtek

13. 1. 2022

Pracovní doba: 7.00 - 16.00

Pracovníci [redacted]

Stroje: bagr JCB, nákl. auto 113

Plnění: geodetické vytyčení kanalizačních
šachet v ulici Cedrová, Meduňkova, Mažová
a za lesem, výkop pánevní rýhy v napojení
v Cedrové ulici s naložním a odvozem
výkopkou na skládku.

J A

pátek

Z důvodu pozitivního pracovníka na
COVID-19 práce na stavbě přerušeny
do pondělí 17. 1. 2022.

14. 1. 2022

Zápis o zjištěném nesouladu s projektem

Na základě vytyčení trasy kanalizačního
řádu v Cedrové, Meduňkové a Mažové
ulici v lokalitě Polívkov bylo zjištěno,
že v trase kanalizačního řádu je na
komunikaci proveden živičný kryt,
který projekt nepředpokládal. Z důvodu
výše popsaného zjištění bude nutné
v celé délce řádu kryt v tl. 10cm, š. 2m
odfrézovat, dl. 840m a provedení zpětného
doplnění živičného krytu po ukončení
práci na kanalizaci a vodovodu. Zároveň
bude nutné vyříznout a odstranit kryt pro
realizaci kanalizačních přípojek. [redacted]


Lhota - doplnění kanalizačního a vodovodního systému
SO 04 lokalita Polívkov

Celková plocha opravy Cedrové ulice má výměru 1282 m²

plocha opravy po kanalizaci 673 m²

plocha opravy po vodovodu 609 m²

plocha opravy Mátové ulice má výměru 855 m²

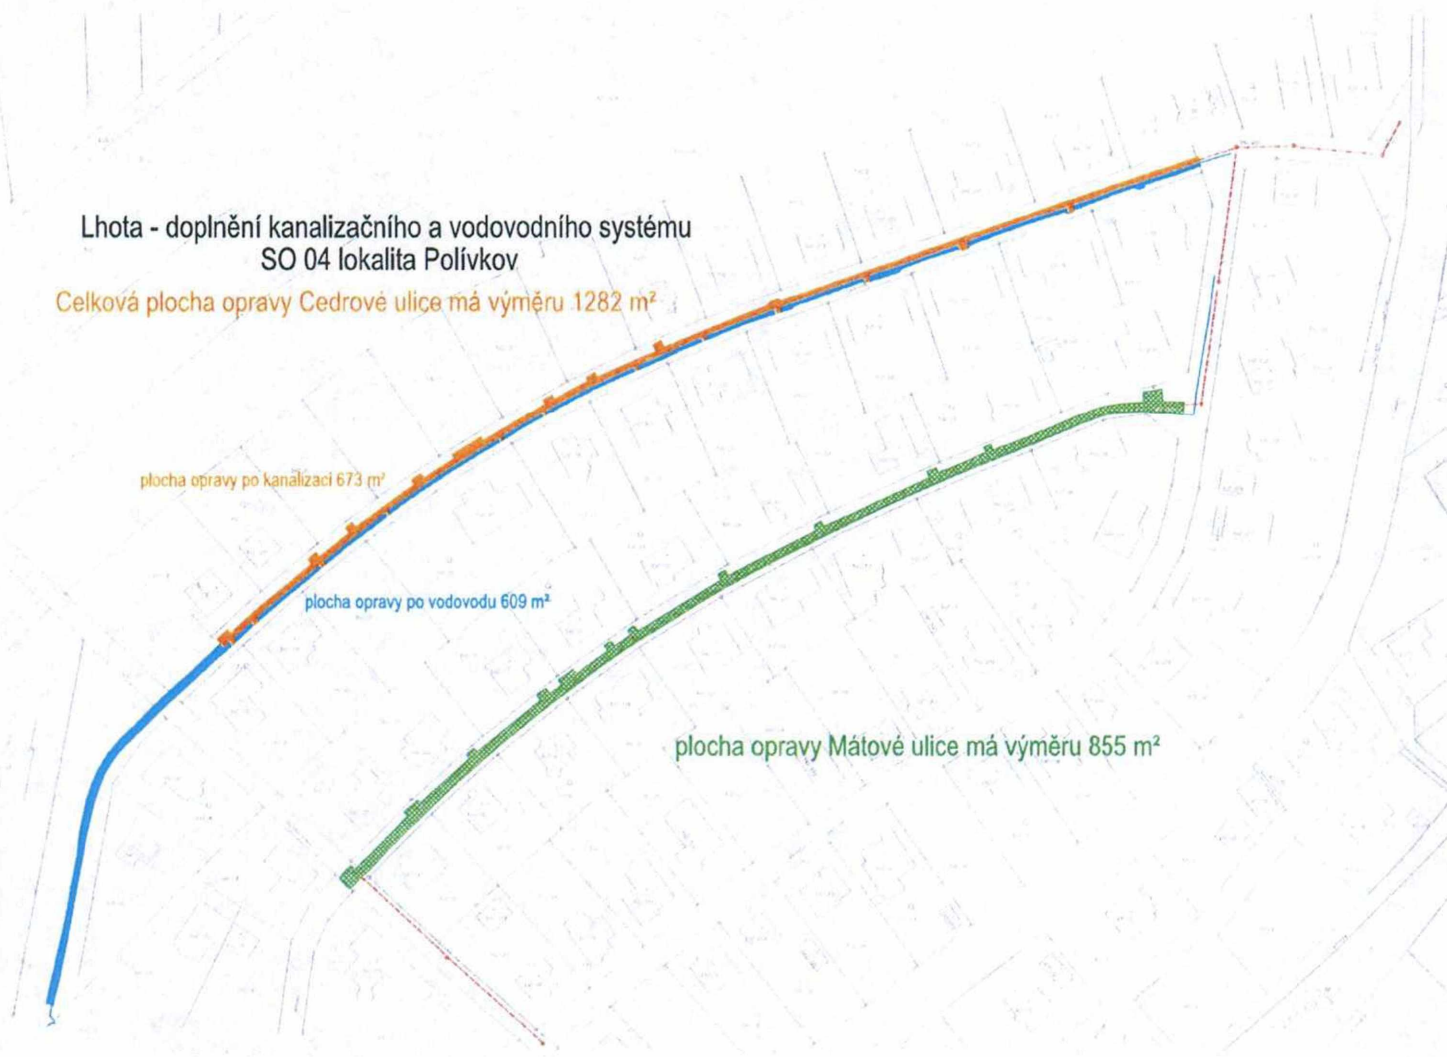



Název projektu: Odkanalizování Lhoty II

Registrační číslo projektu: [REDACTED]

Změnový list č. 1:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření TDS ke Změnovému listu č.1

Předmětem změnového listu č.1 je živičný postřik nad kanalizací Cedrová a Mátová ulice.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.

Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy budou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu dokončení o 10 dní. Ostatní části stavby nebudou tímto změnovým listem z hlediska termínu dokončení dotčeny.

Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.

Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 1 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 16.12.2022

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Název projektu: **Odkanalizování Lhoty II**

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 1:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)



Vyjádření AD ke Změnovému listu č.1

Předmětem změnového listu č.1 je živičný postřik nad kanalizací Cedrová a Mátová ulice.

Živičný postřik v ulici Cedrová a Mátová nebyl součástí projektové dokumentace.

AD souhlasí se změnovým listem.

V Plzni dne 16.12.2022


atel společnosti

Název projektu: Odkanalizování Lhoty II

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 1:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření Objednatele ke Změnovému listu č. 1

Předmětem změnového listu č. 1 je doplnění živičného krytu komunikace v lokalitě Polívkov.

Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že se v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová nachází živičný kryt komunikace, s čímž projektová dokumentace neuvažovala. Z toho důvodu muselo být provedeno odfrézování krytu a následně dle požadavku správce komunikace provedení zpětného doplnění konstrukce komunikace v určených mocnostech a tloušťkách jednotlivých vrstev skladby komunikace.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.

Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy budou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu dokončení o 10 dní. Ostatní části stavby nebudou tímto změnovým listem z hlediska termínu dokončení dotčeny.


Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.

Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 1 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

Objednatel po doporučení ADP a TDS považuje Změnový list č. 1 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 17.12.2022



Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 , změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)


Stavební akce: **Odkanalizování Lhoty II**

Změnový list 02

Změna stavby / projektové dokumentace č. **Změna stavby**

Dotčená část stavby:			
Název / označení změny:		ZL 2 - výměna nevhodného materiálu pro zásypy	
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		List č. 019714 ze dne 15. 3. 2022, list č. 019724 ze dne 30.3.2022,	
Návrh pro změnu podal: zhotovitel - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným		██████████	Dne: ██████████
Zdůvodnění a popis změny:		Po provedeném rozboru vhodnosti vytěžené zeminy do zásypu akreditovanou a schválenou laboratoří, bylo zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná do zpětného zásypu rýhy, bylo navrženo provedení výměny materiálu.	
Identifikace plnění		<p>Náklady na plnění dle přiložených rozpočtů víceprací a méněprací jednotlivých objektů jsou rozděleny na část</p> <p>A) spolufinancováno z prostředků OPŽP vícepráce ██████████ Kč Méněpráce ██████████ Kč Změnový list ██████████ Kč</p> <p>B) financováno mimo prostředky OPŽP vícepráce ██████████ Kč Méněpráce ██████████ Kč Změnový list ██████████ Kč Celkem změnový list ZL 2 ██████████ Kč</p>	
Popis příčin vzniku změny díla		Dle provedeného rozboru zeminy CBR na vhodnost do násypu bylo zjištěno, že zemina nevyhovuje na Okamžitý index únosnosti IBI, namrzavost a poměr únosnost dle protokolu 014/vh/22 z 15.3.2022 na část Polivkov, 026/vh/22 z 30.3.2022 na část Za Lesem, 025/vh/22 z 30.3.2022 lokalita Na Blatech.	
Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem (bezDPH):		██████████	
přípočty celkem (bezDPH):		██████████	
odpočty celkem (bezDPH):		██████████	
Přílohy:			
		- č.1 - Ocenění změny díla	
		- č.2 - Projektová dokumentace Celá lokalita	
		- č.3 - Doklad ze skládky o uložení zeminy	
		- č.4 - Fotodokumentace	
		- č.5 - Zápis ze stavebního deníku I.č.019714 z 15.3.2022, I.č. 019724 z 30.3.2022	
		- č.6 - Vyjádření TDS, AD, objednatele	

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum
zhotovitel VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, společnost s ručením omezeným./ -	██████████	24.6. 2024
projektant /EGYPROJEKT spol s r.o./ -	██████████	24.6. 2024
techn. dozor stavebníka /RAVAL projekt v.o.s./ -	██████████	24.6. 2024
objednatel /Vodárna Plzeň, a.s./ -	██████████	24.6. 2024



Rekapitulace

Stavba:

Objekt:

A - Odkanalizování Lhoty II - kanalizace (spolufinancováno z prostředků OPŽP)

Plzeň, Lhota

Vícepráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

7.6.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vodohospodářské stavby

DIČ:

Celkem ZL 2 - výměna nevhodné zeminy

Vyplň údaj

- 1 01 - SO 01 Lokalita Za Lešem - vícepráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
01 - SO 01 Lokalita Za Lešem - méněpráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
- 2 03 - SO 03 Lokalita Ke Křížku - vícepráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
03 - SO 03 Lokalita Ke Křížku - méněpráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
- 3 04 - SO 04 Lokalita Polívkov - vícepráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
04 - SO 04 Lokalita Polívkov - méněpráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
- 4 Lokalita K Jezírku kanalizace - vícepráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
Lokalita K Jezírku kanalizace - méněpráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
- 5 Lokalita Na Blatech kanalizace - vícepráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
Lokalita Na Blatech kanalizace - méněpráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
A - Odkanalizování Lhoty II - kanalizace (spolufinancováno z prostředků OPŽP) - vícepráce
A - Odkanalizování Lhoty II - kanalizace (spolufinancováno z prostředků OPŽP) - méněpráce
A - Odkanalizování Lhoty II - kanalizace (spolufinancováno z prostředků OPŽP) ZL 02
- 6 Lokalita Na Blatech vodovod - vícepráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
Lokalita Na Blatech vodovod - méněpráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
- 7 Lokalita K Jezírku vodovod - vícepráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
Lokalita K Jezírku vodovod - méněpráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
- 8 Cedrová ulice vodovod - vícepráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
Cedrová ulice vodovod - méněpráce ZL 2 výměna nevhodné zeniny
B - Odkanalizování Lhoty II - vodovod (financováno mimo prostředků OPŽP) - vícepráce
B - Odkanalizování Lhoty II - vodovod (financováno mimo prostředků OPŽP) - méněpráce
B - Odkanalizování Lhoty II - vodovod (financováno mimo prostředků OPŽP) ZL 02
