

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021, změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce: **Odkanalizování Lhoty II**

Změnový list 09

Změna stavby / projektové dokumentace č. **Změna stavby**

Dotčená část stavby:	Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov	
Název / označení změny:	ZL 9 - Cedrová vodovod - doplnění živičného krytu nad rýhou	
Podklad pro změnu:		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		
Návrh pro změnu podal: objednatel	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	Při geodetickém vytyčení trasy vodovodu v Cedrové ulici bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné odřezování živičného krytu tl. 40 nad rýhou pro vodovod s přesahem 25cm pro zámek. Dle požadavku správce komunikace se provede doplnění konstrukce komunikace nad rýhou živičnou frézovanou drť v tl. 10cm, asfaltového nátěru s předdrcením šterkem rakce 8/16 a následným podrcením šterkem frakce 4/8, vč. výškové úpravy hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů. Po geodetickém zaměření je plocha takto provedené úpravy nad rýhou 609m ² . Vzhledem k tomu, že tato úprava je dočasná je její provedení je bez záruky.	
Identifikace plnění	Náklady na plnění dle příložených rozpočtů víceprací a méněprací spadají v plném rozsahu pod část : .A. spolufinancováno z prostředků OPŽP vícepráce █████ KČ .Méněpráce █████ KČ .Celkem uznatelné █████ KČ .B. financováno mimo prostředky OPŽP vícepráce █████ KČ .Méněpráce █████ KČ .Celkem neuznatelné ZL 9 █████ KČ	
Popis příčin vzniku změny díla	Při geodetickém vytyčení trasy vodovodu v ulici Cedrová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné odřezování živičného krytu tl. 40 a dle požadavku správce komunikace se provede doplnění konstrukce komunikace živičnou frézovanou drť v tl. 10cm a asfaltového nátěru s předdrcením šterkem rakce 8/16 a následným podrcením šterkem frakce 4/8, vč. výškové úpravy hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů.	
Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	10 dní
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem (bezDPH):	██████████	
přípochty celkem (bezDPH):	██████████	
odpočty celkem (bezDPH):	██████████	
Přílohy:	<ul style="list-style-type: none"> - č.1 - Ocenění změny díla Rozpočet víceprací + méněprací - č.2 - Projektová dokumentace - č.3 - Geodetické zaměření - č.4 - Fotodokumentace - č.5 - Zápis ze stavebního deníku I.č.019685 z 14.1.2022 - č.6 - Vyjádření TDS, AD, objednatel Vyjádření AD 	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum
zhotovitel /VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, společnost s ručením omezeným./ -	██████████	24.6.2024
projektant /EGYPROJEKT spol s r.o./ -	██████████	24.6.2024
techn. dozor stavebníka /RAVAL projekt v.o.s./ -	██████████	24.6.2024
objednatel /Vodárna Pízeň, a.s./ -	██████████	24.6.2024

S.
91
52

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 , změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II Změnový list 09

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov ZL 9 - Cedrová vodovod - doplnění živičného krytu nad rýhou Přípočty neuznatelné

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		Komunikace					
	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	609,00			
3	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	609,00			
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	VV		136,0 * 1,5		204,00			
	VV		324,0 * 1,25		405,00			
	VV							
	K	564930512	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	609,00			

Denní záznam stavby:

List č. [redacted]

Datum:

čtvrtek

Počasí: ráno - 4°C převážně, odpoledne +4°C převážně

13. 1. 2022

Pracovní doba: 7.⁰⁰ - 16.⁰⁰

Pracovníci: [redacted]

Stroje: bagr JCB, nábl. auto MB

Plnění: geodetické vytyčení kanalizačních
řádků v ulici Cedrová, Meduňkova, Hážová
a za lesem, výkop pánečkové rýhy v napojení
v Cedrové ulici s naložním a odvozem,
výkopku na skládku.

pátek

Z důvodu pozitivního pracovníka na
COVID-19 práce na stavbě přerušeny
do pondělí 17. 1. 2022.

14. 1. 2022

Zápis o zjištěném nesouladu s projektem

Na základě vytyčení trasy kanalizačního
řádu v Cedrové, Meduňkové a Hážové
ulici v lokalitě Polivka bylo zjištěno,
že v trase kanalizačního řádu je na
komunikaci proveden živičný kryt,
který projekt nepředpokládal. Z důvodu
výše popsaného zjištění bude nutné
v celé délce řádu kryt v tl. 10cm, š. 2m
odfrézovat, dl. 840m a provedení zpětného
doplnění živičného krytu po ukončení
práci na kanalizaci a vodovodu. Zároveň
bude nutné vyříznout a odstranit kryt pro
realizaci kanalizačních přípojek.


Lhota - doplnění kanalizačního a vodovodního systému
SO 04 lokalita Polívkov

Celková plocha opravy Cedrové ulice má výměru 1282 m²

plocha opravy po kanalizaci 673 m²

plocha opravy po vodovodu 609 m²

plocha opravy Mátové ulice má výměru 855 m²

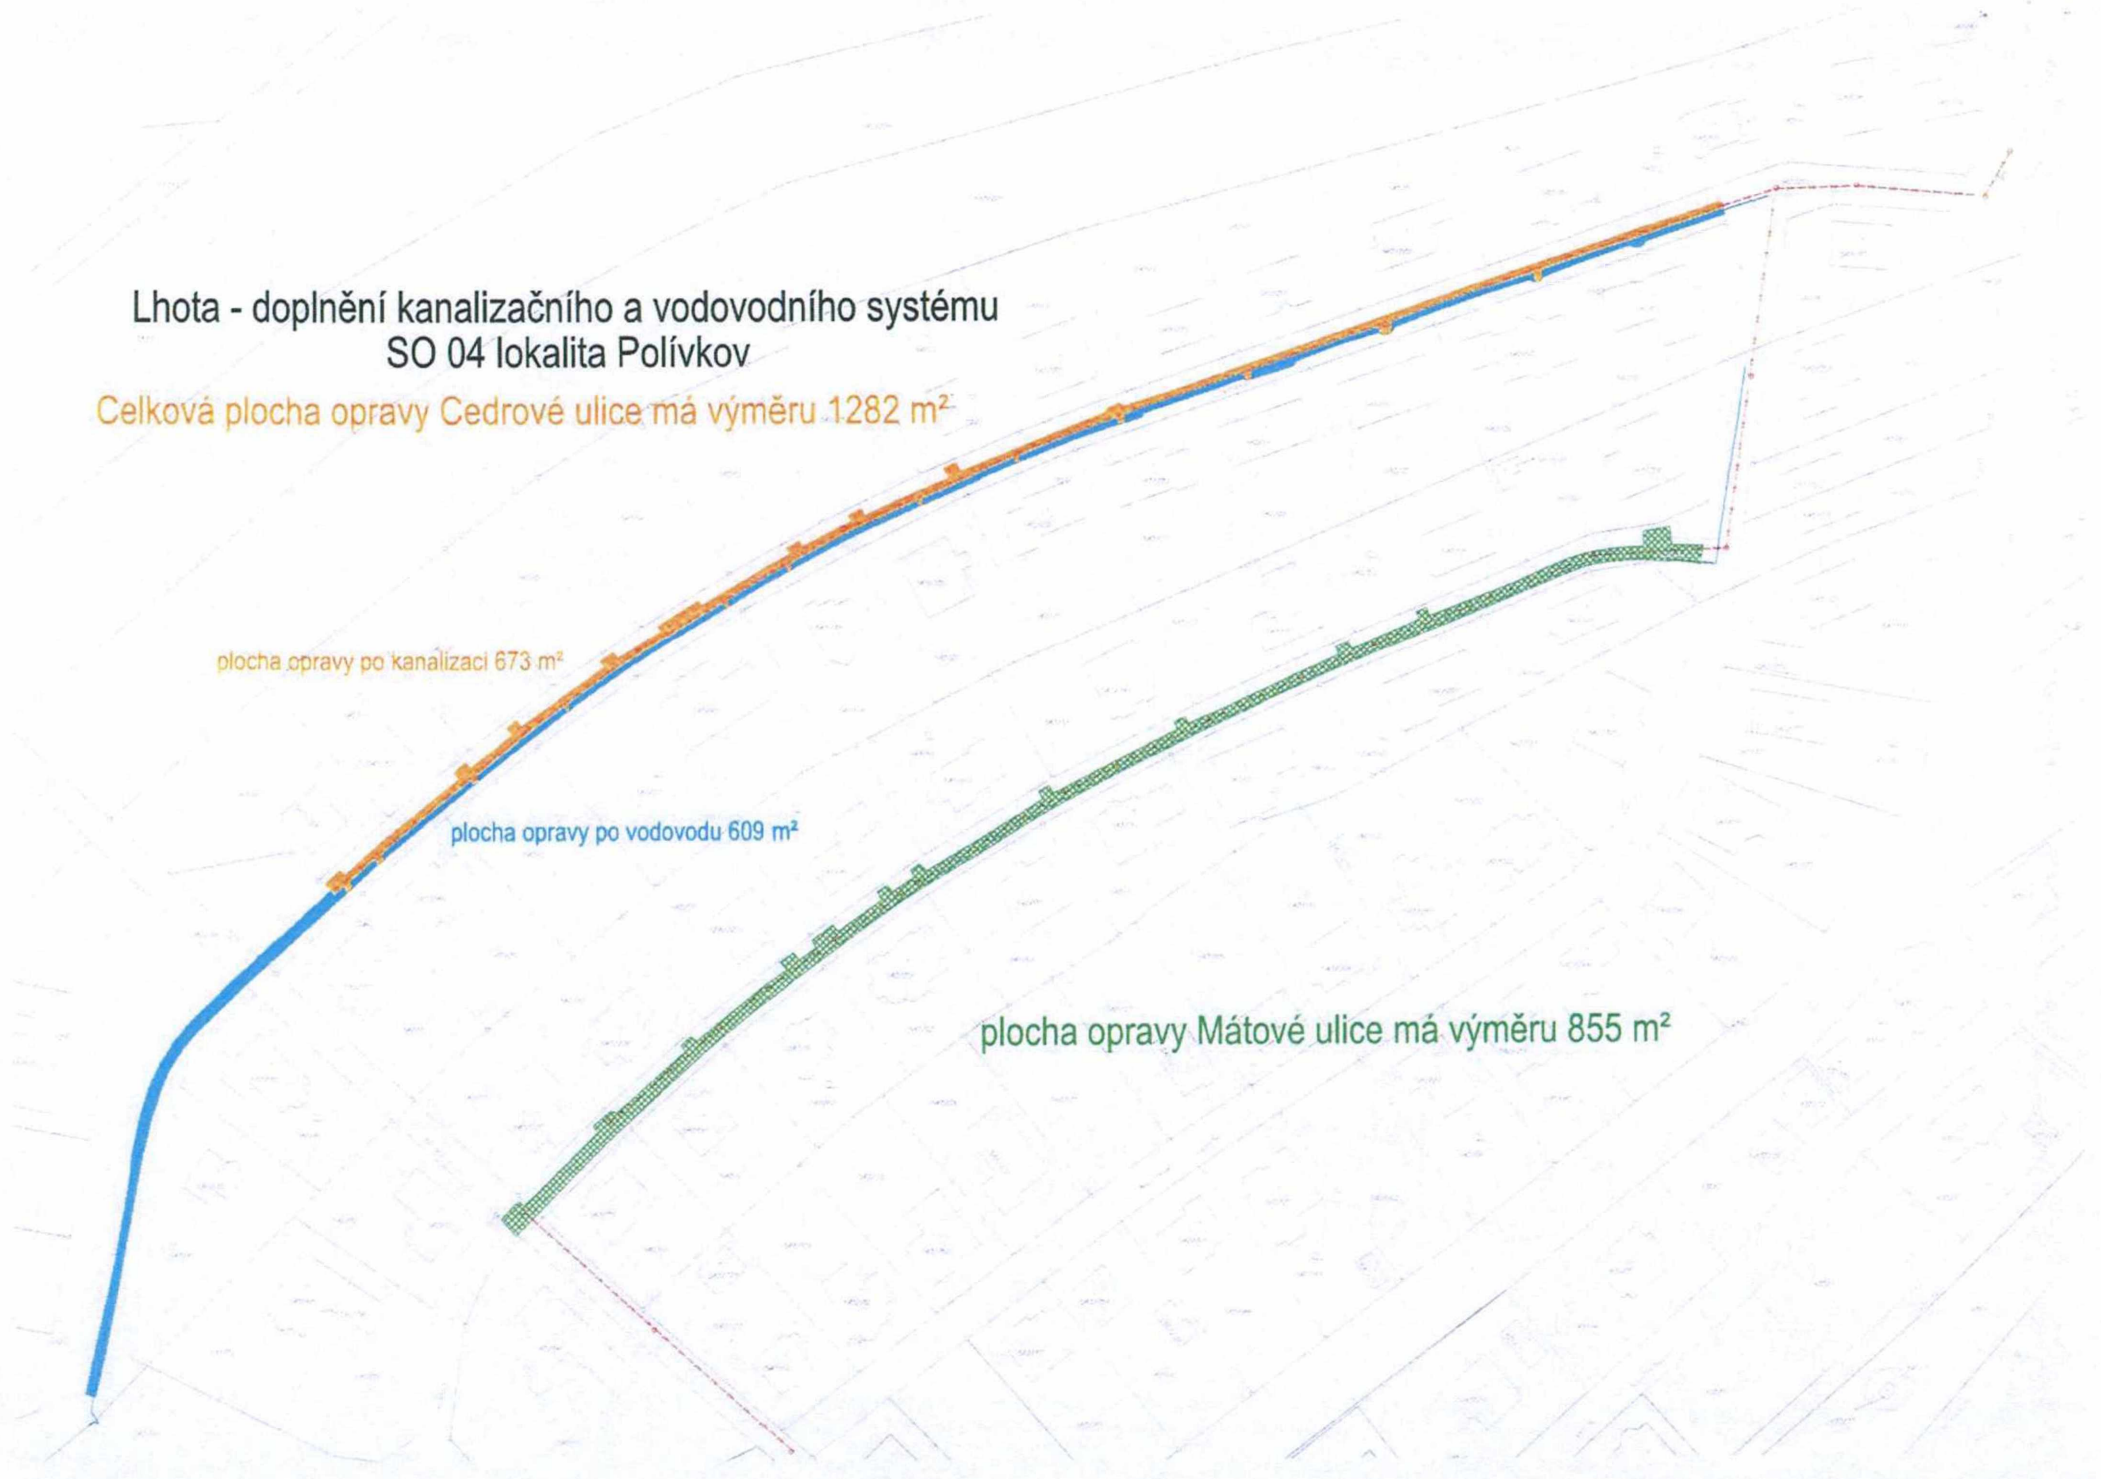





Název projektu: Odkanalizování Lhoty II

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 9:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření TDS ke Změnovému listu č.9

Předmětem změnového listu č.9 - Při geodetickém vytýčení trasy vodovodu v Cedrové ulici bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné odfrézování živičného krytu tl. 40 nad rýhou pro vodovod s přesahem 25cm pro zámek. Dle požadavku správce komunikace se provede doplnění konstrukce komunikace nad rýhou živičnou frézovanou drtí v tl. 10cm, asfaltového nátěru s předdrcením šterkem frakce 8/16 a následným poddrcením šterkem frakce 4/8, vč. výškové úpravy hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů. Po geodetickém zaměření je plocha takto provedené úpravy nad rýhou 609m². Vzhledem k tomu, že je tato úprava dočasná, je její provedení bez záruky.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.


Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy budou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu dokončení o 10 dní. Ostatní části stavby nebudou tímto změnovým listem z hlediska termínu dokončení dotčeny.

Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.


Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 9 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 16.12.2022



Název projektu: **Odkanalizování Lhoty II**

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 9:


Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření AD ke Změnovému listu č.9

Předmětem změnového listu č.9 - Při geodetickém vytýčení trasy vodovodu v Cedrové ulici bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Změnový list řeší obnovu živičného krytu.

AD souhlasí se změnovým listem.

V Plzni dne 16.12.2022



Název projektu: **Odkanalizování Lhoty II**

Registrační číslo projektu: **[REDACTED]**

Změnový list č. 9:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření Objednatele ke Změnovému listu č. 9

Předmětem změnového listu č. 9 je doplnění živičného krytu komunikace v lokalitě Polívkov.

Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že se v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová nachází živičný kryt komunikace, s čímž projektová dokumentace neuvažovala. Z toho důvodu muselo být provedeno odfrézování krytu a následně dle požadavku správce komunikace provedení zpětného doplnění konstrukce komunikace v určených mocnostech a tloušťkách jednotlivých vrstev skladby komunikace.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.

Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy budou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu dokončení o 10 dní. Ostatní části stavby nebudou tímto změnovým listem z hlediska termínu dokončení dotčeny.

Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.

Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 9 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

Objednatel po doporučení ADP a TDS považuje Změnový list č. 9 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 17.12.2022

[REDACTED]
.....
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
