

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 , změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:	Odkanalizování Lhoty II
----------------	--------------------------------

Změnový list 13

Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změna stavby
--	--------------

Dotčená část stavby:	Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov		
Název / označení změny:	ZL 13 - Doplnění živičného krytu v lokalitě Polívkov v ulici Meduňková a část ulice Cedrová		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	I.č.019685 z 14.1.2022, I.č.05329 ze dne 15.11.2022, zápis z 13 KD ze dne 11.10.2022 bod 13.3		
Návrh pro změnu podal: objednatel		Dne:	

Při geodetickém vytýčení trasy kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Polívkov bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se součástí a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s tímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné pro realizaci kanalizace a přeložky vodovodu odfrézování živičného krytu tl. 40. Vzhledem k porušení více jak poloviny povrchu komunikace a dosti velkému dopravnímu zatížení v části ulice Cedrová po křižovatku s Meduňkovou ulicí a v Meduňkové ulici požaduje správce komunikace v daném úseku celoplošné doplnění živičného krytu ve skladbě podkladní vrstva z ACP 16+ v tl. 60 mm a vrchní obrusná vrstva z ACO 11+ v tl. 40mm s výškovou úpravou poklopů kanalizačních šachet a hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů. Po geodetickém zaměření je plocha provedeného živičného krytu 903m² s tím, že napojení na stávající vjezdy a zelenou plochu bylo provedeno dosyváním a úpravou krajnice ze šterkodrti v průměrné šířce 25cm a tl. 10cm.

Identifikace plnění	Náklady na plnění dle příložených rozpočtů víceprací a méněprací jsou rozděleny na část: spolu financováno z prostředků OPŽP vícepráce ████████ Kč 0,00Kč mimo prostředky OPŽP vícepráce ████████ Kč Celkem změnový list ████████ Kč	A) Méněpráce B) financováno Méněpráce ████████ Kč
---------------------	--	---

Při geodetickém vytýčení trasy kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Polívkov bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se součástí a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s tímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné odfrézování živičného krytu tl. 40 pro realizaci kanalizace a přeložky vodovodu. Dle požadavku správce komunikace zpětného doplnění živičného krytu ve skladbě podkladní vrstva z ACP 16+ v tl. 60 mm a vrchní obrusná vrstva z ACO 11+ v tl. 40mm s výškovou úpravou poklopů kanalizačních šachet a hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů.

Vliv změny na termín dončení díla:	Ano	10 dní
Vliv změny na cenu díla:	ANO	

Náklady na změnu celkem (bezDPH):	██████████
přípočty celkem (bezDPH):	██████████
odpočty celkem (bezDPH):	██████████

Přílohy:	
- Č.1 - Ocenění změny díla	Rozpočet víceprací + méněprací
- Č.2 - Projektová dokumentace	
- Č.3 - Geodetické zaměření	
- Č.4 - Fotodokumentace	
- Č.5 - Zápis ze stavebního deníku	I.č.019685 z 14.1.2022, I.č.05329 ze dne 15.11.2022, zápis z 13 KD ze dne 11.10.2022 bod 13.3
- Č.6 - Vyjádření TDS, AD, objednatelé	Vyjádření AD

Za útvár / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel /VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, společnost s ručením omezeným / -	██████████	24.6.2024	██████████
projektant /EGYPROJEKT spol s r.o./ -	██████████	24.6.2024	██████████
lechn. dozor stavebníka /RAVAL projekt v.o.s./ -	██████████	24.6.2024	██████████
objednatel /Vodárna Plzeň, a.s./ -	██████████	24.6.2024	██████████

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 ,

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II Změnový list 13

Změna stavby /

Dotčená část stavby:

Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov

Název / označení
změny:

ZL 13 - Doplnění živičného krytu v lokalitě Polívkov v ulici Meduňková a část ulice Cedrová

Přípočty spolufinancované z prostředků OPŽP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
57	K	113107161	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm stroj $(3,0+25,0+18,5+39,5+30,5+3) * (0,5+1,3+0,5) = 119,5*2,3=274,85 \text{ m}^2$	m2	274,500			
63	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	274,500			
58	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	274,500			
	D	5	Komunikace					
24	K	564930512	Doplnění krajnic - podklad ze šterkodrti plochy do 100 m2 tl 100 mm $262 * 0,25=65,5\text{m}^2$	m2	0,000			
25	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	274,500			
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	274,500			
59	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	0,000			
	D	8	Trubní vedení					

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 , změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZVZ, odst. (6)

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II Změnový list 13

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov

Název / označení změny:

plnění živičného krytu v lokalitě Polívkov v ulici Meduňková a část ulic

Prípčočty financované z prostředků mimo OPŽP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
57	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm stro	m2	693,830			
			10,5 * (18,5+6/2) = 128,63m2 57,0 * 6,0 = 342 m2 79,0 * 6,3 = 497,7 m2 Odpočet uznatelné náklady 274,5 m2					
63	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pí do 500 m2 bez překážek v trase	m2	693,830			
58	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	663,830			
	D	5	Komunikace					
24	K	564930512	Doplnění krajnic - podklad ze štěrkodrti plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	65,500			
			262 * 0,25=65,5m2					
25	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	628,500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	628,500			
59	K	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	38,500			
	D	8	Trubní vedení					
61	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	0,000			
60	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	12,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
	D	997	Přesun sutě					
51	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	138,770			
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	1 248,900			
53	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	62,450			
54	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového	t	76,320			
	D	998	Přesun hmot					
62	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	167,796			

14. 11. 2022

Počasí: ráno +2°C dešť, odpoledne +5°C přehánky

- 18. 11. 2022

Pracovní doba: 7.00 - 16.00


Pondělí - páte

Pracovníci: [REDACTED]

Stroje: bagr obou, traktorbagr, 2x nákladní auto
Plnění:K Jezírku - V pondělí 14. 11. 2022 proveden
opakovaný odběr vzorku vody v místech V0 a V21.Dne 15. 11. oznámil provozovatel vodovodu,
že v odebraném vzorku je vysoké pH a nutný
další opakovaný odběr vzorku vody po předchozím
proplachu, který provozovatel požadil až
na další pondělí 21. 11. 2022.Poliubov - objednatel požaduje jako úkryt
za úhrady nový živičný kryt komunikace
v úseku Meduňková ulice a část Cedrové
ulice v úseku Meduňková - K sídoru ve složení:
6cm ACP 16+ a 4cm ACO 11+.Komunikace v úseku Meduňková ulice
vzhledem k tomu, že nemá podélný spád
bude proveden jen příčný spád s tím, že
voda z komunikace bude odtékat do celkové
krajnice.Úsek Cedrové ulice bude odvozen do
silničního příkopu. V místě napojení
na ulici K sídoru bude z důvodu
stávajících propustek vyškoleně přizpůsoben.
Na stavbě prováděno odstraňování
utvá. povrchu a úprava pláně.KČP P. [REDACTED] IL 13,
ZATDS [REDACTED]


SITUACE

Lhota - doplnění kanalizačního a vodovodního systému
SO 04 lokalita Polívkov

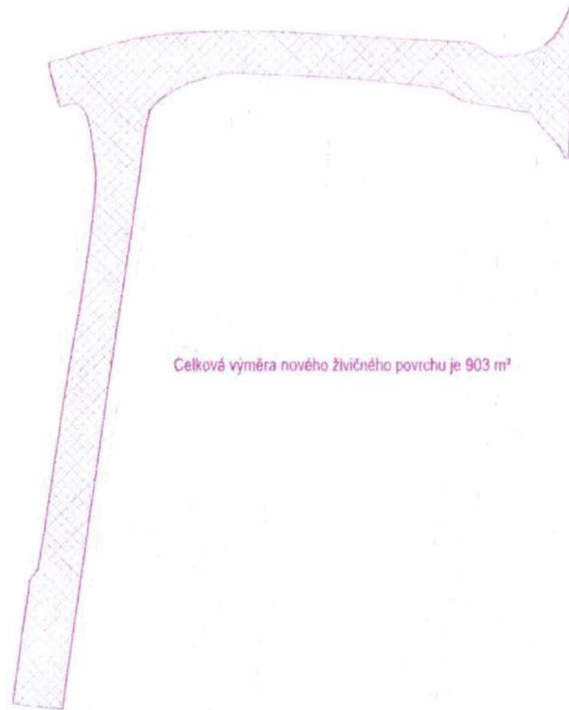

NOVÝ ŽIVIČNÝ POVRCH 903m²

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

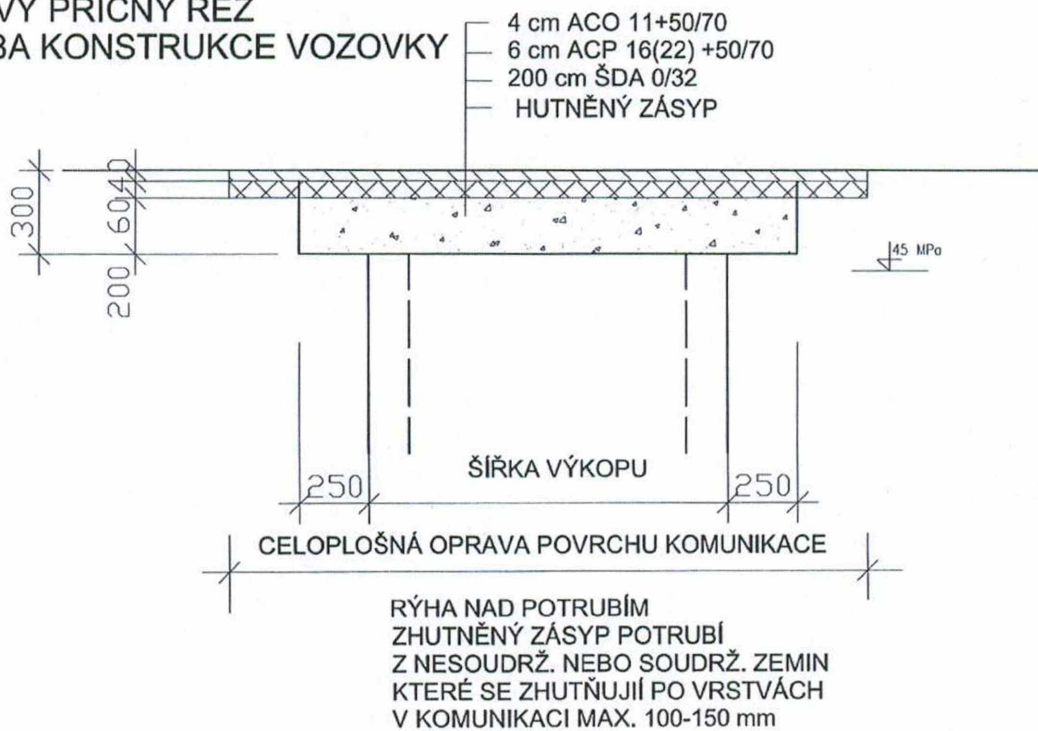

Lhota - doplnění kanalizačního a vodovodního systému SO 04 lokalita Polívkov





Celková výměra nového živičného povrchu je 903 m²
