



26.7.2024

Od : COLAS CZ,a.s.

Pro : Město Mariánské Lázně
Ing. Jarmil Svoboda, Referent Investiční technik

Věc : Předložení projednaných změn akce: „III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“

Naše společnost COLAS CZ,a.s. je zhotovitelem akce „III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“. Na základě projednání a odsouhlasení s TDI a zástupcem objednatele předkládáme změny stavby. Změny byly vyvolány zjištěním při vlastní realizaci, které nemohl zhotovitel v předstihu předpokládat.

OBJEKT SO 302	Přeložka vodovodu	62 837,04 Kč
OBJEKT SO 180.2	Dopravně ing. opatření - město Mariánské Lázně	124 446,05 Kč
OBJEKT SO 501	GasNet - přeložka plynovodu	108 886,28 Kč
OBJEKT SO 000.2	Všeobecné a ostatní náklady - město Mariánské Lázně	14 400,00 Kč
OBJEKT SO 401	Veřejné osvětlení	78 314,53 Kč
OBJEKT SO 303	Přeložka kanalizace	164 813,81 Kč
CELKEM bez DPH		553 697,71 Kč

Předložené změny nemají dopad do konečného termínu realizace.

Předem děkuji za odsouhlasení a přijetí předložených změn.



COLAS CZ – OBLAST ZÁPAD
Divize silničního stavitelství
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
> www.colas.cz

Převzal :

Za TDI

Martin Fiury, technický dozor investora

Za Město Mariánské Lázně

Ing. Jarmil Svoboda, Referent Investiční technik



Firma: COLAS CZ, a.s.

Soupis prací objektu - REKAPITULACE

Stavba:

III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

Objekt:

část město Mariánské Lázně

Rozpočet:

REKAPITULACE

Poř. číslo	Varianta	Název položky
1	3	4
Rekapitulace		
ZL 1	SO 302	Přeložkavodovodu
ZL 2	SO 180.2	Dopravně ing. opatření - město Mariánské Lázně
ZL 3	SO 501	GasNet - přeložka plynovodu
ZL 4	SO 000.2	Všeobecné a osatní náklady - město Mariánské Lázně
ZL 5	SO 401	Veřejné osvětlení
ZL 6	SO 303	Přeložka kanalizace

Celkem

10

553 697,71

62 837,04

124 446,05

108 886,28

14 400,00

78 314,53

164 813,81

553 697,71

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

Datum vydání požadavku:

26.7.24

Adresa objednatele:

Město Mariánské Lázně

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

OBJEKT SO 302 - Přeložka vodovodu

➤ Popis změny, technického řešení:

Projektová trasa vody je v celé své délce DN 160x14,6, materiál vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny - PAS 1075 a respektuje stávající sítě in situ.

➤ Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Zadání dle VV je „Porubí z trub plastových tlakových svařovaných DN do 80MM“

13	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	106,700	389,13	41 520,17
----	-------	--	---	---------	--------	-----------

➤ Zdůvodnění změny:

Změna narovnává disporporci projektové dokumentace s výkazem výměr.

➤ Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Provedené práce budou zakresleny do DSPS.

➤ Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Termín :
Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD.

- Cena :
Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to :

- Odpočet -41 520,17 Kč
- Přípočet 104 357,21 Kč

Přípočet k SOD 62 837,04 Kč

Příloha :

- Kalkulace

Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám, Mariánské Lázně
 Objekt: 02 část město Mariánské Lázně
 Rozpočet: SO 302 Přeložka vodovodu

SO 302	62 837,04
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				7 191,52
3	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	5,475	1 147,23	6 281,08
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,475	166,29	910,44
		4	Vodorovné konstrukce				563,25
6	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,825	308,63	563,25
		8	Potrubí				2 278,84
22	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	7,300	25,03	182,72
23	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VYSTRAŽNÁ FOLIE	M	7,300	25,07	183,01
26	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	7,300	119,73	874,03
27	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	7,300	142,34	1 039,08
			NOVÁ POLOŽKA				94 323,60
			Potrubí	m	114,000	827,40	94 323,60
	286135530		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm	m	114,000	827,40	94 323,60
			ODPOČET				-41 520,17
13	87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	-106,700	389,13	-41 520,17

104 357,21

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

Datum vydání požadavku:

26.7.24

Adresa objednatele:

Město Mariánské Lázně

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**OBJEKT SO 180.2 - Dopravně inženýrská
opatření - město Mariánské Lázně**

➤ Popis změny, technického řešení:

Pro splnění požadavku orgánů státní správy je vyšší počet DZ, nově přidané VDZ, zbudování koridorů pro pěší, realizace přemístění 2x autobusové zastávky pro cestující.

➤ Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle grafické části PD – DIO bylo uvažováno s etapizací – 3. Etapy za označeny pomocí DZ Z4 a semaforové sestavy.

➤ Zdůvodnění změny:

Uvažované DIO stavby „III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“ respektovalo etapizaci výstavby. Na základě podání žádosti k realizaci bylo správními orgány určeno zbudování koridorů pro pěší, přemístění autobusových zastávek, třicestný semafor pro řízení dopravy. Zpracované a odsouhlasené DIO ze dne 26.3.2024 č.j. KRPK-59510/2023-190206, Rozhodnutí č.j. ODSHSA/24/2589-3/OK.

Výpis DZ v realizaci :

označení SDZ	MJ	počet
B20a	ks	1
C4b	ks	1
A10	ks	4
E7b	ks	4
B24b	ks	1
B24a	ks	1
B1	ks	2
E13 (1)	ks	4
Z4	ks	14

Z2 + S7	ks	3+9
Z2 + S7	ks	1

označení VDZ	MJ	počet
V17b	ks	1
V12b	ks	1
V5	ks	2

Semafor	MJ	počet
semafor	ks	3

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

➤ Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na projektovou dokumentaci.

➤ Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Termín :
Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD.

- Cena :
Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to :

- Odpočet - 33 939,45 Kč
- Přípočet 158 385,50 Kč

Přípočet k SOD 124 446,05 Kč



Příloha :

- Kalkulace
- Vyjádření orgánů státní správy

Městský úřad Mariánské Lázně

Odbor dopravy, silniční správní úřad a správních agend

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 354 922 111

fax: 354 623 186, e-mail: muml@muml.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061, ISDS: bprbqms

Číslo jednací: ODSHA/2376-2/OK

Vyřizuje: Olga Konfrštová – úředně oprávněná osoba
tel: 354 922 329
olga.konfrstova@muml.cz

Mariánské Lázně: 2024-04-04

COLAS CZ a.s.
Rusbeška 215/1
190 00 Praha 9
IČ: 261 77 361

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako příslušný správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust. § 171 a ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2000 Sb., (správní řád) na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2114 a místní komunikacích v obci Mariánské Lázně podané dne 27.3.2024 právnickou osobou společností: **COLAS CZ a.s., IČ: 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9** a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, dopravní inspektorát a majetkovým správcem silnice Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov

vydává

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

spočívající v umístění dopravního značení a zařízení, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení

dopravní značení: viz mapová příloha, která je nedílnou součástí tohoto stanovení k dispozici u správního orgánu + elektronická úřední deska
komunikace: III/2114 Plzeňská ul. (úsek u Černého mostu) a MK – ulice Polní, Tepelská, Skalníkova, Ke Kasárnům, Z Tratí, Mariánské Lázně
účel: **částečná uzavírka silnice III/2114, ulice Plzeňská, úplná uzavírka ulice Polní, Mariánské Lázně ke stavbě „Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke kasárnům, Mariánské Lázně“**
dobu platnosti: **10.4.2024 – 15.4.2024** - přípravné práce
15.4.2024 – 30.11.2024 – úplná uzavírka ulice Polní a částečná uzavírka silnice III/211, ulice Plzeňská

Podmínky pro realizaci:

- Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajské ředitelství Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, dopravní inspektorát ze dne 24.8.2023 a 26.3.2024 č.j.: KRPK-59510/ČJ-2023-190206, platným TP 65/ TP 66 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- Dopravní značení musí být po celou dobu jeho umístění udržováno v úplném, čitelném a čistém stavu.

Městský úřad Mariánské Lázně

Odbor dopravy, silniční správní úřad a správních agend

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 354 922 111

fax: 354 623 186, e-mail: muml@muml.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061, ISDS: bprbqms

3. Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí, si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

Odůvodnění

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem tohoto řízení je osazení dopravního značení a zařízení, jehož realizace zakládá účastníkům provozu odlišné povinnosti oproti stanovené obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích, postupoval správní orgán podle části šesté (opatření obecné povahy) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5 den po vyvěšení.

Dne 27.3.2024 podala právnická osoba společnost: COLAS CZ a.s., IČ: 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 o stanovení přechodné úpravy dopravního značení k částečné uzavírce silnice III/2114, ulice Plzeňská a uzavírce ulice Polní, Mariánské Lázně ke stavbě „Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke kasárnům, Mariánské Lázně“. Uvedeným dnem zahájil odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend o opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích. K návrhu přechodné úpravy provozu se souhlasně vyjádřil dotčený orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Policie ČR, Krajské ředitelství Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, dopravní inspektorát č.j.: KRPK-59510/ČJ-2023-190206 ze dne 24.8.2023, s doplněním ze dne 26.3.2024 a majetkový správce komunikace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov. Stavba bude prováděna po etapách, tak aby silnice III/2114 byla průjezdná v jednom jízdním pruhu. Ulice Polní bude po celou dobu stavby uzavřena.

Správní orgán neshledal nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, žádost považuje za důvodnou, vydal toto opatření obecné povahy.

Poučení o opravném prostředku

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn. Ve smyslu § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. Soudního řádu je možný přezkum u soudu.

Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu bude vyvěšeno na úřední desce Města Mariánské Lázně po dobu 15 dnů.

„otisk úředního razítka“

**Olga
Konfrštová**

Podpsal Olga Konfrštová
DN: cn=Olga Konfrštová, o=CZ,
o=Město Mariánské Lázně, ou=187,
email=olga.konfrstova@muml.cz
Datum: 2024.04.04 13:59:46 +02'00'

Olga Konfrštová
odbor dopravy, SH a správních agend
silniční správní úřad

Příloha:
Situace DZ

Městský úřad Mariánské Lázně

Odbor dopravy, silniční správní úřad a správních agend

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 354 922 111

fax: 354 623 186, e-mail: muml@muml.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061, ISDS: bprbqms

Obdrží:

COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, ID: 4indfqd

Na vědomí:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o., Sokolov, ID: 2kdkk64

Město Mariánské Lázně, odbor rozvoje města, investic a dotací, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

DIO - Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám, Mariánské Lázně

Situace širších vztahů

Pozn:

Zobrazené úpravy SDZ budou osazeny po celou dobu realizace DIO.

Autobusové zastávky „Mariánské Lázně „ZŠ Ůšovice“ a „Mariánské Lázně, Ůšovice, st. domky“ budou přesunuty na nová místa.

Přesné termíny budou uvedeny v žádostech.



**viz. Příprava náhradní
autobusové zastávky**

viz. Etapa 1-3



Legenda:

- navrhované přečhodné SDZ
- zněplatněné SDZ
- náhradní trasa pro BUS

26.3.2024 KRPK - 50510 / ČJ-2023 - 190706
DI ŮO Cheb souhlasí dle přiložené situace



ODPRAVY/24/2576-2/16 4.4.24
MĚSTSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
odbor dopravy, silničního hospodářství
a správních agend
Ruská 155, Mariánské Lázně
- 8 -

E 13 (1)

PLATÍ
OD.....
DO.....
MIMO BUS

E 3a (2)

70 m

MAPY.CZ

DIO - Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám,
Mariánské Lázně

Příprava náhradní autobusové zastávky

Pozn:

V rámci pracovního místa dojde k odbagrování pruhu zeleně mezi chodníkem a komunikací a následně pokládce provizorního zpevněného povrchu.

Pracovní místo bude dlouhé max. 30m.

Provoz bude řízen pracovníky, kteří budou prokazatelně řádně poučeni, proškolení a označeni v souladu s vyhl. číslo 294/2015 Sb.


Zbývající šířka komunikace bude minimálně 3m.



26.3.2024 KRPK - 59510 / ČJ-2024 - 190206
DI ÚO Cheb souhlasí dle přiložené situace



OD 14.02.24 1376-2/04 4.4.27
MĚSTSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
odbor dopravy, silničního hospodářství
a správních agend
Ruská 155, Mariánské Lázně
- 8 -

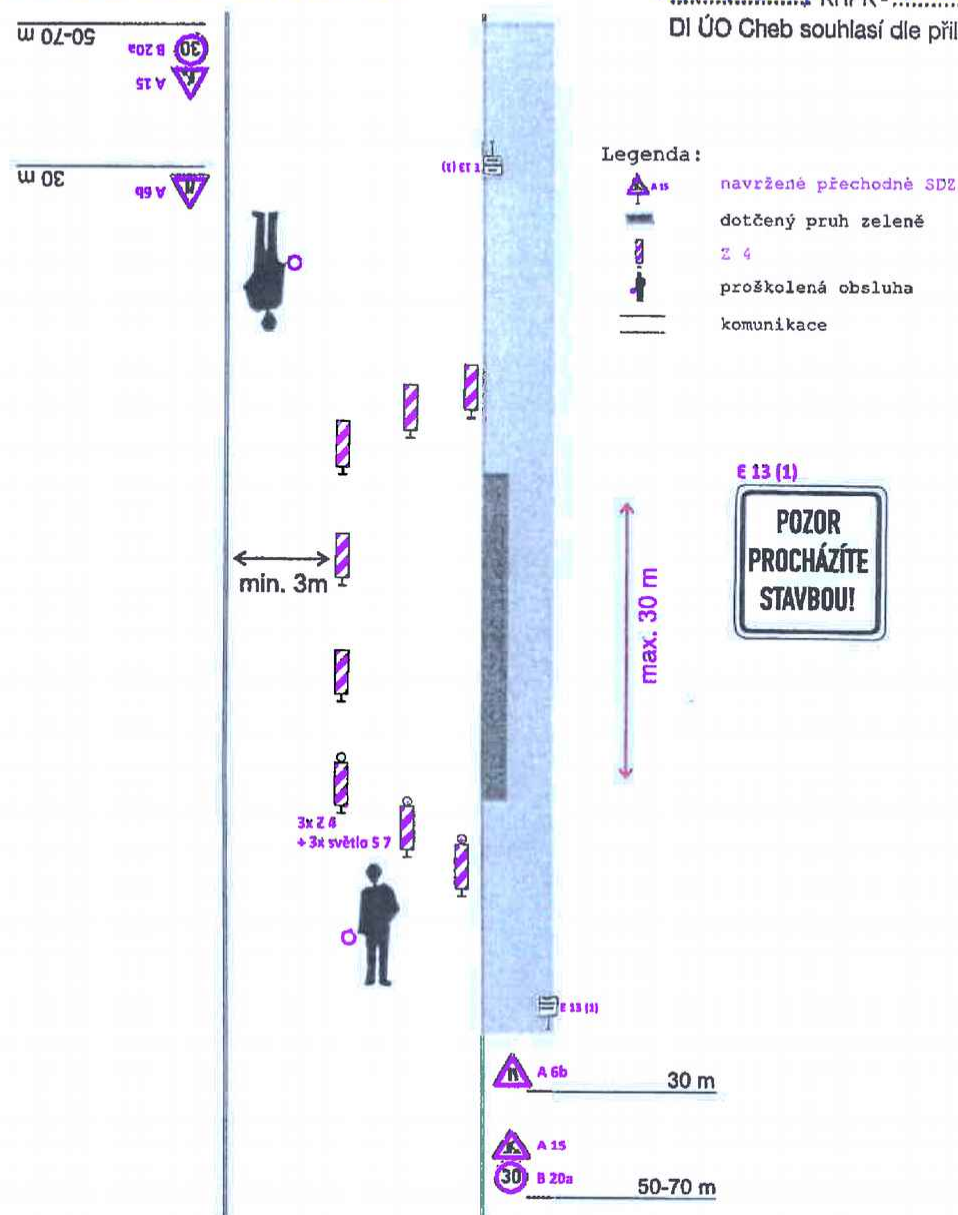

DIO - Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám, Mariánské Lázně
Etapa 1a



Pozn:

Pracovní místo bude ohraničeno zábradlím.

Dopravní zařízení Z 4 bude umístěno v max. rozestupech 10m.

Zbývající šířka komunikace pro každý jízdní pruh bude minimálně 3m.

Autobusové zastávky budou dočasně zrušeny a přesunuty na jiné místo (viz. výkres „Situace širších vztahů“).


Součástí je 1 výkres „Situace širších vztahů“.

Přesné termíny budou uvedeny v žádostech.

26.3.2024 KRPK-59510/ČJ-2023-190206
DI ÚO Cheb souhlasí dle přiložené situace



02.04.2024/29.3.2024 4.4.24
MĚSTSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
odbor dopravy, silničního hospodářství
a správních agend
Ruská 155, Mariánské Lázně
- 8 -

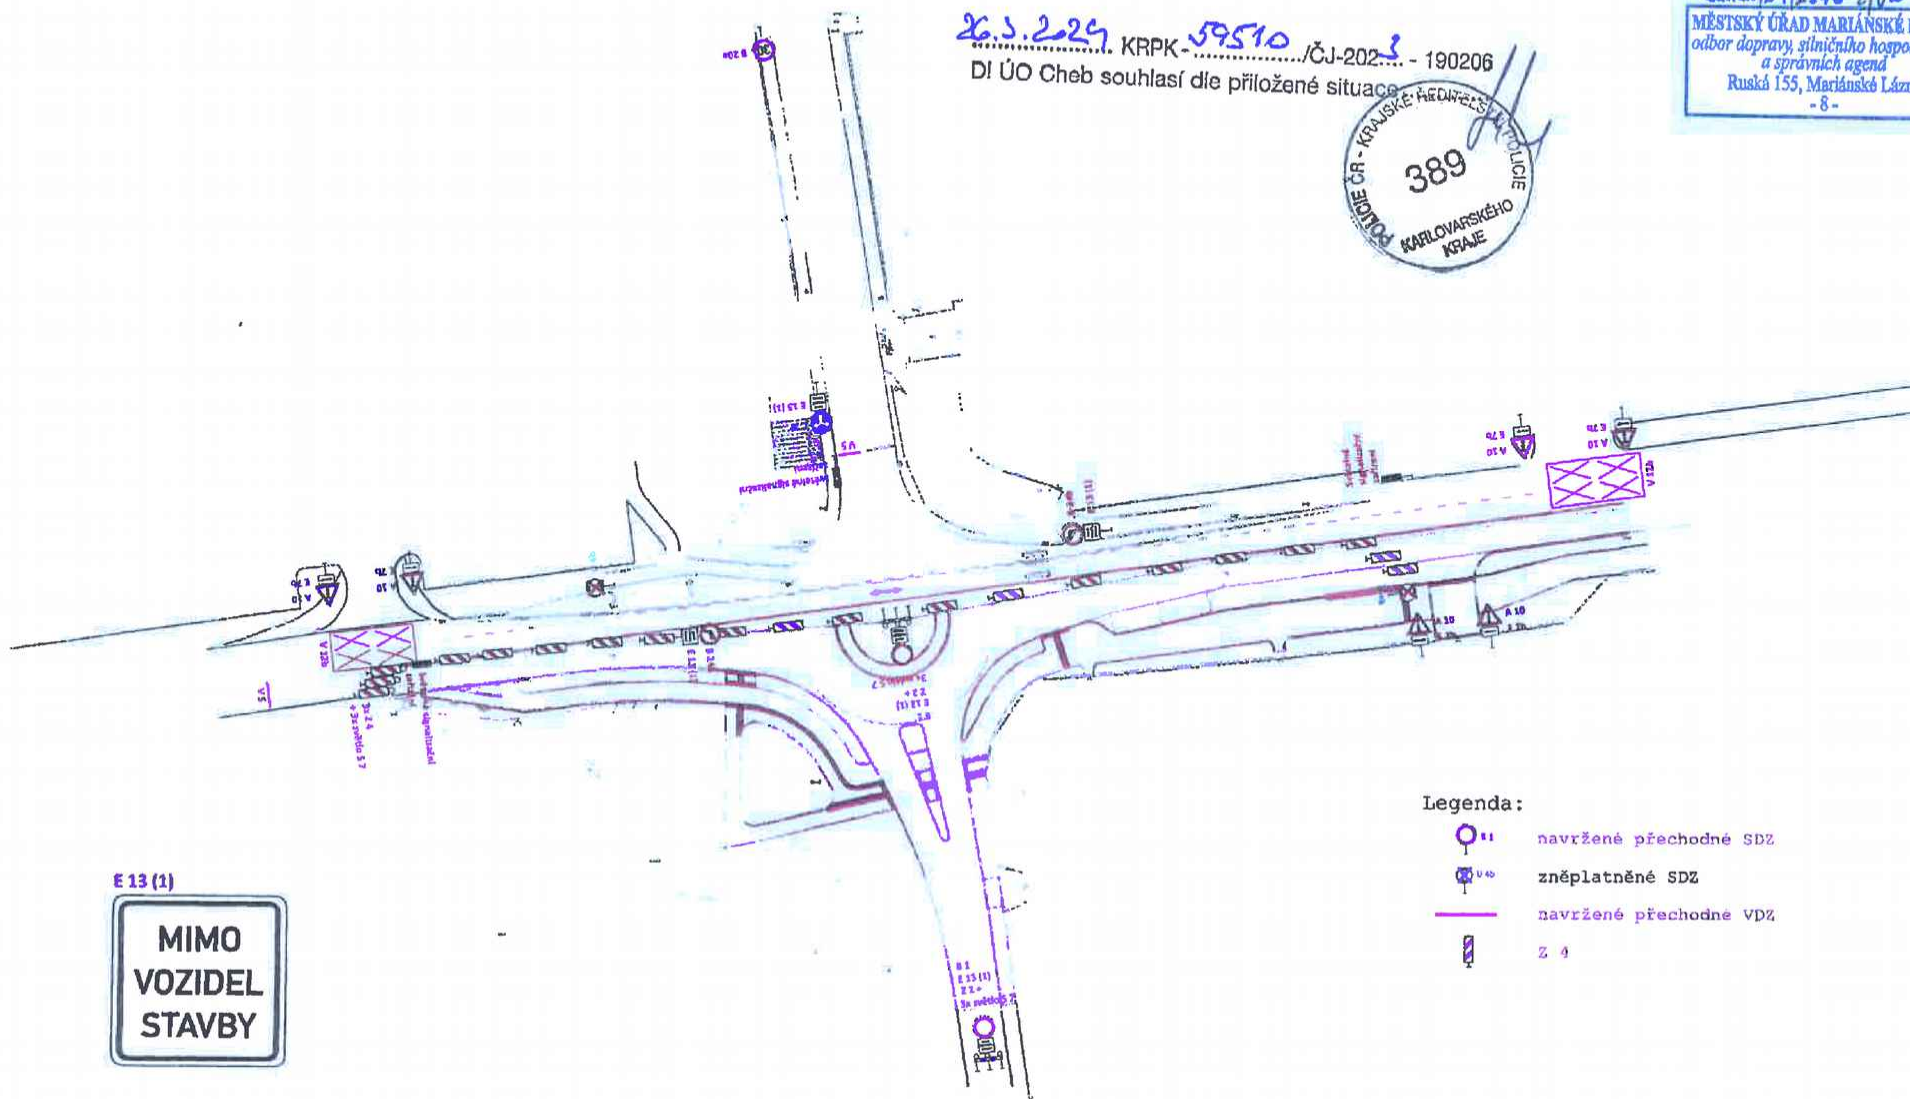

E 13 (1)



Legenda:

- navrhované přechodné SDZ
- zněplatněné SDZ
- navrhované přechodné VPZ
- Z 4

DIO - Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám, Mariánské Lázně
 Etapa 1b




Pozn:
 Pracovní místo bude ohraničeno zábradlím.
 Dopravní zařízení Z 4 bude umístěno v max. rozestupech 10m.
 Zbývající šířka komunikace pro každý jízdní pruh bude minimálně 3m.
 Autobusové zastávky budou dočasně zrušeny a přesunuty na jiné místo (viz. výkres „Situace širších vztahů“).
 Součástí je i výkres „Situace širších vztahů“.
 Přesné termíny budou uvedeny v žádostech.

26.3.2024 KRPK-59510/ČJ-2023-190206
 DI ÚO Cheb souhlasí dle přiložené situace



ONCHSA/24/2576-2/0n 4.4.24
 MĚSTSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
 odbor dopravy, silničního hospodářství
 a správních agend
 Ruská 155, Mariánské Lázně
 - 8 -

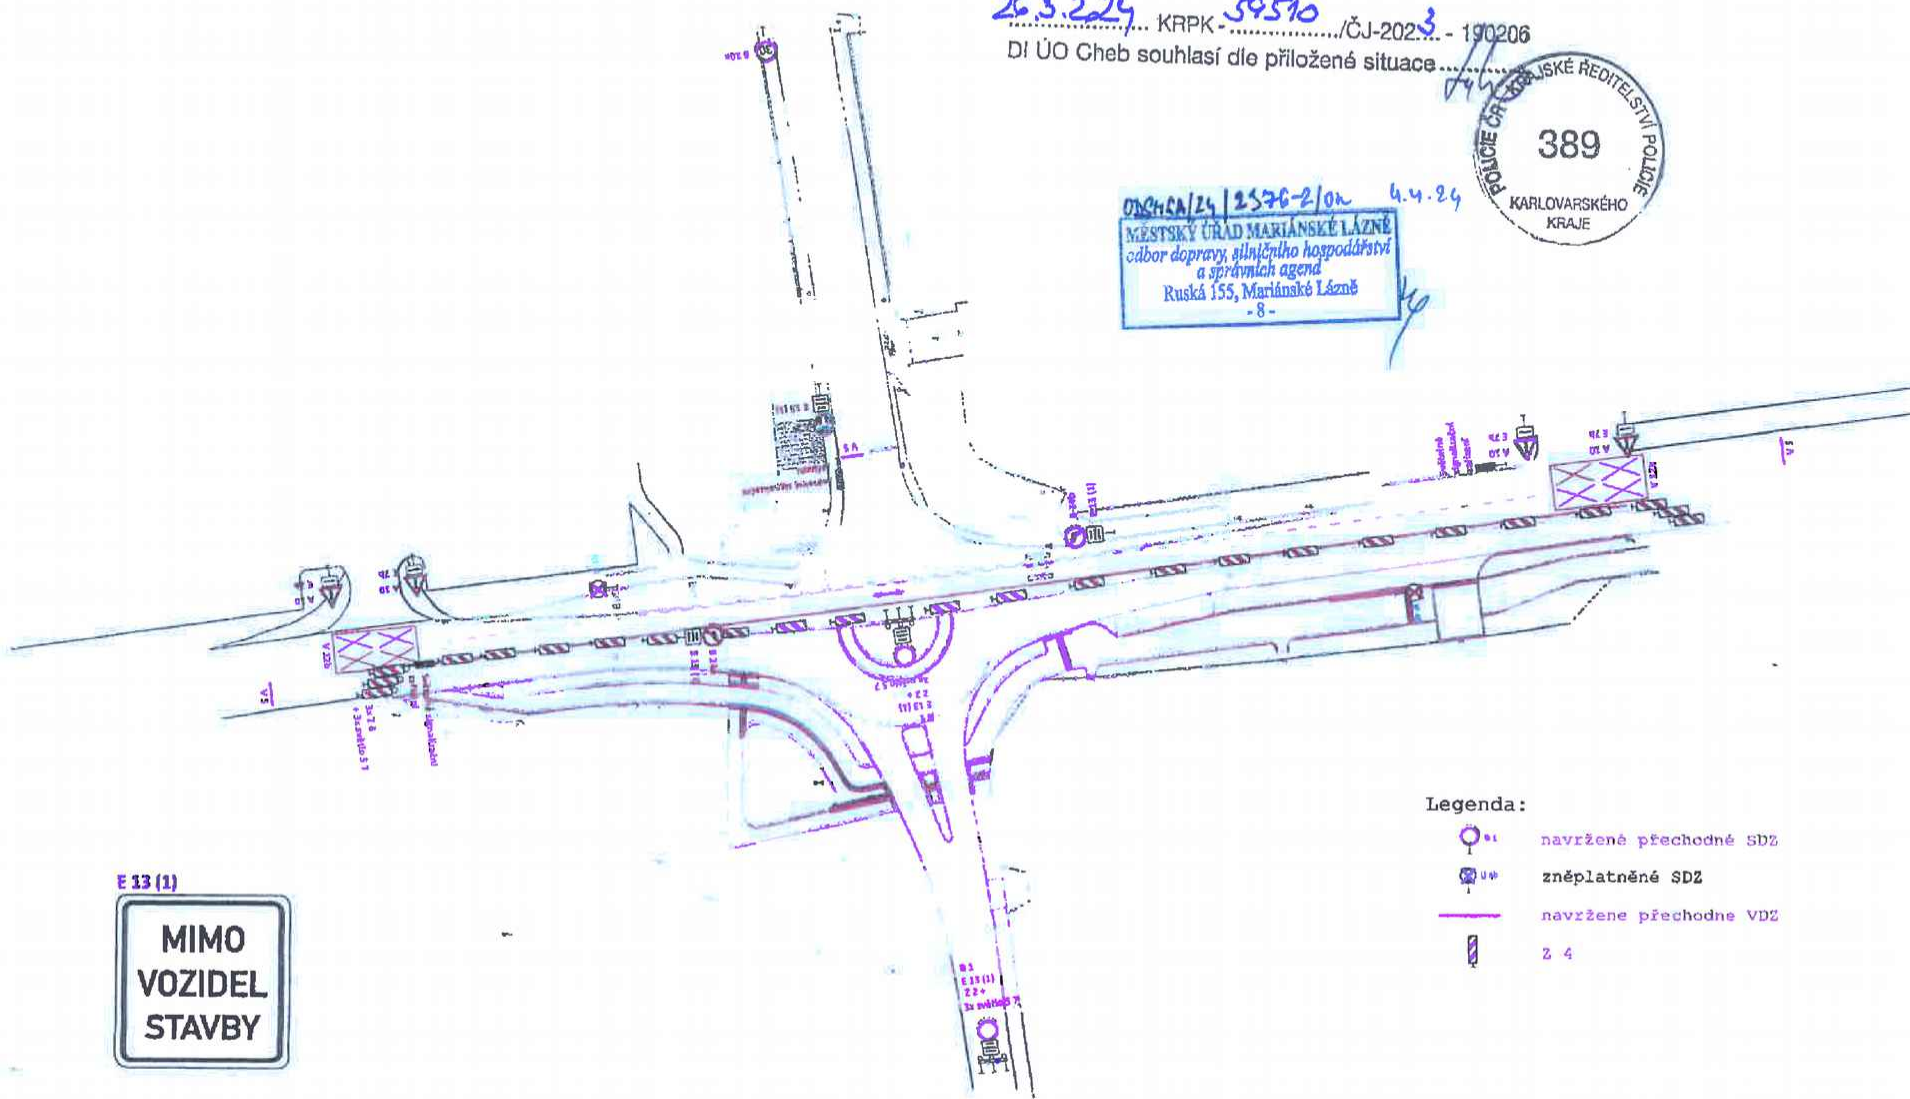

E 13 (1)



Legenda:

- navrhované přechodné SDZ
- zněplatněné SDZ
- navrhované přechodné VDZ
- Z 4

DIO - Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám, Mariánské Lázně
Etapa 2



Pozn:

Pracovní místo bude ohraničeno zábradlím.

Dopravní zařízení Z 4 bude umístěno v max. rozestupech 10m.

Zbývající šířka komunikace pro každý jízdní pruh bude minimálně 3m.

Autobusové zastávky budou dočasně zrušeny a přesunuty na jiné místo (viz. výkres „Situace širších vztahů“).


Součástí je i výkres „Situace širších vztahů“.

Přesné termíny budou uvedeny v žádostech.

26.3.2024 KRPK-59570 /ČJ-2023-190206
DI ÚO Cheb souhlasí dle přiložené situace..



025H14/24/2326-2/02 6.4.24
MĚSTSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
odbor dopravy, státního hospodářství
a správních agend
Ruská 155, Mariánské Lázně
- 8 -

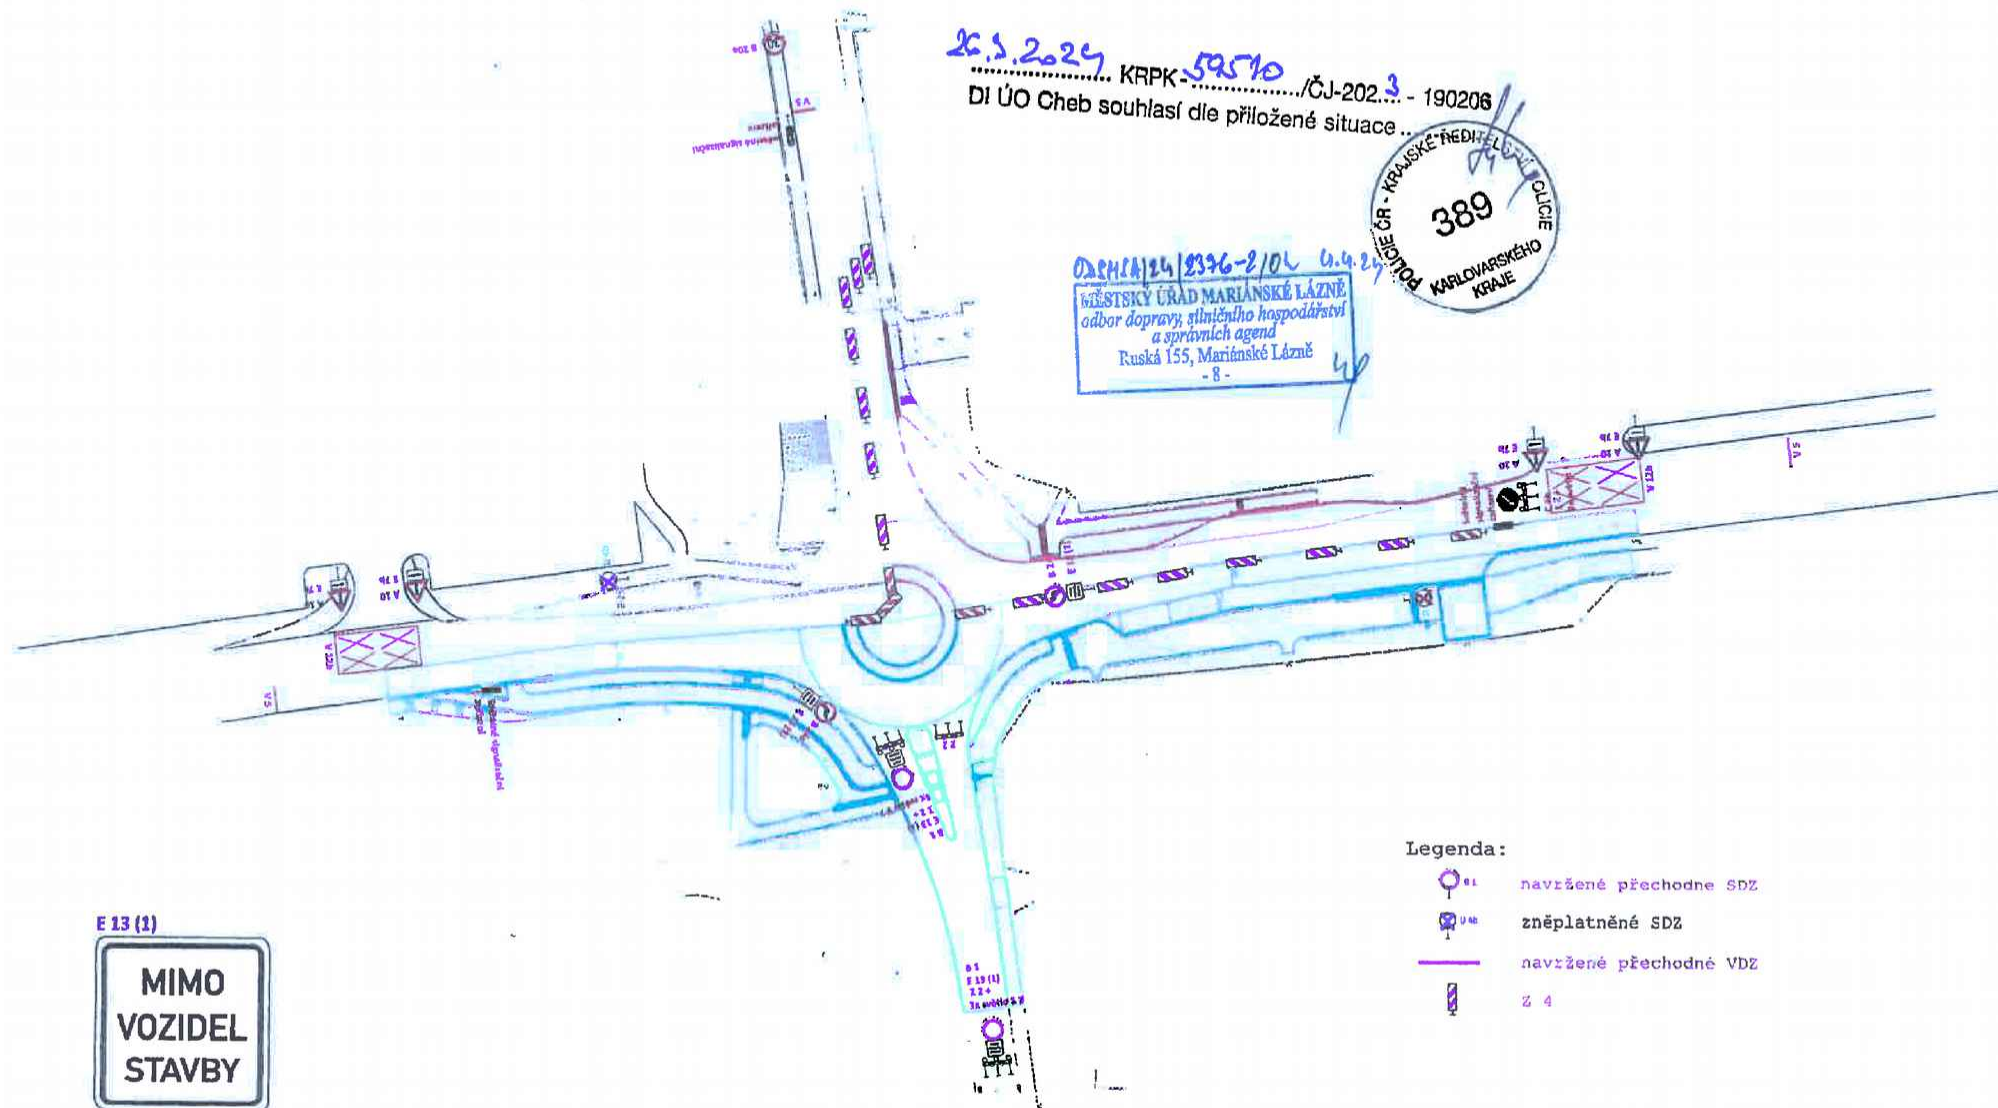

E 13 (1)

MIMO
VOZIDEL
STAVBY

DIO - Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám, Mariánské Lázně Etapa 3



Pozn:

Pracovní místo bude ohraničeno zábradlím.


Dopravní zařízení Z 4 bude umístěno v max. rozestupech 10m.

Zbývající šířka komunikace pro každý jízdní pruh bude minimálně 3m.

Autobusové zastávky budou dočasně zrušeny a přesunuty na jiné místo (viz. výkres „Situace širších vtahů“).

Součástí je i výkres „Situace širších vtahů“.

Přesné termíny budou uvedeny v žádostech.

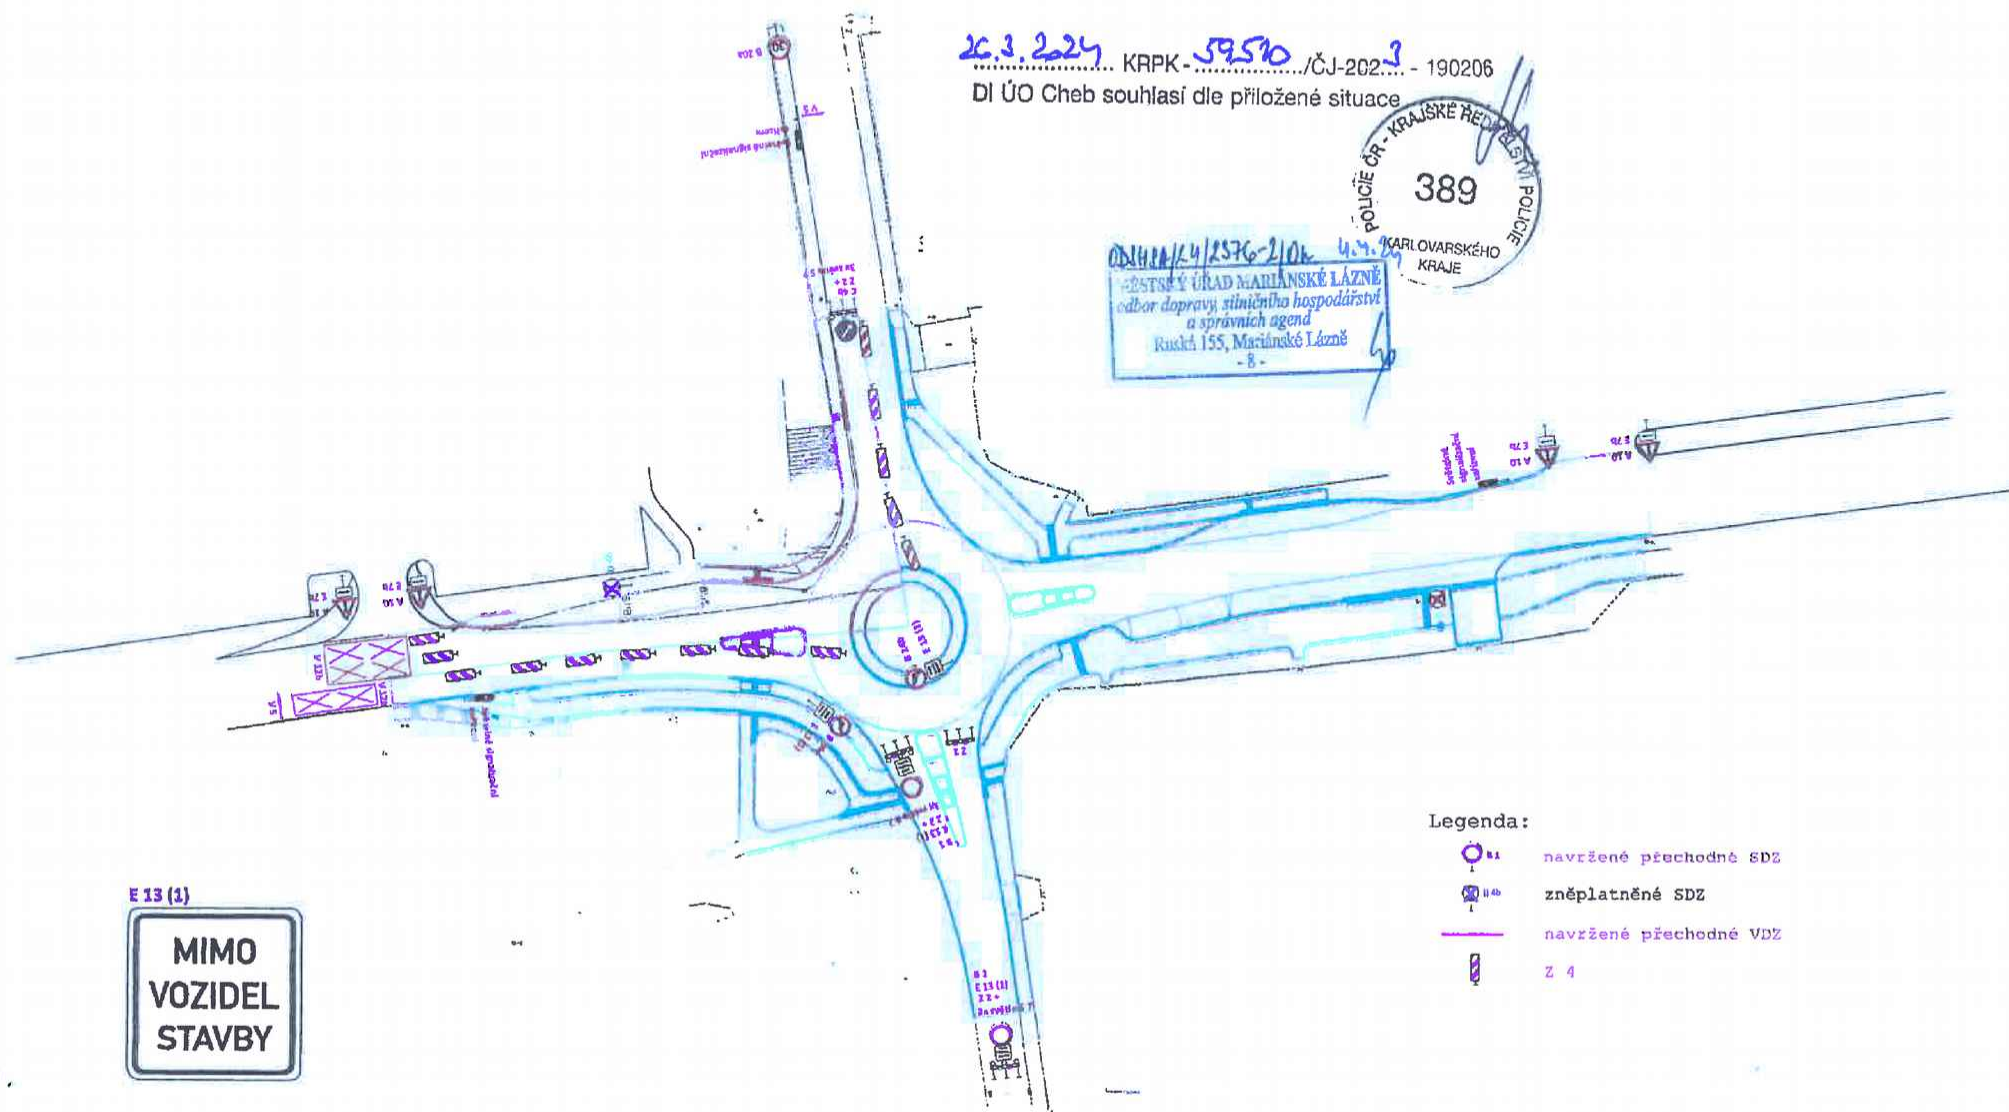

24.8.2023 KPPK -/ČJ-2023... 190206
DI ÚO Cháb souhlasí dle přiložené situace.....

DI ÚO Chéb souhlasí dle příložené situace.....


MĚSTSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
odbor dopravy, silničního hospodářství

stavky, směřujícího hospodářství
a správních agend

úprava 159 Kvalitativní vyhodnocení

Ruská 155, Mariánské Lázně

8

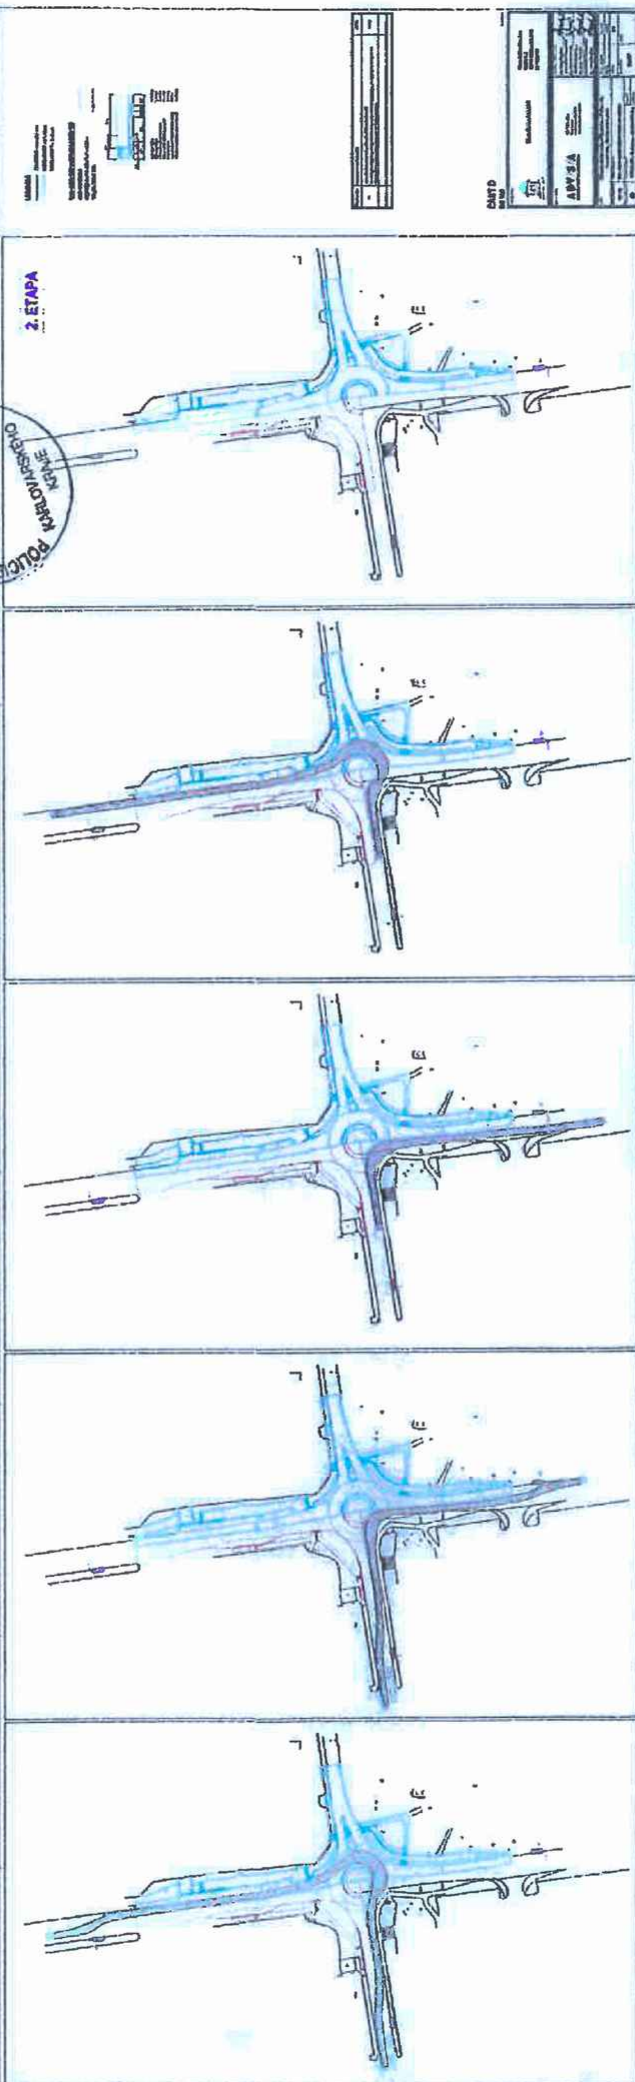[illegible][illegible]



Firma: COLAS CZ, a.s.

Změnový list

2

Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně
Objekt: 2 část město Mariánské Lázně
Rozpočet: SO 180.2 Dopravně inženýrská opatření - město Mariánské Lázně

SO 180.1	124 446,05
----------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
NOVA POLOŽKA							158 385,50
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	87 400,00	87 400,00
			ZŘÍZENÍ DOČASNÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PO DOBU VYSTAVBY S PŘELOŽENÍM	KPL	1,000	70 985,50	70 985,50

DIO na základě zpracování a odsouhlasení ze dne 26.3.2024 č.j. KRPK-59510/2023-190206, Rozhodnutí č.j. ODSHSA/24/2589-3/OK

001	711132101		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	22,500	30,30	681,75
002	693112280		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	24,750	29,10	720,23
007	065002000		Mimostaveništní doprava materiálů - dovoz + odvoz panelů	km	132,000	73,00	9 636,00
003	584121112		Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2	m2	22,500	135,00	3 037,50
005	593810020		panel silniční 3,00x1,20x0,215m - pronájem po celou dobu používání	KUS	5,000	4 000,00	20 000,00
004	998226011		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	5,625	306,00	1 721,25
008	567141112		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 220 mm	m2	22,500	585,00	13 162,50
009	113151111		Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	22,500	66,80	1 503,00
010	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,630	715,00	4 025,45
011	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,320	50,90	16,29
012	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,630	12,90	72,63
013	997231119		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	0,320	19,10	6,11
014	997013645		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,320	2 780,00	889,60
015	997241547		Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	5,630	1 640,00	9 233,20
016	HZS4232		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	628,00	1 256,00
017	HZS4232		Hodinová zúčtovací sazba - řízení dopravy po dobu prací	hod	8,000	628,00	5 024,00
ODPOČET							-33 939,45
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	-1,000	33 939,45	-33 939,45

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

Datum vydání požadavku:

26.7.24

Adresa objednatele:

Město Mariánské Lázně

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

OBJEKT SO 501 GasNet - přeložka plyn.

➤ **Popis změny, technického řešení:**

Provedení části výkopů bezvýkopovou technologií.

➤ **Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Veškeré plynovodní potrubí realizováno pomocí otevřeného výkopu, a to vč. Frekventovaných komunikací ul. Plzeňská a Ke Kasárnům.

➤ **Zdůvodnění změny:**

Podaná žádost o provedení překopu komunikace Ke Kasárnám, Plzeňská na DI PČR pro uložení přeložky plynovodního vedení SO 501 byla zamítnuta. Je nezbytné tak použít jinou technologii pro uložení vedení – bezvýkopovou technologii.

➤ **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Nemá vliv na projektovou dokumentaci.

➤ **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

- **Termín :**
Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD.
- **Cena :**
Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to :

- Odpočet - 56 030,82 Kč
- Přípočet 164 917,10 Kč

Přípočet k SOD 108 886,28 Kč

2

Příloha :

- Kalkulace
- Vyjádření DI PČR

**COLAS****Od :** COLAS CZ,a.s.**Pro :** DI PČR**Věc :** ŽÁDOST O UMOŽNĚNÍ UZAVENÍ KOMUNIKACE ul. PLZEŇSKÁ, ul. KE KASÁRNŮM, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Naše společnost COLAS CZ,a.s. je zhotovitelem stavebních prací na komunikacích Plzeňská, Ke Kasárnům Mariánské Lázně. Na těchto komunikacích je stanoveno DIO ze dne 26.3.2024 č.j. KRPK-59510/2023-190206, Rozhodnutí č.j. ODSHSA/24/2589-3/OK. Zhotovitel žádá o možnost provedení otevřeného překopu po polovinách u výše zmíněných komunikací. Otevřený výkop je plánovaný dle PD pro přeložku plynu SO 501.

**COLAS**
COLAS CZ – OBLAST ZÁPAD

Divize silničního stavitelství

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

 www.colas.cz

*DI Cheb požaduje provést dle schváleného DIO.
Nelec provádět překop po polovinách vzhledem k
trajektologii vozidel a to zejména NA.*

8.4.2024



Firma: COLAS CZ, a.s.

Změnový list

3

Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně
Objekt: 02 část město Mariánské Lázně
Rožpočet: SO 501 GasNet - přeložka plynovodu

SO 501	108 886,28
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce						14 644,56	
42	132351101		Hloubení rýh š. do 800mm v horn. tř. 4	M3	8,000	1 830,57	14 644,56
			zřízení starovací jámy				
NOVA POLOŽKA						150 272,54	
Zemní práce						150 272,54	
	rozpis		Rízený protlak pod komunikaci	M	22,000	6 830,57	150 272,54
	141721219		Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 315 do 355 mm v horní třídě těžite	m	22,000	6 400,00	140 800,00
	P000000901		Příplatek za ztížené prostředí sk.9 tř.0	hod	32,000	33,00	1 056,00
	HZS4232		Hodinová zučtovací sazba technik odborný - čestění technologi, sestavení a demontáž technologie	hod	13,400	628,00	8 415,20
ODPOČET						-56 030,82	
42	132351101		Hloubení rýh š. do 800mm v horn. tř. 4	M3	-17,600	1 830,57	-32 218,03
47	162751137		Vodorov. přemístění výkop. z hor. 4. 10 km	M3	-17,600	400,22	-7 043,87
			obsyp, lože, zásyp, konstrukcepol. 4 + pol. 5a+5b(37,0x0,80x0,60) - z pol. 5c				
			odpočet otevřený výkop				
	01		Stěrkodrt.fr. 0-22 - zásyp	T	-13,200	548,03	-7 234,00
	174111101		Zásyp rýh a šachet se zhutněním - ŠD	M3	-8,800	289,94	-2 551,47
	175111101		Obsyp potrubí a dílů se zhutněním - písek	M3	-7,400	943,71	-6 983,45

Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

Datum vydání požadavku:

26.7.24

Adresa objednatele:

Město Mariánské Lázně

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**OBJEKT SO 000.2 Všeobecné a ostatní
náklady - město Mariánské Lázně**

➤ Popis změny, technického řešení:

Veškeré pomocné stavební, zabezpečovací, ochranné práce včetně zřízení a udržování staveništních dopravních tras pro práce třetích subjektů – přeložky inženýrských sítí.

➤ Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení nebylo řešeno.

➤ Zdůvodnění změny:

Veškeré pomocné stavební, zabezpečovací, ochranné práce včetně zřízení a udržování staveništních dopravních tras pro práce třetích subjektů – přeložky inženýrských sítí.

➤ Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na projektovou dokumentaci.

➤ Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Termín :
Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD.
- Cena :
Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to :

- Přípočet 14 400,00 Kč

Přípočet k SOD 14 400,00 Kč



Firma: COLAS CZ, a.s.

Změnový list

4

Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám, Mariánské Lázně
Objekt: 02 část město Mariánské Lázně
Rožpočet: 000.2 Všeobecné a ostatní náklady - město Mariánské Lázně

000.2	14 400,00
-------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
NOVA POLOZKA - PRIPOČET							
						14 400,00	

	R	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	hod	60,000	240,00	14 400,00
--	---	--	-----	--------	--------	-----------

Veškeré pomocné stavební, zabezpečovací, ochranné práce včetně zřízení a udržování staveništních dopravních tras pro práce třetích subjektů – přeložky inženýrských sítí.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

Datum vydání požadavku:

26.7.24

Adresa objednatele:

Město Mariánské Lázně

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

OBJEKT SO 401 Veřejné osvětlení

➤ Popis změny, technického řešení:

Projektová dokumentace vykazuje nesoulad mezi VV a výkresovou částí.

➤ Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

VV zadávací dokumentace je nekompletní.

➤ Zdůvodnění změny:

Po konzultaci se zpracovatelem PD byl doplněn VV. Výsledkem je rozdílový VV.

Jedná se o :

- 1) ve výkazu výměr chybí výložníky přechodovým svítidlům a jak dlouhé ?
v TZ není uvedeno ani ve světelném výpočtu , prosím o upřesnění včetně změny výkazu výměru.
- 2) osazení přechodových stožárů -
v TZ se uvádí, že stožáry jsou 1m před přechodem - stožár SP3 je za přechodem
- 3) u světelného bodu SN6 jsou 2 svítidla zřejmě silniční jak je tohle plánováno osadit ?
v VV je k tomu přírubový 2 metrový výložník ?

➤ Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude zpracováno do DSPS.

➤ Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Termín :
Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD.

- Cena :
Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to :

- Přípočet 78 314,53 Kč

Přípočet k SOD 78 314,53 Kč

Z

Příloha :

- Kalkulace
- Rozdílový VV

From: Robert Weisz <robert.weisz@advisia.cz>
Sent: Tuesday, June 11, 2024 1:05 PM
To: Svoboda Jarmil <Jarmil.Svoboda@mumli.cz>
Cc: SINKULE, Tomáš (SGCZE) <tomas.sinkule@colas.cz>
Subject: FW: SO 401 - OK Mariánské Lázně

Warning : Message sent from Internet from robert.weisz@advisia.cz

Do not click on the links or attachments unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den

zřejmě se nám tento mail někde toulal, omlouvám se a posíláme.

S pozdravem



www.advisia.cz

From: Petr Krupička
Sent: Thursday, May 23, 2024 4:22 PM
To: Tereza Skorpilova <terez.skorpilova@advisia.cz>
Cc: Rostislav Brož <rostislav.broz@plancon.cz>
Subject: RE: SO 401 - OK Mariánské Lázně

Dobrý den,

odpovědi píšu přímo k otázkám a opravený VV je v příloze. **Označené změny**


| petr.krupicka@plancon.cz

From: Tereza Skorpilova <terez.skorpilova@advisia.cz>
Sent: Wednesday, May 22, 2024 12:08 PM
To: Petr Krupička <petr.krupicka@plancon.cz>; Rostislav Brož <rostislav.broz@plancon.cz>
Cc: Robert Weisz <robert.weisz@advisia.cz>
Subject: FW: SO 401 - OK Mariánské Lázně

Ahoj.

Prosím o reakce na dotazy níže...

Díky, T.



ADVISIA s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, www.advisia.cz

From: SINKULE, Tomáš (SGCZE) <tomas.sinkule@colas.cz>
Sent: Wednesday, May 22, 2024 10:40 AM
To: Tereza Skorpilova <tereza.skorpilova@advisia.cz>
Cc: BALÁK, Petr (SGCZE) <petr.balak@colas.cz>; Martin Fiury <martin.fiury@hotelservis.cz>; richard.stoklasa@seznam.cz; Svoboda Jarmil <Jarmil.Svoboda@mumli.cz>
Subject: SO 401 - OK Mariánské Lázně

Dobrý den,

Obracím se na Vás jako na AD akce III/2114 OK Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně. Níže přeposílám dotazy subdodavatele pro SO 401 Veřejné osvětlení ohledně nesouladu textové a výkresové části PD, či výkazu výměr.

Prosím o odpovědi,

1) **ve výkazu výměr chybí výložníky přechodovým svítidlům a jak dlouhé ?**

v TZ není uvedeno ani ve světelném výpočtu , prosím o upřesnění včetně změny výkazu výměru. **V opraveném VV je specifikace na kterých stožárech jsou jaké výložníky**

2) **osazení přechodových stožárů -**

v TZ se uvádí, že stožáry jsou 1m před přechodem - stožár SP3 je za přechodem , prosím upřesnit, **Přechod osvětlen z jedné strany, stožár za přechodem, lomený výložník (na konci), svítidlo kolmo na vozovku**

3) **u světelného bodu SN6 jsou 2 svítidla zřejmě silniční jak je tohle plánováno osadit ?**

v VV je k tomu přírubový 2 metrový výložník ? Kam směřovat svítidla, dle situace jsou směrem ke komunikaci pod úhlem cca 30 stupňů. **Sn6 – stožár na něm výložník V1/114-1000 pro osvětlení komunikace a třmenový výložník v 6m na osvětlení přechodu.**

Všechna svítidla směřovat kolmo na komunikaci

Děkuji,



COLAS CZ – Divize silničního stavitelství

Oblast Západ

Sedlecká 271/10

360 10 Karlovy Vary

www.colas.cz

Tento e-mail včetně jeho příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud Vám byl doručen omylem, prosím informujte o tom e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému.

Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

Není-li výslovně uvedeno jinak, informace obsažené v tomto e-mailu jsou nezávazné povahy, nezakládají jakékoliv závazky či povinnosti společnosti COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9. Pokud je součástí tohoto e-mailu nabídka, odesílatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou. Pokud je tento e-mail součástí jednání o smlouvě, má odesílatel právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, například pokud nebudou získána potřebná interní schválení, přičemž příslušná smlouva bude uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím obsahu.

Materiály	Popis	Cena za jedn.	Množství vč změny	Množství dle SoD	Jednotka	Celková cena bez DPH vč změny	Celková cena bez DPH v SoD	Rozdíl Kč bez DPH
Stožár bezpatřicový třístupňový silniční s manžetou, žárový zinek-včetně přesouvaného	JB 8 T, 159/133/114mm	17 332,43 Kč	7	6	ks	121 327 Kč	103 995 Kč	17 332 Kč
Stožár bezpatřicový třístupňový silniční s manžetou, žárový zinek - přechod 6m	STP 6-B	14 257,98 Kč	7	7	ks	99 806 Kč	99 806 Kč	0 Kč
Výložník rovný, žárový zinek Sn2	V4/114-1000	2 114,82 Kč	1	1	ks	2 115 Kč	2 115 Kč	0 Kč
Výložník rovný, žárový zinek Sn1, Sn4, Sn5	V2/114-1000/180	1 750,98 Kč	3	3	ks	5 253 Kč	5 253 Kč	0 Kč
Výložník rovný, žárový zinek Sn3, Sn6, vč. přesouvaného	V1/114-1000	2 114,82 Kč	3	3	ks	6 344 Kč	4 230 Kč	2 115 Kč
Výložník obloukový třmenový přechod Sn6	VT 1 - 2000	11 961,24 Kč	1	1	ks	11 961 Kč	11 961 Kč	0 Kč
Výložník rovný, žárový zinek Sp1,Sp2, Sp4, Sp5, Sp6, Sp7	UD 1 - 2000/B	2 887,98 Kč	6	3	ks	17 328 Kč	5 776 Kč	11 552 Kč
Výložník rovný, zalomený žárový zinek Sp3	UD 1 - 2000/B	18 000,00 Kč	1	0	ks	18 000 Kč	0 Kč	18 000 Kč
Elektrovýzbroj 1 pojistka	SV-x9.35.4p vč. pojistky	659,46 Kč	9	8	ks	5 935 Kč	5 276 Kč	659 Kč
Elektrovýzbroj 2 pojistky	SV-x9.35.4p vč. pojistek	704,94 Kč	4	4	ks	2 820 Kč	2 820 Kč	0 Kč
Elektrovýzbroj 4 pojistky	SV-x9.35.4p vč. pojistek	773,16 Kč	1	1	ks	773 Kč	773 Kč	0 Kč
Připojovací pojistková skříň	PS1 63A na sloup	2 887,98 Kč	1	1	ks	2 888 Kč	2 888 Kč	0 Kč
Ocelová instalační trubka 3m	KOPOS 6032 ZNM	613,98 Kč	1	1	ks	614 Kč	614 Kč	0 Kč
Svitidlo LED, silniční	dle světelného výpočtu	14 257,98 Kč	13	13	ks	185 354 Kč	185 354 Kč	0 Kč
Svitidlo LED, silniční, přechod pro chodce OK	dle světelného výpočtu	14 257,98 Kč	7	7	ks	99 806 Kč	99 806 Kč	0 Kč
Zemní vedení - včetně přesouvaného	CYKY-J 4x16	272,88 Kč	270	260	m	73 678 Kč	70 949 Kč	2 729 Kč
Kabel pro svítidla - vánoční osvětlení	CYKY-J 3x4	101,19 Kč	35	35	m	3 542 Kč	3 542 Kč	0 Kč
Kabel pro svítidla - včetně přesouvaného	CYKY-J 3x1,5	27,29 Kč	160	150	m	4 366 Kč	4 094 Kč	273 Kč
Krabice instalační	IP 67	293,35 Kč	1	1	ks	293 Kč	293 Kč	0 Kč
Kabelová průchodka PG 11	PG 11	15,92 Kč	1	1	ks	16 Kč	16 Kč	0 Kč
Chráníč proudový kombinovaný	2p C 10A 300mA A 10kA	1 750,98 Kč	1	1	ks	1 751 Kč	1 751 Kč	0 Kč
Svorka spojovací pásek-drát - včetně přesouvaného	SR 3k	39,80 Kč	28	26	ks	1 114 Kč	1 035 Kč	80 Kč
Svorka spojovací pásek-pásek - včetně přesouvaného	SR2	39,80 Kč	16	14	ks	637 Kč	557 Kč	80 Kč
Kabelové oko šroubové - včetně přesouvaného	M10	61,40 Kč	14	13	ks	860 Kč	798 Kč	61 Kč
Zemnicí pásek - včetně přesouvaného	FeZn 30x40	67,08 Kč	205	200	kg	13 751 Kč	13 416 Kč	335 Kč
Zemnicí drát - včetně přesouvaného	FeZn 10	67,08 Kč	22	20	kg	1 476 Kč	1 342 Kč	134 Kč
Chráníčka Kopoflex - včetně přesouvaného	průměr 50	27,29 Kč	215	205	m	5 867 Kč	5 594 Kč	273 Kč
Zinek ve spreji do 600°C. 400ml	otvor pro průchodku	284,25 Kč	1	1	ks	284 Kč	284 Kč	0 Kč
Systém Bandimex	sestava na jeden stožár	170,55 Kč	2	2	ks	341 Kč	341 Kč	0 Kč
Výstražná folie - včetně přesouvaného	červená s bleskem	6,82 Kč	215	205	m	1 466 Kč	1 398 Kč	68 Kč
Zemní kabelová spojka (Univerzální kabelový soubor Al+Cu 4x16 až 4x50) - včetně přesouvaného	SLV-SV 16-50	1 011,93 Kč	4	2	ks	4 048 Kč	2 024 Kč	2 024 Kč
Pomocný materiál	sada	2 274,00 Kč	1	1	SADA	2 274 Kč	2 274 Kč	0 Kč
Celkem materiály						696 088 Kč	640 373 Kč	55 715 Kč

Montážní práce	Popis	Cena za jedn.	Množství vč změny	Množství dle SoD	Jednotka	Celková cena bez DPH vč změny	Celková cena bez DPH v SoD	Rozdíl Kč bez DPH
Demontáž starých stožárů vč. patek a výložníků - včetně přesouvaného		511,65 Kč	13	12	h	6 651 Kč	6 140 Kč	512 Kč
Demontáž svítidel - včetně přesouvaného		511,65 Kč	7	6	h	3 582 Kč	3 070 Kč	512 Kč
Odpojení starého vedení, odpojení odboček, zapojení odboček - včetně přesouvaného		511,65 Kč	7	6	h	3 582 Kč	3 070 Kč	512 Kč
Hloubení rýh do šířky 600mm - včetně přesouvaného		397,95 Kč	215	205	m	85 559 Kč	81 580 Kč	3 980 Kč
Hloubení šachet pro patky - včetně přesouvaného		1 193,85 Kč	14	13	ks	16 714 Kč	15 520 Kč	1 194 Kč
Obvaz kabelu, vč. položení výstražné folie - včetně přesouvaného	kopaný písek	1 011,93 Kč	10	9	m3	10 119 Kč	9 107 Kč	1 012 Kč
Zásyp výkopu, zhutnění - včetně přesouvaného		214,89 Kč	215	205	m	46 201 Kč	44 052 Kč	2 149 Kč
Ukotvení sloupů včetně materiálu - včetně přesouvaného	beton a zásyp	1 011,93 Kč	14	13	ks	14 167 Kč	13 155 Kč	1 012 Kč
Instalace stožárů - včetně přesouvaného		1 421,25 Kč	14	13	h	19 898 Kč	18 476 Kč	1 421 Kč
Montáž výložníků - včetně přesouvaného		402,50 Kč	13	8	ks	6 038 Kč	3 623 Kč	2 415 Kč
Montáž svítidel s přívodem - včetně přesouvaného		513,92 Kč	21	20	ks	10 792 Kč	10 278 Kč	514 Kč
Uložení zemního vedení - kabel silový s Cu jádrem 4x16mm2 - včetně přesouvaného		61,40 Kč	215	205	m	13 201 Kč	12 587 Kč	614 Kč
Příplatek za zatahování do chráničky do 0,75kg/m - včetně přesouvaného		28,43 Kč	215	205	m	6 112 Kč	5 828 Kč	284 Kč
Uložení uzemnění - zemnicí pásek - včetně přesouvaného		61,40 Kč	215	205	m	13 201 Kč	12 587 Kč	614 Kč
Připojení odboček drát do 10mm, uzemnění, včetně ošetření nátěrem - včetně přesouvaného		511,65 Kč	14	13	h	7 163 Kč	6 651 Kč	512 Kč
Montáž kabelové zemní spojky - včetně přesouvaného		966,45 Kč	4	2	ks	3 866 Kč	1 933 Kč	1 933 Kč
Dělení a montáž ocelových trubek		511,65 Kč	1	1	h	512 Kč	512 Kč	0 Kč
Montáž připojovací skříňové systém Bandimex		511,65 Kč	1	1	h	512 Kč	512 Kč	0 Kč
Vyvrátání a vyzávítování otvoru pro průchodku	PG 11	511,65 Kč	1	1	h	512 Kč	512 Kč	0 Kč
Zimkování otvoru pro průchodku PG 11		511,65 Kč	0,5	0,5	h	256 Kč	256 Kč	0 Kč
Připojení svítidla a elektrovýzbroje stožárů (vč. připojovací skříň) - včetně přesouvaného		511,65 Kč	21	20	h	10 745 Kč	10 233 Kč	512 Kč
Připojení zemnicích drátů ke stožárům - včetně přesouvaného		511,65 Kč	8	7	h	4 093 Kč	3 582 Kč	512 Kč
Práce plošiny - včetně přesouvaného		682,20 Kč	33	32	h	22 513 Kč	21 830 Kč	682 Kč
Poplatek za recyklaci svítidla		7,96 Kč	20	20	ks	159 Kč	159 Kč	0 Kč
Poplatek za recyklaci světelného zdroje		7,96 Kč	20	20	ks	159 Kč	159 Kč	0 Kč
Odvoz sutí - beton do 20km, včetně likvidace - včetně přesouvaného		1 705,50 Kč	4	3	m3	6 822 Kč	5 117 Kč	1 706 Kč
Odvoz demontovaných stožárů, výložníků, svítidel do 10km	dle požadavku správce VO	4 548,00 Kč	1	1	ks	4 548 Kč	4 548 Kč	0 Kč
Celkem montážní práce						317 676 Kč	295 077 Kč	22 599 Kč

Práce v HZS	Popis	Cena za jedn.	Množství vč změny	Množství dle SoD	Jednotka	Celková cena bez DPH vč změny	Celková cena bez DPH v SoD	Rozdíl Kč bez DPH
Práce v HZS		512 Kč	16	16	h	8 186 Kč	8 186 Kč	0 Kč
Vytýčení stávajících sítí všech správců		0 Kč	1		ks	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Geodetické zaměření		0 Kč	1		ks	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Revize	sada	6 140 Kč	1	1	ks	6 140 Kč	6 140 Kč	0 Kč
Celkem práce v HZS						14 326 Kč	14 326 Kč	0 Kč

Cena celkem bez DPH						1 028 090,28 Kč	949 775,75 Kč	78 314,53 Kč
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	--------------

Poznámka: Do stožárů SN2 vrtat otvor pro kabelovou průchodku PG 11 (CYKY-J 3x1,5) - vánoční osvětlení.



Firma: COLAS CZ, a.s.

Změnový list

5

Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám, Mariánské Lázně
Objekt: 02 část město Mariánské Lázně
Rozpočet: SO 401 Veřejné osvětlení

SO 401	78 314,53
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			NOVA POLOŽKA				78 314,53
1		01	Přípočet dle VV	kpl	1,000	78 314,53	78 314,53

Požadavek zhotovitele na změnu č. 6

Projekt: III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

Datum vydání požadavku:

26.7.24

Adresa objednatele:

Město Mariánské Lázně

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

OBJEKT SO 303 Přeložka kanalizace

➤ Popis změny, technického řešení:

Projektové práce byly provedeny na základě vyjádření správců sítí. Přesná poloha je známa in situ.

➤ Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Při zpracování PD nelze přesně predikovat průběh veškerých podzemních sítí.

➤ Zdůvodnění změny:

- Na základě upřesnění napojení stávající x nové kanalizace v šachtě KŠ2 a splnění požadavku CHEVAK a.s. pro osazení vyrovnávací propojovací atypické šachty je nutné upravit stávající technické řešení pro vedení plánované přeložky kanalizace.
- Šachtu KŠ3 je nutné stavebně upravit na rozdílnou dimenzi stávajícího potrubí kanalizačního řadu, než předpokládala PD.
- V trase SO 303 se nachází nevyužívaná betonová šachta neznámého původního účelu. Pro řádné provedení SO 303 je nutno tuto z části vybourat.

➤ Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude zapracováno do DSPS.

➤ Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Termín :
Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD.
- Cena :
Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to :

- Přípočet 164 813,81 Kč

Přípočet k SOD 164 813,81 Kč

Příloha :

- Kalkulace



Firma: COLAS CZ, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovátka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám, Mariánské Lázně

SO 303

164 813,81

Objekt:

02 část město Mariánské Lázně

Rozpočet:

SO 303 Přeložka kanalizace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
NOVÁ POLOŽKA						164 813,81	
001	131351102		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	M3	3,75	604,00	2 265,00
002	997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,62	193,00	1 084,66
003	162751134		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	M3	3,75	271,00	1 016,25
004	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,62	314,00	1 764,68
005	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	3,75	21,40	80,25
006	273321611		Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	M3	0,03	4 730,00	153,25
007	273351121		Zřízení bednění základových desek	m2	1,62	657,00	1 064,34
008	273351122		Odstranění bednění základových desek	m2	1,62	137,00	221,94
009	273362021		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,27	37 400,00	10 098,00
010	894201151		Dno šachet II přes 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	0,03	5 330,00	172,69
011	894302152		Stěny šachet II přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	2,20	5 220,00	11 484,00
012	341361821		Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,31	57 600,00	17 856,00
013	411324444		Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30	M3	0,03	4 990,00	161,68
014	894501221		Podpěrná kce bednění stropů šachet zřízení	m2	1,62	184,00	298,08
015	894501222		Podpěrná kce bednění stropů šachet odstranění	m2	1,62	49,50	80,19
016	411361821		Výztuž stropů betonářskou ocelí 10505	t	0,33	55 900,00	18 447,00
017	899311113		Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 100 do 150 kg	KUS	1,00	710,00	710,00
018	592245430R		deska betonová zákrytová šachty	KUS	1,00	15 000,00	15 000,00
019	899133111		Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šach	KUS	1,00	9 730,00	9 730,00
020	767835003		Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kovových do železobetonu	m	2,00	2 510,00	5 020,00
021	449830220		žebřík výstupový jednoduchý přímý z přírodního hliníku dl 2m	KUS	1,00	1 200,00	1 200,00
022	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,50	127,00	317,50
023	628530040		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2,75	213,00	585,75
024	711199097		Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	2,50	38,30	95,75
025	P000000901		Příplatek za ztížené prostředí sk.9 tř.0	hod	40,00	33,00	1 320,00
026	783823103		Penetrační akrylátový nátěr s plnivem hladkých betonových povrchů	m2	11,22	74,50	835,89
027	894703011R		Dlažba šachet čtyř a vícehranných z čedičové dlažby	m2	1,70	1 850,00	3 145,00
028	632326290		dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x25mm	m2	1,87	1 040,00	1 944,80
029	771591283		Pracnější řezání podlah z dlaždic čedičových rovné tl přes 20 do 25 mm	m	1,50	300,00	450,00
030	771569196		Příplatek k montáži podlah z čediče za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,70	63,70	108,29
031	771569192		Příplatek k montáži podlah z čediče za omezený prostor	m2	1,70	116,00	197,20
032	781464112		Montáž obkladů vnitřních z čediče 200x200 mm tl přes 20 do 25 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	9,60	562,00	5 395,20
033	632326060		dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x100x22mm	m2	2,96	1 220,00	3 611,20
034	632328100		dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x22mm	m2	7,60	875,00	6 650,00
035	781495184		Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	6,80	118,00	802,40
036	781469197		Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za lepení lepidlem dvousložkovým	m2	9,60	51,00	489,60
037	781469192		Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za omezený prostor	m2	9,60	312,00	2 995,20
038	781469191		Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za plochu do 10 m2	m2	9,60	35,70	342,72
039	998781101		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,62	765,00	474,30
040	877355122R		Úprava stávajícího potrubí pro napojení do šachty-asymetrické vyústění	kpl	1,00	16 530,00	16 530,00
041	857443131R		Provizorní propojení potrubí na stávající kanalizaci po dobu realizace DN 600-přepojová	kpl	1,00	8 250,00	8 250,00
042	857444122		Napojení nového řádu-úprava stávajícího vedení s použitím spojovací manžety	kpl	1,00	12 365,00	12 365,00
