

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 13

Projekt : " Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."

Změnu žádá :	Jméno, funkce, podpis :	Datum :	Strany příloh :
HOCHTIEF CZ a. s.	Ing. Daniel Motýčka	30.07.2024	.
			Příloha č. 1 – Rozpočet - 1 str
			Příloha č. 2 – Návrh - 1 str

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

Jedná se o náklady spojené s úpravou stávající prosklené fasády pavilonu N

Číslo výkresu : D-03-1-11 NAPOJENÍ NA PAVILON _N_

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Po demontáži části stávající prosklené fasády bylo zjištěno, že je nutné demontovat a následně upravit ještě jedno krajní pole.

Popis prací, které budou souviset se změnou :

Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny:

- Stavební práce dle přílohy a rozpočtu

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn činí: 268.184,60 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

Ne.

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 13

Vyjádření autorského dozoru (CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.) : **Ing. Milan Konkol**

Souhlasím / Nesouhlasím

Konečné vyjádření TDI : *Ing. Miroslav Geryk*

Souhlasím / Nesouhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :


Datum :

Jméno :

Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA

Podpis :

SOUPIS PRACÍ											
Stavba: Výstavba nadzemních koridírů ve slezské nemocnici v Opavě p.o.											
Objekt: ZL 13 - Úprava fasády u pavilonu N											
Místo: Opava											
Datum:											
Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o.									Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s.									Zpracovatel: HOCHTIEF CZ, a.s.		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J.cena [CZK] Rozpočet SoD	Umístění v rozpočtu SoD	J.cena [CZK] CS ÚRS 2024 01
Náklady soupisu celkem							268 184,60				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				268 184,60				
D	763		Konstrukce suché výstavby				268 184,60				
1	K	96607211R	Dodávka a montáž systémového opláštění kci _ LOP - 6F _ rekonstrukce fasády spojovacího krčku	m2	8,650	30 262,00	261 766,30	CS VLASTNÍ	30 262,00	D.03.1-3 pol. 303	-
VV					1,73*5	8,650					
2	K	OST03_R01	Demontáž opláštění stěn a kci _ rastrové prosklené fasády _ vč. AL profilů a příslušenství , budov v přes 6 do 12 m	m2	8,650	742,00	6 418,30	CS VLASTNÍ	742,00	D.03.1-3 pol.130	-

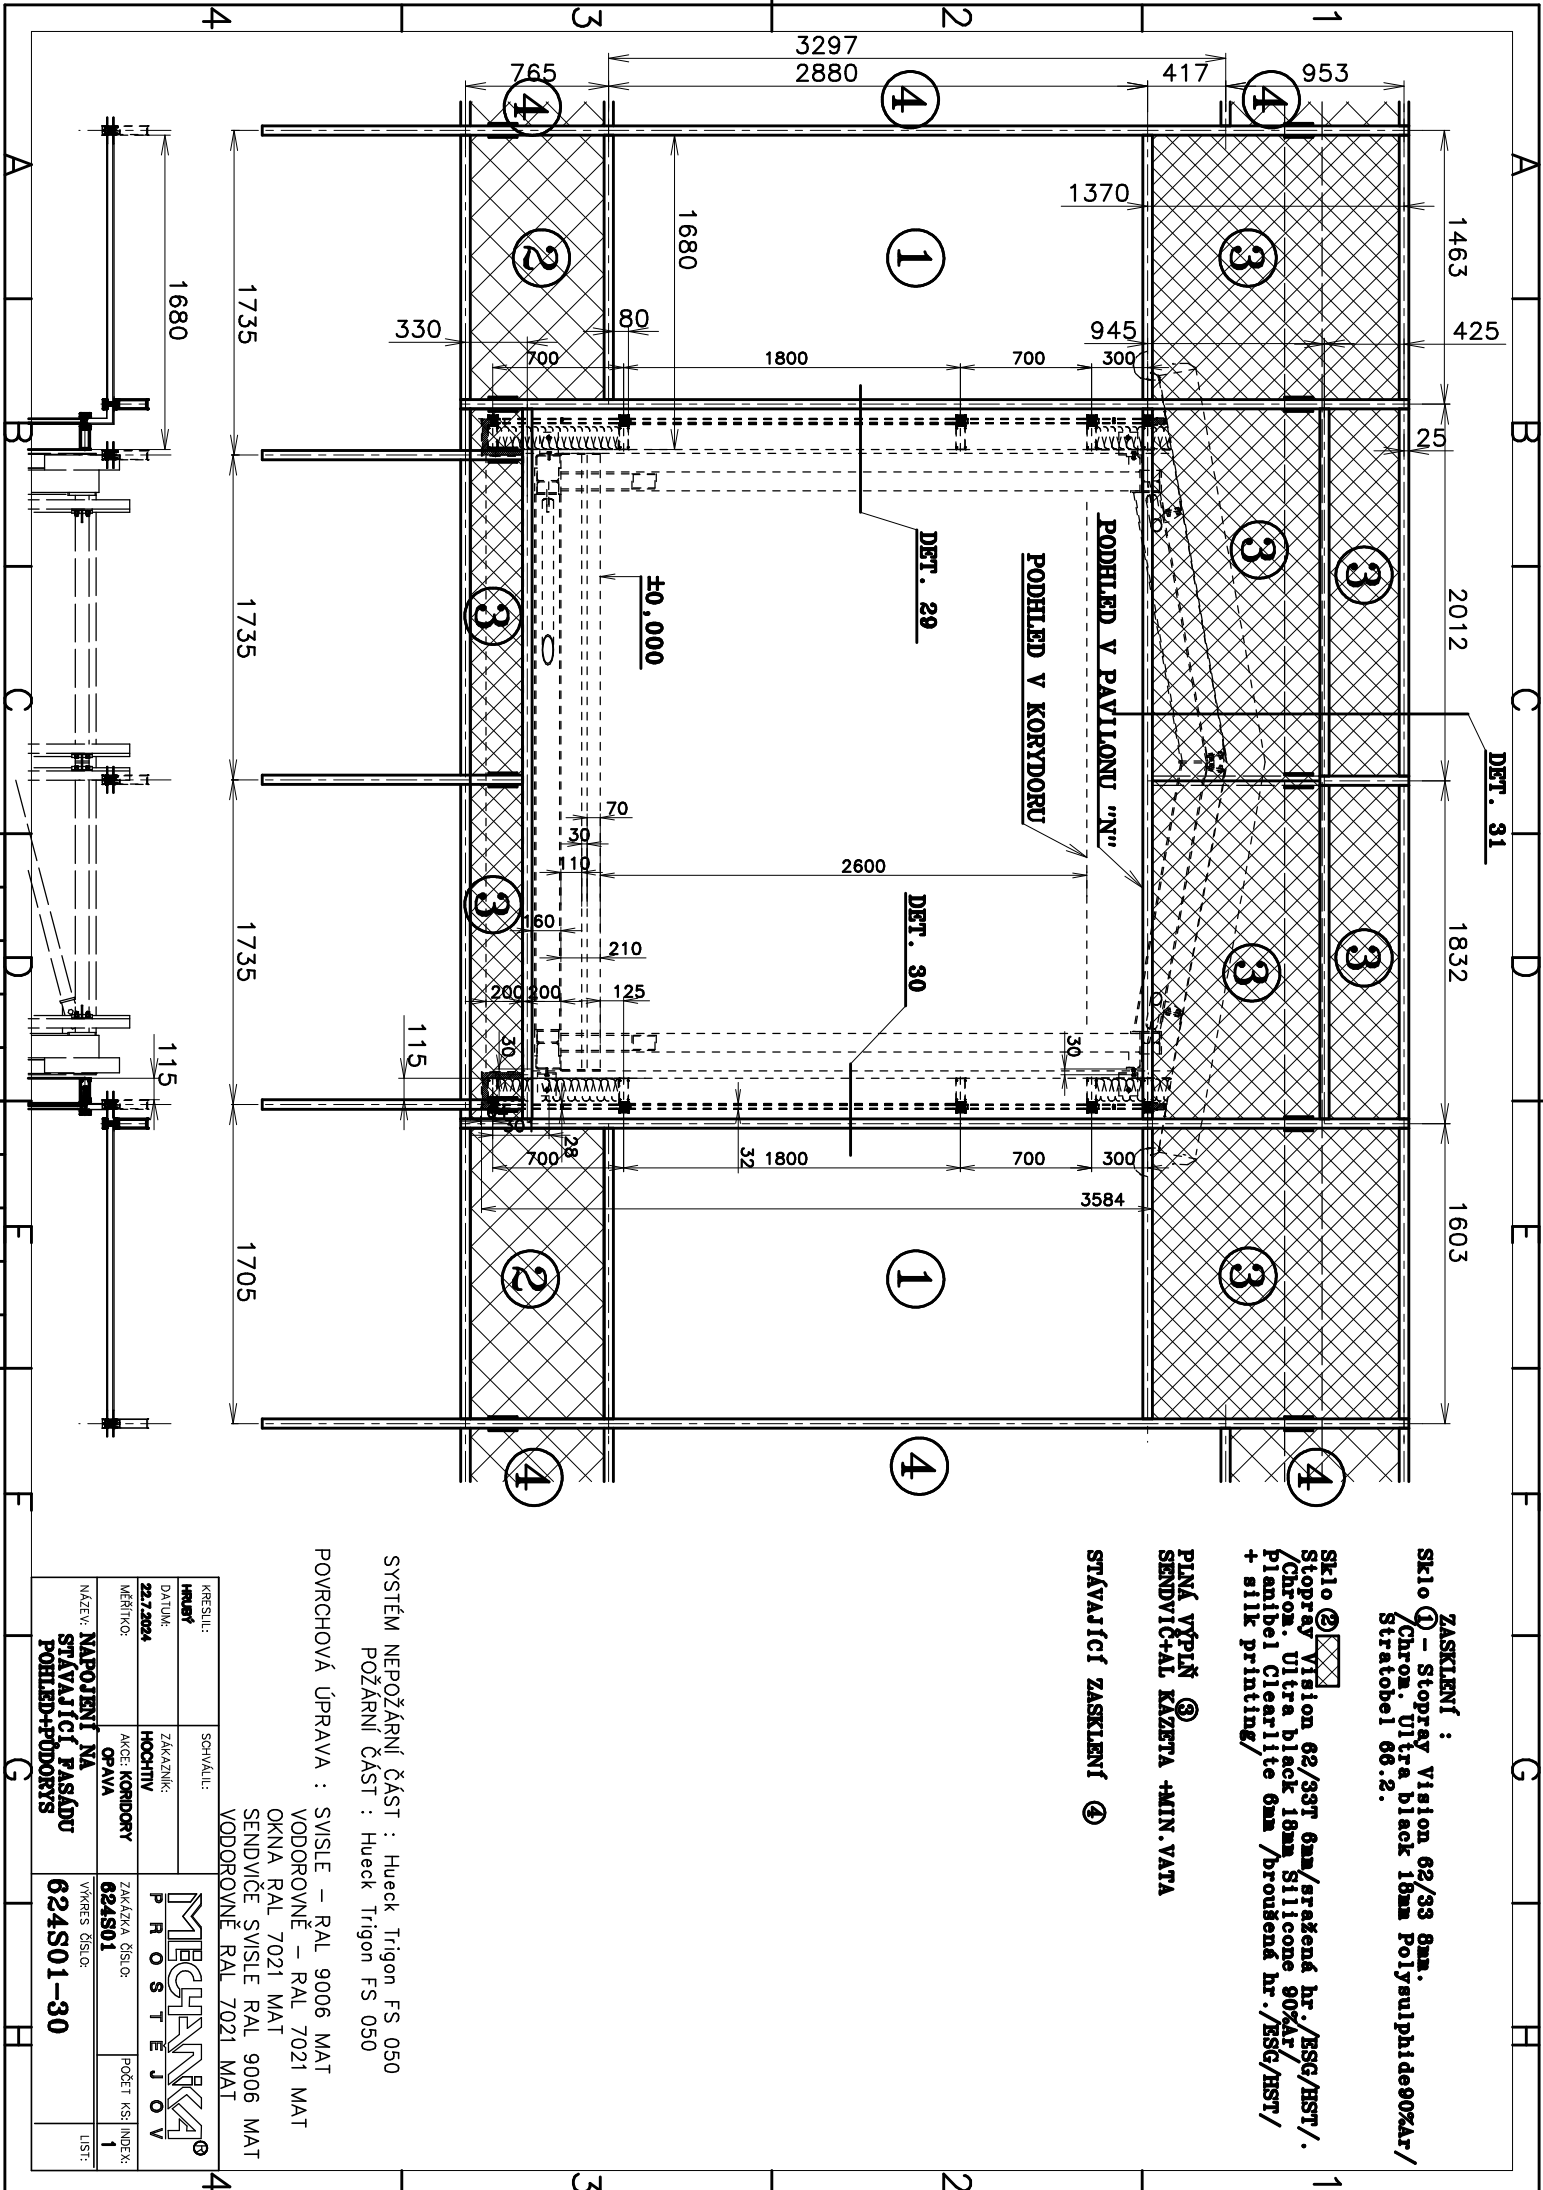

ZASKLENÍ :
SKLO ① - Stopray Vision 62/33 6mm.
/Chrom. Ultra black 18mm Polysulphide90%Ar/
Stratobel 66.2.

SKLO ②
Stopray Vision 62/33T 6mm/sražená hr./ESG/HST/.
/Chrom. Ultra black 18mm Silicone 90%Ar/
Plumbel Clearlite 6mm /broušená hr./ESG/HST/
+ silk printing/

PLNÁ VÝPLŇ ③
SENDEVIC+AL KAZETA +MIN.VATA

STAVAJÍCÍ ZASKLENÍ ④

KRESLIL:		SCHVÁLIL:	
HAJDUŠ			
DATAUM:	ZAKÁZNIK:	P R O S T E J O V	
22.7.2024	HOCHTIV		
MĚŘÍTKO:	AKCE: KORYDOR	ZAKÁZKA ČÍSLO:	POČET KS: INDEX:
	OPAVA	624S01	1
NÁZEV: NÁPOJENÍ NA		VÝKRES ČÍSLO:	LIST:
STAVAJÍCÍ PASADU		624S01-30	
POHLED+PODORYS			

SYSTÉM NEPOŽÁRNÍ ČÁST : Hueck Trigon FS 050
POŽÁRNÍ ČÁST : Hueck Trigon FS 050

POVRCHOVÁ ÚPRAVA : SVISLE – RAL 9006 MAT
VODOROVNĚ – RAL 7021 MAT
OKNA RAL 7021 MAT
SENDEVIC SVISLE RAL 9006 MAT
VODOROVNĚ RAL 7021 MAT
