



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 022

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO104.1 Přeložka silnice III/2322 - západní část		
Název / označení změny:	Přípočet frézování napojení nových AB vrstev		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.07.2024
Zdůvodnění a popis změny: Frézování pro napojení nových asphaltobetonových vrstev vozovky. Původní PDPS uvažuje pouze demolicí asfaltového souvrství stávajícího vozovky.			
Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			4 965,95 Kč
přípočty celkem:			4 965,95 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace obrázková příloha obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.	██████████		██████████
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.	██████████████████		██████████
objednatel /SÚSPK/	██████████		██████████
TDS DOZOR inženýring s.r.o.	██████████		██████████

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: **Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa**

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 965,95
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 965,95	1 042,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 008,80
-------------------	----------	------------	-----------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 965,95	6 008,80	
ZL22	Frézování napojení SO 104.1	4 965,95	6 008,80	STA
SO 104.1	Přeložka silnice III/2322 - západní část	4 965,95	6 008,80	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL22 - Frézování napojení SO 104.1
Soupis: **SO 104.1 - Přeložka silnice III/2322 - západní část**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 965,95

1 - Zemní práce

3 983,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

982,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
 Objekt: ZL22 - Frézování napojení SO 104.1
 Soupis: **SO 104.1 - Přeložka silnice III/2322 - západní část**

Místo: Rokycansko
 Zadavatel:
 Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 965,95


D	1	Zemní práce				3 983,10		
1	K	12573 b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,946			
	P		<i>Poznámka k položce: vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.</i>					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4					
	VV		"frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 5,5*1,2*0,07		0,462			
	VV		"frézování napojení obrusné vrstvy tl. 40 mm" 5,5*2,2*0,04		0,484			
	VV		Součet		0,946			
2	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1,100			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107141					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 01					
	VV		"frézování napojení obrusné vrstvy tl. 40 mm" 5,5*0,2		1,100			
	VV		Součet		1,100			
3	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1,100			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107042					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 01					
	VV		"frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 5,5*0,2		1,100			
	VV		Součet		1,100			
4	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 01					
	VV		"frézování napojení obrusné vrstvy tl. 40 mm" 5,5*2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
5	K	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	5,500			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 01					
	VV		"frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 5,5*1		5,500			
	VV		Součet		5,500			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				982,85		
6	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5,500			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 01					
	VV		"napojení obrusné vrstvy" 5,5		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,500			
7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,500			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 01					
	VV		"napojení podkladní vrstvy" 5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			

SO 104.1

ACO 40 mm

ACL 70 mm

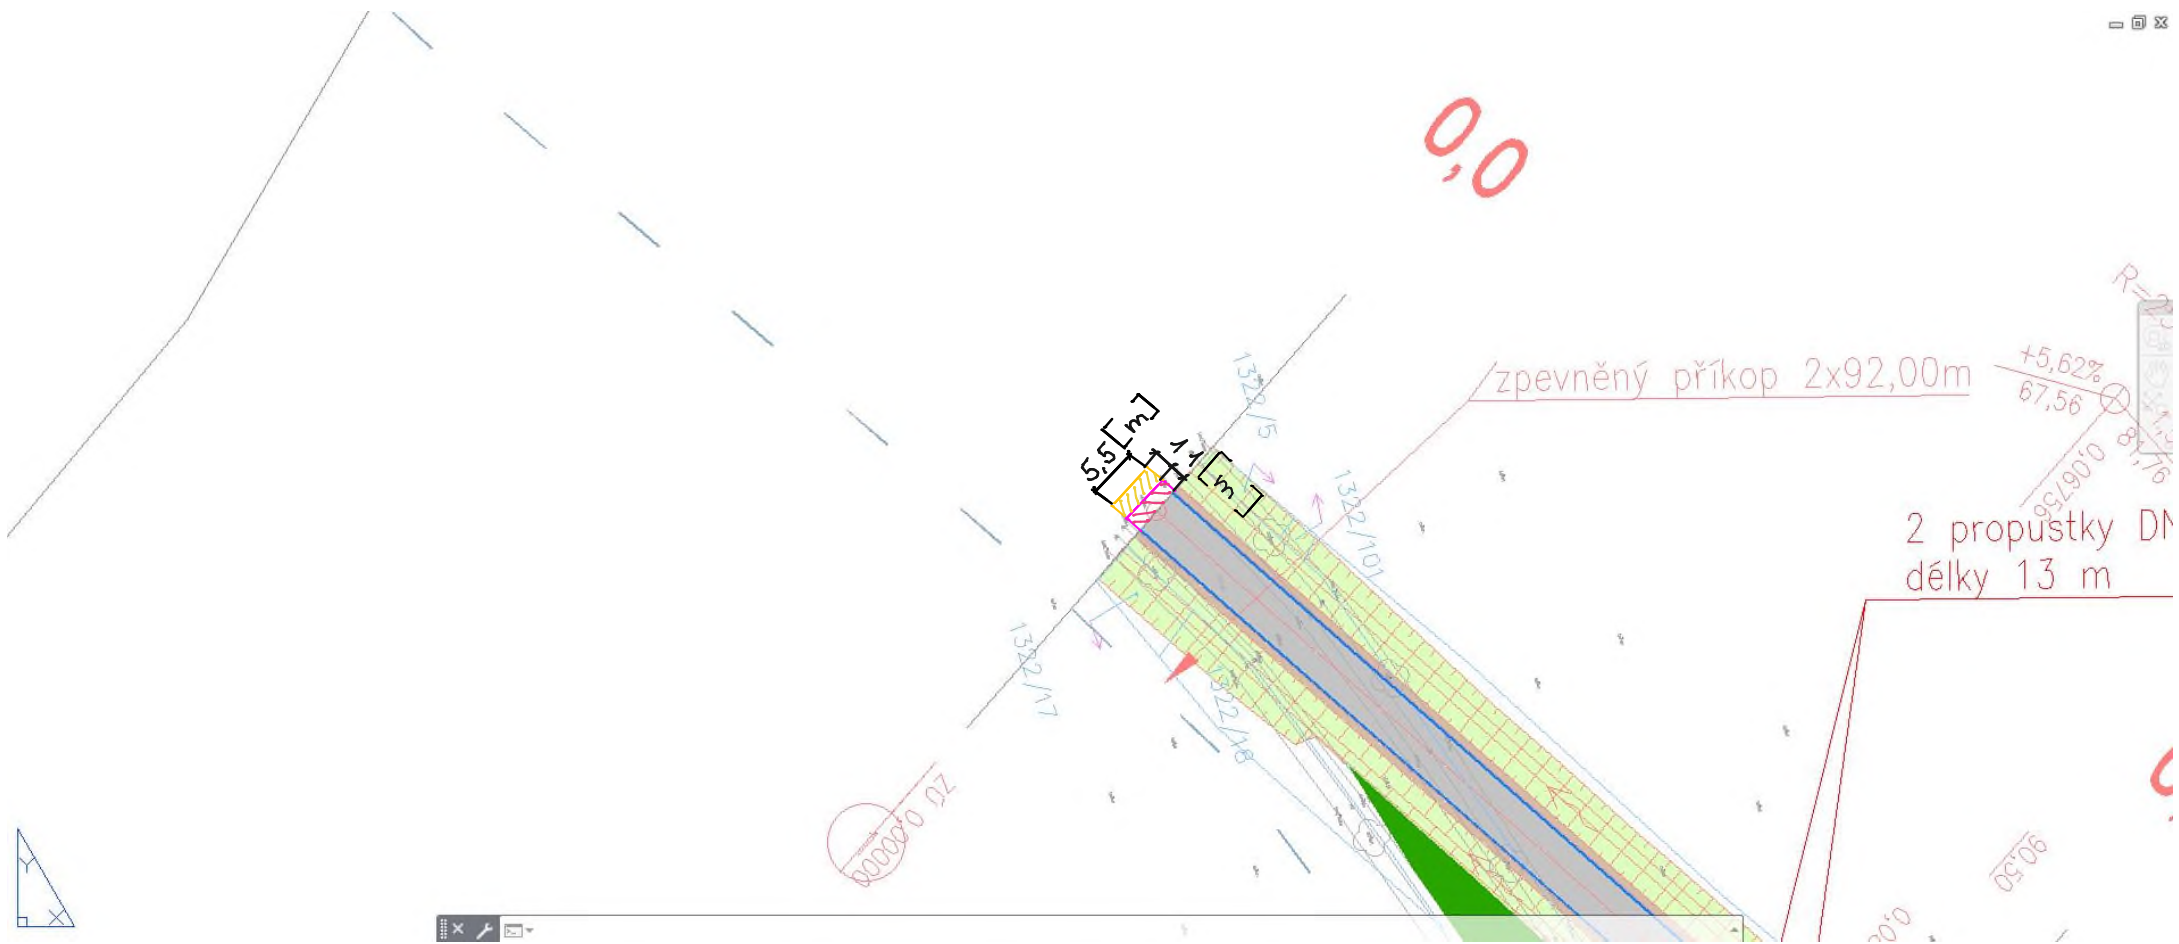



113107042

- Kompletní zobrazení**
- ▶ 013 - Budovy a haly – bourání konstrukcí
 - ▶ 014 - Budovy a haly – opravy a údržba
 - ▶ 015 - Objekty pozemní zvláštní
 - ▶ 211 - Mosty
 - ▶ 221 - Komunikace pozemní a letiště
 - ▶ A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
 - ▶ A99 - Přesun hmot
 - ▶ B01 - Bourání (demonťáž) konstrukcí objektů
 - ▶ 11 - Přípravné a přidružené práce
 - 1131051... - Rozebrání dlažeb z lomového kamene
 - 113106... - Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí
 - 1131061... - Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší
 - 113106... - Rozebrání dlažeb vozovek a ploch
 - 113106... - Rozebrání dílců vozovek a ploch
 - 1131063... - Rozebrání mobilních ploch z plastových zámkových segmentů
 - 113107... - Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí
 - 113107... - Odstranění podkladů nebo krytů
 - 113154... - Frézování živičného podkladu nebo krytu
 - 113155... - Frézování betonového podkladu nebo krytu
 - 1131562... - Tryskání ocelovými broky
 - 11320·1... - Vytrhání obrub
 - 1132051... - Vytrhání svodnic
 - ▶ 1133111... - Odstranění geosyntetik
 - ▶ 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
 - ▶ 96 - Bourání konstrukcí
 - ▶ B99 - Doprava sutí a vybouraných hmot

O	Cenik	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
			113107...	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek			
				ručně			
				z kameniva těžného, o tl. vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107011	do 100 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107012	přes 100 do 200 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107013	přes 200 do 300 mm	m2		
				z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107021	do 100 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107022	přes 100 do 200 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107023	přes 200 do 300 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107024	přes 300 do 400 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107025	přes 400 do 500 mm	m2		
				z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107026	přes 250 do 450 mm	m2		
				z betonu prostého, o tl. vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107030	do 100 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107031	přes 100 do 150 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107032	přes 150 do 300 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107033	přes 300 do 400 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107034	přes 400 do 500 mm	m2		
				z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107035	do 100 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107036	přes 100 do 150 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107037	přes 150 do 300 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107038	přes 300 do 400 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107039	přes 400 do 500 mm	m2		
				živičných, o tl. vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107041	do 50 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107042	přes 50 do 100 mm	m2		

113107141

X Zrušit

Konstrukce: 1
Materiály: 0 [Vyhledej v Materiálech online](#)

Kompletní zobrazení

- 221 - Komunikace pozemní a letiště
 - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
 - 11 - Přípravné a přidružené práce
 - 113107... - Odstranění podkladů nebo krytů

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
			221	Komunikace pozemní a letiště			
			B01	Bourání (demontáž) konstrukcí objektů			
			11	Přípravné a přidružené práce			
			113107...	Odstranění podkladů nebo krytů			
				ručně			
				s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek			
				živičných, o tl. vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107141	do 50 mm	m2		

113154112

Konstrukce: 1

Materiály: 0 [Vyhledej v Materiálech online](#)

Kompletní zobrazení

- 221 - Komunikace pozemní a letiště
 - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
 - 11 - Přípravné a přidružené práce
 - 113154... - Frézování živičného podkladu nebo krytu


O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
			221	Komunikace pozemní a letiště			
			B01	Bourání (demontáž) konstrukcí objektů			
			11	Přípravné a přidružené práce			
			113154...	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154112	40 mm	m2		




113154114 X Zrušit  

Konstrukce: 1

Materiály: 0 [Vyhledej v Materiálech online](#)

Kompletní zobrazení 

- 221 - Komunikace pozemní a letiště
 - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
 - 11 - Přípravné a přidružené práce
 -  113154... - Frézování živičného podkladu nebo krytu

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
			221	Komunikace pozemní a letiště			
			B01	Bourání (demontáž) konstrukcí objektů			
			11	Přípravné a přidružené práce			
			113154...	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154114	100 mm	m2		

919735111

- Kompletní zobrazení**
- 005 - Sanace
 - 006 - Demolice objektů
 - 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické
 - 012 - Budovy a haly – montované
 - 013 - Budovy a haly – bourání konstrukcí
 - 014 - Budovy a haly – opravy a údržba
 - 015 - Objekty pozemní zvláštní
 - 211 - Mosty
 - 221 - Komunikace pozemní a letiště
 - A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
 - A99 - Přesun hmot
 - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
 - 11 - Přípravné a přidružené práce
 - 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
 - 9113818** - Odstranění silničního betonového svodidla
 - 9113818** - Odstranění městské ochranné zábrany
 - 9197351** - Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu
 - 9197351** - Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu
 - 9197918** - Odstranění ochrany

O	Cenik	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381823	1,0 m	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381824	1,2 m	m		
			9113818**	Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 1 m, výšky			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381832	0,5 m	m		
				délky 2 m, výšky			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381835	0,5 m	m		
				oblouku pravouhého o poloměru 1 m, výšky			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381842	0,5 m	kus		
			9197351**	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky			
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735111	do 50 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735112	přes 50 do 100 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735113	přes 100 do 150 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735114	přes 150 do 200 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735115	přes 200 do 250 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735116	přes 250 do 300 mm	m		

919735112

Kompletní zobrazení

- ▶ 005 - Sanace
- ▶ 006 - Demolice objektů
- ▶ 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické
- ▶ 012 - Budovy a haly – montované
- ▶ 013 - Budovy a haly – bourání konstrukcí
- ▶ 014 - Budovy a haly – opravy a údržba
- ▶ 015 - Objekty pozemní zvláštní
- ▶ 211 - Mosty
- ▶ 221 - Komunikace pozemní a letiště
 - ▶ A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
 - ▶ A99 - Přesun hmot
 - ▶ B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
 - ▶ 11 - Přípravné a přidružené práce
 - ▶ 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
 - 9113818** - Odstranění silničního betonového svodidla
 - 9113818** - Odstranění městské ochranné zábrany
 - 9197351** - Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu
 - 9197351** - Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu
 - 9197918** - Odstranění ochrany

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381823	1,0 m	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381824	1,2 m	m		
			9113818**	Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 1 m, výšky			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381832	0,5 m	m		
				délky 2 m, výšky			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381835	0,5 m	m		
				oblouku pravouhého o poloměru 1 m, výšky			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381842	0,5 m	kus		
			9197351**	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky			
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735111	do 50 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735112	přes 50 do 100 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735113	přes 100 do 150 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735114	přes 150 do 200 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735115	přes 200 do 250 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735116	přes 250 do 300 mm	m		

Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO104.1 Přeložka silnice III/2322 - západní část

ZL č.: 022

Název změny: Přípočet frézování napojení nových AB vrstev

Nejedná se o změnu technického řešení.

AD souhlasí s navrženou změnou.



S pozdravem



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 22

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 022

Název ZL: SO 104.1 Frézování napojení

Zdůvodnění:

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. PD uvažovala pouze demolicí asfaltového souvrství stávající vozovky.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.

Odpočítané položky: -0,00 Kč

Připočítané položky: 4 965,95 Kč

Celkem ZL: 4 965,95 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS: 

