



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 024

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Dotčená část stavby:</b>	SO105 Přeložka silnice III/2325		
<b>Název / označení změny:</b>	Přípočet frézování napojení nových AB vrstev		
<b>Podklad pro změnu:</b>	Skutečný stav na stavbě		
<b>Návrh pro změnu podal:</b>	Zhotovitel	<b>Dne:</b>	15.07.2024
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Frézování pro napojení nových asfaltobetonových vrstev vozovky. Původní PDPS uvažuje pouze demolici asfaltového souvrství stávajícího vozovky.			
<b>Změna se týká položek:</b> viz příložený rozpočet			
<b>Způsob ocenění změny:</b>	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / <del>individuální kalkulace</del>		
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>		<b>NE</b>	
<b>Vliv změny na cenu díla:</b>		<b>ANO</b>	
<b>Náklady na změnu celkem:</b>			5 722,60 Kč
<b>přípočty celkem:</b>			5 722,60 Kč
<b>odpočty celkem:</b>			- Kč
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
<b>firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL24 - Frézování napojení SO 105

Soupis: **SO 105 - Přeložka silnice III/2325**

Místo: Rokycansko

Zadavatel:  
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**5 722,60**

1 - Zemní práce

4 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 198,60

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa  
 Objekt: ZL24 - Frézování napojení SO 105  
 Soupis: **SO 105 - Přeložka silnice III/2325**

Místo: Rokycansko  
 Zadavatel:  
 Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 722,60**


D	1	Zemní práce					4 524,00	
1	K	12573 b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1,118			
	P		<i>Poznámka k položce: vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.</i>					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4					
	VV		"frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" (6,5)*1,2*0,07		0,546			
	VV		"frézování napojení obrusné vrstvy tl. 40 mm" (6,5)*2,2*0,04		0,572			
	VV		Součet		1,118			
2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,600			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142</a>					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 02					
	VV		"frézování napojení obrusné vrstvy tl. 40 mm" (6,5*0,2)		1,300			
	VV		"frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" (6,5*0,2)		1,300			
	VV		Součet		2,600			
3	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	13,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512</a>					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 02					
	VV		"frézování napojení obrusné vrstvy tl. 40 mm" (6,5*2)		13,000			
	VV		Součet		13,000			
4	K	113154515	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	6,500			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154515">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154515</a>					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 02					
	VV		"frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" (6,5*1)		6,500			
	VV		Součet		6,500			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 198,60	
5	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,500			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111</a>					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 02					
	VV		"napojení obrusné vrstvy Vítinka a Osek" 6,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,500			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112</a>					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 02					
	VV		"napojení podkladní vrstvy Vítinka a Osek" 6,5		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,500			

SO 105

ACO 40 mm

ACL 70 mm

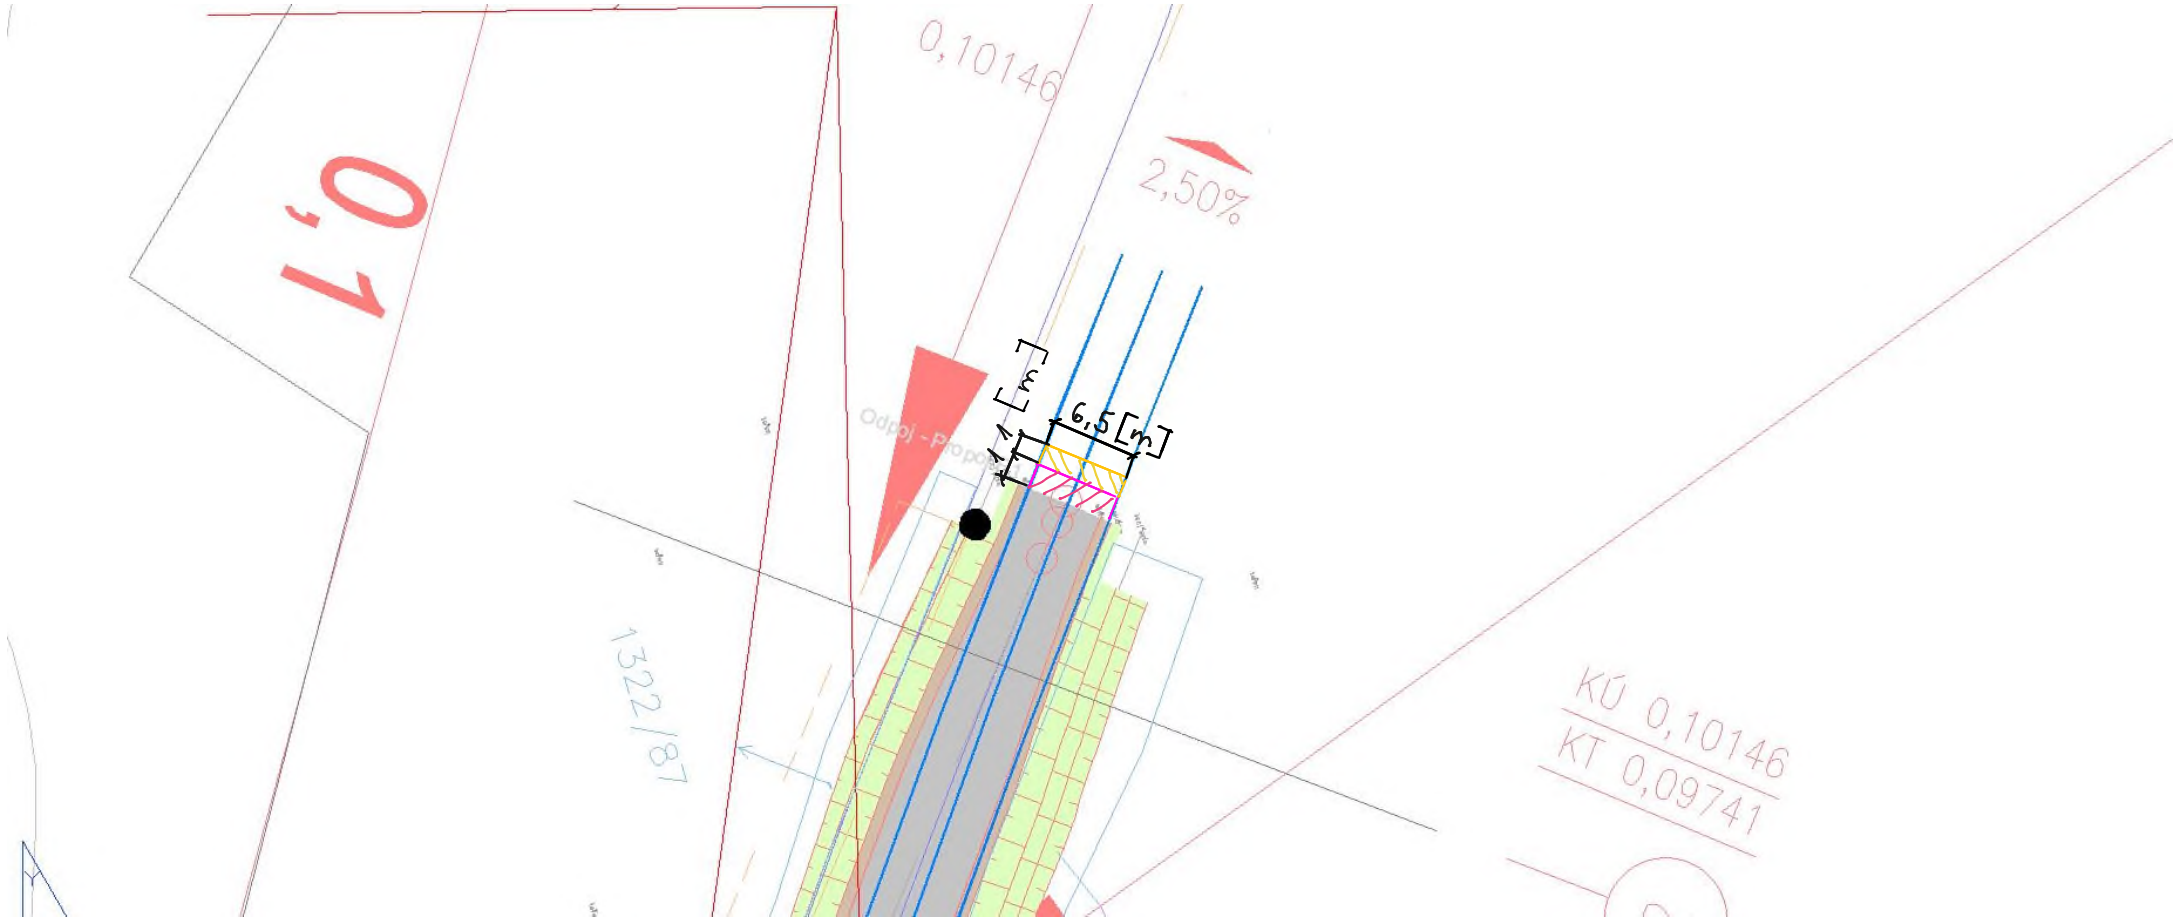

113107142

- Kompletní zobrazení**
- ▶ 015 - Objekty pozemní zvláštní
  - ▶ 211 - Mosty
  - ▲ 221 - Komunikace pozemní a letiště
    - ▶ A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
    - ▶ A99 - Přesun hmot
    - ▲ B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
      - ▶ 113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107139	přes 400 do 500 mm	m2		
				<b>živičných, o tl. vrstvy</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107141	do 50 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107142	přes 50 do 100 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107143	přes 100 do 150 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107144	přes 150 do 200 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107145	přes 200 do 250 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107146	přes 250 do 300 mm	m2		

113154512



## Kompletní zobrazení



- 211 - Mosty
- 221 - Komunikace pozemní a letiště
  - A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
  - A99 - Přesun hmot
  - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
    - 113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů
      - 1131051\*\* - Rozebrání dlažeb z lomového kamene

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107246	přes 250 do 300 mm	m2		
			1131545**	<b>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154511	do 30 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154512	40 mm	m2		

113154515

## Kompletní zobrazení

- 211 - Mosty
- 221 - Komunikace pozemní a letiště
  - A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
  - A99 - Přesun hmot
  - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
    - 113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů
      - 1131051... - Rozebrání dlažeb z lomového kamene
      - 113106... - Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí
      - 1131061... - Rozebrání dlažeb

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107246	přes 250 do 300 mm	m2		
			1131545..	<b>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154511	do 30 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154512	40 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154513	50 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154514	60 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154515	70 mm	m2		



919735111



**Kompletní zobrazení**

- ▶ 005 - Sanace
- ▶ 006 - Demolice objektů
- ▶ 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické
- ▶ 012 - Budovy a haly – montované
- ▶ 013 - Budovy a haly – bourání konstrukcí
- ▶ 014 - Budovy a haly – opravy a údržba
- ▶ 015 - Objekty pozemní zvláštní

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381835	0,5 m	m		
				<b>oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381842	0,5 m	kus		
			9197351**	<b>Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu</b>			
				<b>hloubky</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735111	do 50 mm	m		

919735112



## Kompletní zobrazení

- ▶ 005 - Sanace
- ▶ 006 - Demolice objektů
- ▶ 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické
- ▶ 012 - Budovy a haly – montované
- ▶ 013 - Budovy a haly – bourání konstrukcí
- ▶ 014 - Budovy a haly – opravy a údržba
- ▶ 015 - Objekty pozemní zvláštní
- ▶ 211 - Mosty

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381835	0,5 m	m		
				<b>oblouku pravouhého o poloměru 1 m, výšky</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381842	0,5 m	kus		
			9197351..	<b>Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu</b>			
				<b>hloubky</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735111	do 50 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735112	přes 50 do 100 mm	m		

**Ragemia, s.r.o.**

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

## **Vyjádření autorského dozoru**

**Stavba:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

**Objekt:** SO105 Přeložka silnice III/2325

**ZL č.:** 024

**Název změny:** Přípočet frézování napojení nových AB vrstev

Nejedná se o změnu technického řešení.

AD souhlasí s navrženou změnou.



S pozdravem



Ragemia, s.r.o.

## STANOVISKO TDS K ZL č. 24

**Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa**

Číslo ZL: 024

Název ZL: SO 105 Frézování napojení

### **Zdůvodnění:**

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. PD uvažovala pouze demolici asfaltového souvrství stávající vozovky.

**Stanovisko TDS:** TDS souhlasí se změnou.

### **Technické posouzení:**

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky.

### **Ocenění změny (bez DPH):**

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.

Odpočítané položky: -0,00 Kč

Připočítané položky: 5 722,60 Kč

**Celkem ZL: 5 722,60 Kč**

**Závěr:** Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS: [redacted]

**D**  
D  
Koterovská 574/177  
www.  
1  
eň  
3
